




FECHA (D/M/A): 10/12/2025				BITACORA DE OBRA	
1. DATOS GENERALES					
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):		fallos			
RANGO:	4	CANTIDAD:	100.26 ton / 42.66 m ³		
ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	17		
COMUNA	1 - POBLAEC				
SARRIO	LA AVANZADA				
2. DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025				CONTRATO No. 4600105052 DE 2025	
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377				CONTRATO No. 4600105322 DE 2025	
HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:			
INICIO:	8:00 Am	Jornada nocturna			
TERMINACIÓN:	4:21 Am				
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA	Despejada		
		TARDE	despejada		
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES					
1. localización del frente de trabajo y zona a intervenir.					
2. Señalización de área de intervención según Pmt.					
3. Marcación de carril y ABSURADO A intervenir.					
4. Fresado carpeta asfáltica con patologías (Acl de cocodrilo, Grietas, Baches, Etc)					
5. Demolicion de carpeta asfáltica con compresor donde no LLEGAA la Fresadora.					
6. limpieza de carril y Retiro de escombros.					
7. l/ba con emulsion asfáltica en tibia					
8. Aplicación de mezcla asfáltica MSC-19+RAP tibia, con Finisher.					
9. Compactación de mezcla asfáltica con vibró-compactador Mixto.					
10. Sellado de carpeta asfáltica con compactador de llantas.					
11. Retiro de señalización con Pmt.					
12. Orden y Aseo en frente de trabajo.					
Nota: se solicita al contratista que tenga en obra la unidad sanitaria ya que es de uso obligatorio.					
Nota: Registro fotografico de aguas que salen del telud sin tratamientos las cuales Afectan directamente la carpeta asfáltica.					
5. VISITANTES					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>					
6. FIRMAS					
NOMBRE:	Kelly Jimenez ✓		Jonny Alexander Anselo Gomez		
	Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA		Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR		
FIRMA					
NOMBRE:	Luis Alejandro Castro E		Cristian D. Gomez A		
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA		Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR		

FECHA (D/M/A): 10/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL


No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Kelly Jimenez / Alejandra Giraldo			
2	Encargado	Ferny Franco			
3	Liguero	Albeiro Agudelo			
4	Rastrillero	Juan David Jimenez			
5	Rastrillero	Hernando Abuiné			
6	Ayudante	Raul Restrepo			
7	Ayudante	Cristian Hoyos			
8	Ayudante	Silfredo Beltran			
9	Ayudante	Jhonathan Jaramillo			
10	Ayudante	Jhon Esteban Avendaño			
11	Ayudante	Wilson Amaya			
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jesus Arlen David			
18	Operador fresadora	Juan Carlos Valencia			
19	Operador finisher	Onofre Suarez			
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Edwin Cardona			
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Albeiro Agudelo			
25	Operador Mini cargador	Sebastián de la Cruz			
26	Operador Barredora	Sebastián de la Cruz			
27	Coductor Carrotanque	Jaime Gomez			
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Atlas Copco XA-598			
3	Fresadora	Wirtgen W-1900 CP			
4	Finisher	Vögele 1603-3			
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Ingersoll Rand SD-770A			
7	Compactador llantas	hyster CAT CW-16			
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	LEE BOY			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai Hsl 050			
13	Barredora	" " "			
14	Carrotanque				
15	Camión	CSY 314 Hino			
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 10/12/2025

10. ESQUEMAS

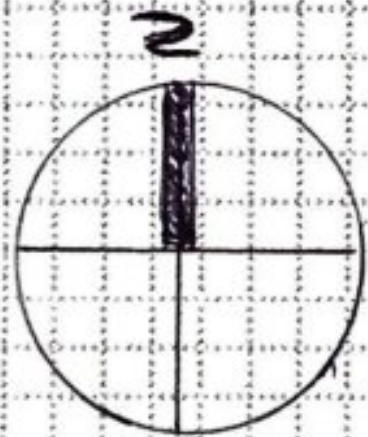

EL 108



EL 28



1A

1B

1C

2

EL 28

SEGMEN TO DE VÍA
3000 349

LA AVANZADA

TIPO DE INTERVENCIÓN:

FALLOS

FRENTE

17

RANGO:

4

CANTIDAD:

42.66 m³

BARRIO

2A AVANZADA

DIRECCIÓN

EL 28 EL 109 EL 110

PROCOFAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 235488

235488

FECHA: 10/12/2025

HORA: 9:35:53 PM

CONDUCTOR: ROBERTO VALDERR

PLACA: TRH823

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.33 Tonnes

PESO TARA: 11.79 Tonnes

PESO NETO: 20.54 Tonnes

20.54 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 80.66 Tonnes

Kelly JV.

PROCOFAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 235489

235489

FECHA: 10/12/2025

HORA: 9:43:04 PM

CONDUCTOR: YEISON CIRIO

PLACA: TRH821

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 31.57 Tonnes

PESO TARA: 11.97 Tonnes

PESO NETO: 19.60 Tonnes

19.60 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 100.26 Tonnes

Kelly JV

FERNES

PROCDPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA:

235485

235485

FECHA: 10/12/2025

HORA: 9:07:32 PM

CONDUCTOR: EDGAR CORREA

PLACA: LCL816

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.42 Tonnes

PESO TARA: 12.38 Tonnes

PESO NETO: 20.04 Tonnes

20.04 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 20.04 Tonnes

Kelly J.V.

PROCDPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA:

235486

235486

FECHA: 10/12/2025

HORA: 9:17:52 PM

CONDUCTOR: GUSTAVO VELEZ

PLACA: LCL915

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.25 Tonnes

PESO TARA: 12.23 Tonnes

PESO NETO: 20.02 Tonnes

20.02 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 40.06 Tonnes

Kelly J.V.

PROCDPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA:

235487

235487

FECHA: 10/12/2025

HORA: 9:26:28 PM

CONDUCTOR: WILSON FRANCO

PLACA: TRG817

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.25 Tonnes

PESO TARA: 12.19 Tonnes

PESO NETO: 20.06 Tonnes

20.06 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 60.12 Tonnes

Kelly J.V.

