

FECHA (D/M/A): 11/12/2025				BITACORA DE OBRA  Alcaldía de Medellín <small>Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA	
1. DATOS GENERALES					
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):		FALLOS			
RANGO:	4	CANTIDAD:	85.28 ton / 36.29 m ³		
ZONA:	1	FRENTE DE TRABAJO:	17		
COMUNA:	7 - Popular				
BARRIO:	LA AVANZADA				
2. DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025				CONTRATO No. 4600105052 DE 2025	
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377				CONTRATO No. 4600105322 DE 2025	
HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:			
INICIO:	7:30 pm	Jornada nocturna			
TERMINACIÓN:	4:12 AM				
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA	Despejada		
		TARDE	Despejada		
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES					
1. Localización del Frente de Trabajo y zona a intervenir.					
2. Señalización de área de intervención según pmt.					
3. Marcación de carril y Adecuado a intervenir.					
4. Fresado carpeta asfáltica con patologías (Piel de cocodrilo, grietas, baches, etc)					
5. Demolicion de carpeta asfáltica con compresor donde no llega la fresadora.					
6. Limpieza de carril y Retiro de escombros.					
7. Liga con emulsion asfáltica en tibia					
8. Aplicación de mezcla asfáltica RSC-19+RAP TIBIA, con Finisher.					
9. Compactación de mezcla asfáltica con vibrador-compactador mixto.					
10. Sellado de carpeta asfáltica con compactador de llantas.					
11. Retiro de señalización con pmt.					
12. Orden y Aseo en frente de trabajo.					
Nota: se hace marcación de 6 Reales de mt en el trayecto de Recapeo.					
5. VISITANTES					
6. FIRMAS					
NOMBRE: Kelly Jimenez		Jonny Alexander Anzulo Gómez			
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA		Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR			
FIRMA		FIRMA			
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.		NOMBRE: Cristian D. Giraldo A.			
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA		Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR			

FECHA (D/M/A): 11/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL



[illegible]

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Atlas Copco MA-54B			
3	Fresadora	Wartgen W 1900-CP			
4	Finisher	Voöelc 1603-3			
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Ingersoll Rand SD-7704			
7	Compactador llantas	hyster CAT CW-16			
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	LEEBOY			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai HSL 050			
13	Barredora	" "			
14	Carrotanque				
15	Camión	Esy 314 Hino			
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 11/12/2025

10. ESQUEMAS

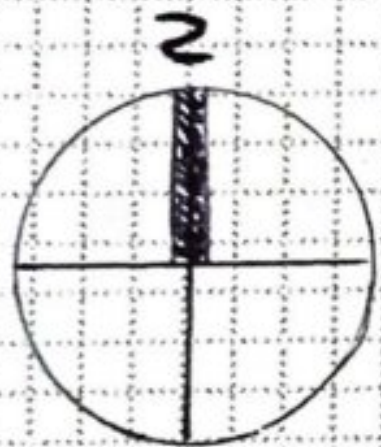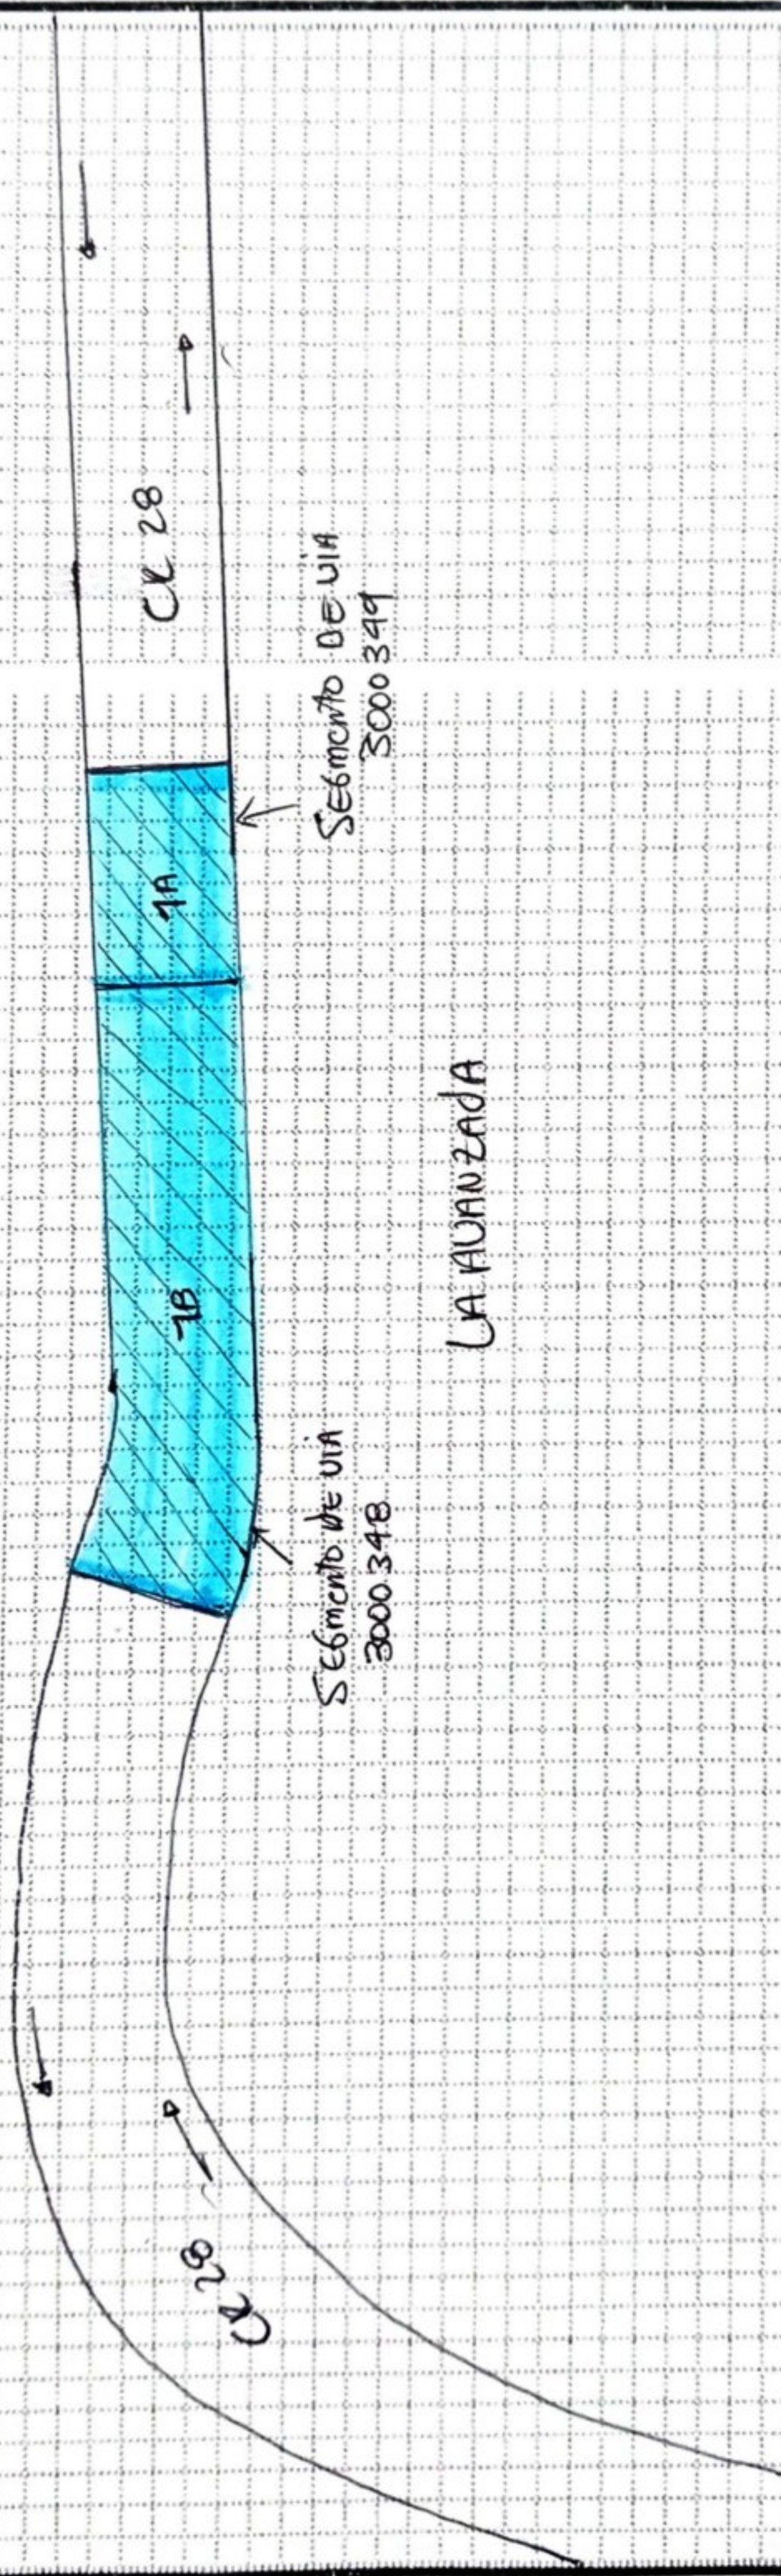

TIPO DE INTERVENCIÓN:

FALLOS

FRENTE

77

RANGO:

4

CANTIDAD:

36.29 M³

BARRIO

LA AVANZADA

DIRECCIÓN

CL 28 CL108E CL109

PROCCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

①

TIGUETE DE BASCULA: 235507

235507

FECHA: 11/12/2025

HORA: 8:44:28 PM

CONDUCTOR: EDGAR CORREA

PLACA: LCL816

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 33.74 Tonnes

PESO TARA: 12.38 Tonnes

PESO NETO: 21.36 Tonnes

21.36 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIRIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 21.36 Tonnes

Kelly J.V.

PROCCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

②

TIGUETE DE BASCULA: 235508

235508

FECHA: 11/12/2025

HORA: 8:55:00 PM

CONDUCTOR: GUSTAVO VELEZ

PLACA: LCL915

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 33.64 Tonnes

PESO TARA: 12.21 Tonnes

PESO NETO: 21.43 Tonnes

21.43 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIRIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 42.79 Tonnes

Kelly J.V.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

(3)

TIQUETE DE BASCULA: 235509

235509

FECHA: 11/12/2025

HORA: 9:03:36 PM

CONDUCTOR: ROBERTO VALDERR

PLACA: TRH823

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 33.12 Tonnes

PESO TARA: 11.74 Tonnes

PESO NETO: 21.38 Tonnes

21.38 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 64.17 Tonnes

Kelly J.V.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

(4)

TIQUETE DE BASCULA: 235510

235510

FECHA: 11/12/2025

HORA: 9:12:42 PM

CONDUCTOR: WILSON FRANCO

PLACA: TRGB17

OBRA: 2310

MAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 33.26 Tonnes

PESO TARA: 12.14 Tonnes

PESO NETO: 21.12 Tonnes

21.12 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 85.29 Tonnes

Kelly J.V.
