




FECHA (D/M/A): 15/12/2025		BITÁCORA DE OBRA	
1. DATOS GENERALES			
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):		FALLOS	
RANGO:	4	CANTIDAD:	119.19 ton / 50.72 m ³
ZONA:	7	FRENTE DE TRABAJO:	17
COMUNA:	1 - Popular		
BARRIO:	Santo Domingo Savio 2		
 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA			
2. DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025		CONTRATO No. 4600105052 DE 2025	
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377		CONTRATO No. 4600105322 DE 2025	
HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	
INICIO:	8:00 Pm	Jornada Nocturna.	
TERMINACIÓN:	4:54 Am		
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA	Noche Parcialmente nublada
		TARDE	Nublada.
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES			
1. localización del frente de trabajo y zona a intervenir			
2. Señalización de área de intervención según PNT.			
3. marcación de carril y Absorbido a intervenir.			
4. Fresado carpeta asfáltica con patologías (Acl de rodado, baches, grietas, etc)			
5. Demolición de carpeta asfáltica con compresor donde no llega la Absorbida.			
6. limpieza de carril y Retiro de Escombros.			
7. liga con Emulsion asfáltica en Tigris.			
8. Aplicación de mezcla asfáltica MSO-19 + Rap Tigris, con Finisher.			
9. Compactación de mezcla Asfáltica con Vibró-compactador mixto.			
10. Sellado de carpeta asfáltica con compactador de llantas.			
11. Retiro de señalización con PNT.			
12. Orden y Aseo en Frente de trabajo.			
Nota: Se presenta incidente con dos chicas motociclistas las cuales invadieron la obra que se estaba fresando y chocaron con una volqueta, las chicas estaban sin casco y recibieron primeros auxilios por parte de la policía del Cuadrante los cuales llamaron la Ambulancia.			
5. VISITANTES			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
6. FIRMAS			
NOMBRE: Kelly Jimenez V		Jonny Alexander Angulo Gómez	
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA		Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR	
FIRMA: 		FIRMA: 	
NOMBRE: Lina María Ríos		NOMBRE: Wilson D. Guevara	
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA		Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR	

[illegible]

8. MAQUINARIA Y EQUIPO					
No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Sí	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Atlas Copco XA-598			
3	Fresadora	Wirtgen W 100-CP			
4	Finisher	Vögele 1603-3			
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Ingersoll Rand SD-77DA			
7	Compactador llantas	Hyster cat CW-16			
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	LEEROY			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai HSL 850-7A			
13	Barredora	Hyundai HSL 850-7A			
14	Carrotanque				
15	Camión	Esy 314 Hino			
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 15/12/2025

10. ESQUEMAS

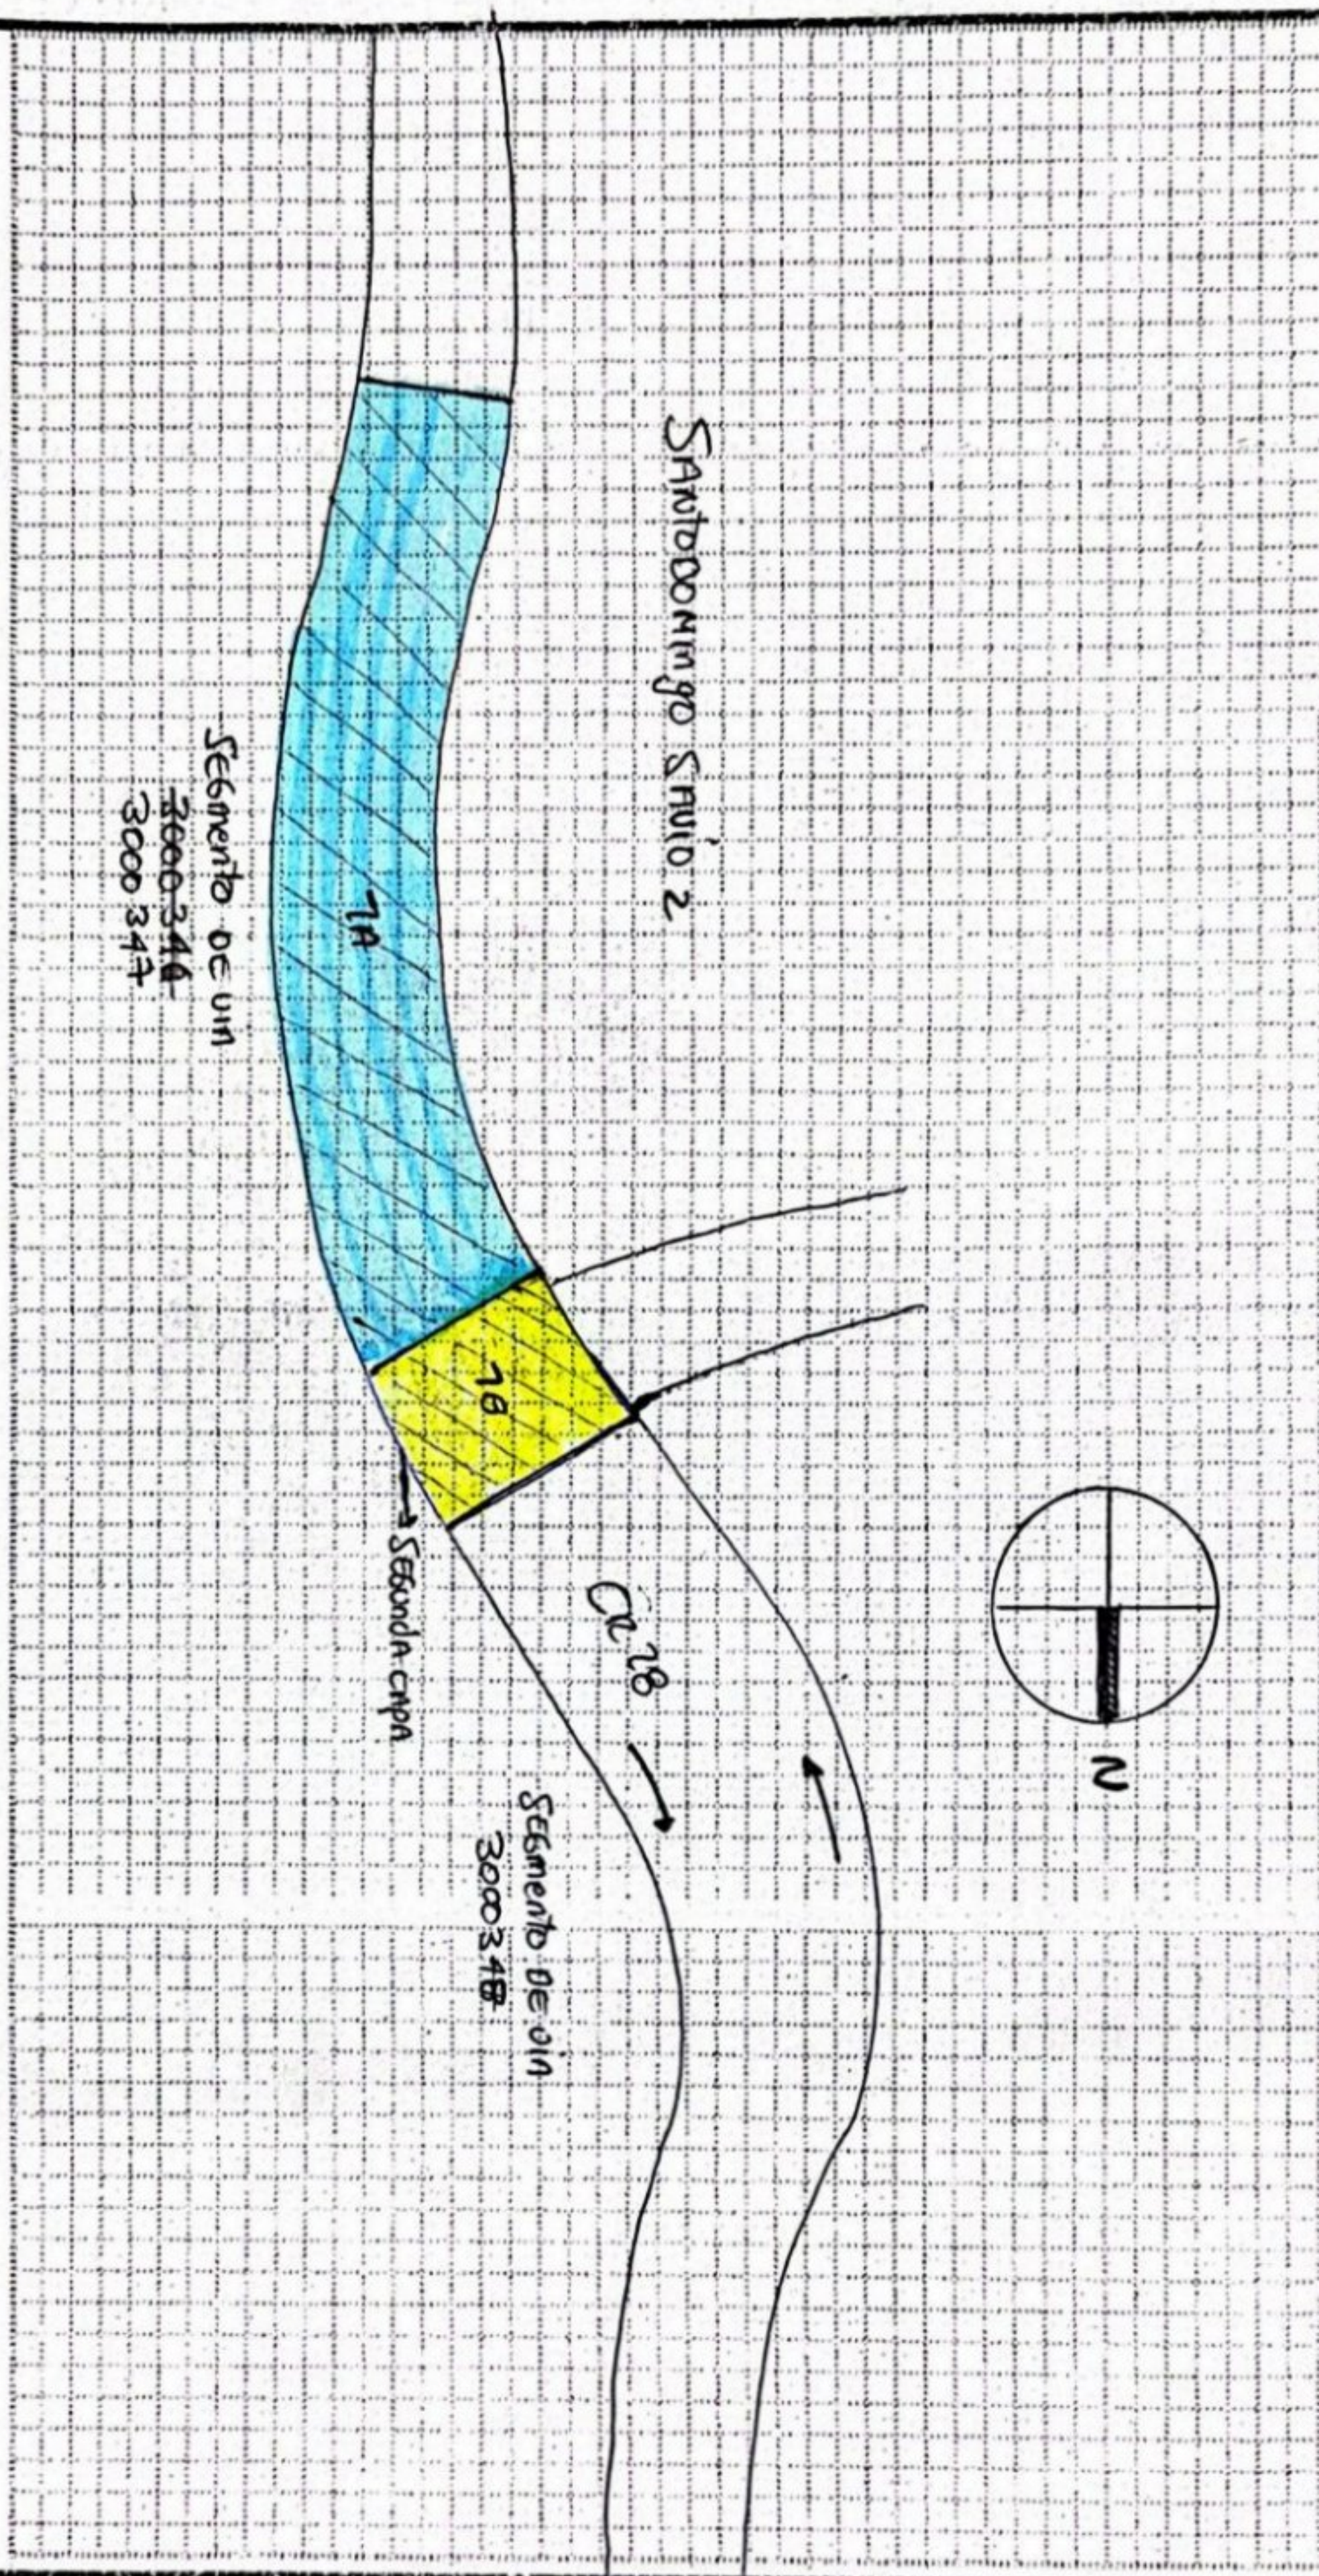

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fallos

FRENTE

17

RANGO:

4

CANTIDAD:

50.72 m³

BARRIO

Santiboniego Sruio 2

DIRECCIÓN

CL 28 CL 108 CL 106

 PROCOPAL S.A. Ingenieros Contratistas	TRANSPORTE DE MATERIAL		Código: PC F - 37
			Revisión: 02
			Vigencia: Marzo 2008

FECHA: <u>15/12/2025</u>	Nº 237483
OBRA: <u>mailla en el</u>	
TRAMO O PROCEDENCIA: <u>Santo Domingo</u>	
DESTINO: <u>Planta Verde</u> PLACA: <u>TRM 049</u>	

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado		
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Escombros.</div>			
DESPOCHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

P PROCOPAL S.A. Ingenieros Contratistas	TRANSPORTE DE MATERIAL ③	Código: PC F - 37
		Revisión: 02
		Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 15/12/2025	Nº 237481
OBRA: Calle en	
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo	
DESTINO: Petio Fatima	PLACA: Tm 051

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	1400
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:		
DES-PACHADO	HORA	RECIBIDO

Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 15/12/2025	Nº 237479
OBRA: Calle en	
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo	
DESTINO: Petio Fatima	PLACA: Lcl 816

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	1400
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:		
DES-PACHADO	HORA	RECIBIDO

P PROCOPAL S.A. Ingenieros Contratistas	TRANSPORTE DE MATERIAL ④	Código: PC F - 37
		Revisión: 02
		Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 15/12/2025	Nº 237482
OBRA: Calle en	
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo	
DESTINO: Petio Fatima	PLACA: Tm 051

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	1400
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:		
DES-PACHADO	HORA	RECIBIDO

Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 15/12/2025	Nº 237480
OBRA: Calle en	
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo	
DESTINO: Petio Fatima	PLACA: Lcl 874

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	1400
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:		
DES-PACHADO	HORA	RECIBIDO

PROCCPAL S.A.

Ingenieros Contratista

(3)

TIQUETE DE BASCULA: 235564

235564

FECHA: 15/12/2025

HORA: 8:38:26 PM

CONDUCTOR: ROBERTO VALDERR

PLACA: TRH823

OBRA: 2310

NAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 31.72 Tonnes

PESO TARA: 11.70 Tonnes

PESO NETO: 20.02 Tonnes

20.02 ton

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 60.11 Tonnes

Kelly JV.

PROCCPAL S.A.

Ingenieros Contratista

(2)

TIQUETE DE BASCULA: 235563

235563

FECHA: 15/12/2025

HORA: 8:28:26 PM

CONDUCTOR: JHON ARIAS

PLACA: LCL835

OBRA: 2310

NAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.39 Tonnes

PESO TARA: 12.33 Tonnes

PESO NETO: 20.06 Tonnes

20.06 ton

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 40.09 Tonnes

Kelly JV.

PROCCPAL S.A.

Ingenieros Contratista

(1)

TIQUETE DE BASCULA: 235562

235562

FECHA: 15/12/2025

HORA: 8:17:39 PM

CONDUCTOR: GUSTAVO VELEZ

PLACA: LCL915

OBRA: 2310

NAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.31 Tonnes

PESO TARA: 12.28 Tonnes

PESO NETO: 20.03 Tonnes

20.03 ton

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 20.03 Tonnes

Kelly JV.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

⑥

TIQUETE DE BASCULA: 235567

235567

FECHA: 15/12/2025

HORA: 9:03:42 PM

CONDUCTOR: DAYRON MESA

PLACA: STE519

OBRA: 2310

KAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 31.34 Tonnes

PESO TARA: 12.34 Tonnes

PESO NETO: 19.00 Tonnes

19 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 119.19 Tonnes

Kelly JV.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

⑤

TIQUETE DE BASCULA: 235566

235566

FECHA: 15/12/2025

HORA: 8:54:37 PM

CONDUCTOR: EDGAR CORDOBA

PLACA: LCL813

OBRA: 2310

KAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 32.38 Tonnes

PESO TARA: 12.38 Tonnes

PESO NETO: 20.00 Tonnes

20 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 100.19 Tonnes

Kelly JV.

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

④

TIQUETE DE BASCULA: 235565

235565

FECHA: 15/12/2025

HORA: 8:50:33 PM

CONDUCTOR: YEISON CIBO

PLACA: TRH821

OBRA: 2310

KAL VIAL MED-CONS VIALMED2025

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 31.99 Tonnes

PESO TARA: 11.91 Tonnes

PESO NETO: 20.08 Tonnes

20.08 ton

PRODUCTO: 113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 80.19 Tonnes

Kelly JV.
