

INFORME FINAL DE EJECUCION.

CONTRATO No. SPOPM-CO-IMC-657-2025 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025

"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO"

Fecha de inicio del 10 de noviembre de 2025 hasta fecha terminación 09 de diciembre de 2025.

ENTIDAD

Alcaldía Municipal Valle del Guamuez.

SUPERVISOR

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio del Valle del Guamuez

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME:

Nueve (09) de diciembre de 2025

1. INTRODUCCIÓN.

El municipio Valle del Guamuez realizó la contratación del contrato de mínima cuantía No. SPOPM-CO-IMC-657-2025 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO"

Con la ejecución del contrato se realiza el mejoramiento de la malla vial en la calle 8 entre la carrera 9 y carrera 10 del del casco urbano del municipio Valle del Guamuez, Putumayo.

En el presente informe se da a conocer de manera detallada los resultados de la ejecución del proyecto en todos sus aspectos.

2. OBJETO DEL INFORME

Este informe tiene como objeto entregar una relación detallada de todas las actividades ejecutadas por la empresa INGSERH S.A.S durante el periodo comprendido entre Fecha de inicio del 10 de noviembre de 2025 hasta fecha terminación 09 de diciembre de 2025.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La intervención de esta obra se realizó en el casco urbano de La Hormiga, municipio Valle del Guamuez, Putumayo, específicamente en las coordenadas geográficas 0°25'38"N – 76°54'28"W, frente al terminal de transporte, punto de referencia característico de la zona.

El proyecto consiste en el mejoramiento de la malla vial mediante la reparación de los baches en la vía principal mediante señalización del área, limpieza, relleno y compactación, y bacheo con pavimento de concreto hidráulico MR 38, con el fin de mejorar la transitabilidad, reducir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL.

Ejecutar las actividades del contrato No SPOPM-CO-IMC-657-2025 DEL DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO", de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el proyecto de inversión y en las condiciones del contrato

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

EL proyecto inicialmente comprendía la ejecución de las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION
1	CIMENTACION
1.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO
1.2	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL
2	PAVIMENTO

2.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38
-----	--

4.3 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

4.3.1 CONTRATO DE MINIMA CUANTIA DE OBRA.

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No:	SPOPM-CO-IMC-657-2025 DEL DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
CONTRATISTA:	INGSERH S.A.S NIT: No. 900128087-6 R. Legal: JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL. C.C: No. 1.126.456.040 expedida en Valle del Guamuez (Pty)
SUPERVISOR:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

4.3.2 CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Tipo de póliza: Cumplimiento
Tipo de movimiento: EMISION ORIGINAL
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6
Tomador: INGSERH S.A.S
Póliza No.: 41-44-101298712 (Anexo 0) ✓
Fecha de expedición: 27/10/2025 ✓
RESOLUCION No OJMVG-285-2025 del 05/11/2025 ✓
Estado de póliza: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	24/10/2025 ✓	24/03/2026	\$ 3.951.339,89 ✓
Anticipo	24/10/2025 ✓	24/03/2026	\$ 11.854.019,67 ✓
Calidad del servicio	24/10/2025 ✓	24/03/2026	\$ 1.975.669,95 ✓
Estabilidad y Calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.		\$ 3.951.339,89 ✓

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Tipo de movimiento: EMISION ORIGINAL
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6
Tomador: INGSERH S.A.S
Póliza No.: 41-40-101057904 (Anexo 0) ✓
Fecha de expedición: 27/10/2025 ✓
RESOLUCION No OJMVG-285-2025 del 05/11/2025 ✓
Estado de póliza: Aprobado

INGSERH S.A.S

NIT:900128087-6

135

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios labores y operaciones	24/10/2025	24/11/2025	\$ 284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	24/10/2025	24/11/2025	\$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	24/10/2025	24/11/2025	\$ 284.700.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	24/10/2025	24/11/2025	\$ 284.700.000,00
Daño Emergente y Lucro Cesante	24/10/2025	24/11/2025	\$ 284.700.000,00
Perjuicios Extrapatrimoniales	24/10/2025	24/11/2025	\$ 284.700.000,00

Tipo de póliza: Cumplimiento

Tipo de movimiento: ANEXO DE MODIFICACIÓN.

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6

Tomador: INGSERH S.A.S

Póliza No.: 41-44-101298712 (Anexo 1)

Fecha de expedición: 19/11/2025

RESOLUCION No OJMVG-330-2025 del 05/12/2025

Estado de póliza: NO Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	-	-	-
Anticipo	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Estabilidad y Calidad de la obra	-	-	-

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual

Tipo de movimiento: ANEXO DE MODIFICACIÓN.

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6

Tomador: INGSERH S.A.S

Póliza No.: 41-40-101057904 (Anexo 1)

Fecha de expedición: 19/11/2025

RESOLUCION No OJMVG-330-2025 del 05/12/2025

Estado de póliza: NO Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios labores y operaciones	-	-	-
Contratistas y Subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Responsabilidad Civil Patronal	-	-	-
Daño Emergente y Lucro Cesante	-	-	-
Perjuicios Extrapatrimoniales	-	-	-

Tipo de póliza: Cumplimiento

Tipo de movimiento: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA.

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6

Tomador: INGSERH S.A.S

Póliza No.: 41-44-101298712 (Anexo 2)

Fecha de expedición: 19/11/2025

RESOLUCION No OJMVG-330-2025 del 05/12/2025

Estado de póliza: Aprobado

CELULAR: 3124737838

INGSERH S.A.S**NIT:900128087-6**

136

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	10/11/2025 ✓	10/04/2026 ✓	\$ 3.951.339,89 ✓
Anticipo	10/11/2025 ✓	10/04/2026 ✓	\$ 11.854.019,67 ✓
Calidad del servicio	10/11/2025 ✓	10/04/2026 ✓	\$ 1.975.669,95 ✓
Estabilidad y Calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días. ✓		\$ 3.951.339,89 ✓

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual**Tipo de movimiento:** ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA.**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6**Tomador:** INGSERH S.A.S**Póliza No.:** 41-40-101057904 (Anexo 2) ✓**Fecha de expedición:** 19/11/2025**RESOLUCION No** OJMVG-330-2025 del 05/12/2025 ✓**Estado de póliza:** Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios labores y operaciones	10/11/2025	11/12/2025 ✓	\$ 284.700.000,00 ✓
Contratistas y Subcontratistas	10/11/2025	11/12/2025 ✓	\$ 284.700.000,00 ✓
Vehículos propios y no propios	10/11/2025	11/12/2025 ✓	\$ 284.700.000,00 ✓
Responsabilidad Civil Patronal	10/11/2025	11/12/2025 ✓	\$ 284.700.000,00 ✓
Daño Emergente y Lucro Cesante	10/11/2025	11/12/2025 ✓	\$ 284.700.000,00 ✓
Perjuicios Extrapatrimoniales	10/11/2025	11/12/2025 ✓	\$ 284.700.000,00 ✓

5. INFORME TÉCNICO.

Dentro del periodo transcurrido la empresa INGSERH S.A.S ha realizado las siguientes actividades:

1. Se ha mantenido comunicación activa con el supervisor del proyecto.
2. Se dieron indicaciones y localización para la ejecución del contrato.
3. Se tomaron mediciones y cantidades de obra ejecutada.
4. Se atendieron problemas propios de la obra, dando sugerencias y soluciones

5.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE**6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.**

Por parte de la empresa INGSERH S.A.S, durante el plazo de ejecución del contrato, ejecuto los siguientes items de obra, dando cumplimiento a las obligaciones surgidas en virtud del contrato suscrito así:

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	27,63	\$ 119.630,20	\$ 3.305.382,43
1,2	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	M3	27,63	\$ 85.915,55	\$ 2.373.846,65
2	PAVIMENTO				
2,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38	M3	27,63	\$ 894.523,82	\$ 0 24.715.693,15
COSTOS DIRECTOS					\$ 30.394.922,23

7.DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE OBRA E INVERSIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO DE OBRA.

En el siguiente cuadro se describen las actividades ejecutadas a la fecha y el porcentaje total de ejecución de obra:

7.1 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA**CELULAR: 3124737838**

7.2 Cumplimiento del cronograma de ejecución:

A continuación, se detalla los avances de obra descritos por cada semana de trabajos adelantados por la empresa INGSERH S.A.S.

1. Descripción de la Ejecución de las actividades de obra:

OBLIGACIÓN	UNIDADES	OBSERVACIONES
Demolición De Pavimento Rígido.	M3	Se realizaron las demoliciones del pavimento rígido existente, el cual presentaba deterioro, mediante el corte y fractura de las losas de concreto. El material resultante fue retirado y dispuesto en un sitio autorizado, dejando la superficie limpia y apta para la posterior conformación de la estructura del nuevo pavimento.
Mejoramiento De Subrasante Con Adición De Material.	M3	se realizó el mejoramiento de la subrasante mediante la adición de material, consistente en el aporte, extendido y conformación de material seleccionado para corregir zonas blandas y garantizar la capacidad de soporte requerida. El material colocado fue debidamente humedecido y compactado, logrando una superficie uniforme y estable, apta para la construcción de las capas estructurales del pavimento.
Pavimento De Concreto Hidráulico Mr 38	M3	se ejecutó la construcción del pavimento de concreto hidráulico MR-38, que incluyó la preparación de la superficie, colocación del concreto, extendido, nivelación y acabado conforme a la rasante y pendientes establecidas. Se realizaron los cortes de juntas, el curado del concreto y los controles necesarios para asegurar la resistencia, durabilidad y adecuada terminación del pavimento, dejándolo habilitado para su puesta en servicio una vez cumplidos los tiempos técnicos requeridos.

137

INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6

- Flujo caja de inversión

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FINANCIERO %	
	DESDE	HASTA	% PERIODO	% ACUMULADO
1	10/11/2025	09/12/2025	100 %	100 %

Para el desarrollo de cada una de las actividades contractuales, la empresa INGSERH S.A.S del municipio valle del Guamuez realizo las siguientes acciones:

INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6

ITEM	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ TOTAL	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	CIMENTACION									
1,1	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	27,63	119.630,20	3.305.382,43	10,88%	\$ 3.305.382,43			
							10,88%			
1,2	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	M3	27,63	85.915,55	2.373.846,65	7,81%		\$ 2.373.846,65		
								7,81%		
2	PAVIMENTO									
2,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38	M3	27,63	894.523,82	24.715.693,15	81,32%			\$ 12.357.846,58	\$ 12.357.846,58
									40,66%	40,66%
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					30.394.922,23	100,00%				
						%	10,88%	7,81%	40,66%	40,66%
						% ACUMULADO	10,88%	18,69%	59,34%	100,00%
						VALOR	\$ 3.305.382,43	\$ 2.373.846,65	\$ 12.357.846,58	\$ 12.357.846,58
						VALOR ACUMULADO	\$ 3.305.382,43	\$ 5.679.229,08	\$ 18.037.075,66	\$ 30.394.922,23

CELULAR: 3124737838

2. Registro fotográfico

A continuación se detallan evidencias fotográficas de las actividades de obra desarrolladas.

EVIDENCIA DE SUMINISTRO DE MATERIAL	RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE
	
<p>RIEGO DE MATERIAL PARA NIVELACION Y COMPACTACION</p>	

INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6




VACIADO DE CONCRETO Y CURADO DEL CONCRETO



FINALIZACION DE OBRA



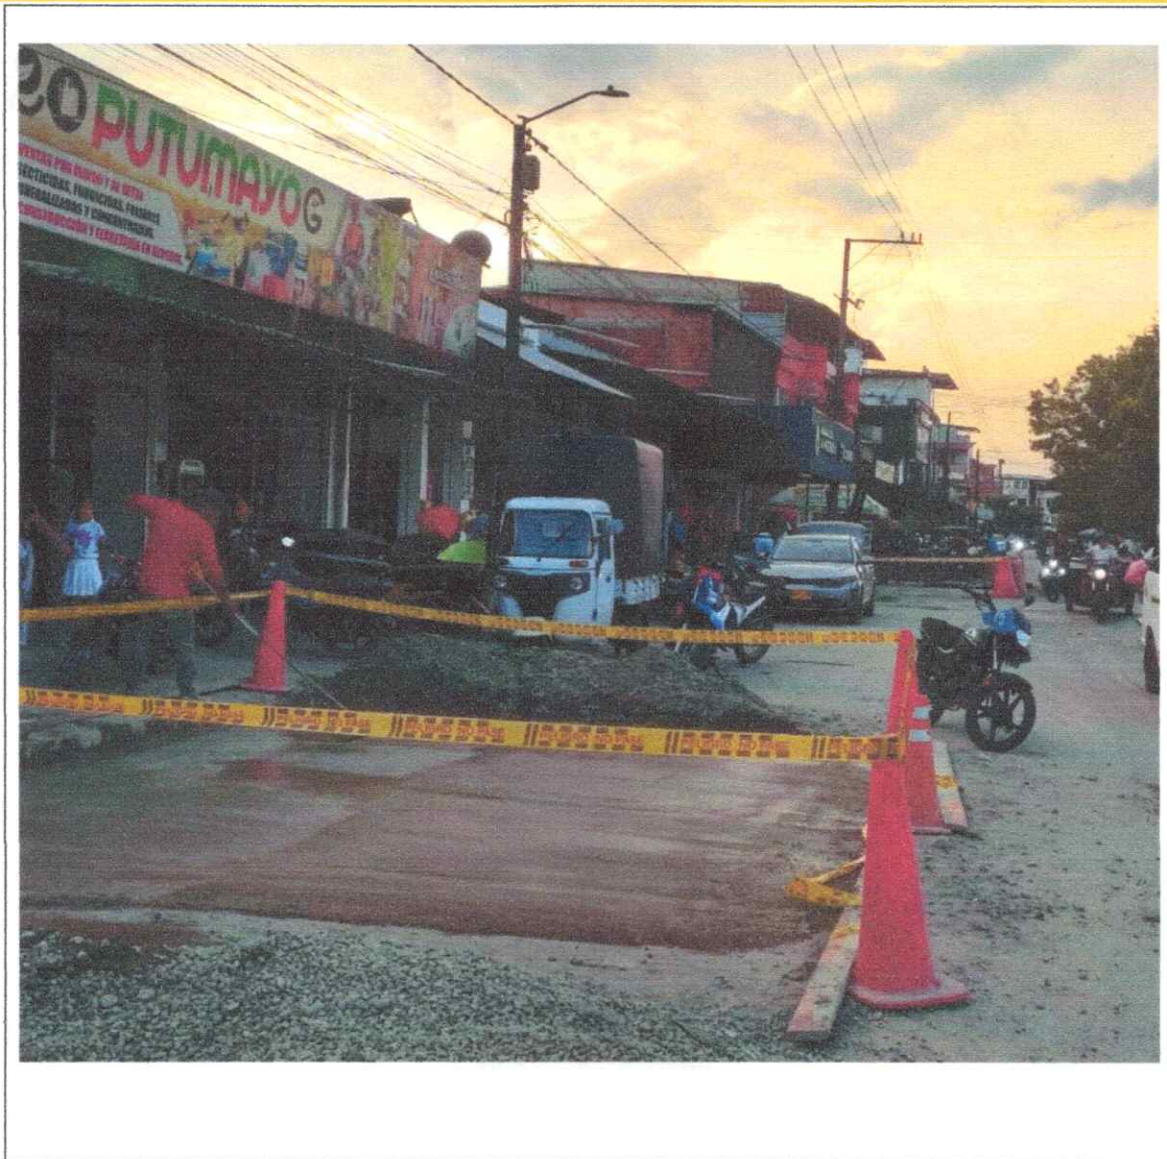

7.2 BALANCE DE OBRA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 39.513.398,90
VALOR PAGADO ANTICIPO	\$ 11.859.019,67
VALOR TOTAL POR PAGAR:	\$ 27.654.379,23

8. PERSONAL UTILIZADO

En cumplimiento de lo establecido en el presupuesto oficial del contrato de mínima cuantía, la empresa INGSERH S.A.S. dispuso de personal capacitado y calificado para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra. El personal vinculado para el desarrollo de las labores contó con la experiencia y formación necesarias para garantizar una correcta ejecución de los trabajos, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad exigidos.

El equipo de trabajo estuvo conformado por personal operativo capacitado, el cual participó de manera organizada y rotativa durante el desarrollo de las actividades, asegurando la continuidad y eficiencia en cada una de las jornadas laborales. Como oficial de obra se designó a un trabajador con experiencia comprobada en labores de construcción, quien apoyó de manera permanente las actividades ejecutadas en campo.

INGSERH S.A.S**NIT:900128087-6**

Adicionalmente, los profesionales de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal brindaron acompañamiento técnico constante durante la ejecución del proyecto, con el propósito de verificar que el proceso constructivo se desarrollara conforme a las especificaciones técnicas, planos y condiciones establecidas en el contrato de referencia, garantizando así la calidad y correcta ejecución de las obras.

	NOVIEMBRE				
	NOMBRE	N° DOCUMENTO	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	
				PENSIÓN	SALUD
MAESTRO	LUIS ALFREDO BASTIDAS CERON	13.073.576	1077716234	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
OFICIAL	DAIMER RODRIGUEZ BARRERA	1.077.853.599	1077788813	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE

	DICIEMBRE				
	NOMBRE	N° DOCUMENTO	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	
				PENSIÓN	SALUD
MAESTRO	LUIS ALFREDO BASTIDAS CERON	13.073.576	1077716559	DICIEMBRE	DICIEMBRE
OFICIAL	DAIMER RODRIGUEZ BARRERA	1.077.853.599	1077788914	DICIEMBRE	DICIEMBRE

9. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.**RELACIÓN DE ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS, SUSCRITOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.**

Durante la ejecución del contrato, se ha suscrito los siguientes documentos:

- Suscripción de actas de inicio de fecha 10 de noviembre de 2025. ✓
- Suscripción de acta de recibo final de fecha 09 de diciembre de 2025. ✓

10. INFORME FINANCIERO.

A la fecha la empresa INGSERH S.A.S recibió una transferencia por concepto de anticipo por un valor de \$ 11.859.019,67, los cuales fueron transferidos el día 25 de noviembre de 2025 a la cuenta bancaria N° 451-000011-26 de Bancolombia

Detalle	Valor
Valor total del contrato:	\$ 39.513.398,90
Valor anticipo:	\$ 11.859.019,67
Valor de amortización a pagar:	\$ 27.654.379,23
Saldo a favor del municipio:	\$ 0
Saldo sin Ejecutar:	\$ 0

Respecto del manejo de los recursos a título de anticipo, se deja constancia que los mismos fueron utilizados para el pago de las compras por concepto de materiales de construcción y de ferretería, que se establecieron en el análisis de precios unitarios para cada ítem de obra.

11. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.**CELULAR: 3124737838**

No se presentaron inconvenientes en el desarrollo de la obra.

12. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.

- Se ejecuta la obra al 100% de acuerdo con las actividades contratadas.

13. DOCUMENTACION QUE SOPORTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

- Cuenta de cobro suscrito por la empresa INGSERH S.A.S.
- Certificación de cumplimiento de pago de aportes a Seguridad Social suscrita por la empresa INGSERH S.A.S. y un contador.
- Copia de Planilla de aportes a seguridad social Tipo Y correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
- Facturas de compra
- Copia de Extracto bancario en la cual se transfirió el anticipo.

Para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de diciembre del año 2025.

Julieth Ortega.

INGSERH S.A.S
NIT: 900128087-6
R/L: JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL.
C.C: 1.126.456.040 expedida en Valle del Guamuez (Pty).

146



INGSERH SAS
 NIT 900.128.087-6
 CR 5 7 08 BRR CENTRA
 Tel: 3249631070
 Valle Del Guamuez - Colombia
 bvallejoportilla@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVIN 5

Señores	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ			Fecha y hora Factura	
NIT	800.102.912-2	Teléfono	(608) 0000000	Generación	09/12/2025, 22:28
Dirección	ALCALDIA BARRIO CENTRAL	Ciudad	Valle Del Guamuez - Colombia	Expedición	09/12/2025, 22:28
				Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	30,394,922.23
2	ADMINISTRACION	1.00	7,598,730.56
3	IMPREVISTOS	1.00	303,949.22
4	UTILIDAD	1.00	1,215,796.89

Total ítems: 4		Total Bruto	39,513,398.90
Valor en Letras: Treinta y nueve millones quinientos trece mil trescientos noventa y ocho pesos m/cte con noventa cent.		Total a Pagar	39,513,398.90
Forma de pago: Contado			
Medio de pago: Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	\$	39,513,398.90	

Observaciones:
 CONTRATO: SPOPM-CO-IMC-657-2025.
 "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099866183 aprobado en 20251007 prefijo FVIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 852b0bcf916c1a3b27dd850ee06e8def00166d000dda40cf44510f472b2745bcbc387938435c29991c8bbf0890a5ace5

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre: Software Siglo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 03:55:34 PM

Tipo Planilla:

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1077716234

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

noviembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGSERH SAS		
Documento	NI900128087	Dirección	CL 7 #5 - 01
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3115500904
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VALLE DEL GUAMUEZ	Departamento	PUTUMAYO
Representante Legal	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI		Identificación
Total Afiliados	1	ARP	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RES	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VET	SLN	LM	LM	VAC	AVP	VCT	BP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13073576	LUIS ALFREDO BASTIDAS CERON	67	04	X	X																				(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 996.450	\$ 124.600	6,960	\$ 996.450	\$ 69.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 996.450	\$ 996.450	\$ 0	\$ 0	\$ 124.600	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 0	\$ 194.000



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 03:50:26 PM

Tipo Planilla:

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1077788813

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

noviembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGSERH SAS		
Documento	NI900128087	Dirección	CR 7 #5 - 01
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3115500904
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VALLE DEL GUAMUEZ	Departamento	PUTUMAYO
Representante Legal	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI		Identificación
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	CDR	VET	REN	SAE	LMA	VAC	AVP	VCT	BP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077883598	DAIMER RODRIGUEZ BARRERA	67	00	X	X																0	21	21	0	(230301) PORVENIR	\$ 996.450	\$ 159.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 996.450	\$ 124.600	8,960	\$ 996.450	\$ 66.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 996.450	\$ 996.450	\$ 996.450	\$ 0	\$ 159.500	\$ 124.600	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.500	\$ 0	\$ 353.500

bht



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 03:55:38 PM

Tipo Planilla:

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1077716559

Periodo Cotización:

diciembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGSERH SAS	Dirección	CL 7 #5 - 01
Documento	NI900128087	Teléfono	3115500904
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	PUTUMAYO
Ciudad	VALLE DEL GUAMUEZ	Identificación	
Representante Legal	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI	ARP	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	REP	RET	PRE	TOD	TAE	TAF	TDP	VFP	CON	VEN	SUA	PER	LM	VAL	AVP	VCT	BP	Días AFP	Días EPS	Días AFR	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13073576	LUIS ALFREDO BASTIDAS CERON	67	04	X	X																	0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 427.050	\$ 53.400	6,960	\$ 427.050	\$ 29.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 427.050	\$ 427.050	\$ 0	\$ 0	\$ 53.400	\$ 29.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.200	\$ 0	\$ 83.200



150



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 03:50:38 PM

Tipo Planilla:

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 107788914

Periodo Cotización:

diciembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGSERH SAS		
Documento	NI900128087	Dirección	CR 7 #5 - 01
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3115500904
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	VALLE DEL GUAMUEZ	Departamento	PUTUMAYO
Representante Legal	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI	Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAL	TAP	VBP	COR	VET	EDU	LM	LMAL	VALC	AVP	VCT	BP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077853599	DAIMER RODRIGUEZ BARRERA	57	00	X	X															0	9	9	0	(230301) PORVENIR	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 427.050	\$ 53.400	6,960	\$ 427.050	\$ 29.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 427.050	\$ 427.050	\$ 427.050	\$ 0	\$ 68.400	\$ 53.400	\$ 29.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.600	\$ 0	\$ 151.600



BRAYAN VALLEJO
Contador Público

Asesoría Contable Tributaria Y Financieras

Brayan Leonel Vallejo Portilla

Nit - 1.126.455.615

Contador Público - Corporación universitaria
Autónoma De Nariño

152

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTESAL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos, **JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL**, identificado con cédula de ciudadanía 1.126.456.040 del Valle del Guamuez (Putumayo) en condición de representante legal y **BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.126.455.615 del Valle del Guamuez (Putumayo) con Tarjeta Profesional No. **289542-T** de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de **CONTADOR PUBLICO** de la Persona Jurídica razón social **INGSERH S.A.S** identificada con NIT 900128087-6, luego de examinar los estados financieros de la entidad de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico desde el 09 del mes de noviembre del año 2025 hasta el 10 de diciembre del año 2025 legalmente exigible, para el contrato cuyo objeto: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO". este realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, ARL, Pensiones y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes del equipo de trabajo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para Constancia se firma en la Ciudad de Valle del Guamuez Putumayo, a los 09 días del mes de diciembre del año 2025.

FIRMA


JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL

C.C N° 1.126.456.040 Valle del Guamuez (Putumayo)

FIRMA


BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA

C.C N° 1.126.455.615 Del Valle del Guamuez (Putumayo)

T.P No 289542-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



289542-T

BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA
C.C. 1126455615
RES. INSCRIPCIÓN 2846 DEL 08/11/2021



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312454 331702

Verificación: Papeles S.A. 210551/0721


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.126.455.615**

VALLEJO PORTILLA


APELLIDOS

BRAYAN LEONEL

NOMBRES



FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1995**

VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
 (PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-2013 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-6402800-00783257-M-1126455615-20160114 0048010515A 1 45061693

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

3661E30480313F49

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126455615 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 289542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 09 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados apartirde la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



La Hormiga Valle del Guamuez Putumayo 09 de diciembre del 2025

Señor:
NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL
C.C.1.126.456.040 Exp. Valle del Guamuez
INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6

Asunto: Solicitud de presentación de soportes de ejecución del contrato **SPOPM-CO-IMC-657-2025**.

Cordial Saludo.


La Secretaría de Planeación y Obras Públicas, en ejercicio de la función de supervisión del contrato **SPOPM-CO-IMC-657-2025**, suscrito entre la Administración Municipal y la empresa **INGSERH S.A.S.**, requiere la entrega completa y actualizada de los soportes de ejecución correspondientes.
Se informa que el día **09 de diciembre de 2025** la empresa allegó el informe de ejecución y la factura electrónica, quedando pendiente la presentación de los siguientes documentos:

1. Actualización del pago de pólizas con el Acta de Recibo Final.
2. Certificado de pagos de seguridad social, acompañado de los soportes emitidos por el contador.
3. Certificado del **FIC SENA**.

Este requerimiento se formula con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los compromisos adquiridos. La presentación oportuna de la documentación solicitada resulta fundamental para garantizar la transparencia del proceso y la adecuada trazabilidad administrativa.

Todo lo anterior constituye requisito indispensable para adelantar de manera correcta la etapa poscontractual y proceder a la liquidación del contrato, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales que regulan este tipo de procedimientos.

Se suscribe.


HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


Elaboró Parte técnica:
Lisbeth Yandun
Contratista SPOPM





MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



163

La Hormiga Valle del Guamuez Putumayo 19 de diciembre del 2025

Señor:

NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL
C.C.1.126.456.040 Exp. Valle del Guamuez
INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6

Asunto: Solicitud de presentación de soportes de ejecución del contrato **SPOPM-CO-IMC-657-2025**.

Cordial Saludo.

La **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**, en ejercicio de la función de supervisión del contrato **SPOPM-CO-IMC-657-2025**, suscrito entre la Administración Municipal y la empresa **INGSERH S.A.S.**, requiere la entrega completa y actualizada de los soportes de ejecución correspondientes.


Se deja constancia que el día **09 de diciembre de 2025** la empresa allegó el informe de ejecución y la factura electrónica, y que el día **10 de diciembre de 2025**, tras el respectivo requerimiento, se allegaron las planillas de seguridad social del maestro y oficial, así como la actualización de las pólizas con el Acta de Recibo Final. En consecuencia, se determina que aún quedan pendientes los siguientes documentos:

1. Certificado de pagos de seguridad social del representante legal, acompañado de los soportes emitidos por el contador.
2. Certificado del **FIC SENA**.

Este requerimiento se formula con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los compromisos adquiridos. La presentación oportuna de la documentación solicitada resulta fundamental para garantizar la transparencia del proceso y la adecuada trazabilidad administrativa.

Todo lo anterior constituye requisito indispensable para adelantar de manera correcta la etapa poscontractual y proceder a la liquidación del contrato, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales que regulan este tipo de procedimientos.

Se suscribe.


HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


Elaboró Parte técnica:
Lisbeth Yandun
Contratista SPOPM

Dirección: Calle 7 No 5-20 Palacio Municipal-La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: 310 425 9180 Despacho Municipal, 314 299 6065 Rentas Municipales
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-Putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



164

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social INGSERH S.A.S identificado con el NIT 900128087, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SPOPM-CO-IMC-657-2025	M MALL V BACHEO CI 8 C.URB VGU	VALLE DEL GUAMUEZ	98,800	2025-12	17-DIC-2025	152316666
		Total	98,800			

Expedido por el SENA, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-17

Generado por : Jose Ricardo Ordonez

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 845854227 y el Número de Certificado: 449897

PAGADO 22/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGSERH SAS			Dirección	CR 5 #7 - 08
Documento	NI900128087			Teléfono	3214337838
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	PUTUMAYO
Ciudad	VALLE DEL GUAMUEZ			Identificación	
Representante Legal	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI			ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colizante	Subtipo Colizante	ING	RET	RET P	TRE	YAS	TOP	TAP	VBP	VET	BL	LM	MA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1126458040	JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL	03	00	X	X														0	21	21	0		(230301) PORVENIR	\$ 998.450	\$ 159.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 998.450	\$ 124.800	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 998.450	\$ 998.450	\$ 0	\$ 0	\$ 159.500	\$ 124.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.100	\$ 2.300	\$ 288.400



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-22, 09:48:57 AM

Tipo Planilla:

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1078163459

Periodo Cotización:

diciembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 22/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGSERH SAS	Dirección	CR 5 #7 - 08
Documento	NI900128087	Teléfono	3214337838
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	PUTUMAYO
Ciudad	VALLE DEL GUAMUEZ	Identificación	
Representante Legal	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI	ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	MIG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VERP	COR	MA	MA	MA	LMA	VAC	AVP	NCT	BRP	Diem AFP	Diem EPS	Diem ARP	Diem CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1129458040	JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL	03	00	X	X																0	9	0	0	(230301) PORVENIR	\$ 427.050	\$ 66.400	(ESSC18) EMISANAR EPS	\$ 427.050	\$ 53.400	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 427.050	\$ 427.050	\$ 0	\$ 0	\$ 68.400	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.800	\$ 0	\$ 121.800



ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ

N.I.T: 800.102.912-2
Dirección: CALLE 7 No. 5-11 VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA
PUTUMAYO
Telefonos: 4287120
Código postal: 00086

Orden de compra
2025000020



Identificacion	900128087	Nombre	INGSERH SAS
Direccion	BRR LA PARDER	Telefono	3124737838
Concepto	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO - SPOPM-CO-IMC-657-2025 (EJECUCION 1 MES)		

Productos								
Nombre	Caracteristicas	Marca	Modelo	Cantidad	Valor	Subtotal	Iva	Total
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO - SPOPM-CO-IMC-657-2025	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38	N/A	N/A	1	39.513.398,90	39.513.398,90	0,00	39.513.398,90
TOTAL:								39.513.398,90

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN VALLE DEL GUAMUEZ, A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025



Elaboró: MARILU TORRES PIAMBA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ
N.I.T: 800.102.912-2
Dirección: CALLE 7 No. 5-11 VALLE DEL GUAMUEZ LA HORMIGA
PUTUMAYO
Telefonos: 4287120
Código postal: 00086



168

Compra	No. de factura
2025000017	FVIN 5
Fecha de vencimiento: 2025-12-30	

Identificación	900128087	Nombre	INGSERH SAS
Dirección	BRR LA PARDER	Teléfono	3124737838
Concepto	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO - SPOPM-CO-IMC-657-2025		

PRODUCTOS					
Código	Nombre	Características	Marca	Modelo	Valor
BUP - 558	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE BACHEO EN CALLE 8 ENTRE LA CARRERA 9 Y CARRERA 10 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO - SPOPM-CO-IMC-657-2025	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 38	N/A	N/A	39.513.398,90
			IVA:	0,00	TOTAL: 39.513.398,90

AFECTACIÓN CONTABLE						
Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Débitos	Créditos
240102001	PROYECTOS DE INVERSION	900128087	000	FVIN 5	0,00	39.513.398,90
171001001	RED CARRETERA	900128087	000	FVIN 5	39.513.398,90	0,00
TOTAL					39.513.398,90	39.513.398,90

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN VALLE DEL GUAMUEZ, A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025


Elaboró: MARILU TORRES PIAMBA
