

Bogotá D.C 12 de septiembre de 2025

Señores

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ.

JHON ALEXANDER VARGAS MELO


SUPERVISOR CONTRATO No. 053-2025

Carrera 7 No. 27-18 Piso 12

Asunto: plan de ejecución en obra del – **Contrato No. 053-2025**

Cordial saludo,

Yo **EDWIN PARADA CALVO**, en mi calidad de CONTRATISTA, remito a ustedes el paso a paso del desarrollo de actividades contempladas en el **Contrato No. 053-2025**, cuyo objeto es “Realizar la desinstalación de la cubierta existente y la instalación de una cubierta termoacústica tipo sándwich, junto con las obras civiles y eléctricas complementarias, en el bloque E del complejo judicial de Paloquemao, sede a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.”

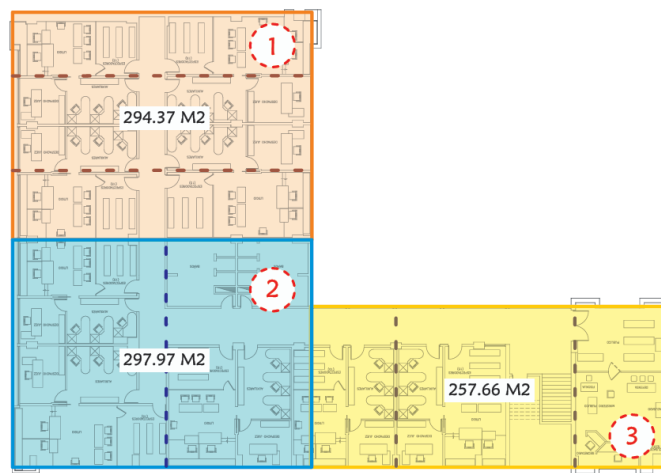

Se iniciará la intervención en las Áreas 1, 2 y 3, donde se llevarán a cabo las actividades de inventario, incluyendo el traslado del mobiliario. Estas actividades tomarán un tiempo aproximado de **7 días en total**.

Posteriormente, se dará inicio a las actividades propiamente dichas en el **Área 1**, con una duración estimada de **30 días**, distribuidos de la siguiente manera:

- 3 días para el retiro de cielo raso y luminarias.
- 5 días para el retiro del cableado.
- 20 días para el retiro de la estructura y la cubierta.
- 2 días para labores de aseo y retiro de sobrantes.

A continuación, se intervendrá el **Área 2**, con una duración también estimada de **30 días**, distribuidos de la siguiente forma:

- 3 días para el retiro de cielo raso y luminarias.
- 5 días para el retiro del cableado.
- 20 días para el retiro de la estructura y la cubierta.
- 2 días para labores de aseo y retiro de sobrantes.

Durante la ejecución de los ítems del Área 2, se realizarán en paralelo las siguientes actividades en el Área 1:

- 15 días para la instalación de redes eléctricas.
- 15 días para la instalación de cielo raso en fibra.

Finalmente, se procederá con las actividades en el **Área 3**, también con una duración estimada de **30 días**, organizados de la siguiente manera:

- 3 días para el retiro de cielo raso y luminarias.
- 5 días para el retiro del cableado.
- 20 días para el retiro de la estructura y la cubierta.
- 2 días para labores de aseo y retiro de sobrantes.

Mientras se desarrollan los ítems del Área 3, se iniciarán paralelamente en el Área 2 las siguientes actividades:

- 15 días para la instalación de redes eléctricas.
- 15 días para la instalación de cielo raso en fibra.

Atentamente,



EDWIN PARADA CALVO

C.C. 79.809.979. DE BOGOTÁ D.C
Calle 30 a sur No 3-20 este: 310 2723541 – / 2067392 Bogotá D.C. –
Correo: edwin_parada@hotmail.com
