

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	003 DE 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES RURALES VENTUROSA Y EL TIGRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE.
CONTRATISTA:	RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO
NIT:	1121882541 – 7
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA NIT: 844002430 – 5
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	06 DE MARZO DE 2026
TERMINO DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DIAS
FECHA ACTA INICIO:	09 DE MARZO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACION	28 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 25.486.500,00) M/CTE
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO/LIQUIDADO

1.1. ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA ACTA
ACTA N° 1	INICIO	09 DE MARZO DE 2026

1.2. CONTROL DE PÓLIZAS

El contrato fue suscrito el día 06 de Marzo de 2026, y el día 09 de Marzo de 2026 el contratista expidió las pólizas de cumplimiento por la compañía de seguros COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Estas pólizas fueron revisadas y verificadas por parte de la supervisión. El día 09 de Marzo de 2026 fueron aprobadas bajo los siguientes amparos y vigencias y se presenta anexo al presente informe.

No. DE PÓLIZA	AMPAROS	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO EN PESOS	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CHU-100075345	CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	2.548.650,00	06/03/2026	27/09/2026
	PRESTACIONES SOCIALES		2.548.650,00	06/03/2026	27/09/2026

1.3. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Se presenta copia de planilla de pago de seguridad social para el periodo comprendido del presente informe el cual hace parte de los anexos relacionados.

1.4. CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA PARA EL CONTRATO

Se presenta cuenta de ahorros para pago del contrato con la entidad bancaria **BANCOLOMBIA** a través de cuenta de Ahorros N° **912460233 – 74**, a nombre de **RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO** identificada con **NIT 1121882541 – 7**, desde el **18 de Diciembre de 2022** y se presenta soporte como anexo al presente informe.

1.5. SANCIONES, ACCIONES LEGALES

NO SE REALIZO NINGUNA SANCIÓN NI ACCIONES LEGALES.

1.6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUCIÓN FÍSICA

La supervisión junto con el contratista realizó la medición, cuantificación y revisión de cada una de las cantidades ejecutadas.

En la siguiente tabla se presenta el balance de las cantidades ejecutadas las cuales fueron verificadas y aprobadas por la supervisión.

No	UBICACIÓN	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	I.E. SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 incluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit).	M2	63,8	\$ 95.000,00	\$ 6.061.000,00
2	I.E. SEDE RURAL EL TIGRE	Levantamiento de los muros de los 4 lados del aula de clase aumentado un metro de altura, con bloques maguncia y cemento (incluye pañete de 1 cm de grosor)	M2	26	\$ 103.000,00	\$ 2.678.000,00
3	I.E. SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte)	M2	177	\$ 13.500,00	\$ 2.389.500,00
4	I.E. SEDE RURAL EL TIGRE	Mantenimiento, limpieza de red en puntos eléctricos salón de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales)	UN	4	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00
5	I.E. SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro de pintura en aceite para puerta del aula de clases (a dos manos)	M2	4	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00
6	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 incluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit).	M2	68,6	\$ 95.000,00	\$ 6.517.000,00
7	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte)	M2	290	\$ 13.500,00	\$ 3.915.000,00

8	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Mantenimiento, limpieza de red en puntos eléctricos salón de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales)	UN	4	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00
9	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en aceite para puerta y ventanas del aula de clases (a dos manos)	M2	28	\$ 30.000,00	\$ 840.000,00
10	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en aceite para unidades sanitarias (a dos manos) y mantenimiento y ajustes de 4 de puertas de unidades sanitarias	M2	14,8	\$ 30.000,00	\$ 444.000,00
11	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Desmante de lámpara de balastro, suministro e instalación de lámparas led con rosetas plásticas de 35 watts	UN	2	\$ 75.000,00	\$ 150.000,00
12	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro e instalación de baldosas área del mesón de la cocina del restaurante escolar, incluye demolición de enchape existente.	M2	7,65	\$ 80.000,00	\$ 612.000,00
13	I.E. SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros de la unidad sanitaria y áreas comunes (pintada a dos manos, incluye transporte)	M2	80	\$ 17.000,00	\$ 1.360.000,00
TOTAL						\$ 25.486.500,00

NOTA: Se presenta ANEXO 1 (ACTA DE RECIBO) en el cual se relacionan las actividades, cantidades y precios unitarios ejecutadas acorde a las cantidades contratadas y aprobadas por la supervisión.

NOMBRE DE CONTRATANTE / SUPERVISION R/L DIRECCION E-MAIL Cel.:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO CARRERA 7 # 3 – 17 iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co 311 262 96 70
---	---


RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO
C.C. No.: 1.121.882.541 de Villavicencio – Meta
INGENIERO CIVIL
M.P. No. 25202 – 270137 CND

INFORME DE CONTRATISTA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Para el reporte del Informe de RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO correspondiente al desarrollo del contrato comprendido en el periodo del 09 de Marzo de 2026 hasta el 28 de Marzo de 2026 se presenta descripción en donde se desarrolla cada una de las actividades ejecutadas y en el cual se presenta el respectivo soporte fotográfico para cada una de las actividades:

I.E. SEDE RURAL EL TIGRE

1. CODIGO ITEM 1: ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 INCLUIDO CABALLETE (CON DESMONTE DE CUBIERTA Y CABALLETE EXISTENTE EN ETERNIT):

Esta actividad contempló el desmonte de la cubierta existente (incluyendo su caballete) en Eternit, contempló el retiro y posterior instalación de las cerchas existentes, contempló el retiro y posterior instalación de los Pie de Amigos existentes para la cubierta, contempló el Suministro y la Instalación de la Cubierta en lámina master 1000 calibre 28 Color Azul, incluido el caballete en Lamina Master 1000 Color Azul, se utilizaron amarres para Cubiertas y se realizó el sellado de los amarres con sellante para goteras. Los Materiales utilizados para esta actividad fueron los siguientes: Teja Master 1000 Calibre 28, Caballete en Teja Master 1000 Calibre 28, Amarres y sellante de goteras. El área intervenida fue de 63.80 M2, se realizó la Intervención de la Cubierta de uno de los salones que queda al frente del Salón Comunal de la Escuela.



Foto 1: Cubierta existente del Salón de Clases.



Foto 2: Esta actividad contempló la ejecución de 63.80 M2 de desmonte de cubierta existente (incluyendo su caballete), contempló el retiro y posterior instalación de las cerchas existentes, contempló el retiro y posterior instalación de los Pie de Amigos existentes para la cubierta, contempló la Instalación de la Cubierta en lámina master 1000 calibre 28 incluido el caballete y el sellado de los amarres con sellante para goteras.



Foto 1: Cubierta existente del Salón de Clases.



Foto 2: Se evidencia el Desmonte de la Cubierta Existente, donde se reinstalaron las cerchas existentes apoyadas en la Mampostería nueva del Salón.



Foto 1: Cubierta existente del Salón de Clases.



Foto 2: Se evidencia la Instalación de la Cubierta Master Mil, con su respectivo Caballete, también se evidencia la Aplicación del sellante para Goteras en todos los Amarres.

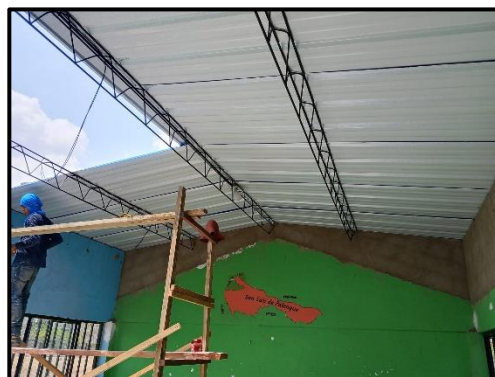
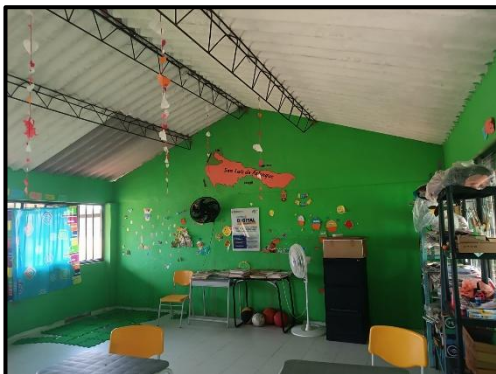


Foto 1: Cubierta existente del Salón de Clases.

Foto 2: Se evidencia la Instalación de la Cubierta Master Mil, con su respectivo Caballete desde la parte Interna del Salón.

2. CODIGO ITEM 2: ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE LOS MUROS DE LOS 4 LADOS DEL AULA DE CLASE AUMENTADO UN METRO DE ALTURA, CON BLOQUES MAGUNCIA Y CEMENTO (INCLUYE PAÑETE DE 1 CM DE GROSOR):

Esta actividad contempló el suministro y la Instalación de Ladrillo Maguncia, con su respectivo mortero de pega y se realizó la Instalación de Pañete con espesor promedio de 1 cm de grosor; los materiales utilizados fueron; Ladrillo Maguncia, Cemento General y Arena para Pañete. El área Intervenida fue de 26.00 M2, se realizó la Intervención de los cuatro lados de los Muros del Salón, la Instalación se realizó dando la continuación de los Muros Existentes del Salón de Clases.



Foto 1: Muros Perimetrales del Salón de Clases.



Foto 2: Se evidencia el levantamiento de Muros con Bloques Maguncia en la parte Frontal del Salón.



Foto 1: Muros Perimetrales del Salón de Clases.



Foto 2: Se evidencia el levantamiento de Muros con Bloques Maguncia en la parte Posterior del Salón.



Foto 1: Muros Perimetrales del Salón de Clases.



Foto 2: Se evidencia la Instalación del Pañete.

3. CODIGO ITEM 3: ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE PINTURA EN VINILO TIPO 2 PARA MUROS DEL AULA DE CLASES Y ÁREAS COMUNES, INCLUIDA LA MANO DE OBRA (CON PINTADA DE MURO A DOS MANOS, INCLUYE TRANSPORTE):

Esta actividad contempló el suministro y la Instalación de Pintura Vinilo Tipo 2, en los Muros del Aula de Clases y las Paredes Externas (pasillos) que son las Áreas Comunes del Aula. Se realizó los Resanes correspondientes con Estuco y Mortero donde se requería y se realizó la Aplicación de tres Manos de Pintura, ya que se requerían para poder tapar el color verde existente; los materiales utilizados en esta actividad fueron: Pintura Vinilo Tipo 2 de Color Azul Claro, Estuco, Mortero. El área Intervenido fue de 177.00 M2, se realizó la Intervención en los Muros Internos y Externos del Salón.



Foto 1: Muros Internos del Salón de Clases con Pintura color Verde.



Foto 2: Suministro y Aplicación de Pintura del Salón de Clases de Color Azul Claro.



Foto 1: Muros Internos del Salón de Clases con Pintura color Verde.



Foto 2: Suministro y Aplicación de Pintura del Salón de Clases de Color Azul Claro.



Foto 1: Muros Externos (Áreas Comunes) del Salón de Clases con Pintura color Verde.



Foto 2: Suministro y Aplicación de Pintura a los Muros Externos (Áreas Externas) del Salón de Clases de Color Azul Claro.

4. CODIGO ITEM 4: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE RED EN PUNTOS ELÉCTRICOS SALÓN DE CLASES Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS (TAPAS Y CAJAS OCTOGONALES):

Esta actividad contempló el Mantenimiento y la Limpieza de los Puntos Eléctricos (Tomacorrientes) del Salón de Clases, se realizó el cambio de las Tapas y Cajas Octogonales, se realizó la limpieza de los tomacorrientes con el retiro del comején que se encontraba adentro y se realizó el ajuste de la acometida eléctrica. Los materiales utilizados en esta actividad fueron; Tapas y Cajas Octogonales, Cable Tipo Alambre y Cinta Aislante. Se realizó el Mantenimiento y Limpieza de cuatro 4 Puntos Eléctricos dentro del salón de Clases. Adicional a estas actividades, se realizó la Instalación de Puntos Eléctricos en la Cocina y un Cuarto Adicional donde se suministro energía a tomas corrientes y bombillas en estas zonas.



Foto 1: Puntos Eléctricos localizados en el Salón de Clases.



Foto 2: Se realizó la Limpieza de Puntos Eléctricos y Suministro de Accesorios.



Foto 1: Puntos Eléctricos localizados en la parte exterior del Salón de Clases.



Foto 2: Se realizó la Instalación de Lámparas en zonas exteriores de la Escuela.

5. CODIGO ITEM 5: ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE PINTURA EN ACEITE PARA PUERTA DEL AULA DE CLASES (A DOS MANOS):

Esta actividad contempló el Suministro y la Instalación de la Pintura en Aceite para la Puerta del Aula de Clases, se aplicaron dos Manos de Pintura Negra Esmalte. En esta actividad se utilizaron los siguientes materiales: Pintura en Aceite Esmalte color Negro y Thinner. La puerta se localiza en la Entrada del Salón. Se ejecutaron 4.00 M2 de Pintura sobre la Puerta.



Foto 1: Puerta de Ingreso al Salón de Clases.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura para la Puerta del Salón de Clases.



Foto 1: Puerta de Ingreso al Salón de Clases.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura para la Puerta del Salón de Clases.

I.E. SEDE RURAL VENTUROSA

1. CODIGO ITEM 1: ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 INCLUIDO CABALLETE (CON DESMONTE DE CUBIERTA Y CABALLETE EXISTENTE EN ETERNIT):

Esta actividad contempló el desmonte de la cubierta existente (incluyendo su caballete) en Eternit, contempló el Suministro y la Instalación de la Cubierta en lámina master 1000 calibre 28 Color Azul, incluido el caballete en Lamina Master 1000 Color Azul, se utilizaron amarres para Cubiertas y se realizó el sellado de los amarres con sellante para goteras. Los Materiales utilizados para esta actividad fueron los siguientes: Teja Master 1000 Calibre 28, Caballete en Teja Master 1000 Calibre 28, Amarres y sellante de goteras. El área Intervenida fue de 68.60 M2, se realizó la Intervención de la Cubierta de uno de los salones que queda a mano izquierda de la entrada de la Escuela.



Foto 1: Cubierta existente del Salón de Clases.



Foto 2: Suministro e Instalación de Cubierta Nueva para el Salón de Clases.

	
<i>Foto 1: Cubierta existente del Salón de Clases.</i>	<i>Foto 2: Suministro e Instalación de Cubierta Nueva y Caballete para el Salón de Clases.</i>

2. CODIGO ITEM 2: ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE PINTURA EN VINILO TIPO 2 PARA MUROS DEL AULA DE CLASES Y ÁREAS COMUNES, INCLUIDA LA MANO DE OBRA (CON PINTADA DE MURO A DOS MANOS, INCLUYE TRANSPORTE):

Esta actividad contempló el suministro y la Instalación de Pintura Vinilo Tipo 2, en los Muros del Aula de Clases y las Paredes Externas (pasillos) que son las Áreas Comunes del Aula. Se realizó los Resanes correspondientes con Estuco y Mortero donde se requería y se realizó la Aplicación de tres Manos de Pintura, ya que se requerían para poder tapar el color verde existente; los materiales utilizados en esta actividad fueron: Pintura Vinilo Tipo 2 de Color Verde Manzana, Estuco, Mortero. El área Intervenida fue de 290.00 M2, se realizó la Intervención en los Muros Internos y Externos del Salón.

	
<i>Foto 1: Paredes del Salón de Clases con el color existente.</i>	<i>Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura Vinilo en las Zonas Comunes del Salón de Clases.</i>

	
<i>Foto 1: Paredes interiores del Salón de Clases con el color existente.</i>	<i>Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura Vinilo en las Paredes Internas del Salón de Clases. Se aplico Pintura para el Zócalo.</i>

3. CODIGO ITEM 3: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE RED EN PUNTOS ELÉCTRICOS SALÓN DE CLASES Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS (TAPAS Y CAJAS OCTOGONALES):

Esta actividad contempló el Mantenimiento y la Limpieza de los Puntos Eléctricos (Tomacorrientes) del Salón de Clases, se realizó el cambio de las Tapas y Cajas Octogonales, se realizó la limpieza de los tomacorrientes con el retiro del comején que se encontraba adentro, se realizó el ajuste de la acometida eléctrica y se dejó la instalación eléctrica para las Lámparas con sus cajas. Los materiales utilizados en esta actividad fueron; Tapas y Cajas Octogonales, Cable Tipo Alambre y Cinta Aislante. Se realizó el Mantenimiento y Limpieza de cuatro 4 Puntos Eléctricos dentro del salón de Clases y se instalaron dos Cajas para las Lámparas Nuevas.

	
<i>Foto 1: Puntos Eléctricos existentes del Salón de Clases.</i>	<i>Foto 2: Se realizó el Mantenimiento y Limpieza de los Puntos Eléctricos del Salón de Clases. Se realizó la Instalación la conexión eléctrica desde el tablero hasta las lámparas .</i>

4. CODIGO ITEM 4: ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE PINTURA EN ACEITE PARA PUERTA Y VENTANAS DEL AULA DE CLASES (A DOS MANOS):

Esta actividad contempló el Suministro y la Instalación de la Pintura en Aceite para la Puerta y las Ventanas del Aula de Clases, se aplicaron dos Manos de Pintura Terracota Esmalte. En esta actividad se utilizaron los siguientes materiales: Pintura en Aceite Esmalte color Negro y Thinner. La puerta se localiza en la Entrada del Salón y las Ventanas en los Muros Laterales del Salón. Se ejecutaron 28.00 M2 de Pintura sobre la Puerta y las Ventanas.



Foto 1: Puerta y Ventanas del Salón de Clases con su color existente.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Aceite para la Puerta y Ventanas del Salón de Clases.



Foto 1: Puerta y Ventanas del Salón de Clases con su color existente.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Aceite para la Puerta y Ventanas del Salón de Clases.

5. CODIGO ITEM 5: ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE PINTURA EN ACEITE PARA UNIDADES SANITARIAS (A DOS MANOS) Y MANTENIMIENTO DE 4 DE PUERTAS DE UNIDADES SANITARIAS:

Esta actividad contempló el Suministro y la Instalación de la Pintura en Aceite para las Puertas y las Ventanas de las Unidades Sanitarias, se aplicaron dos Manos de Pintura Terracota Esmalte y se Ajustaron los Marcos de las 4 Puertas. En esta actividad se utilizaron los siguientes materiales: Pintura en Aceite Esmalte color Terracota y Thinner. Las puertas se localizan en la Entrada de la Unidad Sanitaria que queda en la parte de atrás de la Escuela. Se ejecutaron 14.80 M2 de Pintura sobre las Puertas y las Ventanas.

	
<i>Foto 1: Puertas de la Unidad Sanitaria de la Escuela la Venturosa.</i>	<i>Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Aceite y ajuste de las Puertas de la Unidad Sanitaria de la Escuela la Venturosa.</i>
	
<i>Foto 1: Puertas de la Unidad Sanitaria de la Escuela la Venturosa.</i>	<i>Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Aceite y ajuste de las Puertas de la Unidad Sanitaria de la Escuela la Venturosa.</i>

6. CODIGO ITEM 6: ACTIVIDAD: DESMONTE DE LAMPARA DE BALASTRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED CON ROSETAS PLÁSTICA DE 35 WATTS:

Esta actividad contempló el Desmonte de Lampara de Balastro Existente localizada en una Cercha dentro del Salón de Clases, se suministraron y se instalaron Lámparas Led de 35 Watts con Rosetas plásticas. En esta actividad se utilizaron los siguientes materiales: Lámpara Led de 35 Watts y Roceta. Las puertas se localizan en la Entrada de la Unidad Sanitaria que queda en la parte de atrás de la Escuela. Se ejecutaron 2.00 UN instaladas en las cerchas que sostienen los caballetes de la Cubierta del Salón de Clases.

	
<i>Foto 1: Se localiza lampara en balastro existente del Salón de Clases.</i>	<i>Foto 2: Se realizó el Suministro e Instalación de Lámparas Led con rosetas plásticas de 35 watts para el Salón de Clases.</i>

	
<i>Foto 1: Lampara en balastro existente del Salón de Clases.</i>	<i>Foto 2: Se realizó el suministro e Instalación de Lámparas Led con rosetas plásticas de 35 watts para el Salón de Clases.</i>

7. CODIGO ITEM 7: ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA ÁREA DEL MESÓN DE LA COCINA DEL RESTAURANTE ESCOLAR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE:

*Esta actividad contempló la Demolición del Enchape Existente de la Cocina Escolar, contempló el Suministro y la Instalación del Enchape o Baldosa del Área del Mesón. En esta actividad se utilizaron los siguientes materiales: Baldosa Blanca de Formato 20*20, Pegante para Cerámica y Boquilla Blanca. La cocina del Restaurante Escolar queda en la edificación Final de la Escuela. Se ejecutaron 7.65 M2 de baldosa, localizada en la parte superior e inferior del Mesón de la Cocina del Restaurante Escolar.*



Foto 1: Enchape existente del Mesón de la Cocina del Restaurante Escolar de la Escuela Venturosa.



Foto 2: Suministro e Instalación de Baldosa para el Mesón de la Cocina del Restaurante Escolar de la Escuela Venturosa.



Foto 1: Enchape existente del Mesón de la Cocina del Restaurante Escolar de la Escuela Venturosa.



Foto 2: Suministro e Instalación de Baldosa para el Mesón de la Cocina del Restaurante Escolar de la Escuela Venturosa.

8. CODIGO ITEM 8: ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE PINTURA EN VINILO TIPO 2 PARA MUROS DE LA UNIDAD SANITARIA Y ÁREAS COMUNES, INCLUIDA LA MANO DE OBRA (CON PINTADA DE MURO A DOS MANOS, INCLUYE TRANSPORTE):

Esta actividad contempló el suministro y la Instalación de Pintura Vinilo Tipo 2, en los Muros de la Bateria Sanitaria y las Paredes Externas (pasillos) que son las Áreas Comunes y la Cocina del Restaurante Escolar. Se realizó los Resanes correspondientes con Estuco y Mortero donde se requería y se realizó la Aplicación de tres Manos de Pintura, ya que se requerían para poder tapar el color verde existente; los materiales utilizados en esta actividad fueron: Pintura Vinilo Tipo 2 de Color Verde Manzana, Estuco, Mortero. El área intervenida fue de 80.00 M2, se realizó la Intervención en los Muros Internos y Externos de la Unidad Sanitaria, Los Pasillos y la Cocina del Restaurante Escolar.



Foto 1: Pintura existente de los Muros de las zonas comunes (Pasillos) de la Escuela La Venturosa.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Vinilo de las Zonas comunes (Pasillos) de la Escuela La Venturosa.



Foto 1: Pintura existente de los Muros de las zonas comunes (Cocina Escolar) de la Escuela La Venturosa.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Vinilo de las Zonas comunes (Cocina Escolar) de la Escuela La Venturosa.



Foto 1: Pintura existente de los Muros de las Baterías Sanitarias de la Escuela La Venturosa.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Vinilo de los Muros de las Baterías Sanitarias de la Escuela La Venturosa.



Foto 1: Pintura existente de los Muros del Cuarto donde se encuentra la Planta Eléctrica de la Escuela La Venturosa.



Foto 2: Suministro e Instalación de Pintura en Vinilo para los Muros del Cuarto donde se encuentra la Planta Eléctrica de la Escuela La Venturosa.

RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO
C.C. No.: 1.121.882.541 de Villavicencio – Meta
INGENIERO CIVIL
M.P. No. 25202 – 270137 CND

Espacio para
Logo Corporativo

RICARDO ALEXANDER BRAVO
TAMAYO
NIT 1.121.882.541-7
CALLE 16 A SUR 8 50
Tel: (608) 3144770163
Pitalito - Colombia
ing.ricardobravo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 18

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA		
NIT	844.002.430-5	Teléfono	(608) 3112584634
Dirección	CR 7 3-17	Ciudad	San Luis De Palenque - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 11:04
Expedición	05/05/2026, 11:04
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 incluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit).	63.80	6,061,000.00
2	Levantamiento de los muros de los 4 lados del aula de clase aumentado un metro de altura, con bloques maguncia y cemento (incluye pañete de 1 cm de grosor)	26.00	2,678,000.00
3	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte)	177.00	2,389,500.00
4	Mantenimiento, limpieza de red en puntos eléctricos salón de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales)	4.00	200,000.00
5	Suministro de pintura en aceite para puerta del aula de clases (a dos manos)	4.00	120,000.00
6	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 incluido caballete (con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit).	68.60	6,517,000.00
7	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte)	290.00	3,915,000.00
8	Mantenimiento, limpieza de red en puntos eléctricos salón de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales)	4.00	200,000.00
9	Suministro de pintura en aceite para puerta y ventanas del aula de clases (a dos manos)	28.00	840,000.00
10	Suministro de pintura en aceite para unidades sanitarias (a dos manos) y mantenimiento y ajustes de 4 de puertas de unidades sanitarias	14.80	444,000.00
11	Desmonte de lampara de balastro, suministro e instalación de lámparas led con rosetas plásticas de 35 watts	2.00	150,000.00
12	Suministro e instalación de baldosas área del mesón de la cocina del restaurante escolar, incluye demolición de enchape existente.	7.65	612,000.00
13	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros de la unidad sanitaria y áreas comunes (pintada a dos manos, incluye transporte)	80.00	1,360,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Veinticinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 25,486,500.00

Observaciones:

Total Bruto	25,486,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,486,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093364060 aprobado en 20250521 prefijo FVE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d16384d5763d2cd6811dafcce27da73777d3745f137de7b72123e4792b1a43c2424d7c9f7646accf084cfa67b1f23d33



RAZÓN SOCIAL :	RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121882541
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36614020
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36614020
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 218.900	\$ 219.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 280.200	\$ 280.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 499.100	\$ 499.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2026
----------------------------------	------------
