

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 846-2024

INFORME MENSUAL No. 9

“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA

ENTIDAD CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

PERIODO A REPORTAR

7 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 6 DE ENERO DE 2026

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

HOJA DE CONTROL

INDICE DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	SECCIÓN MODIFICADA	FECHA DE MODIFICACIÓN
0.0	Versión original	5/01/2025
0.1	Versión ajustada	9/01/2026
0.2		

CONTROL DE REVISIONES Y APRBACIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
T.S. Diana Sandoval Elaboró	Residente Social de obra	
Ing. Julián Poveda Revisó	Director de Obra	
T.S. Doris María Ortiz Aprobó	Residente social de interventoría	

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	6
2.1 Objetivo General	7
2.2. Objetivos Específicos	7
3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	8
4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	10
4.2 Área de influencia directa e indirecta	11
5. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL	15
5.1 Programa de Información a la comunidad	15
5.1.1 Reuniones de Inicio	15
5.1.2 Reuniones de Finalización	15
5.1.3. Reuniones extraordinarias	16
5.1.4. Indicadores de cumplimiento Programa de Información al Ciudadano	17
5.2. Programa de divulgación del proyecto	18
5.2.1 Puntos Satélites de Información - PSI	18
5.2.2 Volantes de invitación o convocatoria a reuniones y comités	20
5.2.3 Volantes de inicio	21
5.2.4 Afiches Informativos	22
5.2.5 Volantes de información ciudadana o comunicados	22
5.2.6 Plegable del Plan de manejo de Tráfico	23
5.2.6 Vallas de identificación	23
5.2.7 Indicadores Programa de divulgación a la comunidad	25
5.3.1 Punto CREA	26
5.3.2 Atención y gestión de la Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias – PQRDS	27
5.3.3 Indicadores Programa de Atención al Ciudadano	43
5.4 Programa de Sostenibilidad	43
5.4.1 Conformación Comité CREA	43
5.4.2 Plegables de sostenibilidad	44
5.4.3 Indicadores Programa de Sostenibilidad	45
5.5. Programa de socialización del proyecto a empleados en obra	45
5.5.1 Indicadores Programa de Capacitación a Empleados de Obra	46

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5.6 Programa de apoyo para la generación de empleo	47
5.6.1 Indicadores Cumplimiento programa de apoyo a la generación de empleo	49
5.7 Programa de manejo de impactos en el sector comercial.....	49
5.7.1 Indicadores de cumplimiento Manejo de Impactos en el Sector Comercial	49
5.8 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas	50
5.8.1 Actas de Vecindad de inicio	50
5.8. 2. Actas de Vecindad de Cierre	50
5.8.3 Entrega de Copias de actas de vecindad	51
5.8.3 Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)	51
5.8.4 Información de suspensión de acceso a garajes	51
5.8.5 Actas de Compromiso	52
5.8.6 Levantamiento del registro fílmico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos	54
5.8.7 Indicadores de cumplimiento Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas	55
6. REPORTES	56
6.1 Reporte periódico	56
6.2 Informe Mensual.....	56
6.3 Informe Final de gestión	57
6.4 Comité de seguimiento.....	57
7. CRONOGRAMA	58
8. CONCLUSIONES	58

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1- Datos de identificación del proyecto.....	8
Tabla 2-Datos contratista	8
Tabla 3-Datos interventoría.....	9
Tabla 4-Barrios AID	11
Tabla 5-Listado de vías priorizadas	11
Tabla 6 Segmentos Viales Priorizados	12
Tabla 7 Segmentos viales incluidos para intervención total en la adición.....	13
Tabla 8 Segmentos viales en evaluación por acciones de movilidad.	13
Tabla 9-Personal Social Mínimo Requerido	14
Tabla 10-Estructura gestión social	14
Tabla 11 Reuniones informativas de inicio de obra	17

INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Ubicación de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá	10
Imagen 2 Valla informativa Estación Central.....	24
Imagen 3 Valla Informativa San Francisco Occidental	24
Imagen 4 Valla Informativa Colón	24
Imagen 5 Valla Informativa colon 2	24
Imagen 6 Valla Informativa Veraguas Central 2	25
Imagen 7 Valla Informativa Veraguas Central 1	25
Imagen 8 Punto CREA.....	27
Imagen 9 Soporte del registro de mujeres en la página de la secretaria de la mujer.....	48

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 – Programa de Información a la comunidad – Actas de reunión – Planillas de asistencia – Registros Fotográficos	14
Anexo 2 -Programa de divulgación – Volantes – Planillas control entrega – Registros fotográficos.	19
Anexo 3 -Programa de atención a la comunidad – PQR’S – Respuestas y Cierres.....	30
Anexo 4 - Programa de sostenibilidad – Acta de reunión – Planillas de asistencia – Registros fotográficos.....	32
Anexo 5 - Programa de Socialización del proyecto a empleados en obra – Plegable de capacitación – Planilla de asistencia – Registro fotográfico.....	34
Anexo 6 - Programa de Generación de empleo -Formato de Generación de empleo	37
Anexo 7 - Programa de apoyo social a las actividades técnicas – Planilla de control de entrega de volantes.	36

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

1. INTRODUCCION

De acuerdo a los lineamientos de los términos de referencia del contrato 846 de 2024 cuyo objeto es **“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”**. Generado por el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda y de acuerdo al diagnóstico Socio-Económico de la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto.

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos contractuales, se presenta el informe mensual social No.9, correspondiente al período del 7 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, realizado por el equipo profesional del área social, el cual describe las acciones y actividades ejecutadas para la ejecución del contrato en los diferentes programas del Plan de Gestión Social.

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Describir las actividades para dar cumplimiento al Plan de Gestión Social del Consorcio Vías de Puente Aranda, acorde a los lineamientos de los términos de referencia del contrato de obra No. 846 de 2024, cuyo objeto es **“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”.**”, el cual contiene las estrategias y actividades a implementar para mitigar los impactos sociales generados por el proceso constructivo.

2.2. Objetivos Específicos

- Utilizar los mecanismos de comunicación que permitan brindar información clara, veraz y oportuna, a los residentes mediante la implementación de escenarios de participación comunitaria que faciliten los espacios de comunicación con la comunidad.
- Gestionar y atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía.
- Prevenir y mitigar los impactos sociales ocasionados por la ejecución de las obras.
- Ofrecer un espacio de encuentro con la comunidad, involucrándola en procesos de diálogo y participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo del proyecto.
- Promover la apropiación y sostenibilidad del Proyecto
- Favorecer la contratación de mano de obra de la localidad de Puente Aranda

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Tabla 1- Datos de identificación del proyecto

ENTIDAD CONTRATANTE	
Entidad Contratante	Fondo de desarrollo local de Puente Aranda
Supervisor	Juan Alfredo Torres
Correo	juan.torres@gobiernobogota.gov.co Infraestructura.paranda@gobiernobogota.gov.co
Nombre Contratista	Consortio Vías de Puente Aranda
No. Contrato de obra	846-2025
Objeto del Contrato	“Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación”.
NIT	899.999.061-9

Fuente: Consortio Vías de Puente Aranda

Tabla 2-Datos contratista

CONTRATISTA	
Contrato No.	COP – 846 de 2024
Objeto del contrato	“Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación”.
Localización del proyecto	Puente Aranda
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	7 de abril de 2025
Fecha prevista de terminación	6 de diciembre de 2025
Contratista	Consortio Vías de Puente Aranda
NIT	901.901.931-7
Director de obra	Ing. Julián Camilo Poveda
Residente técnico 1	Ing. Juan Carlos Aguirre
Residente Ambiental	Ing. Julieth Stefanny Ortiz Ortiz

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Residente SST	Ing. Julieth Stefanny Ortiz Ortiz
Residente Social	T.S. Diana Marcela Sandoval
Valor del contrato	\$ 6.351.563.839
Prórroga Nro. 1	Tres (03) meses es decir desde el 7 de diciembre de 2025 al 6 de marzo de 2026.
Adición Nro. 1	\$3.175.781.919
Valor Total del Contrato incluido Adición Nro. 1	\$ 9.527.345.758
Fecha de Terminación incluida Adición y Prórroga Nro. 1	6 de marzo de 2026

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Tabla 3-Datos interventoría

INTERVENTORÍA	
Contrato No.	CIN-850-2024
Objeto del contrato	“REALIZAR LA Cibi TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y Cibi PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-000-2024 CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”
Localización del proyecto	Puente Aranda
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	7 de abril de 2025
Prórroga No. 1	TRES (03) MESES ES DECIR DESDE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 6 DE MARZO DE 2026
Adición No. 1	\$ 225.450.312
Fecha de Terminación incluida Adición y Prórroga Nro. 1	6 de marzo de 2026
Contratista	Consorcio PAVIAS 2025
NIT	901929491 -1

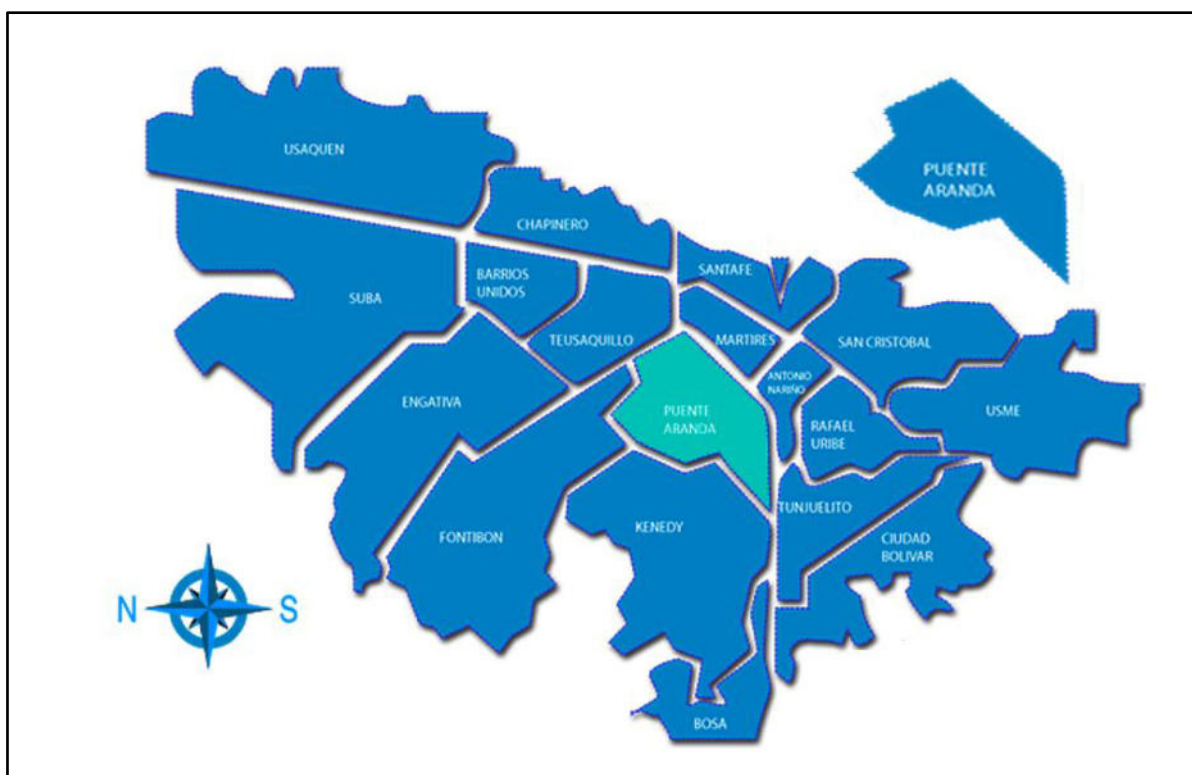
	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Director de obra	Ing. Santiago Carrillo
Residente técnico	Ing. Luis Eduardo Acosta
Residente Ambiental y Cibi	Ing. Julián Vanegas Bustos
Residente Social	T.S Doris María Ortiz
Valor del contrato total	\$ 780.741.362

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Imagen 1 Ubicación de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá



Fuente: Alcaldía Local Puente Aranda

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

4.2 Área de influencia directa e indirecta

El área de influencia indirecta es toda aquella que se verá afectada indirectamente por las intervenciones que se efectúen en la rehabilitación y mantenimiento de malla vial, de manera aledaña y la directa es aquella zona del proyecto en donde se manifiestan los impactos generados por las actividades de construcción y operación, condiciones que corresponden al área de intervención que se va a ejecutar, donde los impactos generales del proceso constructivo de la vía son directos y de mayor intensidad.

A continuación, se relaciona el listado de barrios que serán intervenidos durante la ejecución del Contrato:

Tabla 4-Barrios AID

UPZ	Barrios
San Rafael	San Rafael– Colon – Basilia – San Francisco – Galán
Ciudad Montes	Santa Matilde – Jorge Gaitán Cortes – La Camelia
Zona Industrial	Cundinamarca- Puente Aranda – Salazar Gómez

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

A continuación, se relaciona el listado de segmentos viales priorizados por el presente contrato:

Tabla 5-Listado de vías priorizadas

PRIORIZACIÓN	CIV	PK_ID	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
1	16001124	189329	CL15	KR 35	KR 36
2	16001839	187820	TV 53 BIS	CL 1C	CL 1 SUR
3	16001833	188405	CL 1C	TV 53 BIS	TV 53
4	16000124	189511	CL 18	KR 55	KR 56
5	16000696	187769	DG 5F BIS	TV 47	TV 48
6	16000586	187770	DG 5F BIS	TV 48 ^a	TV 48
7	16000839	188187	KR 55	CLL 4B	CLL 4C BIS
8	16002708	186949	KR 31 A BIS	CL 4 ^a	CL5

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

9	16002834	185581	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S
10	16001079	188061	KR 57ª	CL 2B	TV 53 A
11	16000110	189174	KR 62	CL 15	CL 14
12	16000094	189175	KR 62	CL 17	CL 15
13	16001611	187710	CL5C	KR 39D	KR 40
14	16001664	187035	KR 39D	CL 5ª	CL 5D
15	16003772	185278	KR 39B	CL 29B SUR	CL 29ª SUR
16	16002911	186939	KR 30 A	AC 3	CL 4
17	16002866	186940	KR 30 A	CL 4	CL 4 BIS
18	16001545	188470	CL 2B	TV 53 A	KR 53B BIS
19	16002164	187517	CL 2D	KR 39	KR 39 A
20	16003336	187260	CL 10 A S	KR 36	KR 37
21	16000940	188548	CL 4ª	KR 54	KR 55

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

A partir del presupuesto asignado por el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, el contratista presentó el balance para la ejecución de actividades a la interventoría, en el cual se priorizan los siguientes segmentos viales:

Tabla 6 Segmentos Viales Priorizados

PRIORIZACIÓN	CIV	PK_ID	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
1	16001124	189329	CL15	KR 35	KR 36
2	16001839	187820	TV 53 BIS	CL 1C	CL 1 SUR
3	16001833	188405	CL 1C	TV 53 BIS	TV 53
4	16000124	189511	CL 18	KR 55	KR 56
5	16000696	187769	DG 5F BIS	TV 47	TV 48
6	16000586	187770	DG 5F BIS	TV 48ª	TV 48
7	16000839	188187	KR 55	CLL 4B	CLL 4C BIS

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Mediante el oficio COP-846-2024/034-2025, enviado por el contratista el día 07 de julio de 2025, se solicitó formalmente la prórroga y adición al contrato vigente, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades proyectadas y ampliar el alcance inicialmente establecido. Esta solicitud fue evaluada y aprobada por la

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

interventoría el mismo día, 07 de julio de 2025, mediante el oficio CIN-850-2024-052, en el cual se dio visto bueno a los ajustes propuestos por el contratista, en concordancia con las necesidades del proyecto.

Adicionalmente, por solicitud expresa de la Alcaldía, se procederá a la inclusión de siete (7) nuevos segmentos viales dentro del alcance del contrato. De estos, dos (2) serán objeto de intervención total, con obras contempladas para su mejora integral (Cibi's 16002911 y 16002708).

Tabla 7 Segmentos viales incluidos para intervención total en la adición.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
7	16002911	186939	KR 30 A	AC 3	CL 4
14	16002708	186949	KR 31 A BIS	CL 4 ^a	CL5

Los cinco (5) segmentos restantes serán evaluados con el objetivo de identificar y proponer posibles acciones de movilidad que optimicen la circulación en dichos tramos, de acuerdo con los estudios técnicos que se realicen (CIV's 16001545, 16002834, 16002303, 16002253 y 16002241).

Tabla 8 Segmentos viales en evaluación por acciones de movilidad.

No.	CIV	PK_ID	EJE	DESDE	HASTA
9	16001545	188470	CL 2B	TV 53 A	KR 53B BIS
12	16002834	185581	KR 51C	CL 24 S	AC 26 S
19	16002303	186854	KR 38 B BIS	CL 2B	CL 2C
20	16002253	186855	KR 38 B BIS	CL 2C	CL 2C BIS
21	16002241	186856	KR 38 B BIS	CL 2C BIS	CL 2D

4.3 Recurso humano

Durante la ejecución del Contrato, el Consorcio Vías de Puente Aranda, tendrá como mínimo la planta de personal que se enuncia en el anexo técnico de personal; con la cual debe garantizar la oportunidad, eficiencia y eficacia de los objetivos transversales de información, mitigación, articulación y apropiación y sostenibilidad contempladas para el desarrollo y todas aquellas necesarias que la Interventoría y/o FDLPA soliciten para cumplir

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

con lo establecido en el apéndice. Para la ejecución de actividades por parte del componente social, se cuenta con el personal que se relaciona a continuación:

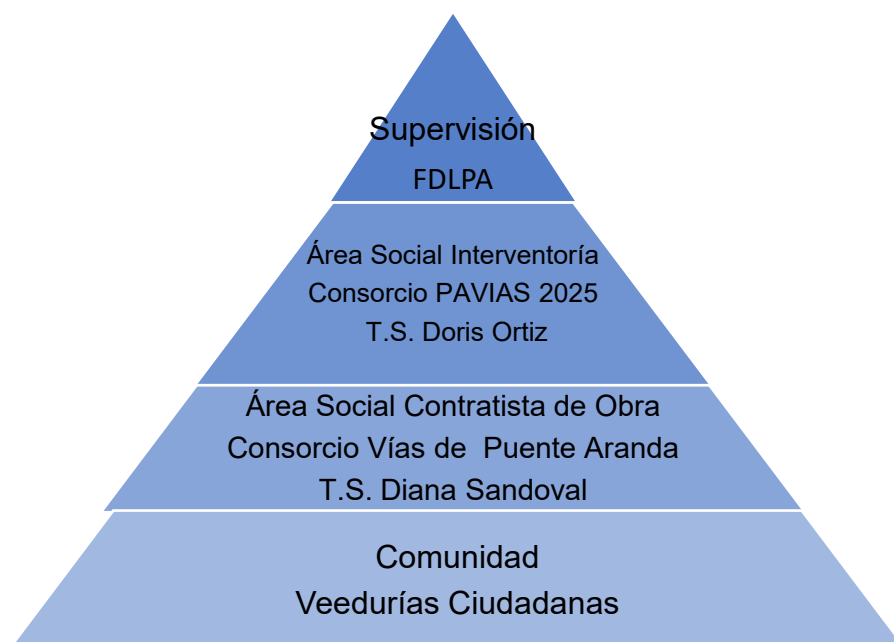
Tabla 9-Personal Social Mínimo Requerido

CARGO	NOMBRE COMPLETO	No. CÉDULA	DEDICACIÓN
Residente Social	Diana Marcela Sandoval Amaya	1.029.936.212	40%
Auxiliar Social	Paula Alejandra Restrepo Rada	1.002. 752.016	40%

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Durante la ejecución del presente contrato se establece la siguiente estructura para el componente social:

Tabla 10-Estructura gestión social



Fuente: Anexo técnico 1

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el equipo de profesionales del área social, durante el periodo que se relaciona en el presente informe en los diferentes programas de gestión social.

5.1 Programa de Información a la comunidad

Para el presente informe se realizaron algunos acercamientos a líderes y lideresas comunitarias de las zonas de influencia directa de los diferentes segmentos viales a intervenir.

5.1.1 Reuniones de Inicio

Las reuniones de inicio de actividades son espacios que posibilitan la entrega de información de forma directa a la comunidad, fomentan el diálogo y permiten definir las instancias y los mecanismos de participación.

- Durante el periodo que se reporta en el presente informe, no se realizaron reuniones de inicio, teniendo en cuenta que no se presentó la necesidad de convocarlas.

5.1.2 Reuniones de Finalización

La reunión de finalización corresponde a la socialización de la ejecución de obra mínimo al 90% de ejecución para cada uno de los tramos. El contratista de obra realizará la presentación de los resultados obtenidos a nivel técnico, social, ambiental y SST y el cumplimiento de los compromisos contractuales y se dará respuesta a las inquietudes de los asistentes.

- Para el periodo que se reporta en el presente informe, se realizó una reunión de finalización en el frente de obra de Puente Aranda, con el fin de socializar con la comunidad las actividades ejecutadas, exponer el proceso constructivo desarrollado, resolver inquietudes de los ciudadanos y formalizar el cierre de las

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

intervenciones, dejando constancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la entrega de las recomendaciones para el adecuado uso y conservación de los espacios intervenidos, como se evidencia a continuación:

Tabla 10 Reuniones informativas de inicio de obra

N o	Fecha	CIV	Barrio	Ubicación	No. participantes
1	10/12/2025	16000124	Puente Aranda	Calle 18 entre Carrera 55 y Carrera 56	5
Total					5

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Anexo 1. Programa de Información a la comunidad – Actas de Reuniones Informativas de Inicio de Obra – Planillas de Asistencia – Registros fotográficos.

5.1.3. Reuniones extraordinarias

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en caso de que el desarrollo del proyecto lo amerite, así como en caso de que la comunidad, la Interventoría o el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda lo soliciten. Estas reuniones son para tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requieran un espacio para ser revisados.

- Para el periodo que se reporta en el presente informe, se realizó una reunión extraordinaria, la cual fue programada y desarrollada, como estrategia de cumplimiento a los compromisos adquiridos en el último comité de veeduría ciudadana, con el fin de socializar las actividades adelantadas, atender inquietudes de la comunidad y realizar el respectivo seguimiento a los compromisos establecidos, como se evidencia a continuación:

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Tabla 11 Reuniones informativas de inicio de obra

No	Fecha	CIV	Barrio	Ubicación	No. participantes
1	17/12/2025	16000586-16000696	San Francisco	Diagonal 5F bis entre TV 48ª y TV 48	9
Total					9

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Anexo 1. Programa de Información a la comunidad – Actas de Reuniones Informativas de Inicio de Obra – Planillas de Asistencia – Registros fotográficos.

5.1.4. Indicadores de cumplimiento Programa de Información al Ciudadano

Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, se aplicaron los siguientes indicadores de cumplimiento para el programa de información al ciudadano.

Tabla 12 Indicadores programa de Información al Ciudadano

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{Total, reuniones de inicio ejecutadas}}{\text{Total, reuniones de inicio programadas}} \times 100$	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
$\frac{\text{Total, reuniones extraordinarias ejecutadas}}{\text{Total, reuniones extraordinarias programadas}} \times 100$	$\frac{1 * 100}{1} = 100\%$
$\frac{\text{Total, reuniones de finalización ejecutadas}}{\text{Total, reuniones de finalización programadas}} \times 100$	$\frac{1 * 100}{1} = 100\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5.2. Programa de divulgación del proyecto

Las piezas de divulgación son herramientas de información masiva que contienen datos generales sobre el proyecto, describiendo e informando a la comunidad, las actividades a realizar en cada segmento vial.

- Para el presente periodo se diseñaron las siguientes piezas informativas, las cuales fueron remitidas a la interventoría para revisión y aprobación. Las observaciones realizadas fueron subsanadas. Así mismo, la interventoría remitió las piezas a la oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Puente Aranda para revisión y aprobación.

Tabla 13 -Piezas informativas

ítem	Pieza
1	Volante de convocatoria a la reunión de finalización de obra en el CIV 16000124 en el barrio Puente Aranda.
2	Plegable de sostenibilidad para reunión de finalización CIV 16000124 barrio Puente Aranda.
3	Plegable de capacitación al personal en obra, tema “Habilidades Sociales”
4	Volante informativo de obra para el CIV 16000696 en el barrio San Francisco.

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.2.1 Puntos Satélites de Información - PSI

Los puntos satélites de Información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano ubicados en zonas estratégicas adyacentes a la intervención, su función es difundir, por medio de piezas comunicativas, la información del proyecto a la comunidad beneficiada por la construcción de la obra.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, se verificó la instalación de los PSI previamente dispuestos en los diferentes frentes de obra, así mismo, se procede con la instalación del PSI pertinente para la intervención que se está adelantando en los andenes ubicados en los CIV's 16000120-16000131 en el barrio Puente Aranda, como se relaciona continuación:

Tabla 14 Instalación de PSI

No.	Fecha	Barrio / CIV	Dirección de ubicación	Piezas Instaladas	Estado
1	29/05/2025	Camelia / 16001839 - 16001833	CI 1C No. 53 - 19	<ul style="list-style-type: none"> • Afiche informativo • Volante informativo de PMT y de inicio de obra • Volante MONC 	Actualización
2	14/06/2025	Camelia / 16001839 - 16001833	Miscelánea La Estación Calle 1 sur No. 53-85	<ul style="list-style-type: none"> • Volante informativo de inicio de obra • Volante de PMT • Volante MONC 	Actualización
3	14/06/2025	Cundinamarca / 16001124	Distribuidora Colgas Calle 15 No. 35-26	<ul style="list-style-type: none"> • Volante informativo de inicio de obra • Volante de PMT • Volante MONC 	Actualización
4	14/06/2025	Puente Aranda / 16000124	Calle 18 No. 55-36	<ul style="list-style-type: none"> • Volante informativo de inicio de obra • Volante de PMT • Volante MONC 	Actualización
5	02/07/2025	San Francisco Occidental/ 16000696 - 16000586	Dg 5 F Bis No. 47-41	<ul style="list-style-type: none"> • Volante informativo de inicio de obra • Volante de PMT • Volante MONC 	Actualización
6	05/08/2025	Colón / 16000839	Carrera 55 No. 4ª – 71	<ul style="list-style-type: none"> • Volante informativo de inicio de obra • Volante de PMT • Volante MONC 	Actualización
7	10/10/2025	Veraguas Central / 16002911	Calle 5 No. 31ª - 11	<ul style="list-style-type: none"> • Volante informativo de inicio de obra • Volante de PMT • Volante MONC 	Instalación

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

No.	Fecha	Barrio / CIV	Dirección de ubicación	Piezas Instaladas	Estado
8	10/10/2025	Veraguas Central / 16002708	Carrera 30ª No. 3 -28	<ul style="list-style-type: none"> Volante informativo de inicio de obra Volante de PMT Volante MONC 	Instalación
9	20/11/2025	Gaitán cortes / 16002303 - 16002253 - 16002241	Carrera 38 B bis No 2C - 21	<ul style="list-style-type: none"> Volante informativo de inicio de obra Volante de PMT Volante MONC 	Instalación
10	24/11/2025	Colon / 16000940	Carrera 54 No. 4 - 29	<ul style="list-style-type: none"> Volante informativo de inicio de obra Volante de PMT Volante MONC 	Instalación
11	25/11/2025	Veraguas central/ 16002807	Carrera 31 A bis No. 4ª - 04	<ul style="list-style-type: none"> Volante informativo de inicio de obra Volante de PMT Volante MONC 	Actualización
12	24/11/2025	Camelia / 16001839 - 16001833	CI 1C No. 53 - 19	<ul style="list-style-type: none"> Afiche informativo Volante informativo de PMT y de inicio de obra Volante MONC 	Retiro
13	6/12/2025	Puente Aranda / 16000124	Calle 18 No. 55-36	<ul style="list-style-type: none"> Volante informativo de inicio de obra Volante de PMT Volante MONC 	Retiro
14	29/12/2025	Puente Aranda / 16000120- 16000131	Calle 17ª No. 57-41	<ul style="list-style-type: none"> volante informativo de inicio de obra Volante MONC 	Instalación

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Anexo 2. Programa de Divulgación – Formato Punto Satélite de Información.

5.2.2 Volantes de invitación o convocatoria a reuniones y comités

Son piezas comunicativas que permiten informar a la comunidad de los diferentes acercamientos, encuentros y/o reuniones, en ellos se incluye la información relevante para

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

el contrato, fecha, hora y punto de encuentro.

- Para el presente periodo, se elaboraron los volantes de convocatoria a reunión de finalización correspondiente al frente de obra ubicado en el barrio Puente Aranda, como se relaciona a continuación:

Tabla 15 -Volantes de convocatoria

No.	Fecha	Tramo	CIV	Barrio	Tipo de Pieza	No. Piezas divulgadas
1	09/12/2025	Calle 18 entre Carrera 55 y Carrera 56	16000124	Puente Aranda	Vol. Convocatoria reunión de finalización.	15
Total						15

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Anexo 2. Programa de Divulgación – Volantes – Planillas control entrega – Registros fotográficos.

5.2.3 Volantes de inicio

Es la pieza informativa en la que se describen aspectos específicos del comienzo del proyecto, se distribuyen a la comunidad del área de influencia y la manzana aferente. Así mismo, estas piezas serán instaladas en los PSI, predio a predio, y se dejan en punto CREA, actores institucionales y sociales identificados.

- Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se efectuó la entrega de volantes informativos de inicio de obra, en ninguno de los frentes de obra.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5.2.4 Afiches Informativos

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades del proyecto, se brinda información acerca del punto de atención CREA y los canales de comunicación con el contratista y la interventoría, todo lo anterior se relaciona en las diferentes piezas comunicativas que, a su vez son instaladas en los Puntos Satélites de Información.

- En el periodo que se relaciona en el presente informe, se continua con la instalación de los afiches informativos en los PSI los cuales se encuentran ubicados en los frentes de obra en ejecución.

5.2.5 Volantes de información ciudadana o comunicados

Estas piezas serán divulgadas según los requerimientos y dinámica de la intervención, donde se adelantará información de las actividades según la programación de intervención, específicamente para cuando se inicien tramos de obra puntuales y previo a la instalación de los cerramientos de obra, se adelante intervención del espacio público, se presente intervención del tráfico vehicular, se presente intervención forestal, se programen cortes de los servicios públicos, se limite el acceso a los predios por intervención del espacio público o de vías y para adecuación de bajantes de agua. Así como las notificaciones para el levantamiento de actas de vecindad, primera, segunda y tercera visita.

- Durante el periodo comprendido en el presente informe, se realizó entrega de volantes de información ciudadana o comunicados en uno de los frentes de obra, como se evidencia a continuación:

Tabla 16 -Volantes Informativos

No.	Fecha	Tramo	CIV	Barrio	Tipo de Pieza	No. Piezas divulgadas
1	23/12/2025	Diagonal 5F Bis entre Transversal 47 y TV 48	16000696	San Francisco	Vol. Informativo de obra	32
Total						32

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Anexo 2. Programa de Divulgación – Volantes – Planillas control entrega – Registros fotográficos.

5.2.6 Plegable del Plan de manejo de Tráfico

Esta pieza informativa contiene la información acerca de la movilidad vehicular y peatonal, desvíos y cierres (fechas, horarios, duración, rutas y tipo de señalización) y el COI de aprobación por parte de la secretaria Distrital de Movilidad.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, no se realiza instalación ni distribución del plegable de Plan de Manejo de Tráfico, ya que no fue requerido.

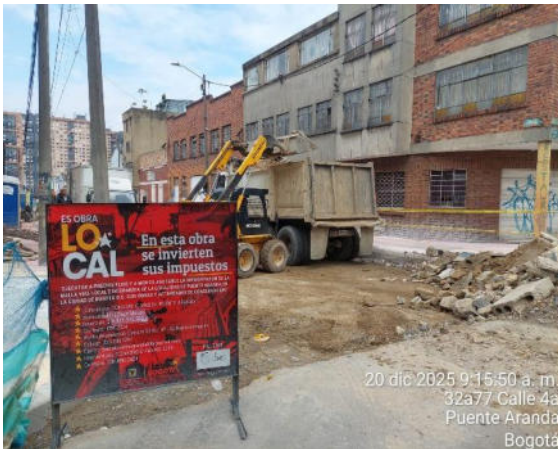
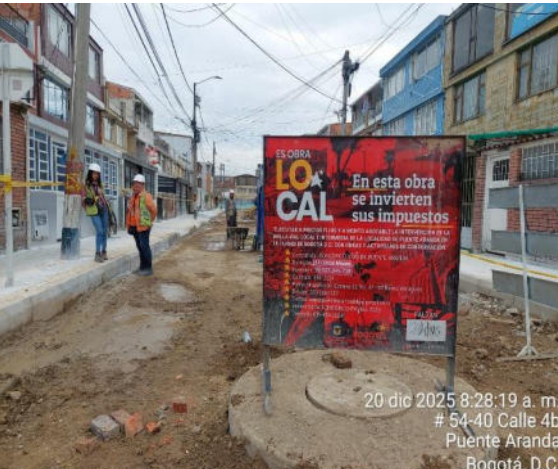
5.2.6 Vallas de identificación

Dando cumplimiento al Acuerdo 787 de 2020, se instalará una valla informativa de conteo regresivo durante la ejecución de la obra, la cual contendrá la información del contrato y la cual permitirá conocer los días que faltan para la finalización contractual del proyecto.

- En el periodo que se reporta en el presente informe, se continua con la instalación de las vallas informativas en los frentes de obra de Estación Central, Puente Aranda, San Francisco Occidental, los dos segmentos de Colón y los dos segmentos viales ubicados en el barrio Veraguas Central.

 <p>CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA</p>	<p>INFORME MENSUAL No. 9</p> <p>“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	 <p>BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda</p>
--	---	--

Tabla 17 Verificación de Instalación de Vallas Informativas

 <p>20 dic 2025 9:15:50 a. m. 32a77 Calle 4a Puente Aranda Bogotá</p>	 <p>20 dic 2025 8:38:06 a. m. 45-88 Diagonal 5f Bis Puente Aranda Bogotá</p>
<p>Imagen 2 Valla informativa Estación Central</p>	<p>Imagen 3 Valla Informativa San Francisco Occidental</p>
 <p>20 dic 2025 8:28:19 a. m. # 54-40 Calle 4b Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	 <p>20 dic 2025 8:13:03 a. m. 33 Carrera 30a Puente Aranda Bogotá</p>
<p>Imagen 4 Valla Informativa Colón</p>	<p>Imagen 5 Valla Informativa colon 2</p>

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

	
<p align="center"><i>Imagen 6 Valla Informativa Veraguas Central 2</i></p>	<p align="center"><i>Imagen 7 Valla Informativa Veraguas Central 1</i></p>

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.2.7 Indicadores Programa de divulgación a la comunidad

Para el presente periodo se aplicaron los siguientes indicadores de gestión para el programa de divulgación de la información:

Tabla 18 -Indicadores programa de divulgación a la comunidad

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{Total, PSI instalados}}{\text{Total, PSI retirados}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{10 * 100}{0} = 100\%$
$\frac{\text{Total, Volantes convocatorias distribuidos}}{\text{Total, Volantes convocatorias requeridos}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{15 * 100}{15} = 100\%$
$\frac{\text{Total, Volantes de inicio distribuidos}}{\text{Total, Volantes de inicio requeridas}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
$\frac{\text{Total, Volantes / comunicados informativos distribuidos}}{\text{Total, Volantes informativos requeridos}} \times 100 = 100$	$\frac{34 * 100}{34} = 100\%$

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

$\frac{\text{Total, Pagable PMT distribuidos}}{\text{Total, Plegable PMT requeridas}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{0 \times 100}{0} = 0\%$
--	--------------------------------

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.3 Programa de Atención al Ciudadano

El Consorcio Vías de Puente Aranda, a partir de las características socio-económicas de la población y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo técnico del contrato, establecerá los recursos y ejecutará las acciones correspondientes para atender los requerimientos de la comunidad.

5.3.1 Punto CREA

El punto CREA (Centro de Reunión, Encuentro y Atención en obra) es el espacio de atención a la comunidad, el cual se encuentra ubicado sobre el eje del proyecto, con las adecuaciones necesarias para la atención a la comunidad.

- El Consorcio Vías de Puente Aranda continua con la atención en el punto CREA con los siguientes canales de comunicación:

Tabla 19 -Ubicación Punto CREA

Dirección	Carrera 33 No. 4ª – 92 Barrio Veraguas
Línea celular	323-2061097
Correo electrónico	Socialpuentearanda846@gmail.com
Horario de Atención	Lunes a Viernes: 8:00 am - 11: 00 am

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Imagen 8 Punto CREA



Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.3.2 Atención y gestión de la Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias – PQRDS

Durante la ejecución del contrato, se contará con un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos (en adelante PQRDS) -Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias, interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico, correo electrónico y/o redes sociales.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, se realiza la apertura de dos (2) PQR's, por lo que, a la fecha, se cuenta con veintiún (21) PQR's creadas y siete (7) de ellas se encuentran en proceso de cierre, a continuación, se relaciona el consolidado de atenciones realizadas:

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Tabla 20 Consolidado de PQR'S

No. PQR	Fecha	CIV Ubicación	Peticionario	Petición	Seguimiento	Estado
1	13/06/2025	16000839	José Gabriel Castiblanco Sosa	Ciudadano solicita el registro fílmico y fotográfico correspondiente al acta de vecindad de inicio de su predio, así como el acta de la reunión de inicio.	<p>13/06/2025 Se responde el correo informando al ciudadano que, una vez finalizadas las actividades de verificación y aprobación, se establece contacto con el ciudadano para la entrega de la información.</p> <p>26/07/2025 Una vez revisadas y aprobadas las actas de vecindad de inicio realizadas, se realiza el envío de los registros fílmicos y fotográficos de la vivienda del petionario, conforme a su solicitud y de esta manera se procede con el cierre de la PQR.</p>	Cerrada
2	04/07/2025	16000586	Elva Arévalo Briceño	La ciudadana se acerca al punto de atención CREA, para solicitar una alternativa para el parqueo de su vehículo, teniendo en cuenta que refiere situaciones	<p>04/07/2025 Se informa a la ciudadana que se va evaluar si existe alguna opción que le permita dejar su vehículo cerca de su vivienda.</p> <p>24/07/2025 El equipo profesional del contratista, la interventoría y el apoyo a la</p>	

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				<p>que afectan su integridad, motivo por el cual solicita la posibilidad de permitirle dejar el vehículo cerca del cerramiento.</p>	<p>supervisión, realizan una visita de seguimiento al predio para informar que, se realizó la evaluación de condiciones del lugar para identificar opciones en las que se le pudiera facilitar el acceso vehicular al predio, no obstante, no es posible, teniendo en cuenta que las actividades propias de la obra, podrían representar riesgos físicos para ella y su familia, por lo que se le informa que se puede apoyar con el equipo de Brigadistas de Orden Aseo y Limpieza para sus desplazamientos y que, si decide dejar el vehículo en las afueras del cerramiento, el contrato no se puede hacer cargo de posibles situaciones que se puedan presentar. De esta manera se procede con el cierre de la PQR.</p>	<p align="center">Cerrada</p>
--	--	--	--	---	---	--------------------------------------

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

3	11/07/2025	16001839 16001833	-Guillermo Barbosa	<p>El ciudadano Guillermo Barbosa, se comunica, mediante el correo electrónico de uso exclusivo del área social del contratista, así como de la interventoría para presentar una queja por "Suspensión de obra CIV'S 16001829 y 16001833 Transversal 53 Bis Calle 1C y Calle 1 Sur", en la que solicita información por la aparente suspensión del contrato.</p>	<p>21/7/2025 Se envía proyección de respuesta a la interventoría para su revisión y aprobación, bajo el oficio COP-846-2024-041-2025.</p> <p>22/07/2025 Una vez revisado y aprobado el oficio por la interventoría, se procede con el envío del mismo al correo electrónico del ciudadano y se procede con el cierre de la PQR.</p>	Cerrada
4	11/07/2025	16000696 16000586	-Martha Blanco	<p>Ciudadana envía derecho de petición mediante el correo electrónico de uso exclusivo del área social, en el que solicita información con respecto a las actividades que se están adelantado en el frente de obra.</p>	<p>25/07/2025 Se realiza el envío del oficio COP-846-2024-043 en el que se proyecta la respuesta, para su revisión y aprobación por parte de la interventoría.</p> <p>28/07/2025 Luego de la revisión y aprobación por parte de la interventoría, se realiza el envío del oficio COP-846-2024/043-2025 a la peticionaria y se procede con el cierre de la PQR.</p>	Cerrada

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5	31/07/2025	16001124	Andrea Princess González Huérfano	Ciudadana solicita se realice la verificación de la información registrada en el acta de vecindad de inicio, ya que, refiere hay afirmaciones en el formato que no corresponden a la realidad del predio, así mismo, envía el registro fotográfico de las áreas pendientes por registrar en el acta de vecindad.	<p>13/09/2025</p> <p>Se realiza toma del registro fotográfico en las áreas autorizadas por la peticionaria para complementar el acta de vecindad de inicio, se le aclara que, en caso de presentarse alguna afectación, se tomará como referencia la fecha actual para proceder con la respectiva respuesta y se procede con el cierre de la PQR.</p>	Cerrada
6	01/08/2025	16000696 16000586	Janerstibel González Leguizamón	Ciudadano envía derecho de petición a la alcaldía, para solicitar se tomen las medidas necesarias para el estacionamiento de los vehículos de los residentes del sector.	<p>4/08/2025</p> <p>Se realiza envío de la respuesta mediante el oficio COP-846-2024/046-2025 y se procede con el cierre de la PQR.</p>	Cerrada

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

7	14/08/2025	16001839	María Eugenia Rubio	Ciudadana reporta mediante el WhatsApp de uso exclusivo del área social que durante le desarrollo de la obra, se presentó una afectación en la materia del antejardín frente a su predio	14/08/2025 Se le informa a la ciudadana que, una vez finalizadas las actividades de alto impacto, se procede con la reparación de la materia ubicada en el andén frente a su predio.	En Seguimiento
8	25/08/2025	16001836	Esther Marcela Gutiérrez Cargas	Ciudadana envía derecho de petición, mediante el correo electrónico en el que solicita el pago de subsidio para el pago del parqueadero para su vehículo.	28/08/2025 Se debe dar respuesta mediante oficio.	Cerrada
9	2/09/2025	16000124	Luz de Patiño	Ciudadana se comunica para reportar afectaciones en el pañete de algunas áreas internas de su predio, como consecuencia del paso del vibro compactador.	02/09/2025. Se realiza verificación del registro filmico y fotográfico del acta de vecindad de inicio y se evidencia que, por solicitud de la persona encargada, no se realiza el registro de las áreas internas de la vivienda, por lo que se le debe notificar que no hay manera de validar el estado inicial. 12/09/2025 Se realiza envío de la respuesta mediante el oficio COP-846-	Cerrada

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

					2024/053-2025 y se procede con el cierre de la PQR.	
10	27/09/2025	16001839	Myriam Céspedes	<p>Ciudadana se comunica para reportar afectaciones ocasionadas por el tránsito de maquinaria. Señala que, en un primer momento, durante la salida de una cama baja para la movilización de la retroexcavadora, el día viernes 26 de septiembre los cables fueron jalados y quedaron descolgados sin que se realizara la corrección correspondiente. Posteriormente, el día sábado 27 de septiembre uno de los camiones terminó de romper dichos cables, situación que generó la suspensión del servicio de internet y afectación en</p>	<p>27/09/2025 Realizar el seguimiento hasta subsanar las afectaciones</p> <p>14/11/2025 Se efectuó la entrega formal de la teja en el predio correspondiente, como medida de reposición por las afectaciones generadas durante el desarrollo de las actividades constructivas. La instalación fue ejecutada con el apoyo de una persona designada directamente por el propietario del inmueble,</p>	En seguimiento

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				<p>las tejas de su vivienda y en la de un predio vecino. Adicionalmente, manifiesta que aún permanecen cables caídos que representan un riesgo para habitantes y transeúntes, así como los daños ya mencionados que requieren atención y respuesta por parte de la entidad responsable.</p>		
11	01/10/2025	16001839	Rusmeyer Rivera	<p>Ciudadana se comunica para reportar afectaciones ocasionadas durante el desarrollo de las actividades de renovación de redes en la cual se presentó una afectación en la cajilla del medidor, motivo por el cual se realizó la instalación provisional de una tabla para su protección. Sin embargo, con el avance de la obra, dicha estructura fue</p>	<p>01/10/2025 Garantizar el despeje del medidor para sus debidas lecturas.</p> <p>10/10/2025 Se realiza la verificación de la instalación de la cajilla y la limpieza del medidor.</p>	Cerrada

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				acumulando sedimentos, generando que en la actualidad el medidor se encuentre completamente obstruido.		
12	8/10/2025	16001839	Omar Rodríguez	<p>Durante recorrido con la interventoría, se acerca el ciudadano Omar Rodríguez, para reportar que, el día 25 de septiembre, en una maniobra de la volqueta, se evidenció la afectación a los cables que se encuentran frente a su predio, dentro de los cuales se encuentra un cable de electricidad y otros de redes, que con el paso de otros vehículos se han distendido y se encuentran cada vez más bajos.</p>	<p>17/10/2025</p> <p>Ciudadano se comunica mediante la línea de atención para informar que, durante la jornada de instalación de asfalto, la maquina haló nuevamente el cable lo que generó mayor distendimiento de los cables.</p> <p>20/10/2025</p> <p>Ciudadano se comunica nuevamente para reportar que, durante las actividades del día, distendieron más los cables, solicita pronta solución.</p>	En Seguimiento

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

13	14/10/2025	16002708	Comunidad barrio Veraguas Central	Se recibe derecho de petición mediante el correo electrónico de uso exclusivo del área social, cuyo asunto es "Queja y solicitud de intervención por obras civiles no socializadas ni autorizadas por la comunidad".	<p>14/10/2025 Se debe tramitar la respuesta en conjunto con el equipo profesional de la alcaldía.</p> <p>16/10/2025 La Alcaldía envía respuesta mediante el radicado 20256620402211.</p> <p>20/11/2025 El contratista, realiza el envío de la respuesta mediante el oficio COP-846-2024/074-2025 con el que se da cierre a la PQR.</p>	Cerrada
14	30/10/2025	16002708	Comunidad barrio Veraguas Central	Se recibe derecho de petición mediante el correo electrónico de uso exclusivo del área social, cuyo asunto es "RADICADO 202566204366 01".	<p>30/10/2025 Se debe tramitar la respuesta en conjunto con el equipo profesional de la alcaldía.</p> <p>18/12/2025 Se realiza el envío de la respuesta a la solicitud mediante el oficio COP-846-2024/080-2025 y de esta manera se procede con el cierre de la PQR.</p>	Cerrada
15	1/11/2025	16001839	Luis Alberto Santamaria	El día 26 de septiembre de 2025, el peticionario reporta que con la maquinaria se	<p>5/11/2025 Se recibe cotización por parte del peticionario,</p>	

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				<p>halan algunos cables que afectaron el circuito cerrado de cámaras que se tiene en la cuadra, por lo que se inicia todo el trámite de cotización para la reparación y proceder con la respectiva respuesta.</p>	<p>generada por su proveedor.</p> <p>15/12/2025</p> <p>Se realiza el pago del anticipo para el inicio de la reparación.</p> <p>29/12/2025</p> <p>Se realiza seguimiento a la pqr no. 15, se establece comunicación con el peticionario, el señor luis alberto santa maría para validar los arreglos realizados, queda pendiente el pago del saldo.</p>	<p>En Seguimiento</p>
16	7/11/2025	16002839	Angela Velandia	<p>Se comunica ciudadana por medio del correo electrónico, con el fin de manifestar que no recibió información sobre la reunión de inicio de obra y, por ello, no pudo asistir al espacio convocado para socializar el alcance de la intervención. Expresa su interés en que el proyecto se</p>	<p>05/01/2026</p> <p>Se da respuesta mediante oficio No COP-846-2024/081-2025, informando sobre la no realización de las actividades en este segmento vial</p>	<p>Cerrada</p>

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				<p>ejecute, dado que es propietaria del predio y considera necesaria la mejora de la vía, especialmente por las afectaciones generadas por actividades comerciales del sector. Asimismo, solicita ser informada oportunamente e sobre cualquier acción legal que pretenda detener la obra, con el fin de participar y expresar la postura de los residentes propietarios que respaldan la intervención.</p>		
17	12/11/2025	16002839	Luis Eduardo Orjuela	<p>Se recibe derecho de petición mediante correo electrónico en donde se especifica que los residentes y comerciantes de la calle 24 con carrera 51C del barrio San Eusebio manifiestan su desacuerdo con la intervención</p>	Elaborar y remitir respuesta formal correspondiente a la solicitud presentada.	En Seguimiento

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				proyectada para el levantamiento y reconstrucción del pavimento, argumentando que la vía se encuentra en buen estado y que la obra generaría afectaciones significativas a la movilidad, a la actividad comercial y a las dinámicas de los residentes		
18	23/11/2025	16002303 16002253 16002241	Esteban Cajamarca	Ciudadano escribe con el fin de dejar evidencia de los daños causados en mi andén por la obra en curso en el barrio Gaitán cortes y de solicitar la correspondient e reparación a la tapa de nuestra caja de inspección sanitaria del predio con dirección cra 38 b bis no 2c-33	Elaborar y remitir respuesta formal correspondiente a la solicitud presentada.	En Seguimiento
19	25/11/2025	16002303 16002253 16002241	Sonia Gómez	Se recibe derecho de petición de la propietaria de la vivienda ubicada en Cra. 38B Bis No. 2B-03,	Elaborar y remitir respuesta formal correspondiente a la solicitud presentada.	En Seguimiento

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				<p>barrio Jorge Gaitán Cortés, informa afectaciones generadas por la obra en la Cra. 38B. Señala ruptura de la manguera de agua, baja presión y suspensión del servicio; daños en el jardín y el andén; presencia de cables y material de obra que representan riesgo; manchas y rayones en la puerta principal; y un hueco sin reparar en el andén. Solicita restablecer el servicio de agua, reparar los daños causados y garantizar que estos no generen cobros adicionales.</p>		
20	28/12/2025	16002708	Organización Vecinos de Veraguas	<p>Se recibe derecho de petición para solicitar información sobre el avance de obra que se viene ejecutando en</p>	<p>Elaborar y remitir respuesta formal correspondiente a la solicitud presentada.</p>	<p>En Seguimiento</p>

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				<p>la vía del barrio Veraguas Central, específicamente en la calle cra 31a bis con 5.</p> <p>ya que se menciona que la obra presenta retrasos significativos y/o se encuentra suspendida sin información clara para la comunidad, lo cual ha generado afectaciones a la movilidad, el comercio, la seguridad y la calidad de vida de los residentes del sector.</p> <p>Adicionalmente, el estado actual de la vía representa riesgos para peatones, personas con movilidad reducida, adultos mayores y vehículos que transitan por el lugar.</p>		
21	29/12/2025	16000839	Maryori Vivas L.	Se recibe derecho de petición mediante correo electrónico en donde se		

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

			<p>especifica que los residentes de la Carrera 55 entre Calle 4B y Calle 4C BIS en donde la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de obtener claridad sobre el estado actual del CIV 16000839. Específicamente, buscando confirmar la disponibilidad presupuestal y el impacto de las adiciones financieras en dicho frente, así como conocer el cronograma detallado de reactivación, los requerimientos técnicos pendientes para la aplicación de asfalto y la justificación sobre la falta de comunicación previa respecto a posibles suspensiones por vacaciones colectivas.</p>	<p>Elaborar y remitir respuesta formal correspondiente a la solicitud presentada.</p>	<p>En Seguimiento</p>
--	--	--	---	---	------------------------------

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Anexo 3 -Programa de atención a la comunidad – PQR’S – Respuestas y Cierres.

5.3.3 Indicadores Programa de Atención al Ciudadano

Para el periodo que se relaciona en el presente informe se manejaron los siguientes indicadores de gestión para el programa de atención al ciudadano:

Tabla 21 -Indicadores atención al ciudadano

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{\# de Puntos CREA instalado}}{\text{\# de puntos CREA requerido}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{1 * 100}{1} = 100\%$
$\frac{\text{Total, PQRDS cerradas}}{\text{Total, PQRDS recibidas}} \times 100 = 100\%$	$\frac{12 * 100}{21} = 57\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.4 Programa de Sostenibilidad

Mediante la ejecución de este programa se busca generar sentido de pertenencia en la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto, a través de la información de las actividades (técnicas, ambientales, SST y sociales) que se adelantaran en ejecución del proyecto y las recomendaciones necesarias para la sostenibilidad y cuidado de su entorno.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, no se realizaron comités de veeduría ciudadana en los diferentes frentes de obra, teniendo en cuenta que, por la temporada de fin de año, no se contaría con la participación de la comunidad.

5.4.1 Conformación Comité CREA

El comité CREA debe ser conformado en cada uno de los frentes de obra siendo este el espacio de participación ciudadana que posibilita el intercambio permanente de información, la resolución de solicitudes ciudadanas, como también la respuesta a las

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

propuestas de los miembros del comité.

- Para el periodo que se relaciona en el presente informe, no se conformaron comités de veeduría ciudadana, teniendo en cuenta que en los diferentes frentes de obra se habían conformado previamente.

5.4.2 Plegables de sostenibilidad

Son piezas comunicativas que propenden por sensibilizar a la comunidad frente a la importancia de la obra y sus beneficios, así como algunas recomendaciones para garantizar la durabilidad de los trabajos realizados, por lo tanto, serán entregados en las reuniones de finalización.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, se realizó la entrega del plegable de sostenibilidad durante la convocatoria a la reunión de finalización de obra, así como en la reunión de finalización realizada en el frente de obra ubicado en el barrio Puente Aranda, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad del segmento vial sobre los cuidados para garantizar la durabilidad de los trabajos realizados, a continuación, se relaciona el consolidado de plegables entregados.

Tabla 22 – plegables de sostenibilidad

No.	Fecha	Tramo	CIV	Barrio	Tipo de Pieza	No. Piezas divulgadas
1	9/12/2025	Calle 18 entre Carrera 55 y Carrera 56	16000124	Puente Aranda	Plegable de sostenibilidad	15
2	10/12/2025	Calle 18 entre Carrera 55 y Carrera 56	16000124	Puente Aranda	Plegable de sostenibilidad	5
Total						20

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Anexo 4 -Programa de sostenibilidad – Actas de reunión – Planillas de asistencia – Registros fotográficos.

5.4.3 Indicadores Programa de Sostenibilidad

Para el presente periodo, se manejar los siguientes indicadores de gestión para el programa de sostenibilidad:

Tabla 23 -Indicadores programa sostenibilidad

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{Total, comités CREA conformados}}{\text{Total, comités CREA requeridos}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
$\frac{\text{Total, reuniones de comités CREA realizados}}{\text{Total, reuniones de comités CREA requeridos}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
$\frac{\text{Total, plegables de sostenibilidad entregados}}{\text{Total, plegables de sostenibilidad programados}} \times 100 = 100\%$	$\frac{20 * 100}{20} = 100\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.5. Programa de socialización del proyecto a empleados en obra

El Consorcio Vías de Puente Aranda, plantea una estrategia de formación sobre temas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y atención al ciudadano, así como el servicio a la ciudadanía, dirigido a los trabajadores vinculados al proyecto, en articulación con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas.

- Para el presente periodo, el día 23 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la octava capacitación dirigida al personal de obra, cuyo tema central fue “Habilidades sociales”. Durante la jornada se generó un espacio de diálogo en el que se hace

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

énfasis en la importancia de reconocer cada una de nuestras emociones y de esta manera poder gestionarlas satisfactoriamente. La capacitación se desarrolló en los cuatro (4) frentes de obra, tal como se detalla a continuación:

Tabla 24 - Capacitaciones al personal de obra

No	Fecha	CIV	Ubicación	Barrio	No. Asistentes
1	23/12/2025	16000696 - 16000586	Diagonal 5F entre transversal 47 y Transversal 48a	San Francisco Occidental	3
2	23/12/2025	16000839	Carrera 55 entre Calle 4B y Calle 4C Bis	Colón	1
3	23/12/2025	16002911	Carrera 30ª entre Av. Cl 3 y Cl 4	Veraguas Central	5
4	23/12/2025	16002708	Carrera 31ª bis entre Cl 4ª y Cl 5	Veraguas Central	4
Total					13

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

Anexo 5 -Programa de Socialización del proyecto a empleados en obra – Plegable de capacitación – Planilla de asistencia – Registro fotográfico.

5.5.1 Indicadores Programa de Capacitación a Empleados de Obra

Para el presente periodo se aplicaron los siguientes indicadores de gestión correspondientes al programa de socialización del proyecto a empleados de obra:

Tabla 25 -Indicador socialización a empleados

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{No. de capacitaciones realizadas}}{\text{No. de capacitaciones programadas}} \times 100 = 100 \%$	$\frac{4 \times 100}{4} = 100\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5.6 Programa de apoyo para la generación de empleo

En cumplimiento a la Directiva 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “sobre la Adopción de medidas en favor de grupos vulnerables, discriminados y/o excluidos” se propenderá por la vinculación de personal perteneciente a población vulnerable, y a la Circular No 017 de 2020 de la secretaria de la Mujer sobre la vinculación del 13.8% de personal femenino y se reportará la vinculación de personas menores de 28 años al proyecto; de igual manera, se debe promover la participación de los ciudadanos de la localidad en el desarrollo de las actividades constructivas, por lo que se precisa necesaria la contratación del 15% de personal MONCL.

Para el presente periodo, se logra la vinculación del equipo profesional contractual, así como profesionales de apoyo para el desarrollo de las diferentes actividades preliminares.

A continuación, se relaciona el personal femenino, mano de obra no calificada, mano de obra no calificada de la localidad y población vulnerable, vinculada durante el periodo que se reporta en el presente informe

Tabla 26 Reporte de personal vinculado al contrato

Ítem	Total, contratado	Cantidad contratada	% Requerido	% Contratado
Vinculación de Población Femenina	28	5	13,8%	17%
Mano de obra no calificada. (MONC)		9	50%	32%
Mano de obra no calificada de la localidad. (MONCL)		2	15%	22%
Población vulnerable		1	5%	11%

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Así mismo, se relaciona el personal femenino vinculado al contrato en el periodo correspondiente al presente informe:

Tabla 27 Mujeres vinculadas al contrato

Mujeres Laborando en el contrato	Nombre	Cargo
5	Diana Marcela Sandoval A. Julieth Stefanny Ortiz Paula Alejandra Restrepo Rada Valentina López Gil Juliana Valentina Vargas Zapata	Residente social Residente Ambiental Auxiliar Social Auxiliar Administrativa Cadenera 2

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

De igual manera, se reporta que se realizó el registro de las mujeres vinculadas en el link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6k8Vk2dnnHkBSogOzCAMwRC6H8ExhjqDbWaY7fsjti-SThQ/viewform> de la secretaria de la mujer.



Imagen 9 Soporte del registro de mujeres en la página de la secretaria de la mujer.

Anexo 5 -Programa de Generación de empleo -Formato de Generación de empleo - Soportes

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5.6.1 Indicadores Cumplimiento programa de apoyo a la generación de empleo

Para el periodo reportado en el presente informe, se manejaron los siguientes indicadores:

Tabla 28 -Indicador Generación de empleo

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{No. total, de personal MONCL}}{\text{No. total, de personal MONC contratado para el proyecto}} \times 100$	$\frac{2 * 100}{9} = 22\%$
$\frac{\text{No. de personas contratadas perteneciente a población vulnerable}}{\text{No. total, personal MONC contratado para el proyecto}} \times 100$	$\frac{1 * 100}{9} = 11\%$
$\frac{\text{No. de personal femenino contratado}}{\text{No. total, de personal contratado}} \times 100$	$\frac{5 * 100}{28} = 17\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.7 Programa de manejo de impactos en el sector comercial

Como estrategia de mitigación de impactos negativos en el sector comercial del área de influencia directa, se realizarán los acercamientos necesarios y mesas de trabajo, para concertar acuerdos que garanticen una adecuada ejecución de las actividades de obra.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, se mantienen abiertos los canales de comunicación para la atención de la población en general, de los diferentes segmentos viales que se encuentran en intervención y a la fecha, no se ha evidenciado la necesidad de realizar acercamientos a los diferentes comercios.

5.7.1 Indicadores de cumplimiento Manejo de Impactos en el Sector Comercial

Para el presente periodo no se implementaron indicadores en el programa de manejo de impactos en el sector comercial, ya que no fue requerido.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Tabla 29 -Indicador manejo de impactos sector comercial

Formula	Porcentaje de cumplimiento
$\frac{\text{No. de actas de compromiso realizadas}}{\text{No. de actas de compromiso programadas}} \times 100$	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.8 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas

Este programa tiene por objeto establecer el estado y condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto y/o los Bienes de interés cultural, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo. Para la realización de estas actividades se contará con un equipo de actas de vecindad conformado por un profesional del área técnica y un profesional del área social.

5.8.1 Actas de Vecindad de inicio

El acta de vecindad es un documento que se diligencia por medio de visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra; en ésta se registra el estado físico y estructural del predio, para que, en caso de presentarse alguna reclamación por daños a este, se pueda identificar si el Contratista es responsable o no.

- Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se realizaron actividades para este ítem.

5.8. 2. Actas de Vecindad de Cierre

Es la actividad que se realiza al finalizar las actividades constructivas para validar el estado físico de los predios posterior a las intervenciones realizadas.

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

- Para el presente informe no se realiza el levantamiento de estas actas.

5.8.3 Entrega de Copias de actas de vecindad

En cumplimiento con el Plan de Gestión Social, se realiza la entrega de copias de actas de vecindad de inicio a cada uno de los predios en los que se realizó dicha actividad de manera que, cada ciudadano pueda evaluar la información registrada en el formato.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, no se realizó entrega de actas de vecindad de inicio.

5.8.3 Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)

Esta actividad tiene como propósito generar un documento soporte sobre el uso y condiciones del garaje, en caso de requerirse se levantarán las actas de rampa de acceso vehicular a aquellos inmuebles ubicados en el área de influencia directa de la obra, a fin de verificar su condición y uso, acreditación de licencia de construcción y demás documentos exigidos por ley.

- En el presente informe, no aplica el presente ítem

5.8.4 Información de suspensión de acceso a garajes

Permite mantener informada a la comunidad sobre los cierres temporales de la vía, que impiden el acceso vehicular a los predios y se realiza en las reuniones informativas de inicio de obra y mediante el volante informativo de inicio de obra.

- Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se realizó ninguna actividad relacionada a este ítem.

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

5.8.5 Actas de Compromiso

En caso de requerirse, se deberá pactar acuerdos con los propietarios de predios y/o representantes de instituciones, que permita el normal desarrollo de las actividades de obra programadas, por lo cual realizará un acta de compromiso.

- Durante el desarrollo del contrato, se han elaborado 6 actas de compromiso, no obstante, durante el periodo que se desarrolla en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con este ítem.

Tabla 30 Control de Actas de Compromiso

No.	Fecha	CIV/ Ubicación	Peticionario (a)	Reporte
1	25/09/2025	160000696 - 16000586/Dg 5f bis 47 72	Carmen Rivera	Se evidencia tubería conectada de manera errónea directamente al pozo frente al predio.
2	25/09/2025	16001124/CALLE 15 # 35 - 59	Fair Guevara	Se evidencian filtraciones de agua en las cámaras de ETB ubicadas en el andén frente a la empresa AGP, por lo que se realizaron pruebas de anilina para determinar el origen de dicha filtración y se evidencia que parte de ella es proveniente de los tanques de la PETAR que se emplea para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, motivo por el cual se precisa necesaria la intervención por parte de la empresa.
3	02/10/2025	16000839/Cra 55 4B 34	Guillermo Sánchez	Ciudadano se comunica para reportar filtraciones en la maguera que conecta con el

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

				medidor.
4	31/10/2025	16002303 – 16002253 – 16002241 / Carrera 38B Bis entre Calle 2B y Calle 2D	María Aracely Hernández	Se informa sobre el inicio de las actividades de mantenimiento a desarrollar.
5	28/11/2025	16002708 / Carrera 31ª bis No. 4 A 34	Hugo Castiblanco	Se realizó acercamiento al predio del señor Hugo Castiblanco con ocasión de la intervención adelantada para la renovación de la red sanitaria. Durante la visita técnica se evidenció la necesidad de construir una caja de inspección en el punto donde actualmente se encuentra ubicada una matera. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que dicha matera contiene plantas de ornamentación sin placa de inventario ni registro como individuo arbóreo protegido. Por lo anterior, se informó al propietario que será necesario retirar la matera para permitir la ejecución de la obra y posteriormente realizar la recuperación del espacio público conforme a la normatividad vigente.
6	28/11/2025	16002708 /	Karen Yisbet	Se efectuó un acercamiento al

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

		Carrera 31 a bis No. 4 A 23	Gómez	predio de la señora Karen Gómez en atención a la intervención que se adelanta para la renovación de la red sanitaria en el sector. Durante la revisión técnica se determinó la necesidad de construir una caja de inspección en el punto donde actualmente se encuentra ubicada una materia ornamental. Al verificar dicho elemento, se constató que las plantas existentes corresponden a especies de jardinería sin placa de inventario ni registro arbóreo, por lo cual no se consideran sujetos de protección especial. En consecuencia, se indicó a la propietaria la necesidad de retirar la materia y despejar el área, con el fin de permitir la ejecución de la obra y posteriormente adelantar la recuperación del espacio público conforme a las especificaciones del proyecto.
--	--	--------------------------------	-------	--

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

5.8.6 Levantamiento del registro fílmico de andenes, fachadas y las vías que sean empleadas como desvíos

Para el caso de las vías a utilizar como desvíos y que están contempladas en el PMT, se diligencia el formato de acta de vecindad, el estado actual de las vías acompañado de su respectivo registro fotográfico y fílmico, este documento es realizado por el personal del

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

contratista, en compañía del representante legal o presidente de Junta de Acción Comunal del barrio o comunidad que pueda verse afectada.

- Para el presente periodo no se realizaron actividades para este ítem.

5.8.7 Indicadores de cumplimiento Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

Durante el periodo en mención, se implementaron los siguientes indicadores de gestión, para el programa de acompañamiento social a actividades técnicas.

Tabla 31-Indicador Actividades Técnicas

Formula	Porcentaje de cumplimiento
No. de actas de vecindad de inicio realizadas _____ x 100 No. de actas de vecindad de inicio programadas	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
No. de actas de vecindad de cierre realizadas _____ x 100 No. de actas de vecindad de cierre programadas	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
No. de actas de compromiso realizadas _____ x 100 No. de actas de compromiso programadas	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$
No. de actas de acceso vehicular realizadas _____ x 100 No. de actas de acceso vehicular programadas	$\frac{0 * 100}{0} = 0\%$

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

6. REPORTES

Hace referencia a la información que se entrega a la interventoría, conforme a los acuerdos realizados previamente. Durante el periodo que se reporta en el presente informe, se realizaron encuentros telefónicos para validar las actividades que se han desarrollado durante el periodo que se reporta en el presente informe.

6.1 Reporte periódico

Conforme a los acuerdos realizados previamente, semanalmente se remitirá vía correo electrónico a la Interventoría el informe de gestión de actividades de gestión de social, así como la programación de actividades del siguiente periodo, y mensualmente el consolidado en donde se evidencie los resultados obtenidos para cada uno de los programas del Plan de Gestión Social.

- Durante el periodo que se reporta en el presente informe, se presentaron cuatro informes semanales, como se relaciona a continuación:

Tabla 32 Reportes Semanales

No. Reporte semanal	Periodo
27	08/12/2025 al 12/12/2025
28	15/12/2025 al 20/12/2025
29	22/12/2025 al 27/12/2025
30	29/12/2025 al 03/01/2026

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

6.2 Informe Mensual

Es el reporte de las actividades realizadas durante el mes, se remite de manera física y magnética con los debidos soportes que lo sustente.

- Se presentó el informe mensual de gestión social No. 8, en su versión inicial, el día

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p style="text-align: center;">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

11 de diciembre de 2025, para su respectiva revisión por parte de la interventoría y el día 16 de diciembre, se realizó una mesa de trabajo en donde se recibieron algunas observaciones, las cuales fueron atendidas y subsanadas el 16 de diciembre, de esta manera, el 17 de diciembre se recibió la aprobación por parte de la interventoría, y se envía el documento completo para las respectivas firmas.

6.3 Informe Final de gestión

Este se presentará una vez finalizado el periodo de ejecución contractual, en el que se consoliden las actividades ejecutadas durante toda la etapa de la obra; relacionadas con lo establecido en el PGS, previa aprobación de la interventoría, este será revisado y evaluado por el FDLPA.

- Para el periodo que se relaciona en el presente informe no aplica este ítem.

6.4 Comité de seguimiento

Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Social, se deben realizar encuentros periódicos que posibiliten una comunicación eficiente para la verificación de las actividades que se vienen adelantando.

- Durante el periodo que se relaciona en el presente informe, se realizaron dos (2) comités integrales (actas relacionadas en el informe de interventoría del área técnica), adicionalmente es importante recalcar que se mantuvo una comunicación constante contratista – interventoría -fondo de desarrollo local de puente Aranda.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

Tabla 33 Comité de seguimiento

Fecha (D/M/A)	Reunión / Mesa de trabajo	Tema Central
10/12/2025	Comité de seguimiento	Seguimiento contrato 846-2025
17/12/2025	Comité de seguimiento	Seguimiento contrato 846-2025

Fuente: Consorcio Vías de Puente Aranda

7. CRONOGRAMA

Las actividades del presente informe se realizaron siguiendo lo establecido en el Plan de Gestión Social diseñado para el presente contrato y de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

8. CONCLUSIONES

- El equipo social estableció acercamientos con líderes comunales y representantes de JAC para socializar los lineamientos, características sociales del proyecto, actividades a realizar desde cada componente y líneas de atención para mantener contacto directo con la comunidad.
- En cumplimiento con las actividades programadas en el programa de información a la comunidad, se realizó la primera reunión de finalización en el segmento vial 16000124 en el barrio Puente Aranda y una reunión de carácter extraordinario para los CIV's 16000696-16000586 en el barrio San Francisco Occidental.
- Se mantienen 12 Puntos Satélites de Información instalados en los diferentes frentes de obra que se encuentran en intervención.
- Se realizó la entrega de 15 volantes de convocatoria a la reunión de finalización realizada, así como la entrega de 32 volantes informativos.
- Durante el periodo en mención, se mantuvo vigente las líneas de atención a la comunidad, el punto fijo, la línea telefónica y el correo electrónico dando

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

cumplimiento de lo programado frente a lo ejecutado, por lo que se tienen 21 PQR's abiertas, de las cuales 12 se encuentran cerradas.

- Se realizó la octava capacitación al personal de obra con el tema de “Habilidades Sociales”, a un total de 13 trabajadores en obra y se logró la vinculación de dos ciudadanos residentes de la localidad para el desarrollo de actividades de Mano de Obra No Calificada.
- Así mismo, se logró la vinculación de cinco (5) mujeres en el contrato, lo que representa el 17 % del personal contratado.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”. CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXOS

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN". CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXO 1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD



- ✓ Acta de Reunión de Finalización CIV 16000124 – Planillas de Asistencia – Registros Fotográficos.
- ✓ Acta de reunión extraordinaria CIV's 16000696 – 16000586 - Planillas de Asistencia – Registros Fotográficos.




	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD	
	PROCESO	
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Contrato No.: FDLPA 829-2024	HORA INICIO: 09:00am	Hoja 1 de 3
FECHA: 10/12/2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00am	Acta N° 1
<p>PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"</p>		
<p>Reunion de fianlizacion CIV 16000124 Barrio Puente Aranda</p>		
<p>Saludo - Bienvenida</p>		
<p>Atención a preguntas, comentarios e inquietudes de la comunidad</p>		
<p>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</p>		
<p>Se realiza reunión de finalización de obra del CIV 16000124, ubicado en la calle 18 entre carrera 55 y carrera 56 en el barrio Puente Aranda, la cual dió inicio con la intervención de la residente social, quien agradece la asistencia y participación de la comunidad presente, indicando que el objetivo del espacio es socializar las actividades ejecutadas durante la intervención del segmento vial y dar cierre a las obras realizadas.</p>		
<p>Posteriormente, se otorga la palabra al director de obra, quien expone de manera general el proceso constructivo adelantado, destacando la recuperación y adecuación de los andenes, la reconstrucción de la malla vial mediante actividades de excavación, conformación y compactación de rellenos, además de la renovación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial con la instalación de dos (2) nuevos sumideros combinados para el adecuado manejo de aguas lluvias y residuales, así como la instalación de la carpeta asfáltica, garantizando así la estabilidad de la vía y el adecuado funcionamiento del espacio público intervenido.</p>		
<p>Seguidamente, la residente social realiza la entrega de los plegables de sostenibilidad, en los cuales se consignan recomendaciones para el buen uso, cuidado y preservación de la vía y del espacio público.</p>		
<p>Durante la reunión, los asistentes manifestaron su agradecimiento por las actividades ejecutadas, destacando la mejora en las condiciones de la vía, los andenes y el sistema de drenaje, así como el acompañamiento brindado durante el desarrollo del proyecto.</p>		
<p>A continuación, se brinda un espacio a la comunidad para la presentación de dudas, inquietudes y preguntas.</p>		
<p>INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD</p>		
<p>1. Durante el espacio de participación, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Daniel, manifestó su preocupación por el frecuente derrame de aceite generado por los talleres mecánicos ubicados sobre la vía intervenida.</p> <p>Respuesta: Frente a esta inquietud, el equipo social informó que, durante el proceso de convocatoria, se realizó la entrega previa de los plegables de sostenibilidad a los residentes y comerciantes del sector, incluyendo aquellos que no pudieron asistir a la reunión, con el fin de socializar las recomendaciones de cuidado del espacio público. No obstante, se aclaró que este tipo de situaciones corresponde principalmente a temas de cultura ciudadana, apropiación y corresponsabilidad comunitaria, sobre los cuales el proyecto no tiene competencia directa más allá de los procesos de sensibilización realizados.</p>		
<p>2. Un vecino del sector preguntó si era posible dejar instaladas de manera permanente las mallas ubicadas en las rejillas de los sumideros.</p> <p>Respuesta: Ante esta inquietud, el contratista explicó que dichas mallas se instalan de forma temporal durante la ejecución de la obra, con el fin de evitar el ingreso de materiales, residuos y sedimentos al sistema de drenaje. Sin embargo, una vez finalizadas las labores, estas deben ser retiradas, ya que no es recomendable dejarlas de manera permanente por posibles afectaciones al correcto funcionamiento del sistema pluvial.</p>		

	FORMATO			
	ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
	PROCESO			
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

Finalmente, la residente social agradeció nuevamente la disposición, acompañamiento y participación activa de la comunidad durante las diferentes etapas del proyecto, resaltando la importancia del cuidado y apropiación de las obras entregadas para garantizar su durabilidad en el tiempo. Así mismo, se reiteró la disponibilidad de los canales de atención para atender cualquier inquietud posterior y se finaliza el proceso informativo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
N/A		N/A	N/A

FIRMAS		
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Leonardo Martinez	Coordinador Inteventoria	
Julián Camilo Poveda	Director Tecnico Contratista	
Juan Carlos Aguirre	Residente Técnico Contratista	
Julieth Ortiz	Residente SST- Ambiental Contratista	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Diana M. Sandoval	Diana M. Sandoval	Doris M. Ortiz
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Social de Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	X	NO	TIPO DE ANEXO: Listado	CANTIDAD: 1
---------	----	---	----	------------------------	-------------



FORMATO
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL



FECHA	10/12/25.	TEMA	Reunion de finalización de obra									
LUGAR	Frentes de obra CIU 16000124		BARRIO	Puente Aranda.	UPZ	43	LOCALIDAD	PUENTE ARANDA				
No.	C.C.T.I.C.E.	DOCUMENTO	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	S E X O	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	C	80.216.363	Daniel Pérez S.	39	JAC Puente Aranda	M	3103168517	Carrera 56 N. 15-34	P. Aranda	jacobperezs@japbpuente.com		
2	C	35475226	Luz Dary Mora	47	comunidad	F	3174028774	calle 18 SS 15	Puente Ar	— o —		
3	C	29779510	Estelito - ibel	75	comunidad	M	311 —	Calle 18 4551	Puente Ar	— o —		
4	C	1000935380	Tatiana Escalante	24	comunidad	F	3117028478	Cra 55 # 18-09	Puente A	— o —		
5	C	39.209.596.	Nidia Ortiz S.	52	COMUNIDAD.	F	389.606.2066	CNE 18 # 55-46.	Puente A.	— o —		
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												



Contrato FDLPA No 846-2024



PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 10 DE 2025



DESCRIPCION: REUNION DE FINALIZACION CIV 16000124 BARRIO PUENTE ARANDA.

	FORMATO		
	ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
	PROCESO		
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Contrato FDLPA - 846-2024		HORA INICIO: 9:30 a.m	Hoja 1 de 3
FECHA: 17 diciembre 2025		HORA FINALIZACION: 10:00 am	Acta N° 1
PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".			
ORDEN DEL DÍA			
Saludo - Bienvenida			
Reunión de extraordinaria de obra CIV 16000586-16000696			
Atención a preguntas, comentarios e inquietudes de la comunidad			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se dio inicio a la reunión extraordinaria con el objetivo de realizar seguimiento y evaluación a los compromisos adquiridos en el			
marco del comité de veeduría ciudadana, relacionados con las intervenciones adelantadas en los CIV's 1600586 y 16000696 del			
barrio San Francisco Occidental. La jornada permitió socializar el estado actual de las actividades ejecutadas y programadas,			
así como atender las inquietudes manifestadas por la comunidad asistente.			
En primer lugar, el equipo del contratista informó sobre el estado general de las actividades ejecutadas, indicando que las obras			
correspondientes a los andenes presentan un cumplimiento conforme al compromiso adquirido. Así mismo, se aclaró que,			
permanecen pendientes algunos remates finales, tales como cortes, dilataciones, y detalles menores propios			
del cierre de obra, los cuales serán atendidos conforme a la programación técnica establecida.			
Así mismo, se informó que se cuenta actualmente con la maquinaria necesaria para la actividad de asfaltado del segmento vial			
intervenido, la cual se encuentra programada para ejecutarse entre la presente semana y la semana siguiente, sujeta a las			
condiciones climáticas, operativas y a la disponibilidad de la planta de asfalto. Se explicó a la comunidad que, la operación de las			
plantas no es continua y que existe alta demanda por parte de otros frentes de obra, situación que puede generar ajustes			
logísticos y de programación.			
Se precisó que, previo al asfaltado, se adelantarán actividades técnicas complementarias, tales como el seriado y nivelación de la			
base, movimientos de material, empalmes y preparación de superficie, lo que implicará el traslado temporal de la carpa,			
maquinaria y material acopiado. Estas acciones responden tanto a requerimientos técnicos como a medidas de seguridad,			
teniendo en cuenta la protección de los equipos durante la temporada de fin de año. Se aclaró que cualquier retiro temporal			
de maquinaria no implica abandono del frente de obra y que las actividades serán retomadas oportunamente.			
Adicionalmente, se informó que se encuentran proyectadas acciones de movilidad en la zona, las cuales se ejecutarán una vez			
finalizadas las actividades de obra que se están desarrollando sobre la Diagonal 5F Bis, estimándose su implementación para el			
mes de enero, para garantizar condiciones de movilidad seguras en el sector.			

	FORMATO			
	ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
	PROCESO			
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

Por otra parte, la comunidad manifestó su disposición para ofrecer la cancha del sector como alternativa de acopio, con el propósito de facilitar el desarrollo de las actividades restantes y optimizar la logística de obra.

A continuación se brinda un espacio para que la comunidad pueda realizar sus preguntas e inquietudes.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. El señor Edilberto, presidente de la JAC consultó sobre los tiempos de ejecución de las actividades pendientes.

Respuesta: Se pretende finalizar las actividades de obra antes de finalizar el año, como se mencionó anteriormente, todo depende del aprovisionamiento del asfalto.

2. Un residente expresó inquietudes relacionadas con la movilidad, el acceso vehicular y las situaciones de inseguridad que se ha presentado en el sector durante el cierre del año.



Respuesta: El contratista reiteró que se adoptarán medidas temporales para permitir el paso y que, a partir del mes de enero, se espera restablecer de manera progresiva las condiciones de normalidad, incluyendo la posibilidad de parqueo en el sector.



Finalmente, un ciudadano intervino para verificar el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, resaltando que se evidencia un avance significativo y un cumplimiento general de lo pactado, especialmente en las actividades relacionadas con los andenes. Así mismo, reconoció el esfuerzo realizado por el equipo de obra y manifestó que, aunque persisten aspectos por culminar, se observan resultados positivos frente a lo informado en reuniones anteriores, por último se dio por finalizada la reunión extraordinaria, dejando constancia de lo tratado y acordado. Se informó a los asistentes que el próximo encuentro será programado para el siguiente año, el cual será notificado oportunamente a la comunidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las dilataciones y cortes de ajuste pendientes en los andenes, realizar el asfaltado del segmento vial conforme a la programación establecida y adelantar en el mes de enero las acciones de movilidad necesarias para atender los puntos críticos identificados en la vía.	Area tecnica del contratista	Durante la ejecucion

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Leonardo Martinez	Coordinador de Interventoria	
Julián Camilo Poveda	Director Técnico Contratista	
Juan Carlos Aguirre	Residente Técnico Contratista	

ELABORÓ			RESPONSABLE		APROBÓ	
NOMBRE	Diana Sandoval		Diana Sandoval		Doris M. Ortiz	
CARGO	Residente Social		Residente Social		Residente Social de Interventoria	
FIRMA						
ANEXOS:	SI	X	NO	TIPO DE ANEXO: Listados		CANTIDAD: 1

		FORMATO FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES PROCESO GESTIÓN SOCIAL									
FECHA	17-12-2025	TEMA	Reunión Extraordinaria								
LUGAR	Frente de Obra		BARRIO	San Francisco Occidental		UPZ	43		LOCALIDAD	PUENTE ARANDA	
No.	C. C. T. I. C. E.	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		79349725	José David Ortiz	60	Fiscal JAC	M	3115353565	Diag. S. N° 41-24	San Francisco		[Signature]
2		39655666	Calmenzo Vela	50		F	3502250706	Diag. S. N° 1147-92	San Francisco		[Signature]
3		79465090	Diana F. J. J. J.	61	UIC JAC	F	3125555671	Diag. S. N° 674552	San Francisco		[Signature]
4		79278335	Hans S. J. J. J.	60	Comunidad	M	3002218285	Diag. S. N° 48-27	San Francisco		[Signature]
5		5732266	Herman C. J. J. J.		Comunidad		642621381	Diag. S. N° 43-95	San Francisco		[Signature]
6		79513983	Wilson Hernandez	50	Comunidad	M	3102118565	S. F. B. N° 44-86	San Francisco		[Signature]
7		1920733	Edilberto G. J. J. J.	65	Comunidad	M	3163431740	S. F. B. N° 44-86	San Francisco		[Signature]
8		1013636943	Johnna Jimenez		Comunidad	F	3125712415	Diag. S. N° 48-03	San Francisco		[Signature]
9		7439323	J. A. B. J. J. J.		Comunidad		300211658	Diag. S. N° 48-03	San Francisco		[Signature]
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

Sexo. M: Mujer / H: Hombre

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

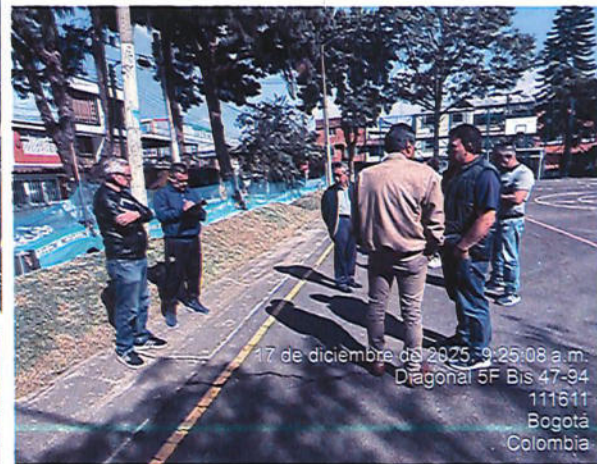


Contrato FDLPA No 846-2024



PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 17 DE 2025



DESCRIPCION: REUNION EXTRAORDINARIA EN EL FRENTE DE OBRA DEL BARRIO SAN FRANCISCO CIV 16000696 - 16000586

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN". CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXO 2. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- ✓ Formato PSI
- ✓ Volantes – Planillas de control de entrega – Registros fotográficos.

CONTRATO No.:		FDLPA-846-2024		PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONTROL PUNTOS SATELITE		 BOGOTÁ <small>Alcaldía Local de Puente Aranda</small>
Hoja ____ de ____						
FECHA						
29	12	25	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y CICLO INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"			
DD	MM	AA				
REGISTRO No.:						

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO	Negativo No.
	

2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Planos facturas Hs SAS.

DIRECCIÓN: C/ 17a # 57-41.

TELÉFONO: 3143921891.

PERSONA CONTACTO: Miguel Angel Sanchez


3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	
CUAL?		

4. OBSERVACIONES

Se realiza instalación de punto satélite de información del contrato 846-2024, otorgado por el fondo de desarrollo local de puente Aranda, en el predio ubicado en la calle 17 # 57-41, con el fin de dar a conocer la información pertinente del CIV. del Barrio puente Aranda.

5. FIRMAS

 Funcionario/Contacto C.C. O NIT 7	 Representante del Contratista C.C. O NIT 10239136212	 Representante de la Intervención C.C. O NIT
---	---	---

Invitamos a los habitantes del barrio Puente Aranda a participar en la reunión de finalización de obra, en donde se mostraran los resultados desde el Técnico, Social, SST y Ambiental sobre los trabajos ejecutados en el sector.



Fecha:

Miércoles 10 de
Diciembre de 2025



Hora:

9:00 a.m.



Lugar:

Puente Aranda
Calle 18 entre carrera 55 y carrera 56

“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”



CIV: 16000124
CALLE 18 ENTRE CARRERA 55 Y
CARRERA 56



Más información

Contratista: CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA

Contrato: 846-2024

Punto CREA: Carrera 33 No. 4ª - 92 Veraguas

Celular: 3232061097

Correo electrónico: socialpuentearanda846@gmail.com

Interventoría: CONSORCIO PAVIAS 2025

Contrato CIN :850-2024

Correo electrónico: consorciopavias2025@gmail.com

		FORMATO CONTROL DE PIEZAS DE INFORMACIÓN						
"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".								
TIPO DE PIEZA: Entrega volante de Convocatoria a reunion de finalización y pligable de sostenibilidad.								
CONTRATO N°: 846-2024		RESPONSABLE: Diana Sandoval.					FECHA: 09/12/2025	
LOCALIDAD: Puente Aranda		BARRIO: Puente Aranda					TRAMO: 16000124	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN	
1	Daniela Contreras	CL 18 # 55.60	4142594	Puente Aranda	[Firma]	2		
2	Lot de patino	CL 18 # 55.51	303687915	Puente A.	[Firma]	2		
3	Martín de Ochoa	CL 18 # 55.47	319719945	Puente A	[Firma]	2		
4	Miguel Cardoso	CL 18 # 55.41	302649960	Puente A	[Firma]	2		
5	Bajo puerta	CL 18 # 55.35	—	Puente A.	—	2		
6	Bajo puerta	CL 18 # 55.25	—	Puente A	—	2		
7	Bajo puerta	CL 18 # 55.21	—	Puente Aranda	—	2		
8	Bajo puerta	CL 18 # 55.17	—	Puente Aranda	—	2		
9	William Moreno	CL 18 # 55.05	3203228319	Puente A	[Firma]	2		
10	Bajo puerta	CL 18 # 55.15	—	Puente A	—	2		
11	Omar Ramirez	CL 18 # 55.15	31625359	Puente A	[Firma]	2		
12	Andrés Pinilla	CL 18 # 55.16	3238040860	Puente	[Firma]	2		
13	Teodoro Cortez	CL 18 # 55.26	3158278402	Puente A	[Firma]	2		
14	Hernando Carrillo	CL 18 # 55.36	3227630618	Puente A	[Firma]	2		
15	Jonh Castillo	CL 18 # 55.46/50	3166289352	Puente A	[Firma]	2		
16								
17								
18								
19								
20								

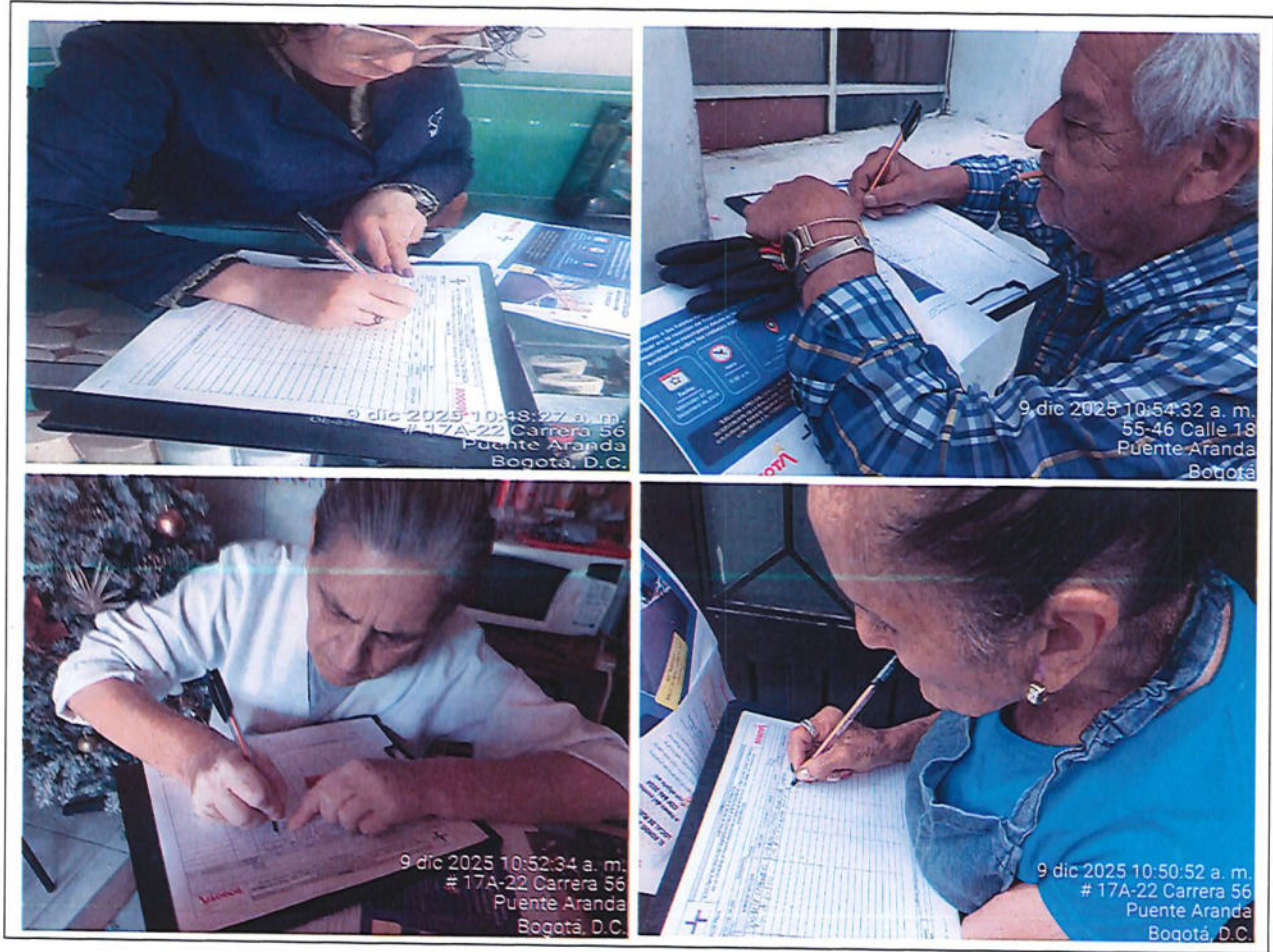
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

15

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Diana Sandoval	NOMBRE	Diana Ortiz
FIRMA	[Firma]	FIRMA	[Firma]

PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 09 DE 2025



DESCRIPCION: ENTREGA DE VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNION DE FINALIZACION CIV 16000124 BARRIO PUENTE ARANDA.

Contrato 846 de 2024

Descripción del proyecto

“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.”

VOLANTE INFORMATIVO DE OBRA

CIV: 16000696

DIAGONAL 5F BIS ENTRE TRANSVERSAL 47 Y TRANSVERSAL 48



Se informa a la comunidad residente del segmento vial ubicado en la Diagonal 5F Bis entre Transversal 47 y Transversal 48 que, el día de hoy 23 de diciembre, se realizó la instalación de la primera capa de asfalto, por lo que se dará apertura de la vía, **únicamente para residentes**, por lo que se dejará un broche para que cada residente tenga la posibilidad de ingresar su vehículo. Se recomienda evitar el ingreso de vehículos pesados y/o de carga, de esta manera se garantiza la durabilidad de los trabajos realizados hasta el momento.



Así mismo, se informa que en el mes de enero se realizara un nuevo cierre (2-3 días) para la instalación de la segunda capa de asfalto, bajo previo aviso.



De antemano ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Contratista: Consorcio Vías de Puente Aranda

Residente Social Contratista: Diana Sandoval

WhatsApp: 323 2061097

Dirección: Carrera 33 No. 4ª - 92 Barrio Veraguas

Horario: Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m

Correo electrónico: socialpuenteareanda846@gmail.com

Interventoría: Consorcio PAVIAS 2025

Residente Social Interventoría: Doris Ortiz

Correo electrónico:

consorciopavias2025@gmail.com



 CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA	FORMATO		 BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda
	CONTROL DE PIEZAS DE INFORMACIÓN		
	"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".		

TIPO DE PIEZA: Volante Informativo de Obra

CONTRATO N°: 846-2024 **RESPONSABLE:** Diana Sandoval **FECHA:** 23-12-2025
LOCALIDAD: Puente Aranda **BARRIO:** San Francisco Occidental **TRAMO:** 16.000696

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Viviana Murillo	Tv 47 # 5F-45 B2	3204397335	San Francisco	Viviana Murillo	1	
2	Bajo Puerta	Tv 47 # 5F-45 P1	-	San Francisco	-	1	
3	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-24	-	San Francisco	-	1	
4	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-30	-	San Francisco	-	1	
5	Nargarida Rodríguez	Dag SF B25 # 47-36	3168066800	San Francisco	Margaretz Padme	1	
6	Yelmy Carolina Ortega	Dag SF B25 # 47-42	3108644084	San Francisco	Carolina Ortega	1	
7	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-48	-	San Francisco	-	1	
8	Rosana Castel	Dag SF B25 # 47-54	3168095371	San Francisco	Rosana Castel	1	
9	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-60	-	San Francisco	-	1	
10	Johana Hernández	Dag SF B25 # 47-66	3213052589	San Francisco	Johana H.	1	
11	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-72	-	San Francisco	-	1	
12	Elba Alevalo	Dag SF B25 # 47-78	3012851571	San Francisco	Elba	1	
13	Wilson Hernández	Dag SF B25 # 47-84	3108118545	SAN FCO	Wilson	1	
14	Samuel Moreno G.	Dag SF B25 # 47-90	3204375860	SAN FCO	Samuel	1	
15	Diana Correa	Dag SF B25 # 47-96	3203326174	" "	Diana	1	
16	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-02	-	San Francisco	-	1	
17	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-08	-	San Francisco	-	1	
18	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-14	-	San Francisco	-	1	
19	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-20	-	San Francisco	-	1	
20	Bajo Puerta	Dag SF B25 # 47-26	-	San Francisco	-	1	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	<u>Diana Sandoval</u>	NOMBRE	<u>Diana Ortiz</u>
FIRMA	<u>Diana Sandoval</u>	FIRMA	<u>Diana Ortiz</u>

	FORMATO		
	CONTROL DE PIEZAS DE INFORMACIÓN		
	"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".		

TIPO DE PIEZA: Volante informativo de Obra

CONTRATO N°: 846-2024 RESPONSABLE: Diana Sandoval FECHA: 23/12/2025
 LOCALIDAD: Puente Aranda BARRIO: San Francisco Occidental TRAMO: 16000

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Carmen Tovar	Dg SF BS #47-81	810335185	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
2	Adriana Ubacpe	Dg SF BS #47-77	30772341	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
3	Cristina Bolívar	Dg SF BS #47-31	33208413	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
4	Saul Castro	Dg SF BS #47-65	321426725	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
5	Bajo puerta	Dg SF BS #47-81	—	San Francisco	—	1	
6	Blanca Nubia Rodriguez	Dg SF BS #47-53	323299941	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
7	Rafael Heredia	Dg SF BS #47-47	325736833	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
8	Bajo puerta	Dg SF BS N°391	—	San Francisco	—	1	
9	Luisa Fernanda Hernandez	Dg SF BS N°47-23	312488854	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
10	Valentina Neelina	Dg SF BS N°47-31	3156152391	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
11	Bajo puerta	Dg SF BS #47-35	—	San Francisco	—	1	
12	Maria Fajardo	Dg SF BS #47-41	32621567	San Francisco	<i>[Signature]</i>	1	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 12

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	<u>Diana Sandoval</u>	NOMBRE	<u>Diana Ortiz</u>
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>



Contrato FDLPA No 846-2024



PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 23 DE 2025





DESCRIPCION: VOLANTE INFORMATIVO DE OBRA CIV 16000696 – 16000586 BARRIO SAN FRANCISCO.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN". CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXO 3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

✓ Apertura, seguimiento y atención de PQR's.

COP- 846-2024			"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"			
Hoja 1 de 1						
FECHA						
30	10					2025
DD	MM					AA
ACTA No. 14						
ATENCIÓN AL CIUDADANO						
1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO						
Nombre		BARRIO VERAGUAS CENTRAL		Organización	Comunidad	
Dirección/Barrio		Comunidad de la Carrera 31A Bis entre calles 4A y 5		Teléfono	hsmproyectos04@gmail.com	
2. TIPO DE SOLICITUD						
Queja	☒	Reclamo	☐	Sugerencia	☐	
				Solicitud información	☐	
				Otro	☐	
3. FORMA DE SOLICITUD						
Personal	☐	Escrito	☒	Teléfono	☐	
				Otro	☐	
4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO						
Se recibe derecho de petición mediante el correo electrónico de uso exclusivo del área social, cuyo asunto es "RADICADO 20256620436601".						
5. AREA DE LA SOLICITUD						
Ambiental	☐	Social	☒	Seg. Integral	☐	
				Tráfico	☐	
				Construcción	☒	
				Otra	☐	
Fecha	Trámite			Solución		
30/10/2025	Se debe tramitar la respuesta en conjunto con el equipo profesional de la alcaldía.			Tramitar respuesta mediante oficio.		
18/12/2025	Envío del oficio con la respectiva respuesta a la comunidad			Se realiza envío de la respuesta de la solicitud mediante el oficio COP-846-2024-080-2025 al correo electrónico y de esta manera se procede con el cierre de la PQR.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ELABORÓ.</p> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) Diana Sandoval</p> <p>Residente Social - Contratista</p> </div> <div> <p>(Firma) _____</p> <p>(Nombre) Ciudadano</p> <p style="text-align: center;">Se firma con el envío de la respuesta</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>APROBÓ.</p> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) Doris Ortiz</p> <p>Profesional de Interventoría</p> </div> </div>						
<small> 1era copia: Dependencia ejecutora del contrato 2da copia: Interventoría 3era copia: Contratista </small>						

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

Señora:

Paola S

DIRECCION: Carrera 31 A BIS # 4 A – 00

CORREO: hsmproyectos04@gmail.com

Bogotá, Barrio Veraguas Central – Localidad de Puente Aranda

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLPA-846-2024

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

ASUNTO: Queja formal y solicitud de aclaración sobre intervención vial en el sector Veraguas Central, Localidad de Puente Aranda CIV: 16002708

REFERENCIA: Radicado 20256610093892 del 28 de octubre de 2025

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, en la cual presenta una queja por solicitud de información por parte de la comunidad del barrio Veraguas Central; de manera atenta nos permitimos informar que, la Alcaldía Local de Puente Aranda generó la respuesta a su solicitud bajo el No de radicado 20256620442951, en la que se describen los cuatro ítems a los que hace referencia.

Por último, el **Consorcio Vías de Puente Aranda** reitera su disposición de atención a la comunidad a través de los siguientes canales oficiales de comunicación: correo electrónico **socialpuentearanda846@gmail.com**, línea celular **3232061097**, y punto de atención presencial en la **Carrera 33 No. 4A-92, Barrio Veraguas**.

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud adicional que pueda surgir en el marco del desarrollo del proyecto.

Atentamente,



JULIAN CAMILO POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA





Bogotá, D.C.

(662)

Señores

COMUNIDAD BARRIO VERAGUAS

Correo: hsmproyectos04@gmail.com

Dirección: Carrera 31 A BIS # 4 A - 00

Ciudad: Bogotá D.C

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Solicitud de reunión formal de socialización

Referencia: Radicado 20256610093892 del 28 de octubre de 2025

Cordial saludo.

En atención a la comunicación del asunto y referencia, en la cual se relacionan 5 ítems a responder, de la siguiente manera:

1. Solicitud de reunión formal de socialización.

En mi calidad de alcalde local, reitero que el pasado 14 de octubre de 2025 se realizó la reunión de inicio de obra, a la cual junto con el contratista de obra, interventoría y apoyo a la supervisión, asistí y acompañe, con el fin de socializar a la comunidad las obras a ejecutar sobre el CIV 16002708, ahora bien, teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad, se extendió la fecha para el inicio de obra, por dos semanas más para que la comunidad pudiese buscar alternativas de parqueaderos y demás. Con base en lo anterior, se reitera que el próximo martes 4 de noviembre de 2025, se dará inicio a la obra.

2. Problemática con el estacionamiento de vehículos.

Teniendo en cuenta la respuesta al primer punto, se reitera que de acuerdo a las solicitudes de la comunidad se extendió la fecha de inicio de obra para que la comunidad pudiese buscar alternativas para los parqueaderos y demás inconvenientes, teniendo en cuenta esto, no se puede extender más el tiempo ya que esto traería inconvenientes con la entrega de la obra en los tiempos establecidos, de igual manera se recuerda que el contrato en sí tiene fecha de finalización el día 6 de marzo de 2026, por lo que, los tiempos coinciden de manera exacta con el termino para la ejecución de la obra.

3. Falta de información y documentación.

Se adjunta Carpeta comprimida con el registro fotográfico solicitado, así como el acta de la reunión de inicio y el inventario predial.

En cuanto a las actas de vecindad que contienen datos personales, incluidos datos sensibles, han sido tratados de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, que regula el régimen de protección de datos personales en Colombia. Esta información se encuentra protegida bajo los principios de legalidad,



confidencialidad, y seguridad; en tal sentido, en caso de existir información alguna al respecto, para la entrega de esta información, es necesario contar con una justificación legal que permita la transferencia de dichos datos personales.

4. Afectaciones previstas y falta de cronograma detallado.

Se adjunta el cronograma detallado de la obra a ejecutar en el CIV 16002708

Atentamente,



VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

Aldede Local de Puente Aranda







cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Información y Documentacion.zip y CRONOGRAMA CIV 16002708.pdf

Proyectó: Ing. Andres Felipe Morales Perdomo - Profesional Área de Infraestructura

Revisó: Arq. Juan Alfredo Torres Prieto - Profesional Área de Infraestructura

Revisó: Dr. César Augusto Buitrago - Profesional especializado Despacho

COP- 846-2024			"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"					
Hoja 1 de 1								
FECHA								
1	11 2025							
DD	MM AA							
ACTA No. 15								
ATENCIÓN AL CIUDADANO								
1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO								
Nombre	Luis Alberto Santamaria		Organización	Comunidad				
Dirección/Barrio	Transversal 53 Bis # 1B-09		Teléfono	3123704788				
2. TIPO DE SOLICITUD								
Queja	☒	Reclamo	☐	Sugerencia				
			☐	Solicitud información				
			☐	Otro				
			☐					
3. FORMA DE SOLICITUD								
Personal	☐	Escrito	☒	Teléfono				
			☐	Otro				
			☐					
4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO								
<p>El día 26 de septiembre de 2025, el peticionario reporta que con la maquinaria se halaron algunos cables que afectaron el circuito cerrado de camaras que se tiene en la cuadra, por lo que se inicia todo el tramite de cotización para la reparación y proceder con la respectiva respuesta.</p>								
5. AREA DE LA SOLICITUD								
Ambiental	☐	Social	☒	Seg. Integral				
			☐	Tráfico				
			☐	Construcción				
			☒	Otra				
			☐					
Fecha	Trámite		Solución					
5/11/2025	Se recibe cotización por parte del peticionario, generada por su proveedor.		Evaluar acuerdos para la reparación					
15/12/2025	Proceder con el pago a la persona que se hará cargo de la reparación de la red de seguridad del sector.		Se realizó el pago parcial para el arreglo de la red de camaras, se adjunta el soporte de pago.					
29/12/2025	Verificar las actividades realizadas para la reparación de las redes del circuito de seguridad.		Se establece comunicación con el peticionario para validar que los arreglos se realizaron a conformidad de la afectación, queda pendiente el pago del saldo pendiente.					
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ELABORÓ. (Firma)  (Nombre) Diana Sandoval Residente Social - Contratista </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> Se firma con el envío de la respuesta (Firma) _____ (Nombre) Ciudadano </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> APROBÓ. (Firma)  (Nombre) Doris Ortiz Profesional de Interventoria </td> </tr> </table>					ELABORÓ. (Firma)  (Nombre) Diana Sandoval Residente Social - Contratista	Se firma con el envío de la respuesta (Firma) _____ (Nombre) Ciudadano		APROBÓ. (Firma)  (Nombre) Doris Ortiz Profesional de Interventoria
ELABORÓ. (Firma)  (Nombre) Diana Sandoval Residente Social - Contratista	Se firma con el envío de la respuesta (Firma) _____ (Nombre) Ciudadano							
	APROBÓ. (Firma)  (Nombre) Doris Ortiz Profesional de Interventoria							
<small> 1era copia: Dependencia ejecutora del contrato 2da copia: Interventoria 3era copia: Contratista </small>								

	Contrato FDLPA No 846-2024	
---	-----------------------------------	---

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 15 DE 2025

Archivo del pago





Bogotá D.C. 21 de octubre de 2025

Señores: consorcio vías de puente Aranda

NIT: 90.950.193-7

Costos de instalación de cámaras de seguridad y equipos de video vigilancia

Descripción	Cant.	v. unitario	v. total
abr de 32 canales digital	1	1.300.000	1.300.000
Cable utp	2	400.000	800.000
Kit de cámaras	10	15.000	150.000
Cable red ethernet	2	165.000	330.000
instalación	1	1.800.000	1.800.000
total			\$4.380.000

Nota: 1 año de garantía en equipo de video vigilancia.
Para inicio de instalación se iniciará con el 60% de anticipo y el 40% al momento de entregar el trabajo.

ANT #F63B




Proveedor

Monto*

Cruce

Estado

Medio de pago

Origen

Fecha de creación

Fecha de vencimiento

Detalle

Etiquetas

JONATAN ALEXANDER HERRERA CELIS

\$2.616.000,00



En proceso

 BANCO DE BOGOTA - **** ANDA

Manual

10/12/2025

10/01/2026

ANTICIPO

Seleccione etiquetas

DESCRIPCION: SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA PQR No. 15, CON EL ENVIO DEL SOPORTE DE PAGO AL SEÑOR JONATAN HERRERA, PERSONA A CARGO DE LA REPARACIÓN DE LA RED DE CAMARAS.

	Contrato FDLPA No 846-2024	
---	-----------------------------------	---

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 29 DE 2025


Luis Alberto Camelia
24.12.2025 2:43



2:43

3:20 a.m.

24/12/2025

Buenas tardes don Luis, muchas por el reporte, igualmente deseo una feliz navidad para usted y los suyos, muchas bendiciones y seguimos atentos a cualquier situación

12:30 p.m.



12:42 p.m.



12:42 p.m.



2:24

3:43 p.m.

29/12/2025

Buenas tardes señor Luis como se encuentra, es para preguntarle si ya quedó listo el arreglo de las cámaras

2:44 p.m.

Vale señor Luis, muchas gracias por la información, muy amable

2:55 p.m.

Vale si señor muchas gracias, igualmente para usted, un feliz año

2:58 p.m.



3:57 p.m.

DESCRIPCION: SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA PQR No. 15, SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON EL PETICIONARIO, EL SEÑOR LUIS ALBERTO SANTA MARÍA PARA VALIDAR LOS ARREGLOS REALIZADOS, QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO.

COP- 846-2024			"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"								
Hoja 1 de 1											
FECHA											
7	11 2025										
DD	MM AA										
ACTA No. 16											
ATENCIÓN AL CIUDADANO											
1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO											
Nombre	Ángela Velandia	Organización	Comunidad								
Dirección/Barrio	carrera 51 C 24 21 sur	Teléfono	velandiangela@gmail.com								
2. TIPO DE SOLICITUD											
Queja	☒	Reclamo	☐	Sugerencia	☐	Solicitud Información	☐	Otro	☐		
3. FORMA DE SOLICITUD											
Personal	☐	Escrito	☒	Teléfono	☐	Otro	☐				
4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO											
<p>Se comunica ciudadana por medio del correo electrónico, con el fin de manifestar que no recibió información sobre la reunión de inicio de obra y, por ello, no pudo asistir al espacio convocado para socializar el alcance de la intervención. Expresa su interés en que el proyecto se ejecute, dado que es propietaria del predio y considera necesaria la mejora de la vía, especialmente por las afectaciones generadas por actividades comerciales del sector. Asimismo, solicita ser informada oportunamente sobre cualquier acción legal que pretenda detener la obra, con el fin de participar y expresar la postura de los residentes propietarios que respaldan la intervención.</p>											
5. AREA DE LA SOLICITUD											
Ambiental	☐	Social	☒	Seg. Integral	☐	Tráfico	☐	Construcción	☒	Otra	☐
Fecha	Trámite				Solución						
7/11/2025	Elaborar la respuesta, remitirla a la interventoría para su aprobación y posteriormente enviar la respuesta correspondiente a la comunidad.				elaborar y remitir respuesta formal correspondiente a la solicitud presentada.						
18/12/2025	Enviar proyección de respuesta a la interventoría para su revisión, aprobación y posterior envío a la peticionaria.				Envío de respuesta mediante el oficio COP-846-2024/081-2025 a la interventoría para su revisión y aprobación.						
5/1/2026	Enviar oficio de respuesta a la peticionaria.				Se realiza envío del oficio COP-846-2024/081-2025 a la peticionaria mediante el correo electrónico y se procede con el cierre de la PQR.						
ELABORÓ. (Firma) (Nombre) Diana Sandoval Residente Social - Contratista		(Firma) (Nombre) Ciudadano Se firma con el envío del oficio de respuesta									
		APROBÓ. (Firma) (Nombre) Doris Ortiz Profesional de Interventoría									
Tercer copia: Dependencia ejecutora del contrato Dos copia: Interventoría Una copia: Contratista											

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

Señora:

Ángela Velandia

DIRECCIÓN: carrera 51 C 24 21 sur

CORREO: velandiangela@gmail.com

Bogotá, Barrio San Eusebio – Localidad de Puente Aranda

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLPA-846-2024

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

ASUNTO: Solicitud de Información.

REFERENCIA: Respuesta por solicitud de información

Cordial saludo

En atención a la solicitud de información, nos permitimos informar lo siguiente:

1. La copia del acta de vecindad debe ser entregada de manera presencial, no obstante, en el presente documento se adjunta la copia del acta de vecindad.
2. En efecto, durante la reunión informativa de inicio de obra, realizada el día 6 de noviembre de 2025, se propició un espacio de diálogo entre la comunidad asistente y el equipo profesional representante del proyecto, en el cual se socializaron las generalidades del contrato y las actividades a desarrollar por los diferentes componentes: técnico, ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y social. No obstante, la mayoría de los ciudadanos que participaron en el espacio manifestó su desacuerdo con la intervención, argumentando que han sido significativamente afectados por la ejecución de diversas obras en el sector y que una nueva intervención agravaría su

situación económica, especialmente considerando la temporada de fin de año, en la cual se incrementan las actividades comerciales.

3. Nos permitimos informar que, una vez iniciado el trámite para la solicitud del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para el cierre del segmento vial, se evidenció que la entidad Metro cuenta con una reserva sobre una parte del mismo, destinada al desarrollo de intervenciones propias de su contrato. En consecuencia, si el Consorcio Vías de Puente Aranda ejecutara las actividades de reconstrucción vial, incluyendo la renovación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, podría configurarse un posible detrimento patrimonial.

Por lo anterior, y tras la realización de mesas técnicas de trabajo de carácter interinstitucional, se determinó que, en el marco del contrato No. 846-2024 del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, no se llevará a cabo ninguna intervención en el referido segmento vial.

Por último, el **Consorcio Vías de Puente Aranda** reitera su disposición de atención a la comunidad a través de los siguientes canales oficiales de comunicación: correo electrónico **socialpuentearanda846@gmail.com**, línea celular **3232061097**, y punto de atención presencial en la **Carrera 33 No. 4A-92, Barrio Veraguas**.

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud adicional que pueda surgir en el marco del desarrollo del proyecto.

Atentamente,



JULIAN CAMILO POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA
E-mail: cviasdepuentearanda@gmail.com

FECHA			BOGOTÁ	
27	10	25	BOGOTÁ	
DD	MM	AA		
ACTA No.: 165				

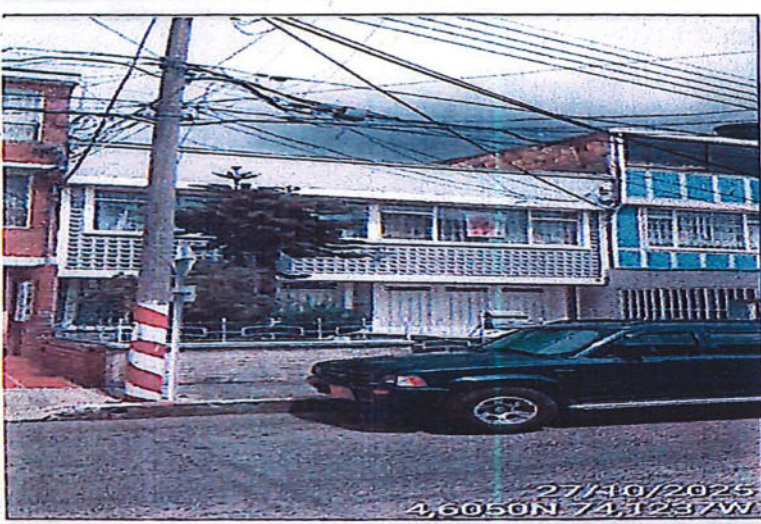


MUNICIPIO DE BOGOTÁ

ACTA DE VECLINIDAD INICIO

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angeles Yolandra

Dirección: Carrera SIC # 24-21 Sur

Teléfono: 313 2419300

Long. del frente (mts): 6 mts Aprox

Barrio: San Excebio.

No. de pisos: 2 + terraza

Estrato: 3

Localidad: Puente Aranda

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	

USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

Garaje SI	☒ NO
Cuantos	<u>2</u>
El garaje se usa como	
comercio SI	☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR:

Se inicia registro filmico para predio ubicado en la carrera SIC # 24-21 Sur. El predio en área de antejardín presenta ceramiento en reja metálica y muro bajo enchapado. Humedad y dilataciones de pintura con fisuras en muro junto a reja, al igual que en cabezote para reja. Dilataciones entre baldosas en muro de cerramiento. Reja metálica hacia la parte posterior. En área de antejardín se evidencia fisuras verticales en muro divisor entre garaje e ingreso peatonal. Humedad en área de antejardín con múltiples fisuras en cabezote. Primer de la parte interna presenta Fachada en bloques pintados, portón en carpintero metálica con vidrio liso al igual que la puerta y ventana del costado Sur. Placa solante en paramento labrado con dilataciones y resacas sobre estuco. Fisuras resacas y pintados. En área de antejardín se evidencian maderas para individuo arborio con resacas y pérdida de material. Individuo arborio con inclinación. Para segundo nivel se evidencian ventanas en carpintero metálica, alfaja de ventana en parte central presenta fisura vertical. Placa solante en Caraplast con despartillamiento en fibs. Se evidencia área de andén rompa vehicular con fisuras y despartillamiento.

FECHA				ACTA DE VERGADAD INICIO "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".	
27	10	25			
DD	MM	AA			
ACTA No.: 705					

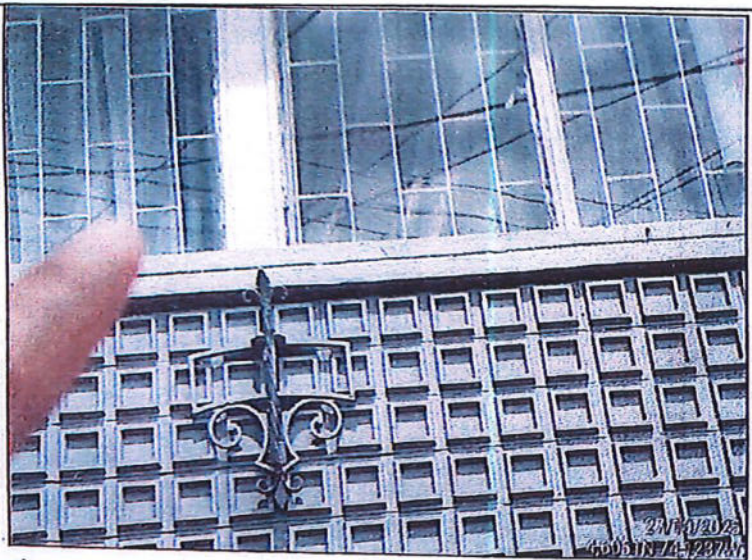


Foto No. 2

Descripción: laminas de vidrio de ventanas con fisura y desgaste en marcos metalicos.



Foto No. 3

Descripción: Desportillamiento en filos de alaca saliente con manchas y desgaste.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con a los lineamientos técnicos definidos para el presente contrato, vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Octubre de 2025.

Agustin Velazquez
 Propietario
 C.C. 52328827
 Nombre
 Relación:

Juan Aguirre
 Nombre: Juan Aguirre
 Técnico-Contratista

Elaboró- área Social
 Por el contratista
 Nombre:

Nombre: Técnico - Interventoría

Revisó - área Social
 Por la Interventoría
 Nombre:

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos definida en la Ley 1581 de 2012.

BOGOTÁ MUNICIPIO DE BOGOTÁ																																											
ACTA DE RAMPA Y ACCESO VEHICULAR PRODEBO Gestión Social y Participación Ciudadana																																											
FECHA		CONTRATO N° FDLPA- 840-2024	ACTA No. 285																																								
27 DO	10 DICI	25. AA	APERTURA ☒ CIERRE ☐																																								
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA 		2. DATOS DEL PREDIO Nombre del Propietario: <u>Angela Velandía</u> Teléfono: <u>313 241 4300</u> Dirección: <u>CALLE 61C # 24-21 SUR</u> Nombre y No C.C. propietarios vehículos: <u>NO SUMINISTRA</u> No de CC propietario: <u>52398877</u> No. de pisos: <u>2 + TERRAZA</u> INFORMACIÓN BÁSICA <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> 1. Propietario ☒ 2. Arrendatario ☐ 3. Familiar ☐ 4. Encargado ☐ 5. Empleado ☐ 6. Otro ☐ </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> NOMBRE Y C.C. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> USO ACTUAL DEL PREDIO 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ Cual uso? <u> </u> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> 5. Recreacional ☐ 6. Parquadero ☐ 7. Bien de Interés cultural* ☐ 8. Otro uso ☐ </td> </tr> </table> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> ACCESOS VEHICULARES Garaje ☒ Cuantos <u>1</u> Vehículos ☒ Cuantos <u>2</u> El garaje se usa como Comercio ☐ SI ☐ NO ☒ No de placa Vehículos: <u>SIN INFORMACIÓN</u> </td> <td style="width:50%;"></td> </tr> </table>		1. Propietario ☒ 2. Arrendatario ☐ 3. Familiar ☐ 4. Encargado ☐ 5. Empleado ☐ 6. Otro ☐	NOMBRE Y C.C. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>						USO ACTUAL DEL PREDIO 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ Cual uso? <u> </u>	5. Recreacional ☐ 6. Parquadero ☐ 7. Bien de Interés cultural* ☐ 8. Otro uso ☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje ☒ Cuantos <u>1</u> Vehículos ☒ Cuantos <u>2</u> El garaje se usa como Comercio ☐ SI ☐ NO ☒ No de placa Vehículos: <u>SIN INFORMACIÓN</u>																														
1. Propietario ☒ 2. Arrendatario ☐ 3. Familiar ☐ 4. Encargado ☐ 5. Empleado ☐ 6. Otro ☐	NOMBRE Y C.C. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																																										
USO ACTUAL DEL PREDIO 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ Cual uso? <u> </u>	5. Recreacional ☐ 6. Parquadero ☐ 7. Bien de Interés cultural* ☐ 8. Otro uso ☐																																										
ACCESOS VEHICULARES Garaje ☒ Cuantos <u>1</u> Vehículos ☒ Cuantos <u>2</u> El garaje se usa como Comercio ☐ SI ☐ NO ☒ No de placa Vehículos: <u>SIN INFORMACIÓN</u>																																											
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">1. Estado Antejardín</td> <td style="width:10%;">Bueno</td> <td style="width:10%;">☐ Regular</td> <td style="width:10%;">☒ Malo</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Estado Garaje</td> <td>Bueno</td> <td>☐ Regular</td> <td>☒ Malo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Estado Fachada</td> <td>Bueno</td> <td>☐ Regular</td> <td>☒ Malo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Estado Portón/reja</td> <td>Bueno</td> <td>☐ Regular</td> <td>☒ Malo</td> <td></td> </tr> </table> El predio posee rampa de acceso vehicular: SI ☐ NO ☒		1. Estado Antejardín	Bueno	☐ Regular	☒ Malo		2. Estado Garaje	Bueno	☐ Regular	☒ Malo		3. Estado Fachada	Bueno	☐ Regular	☒ Malo		4. Estado Portón/reja	Bueno	☐ Regular	☒ Malo		ESTADO DE PREDIO DESPUES DE INTERVENIR ESPACIO PÚBLICO <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">1. Estado Antejardín</td> <td style="width:10%;">Bueno</td> <td style="width:10%;">☐ Regular</td> <td style="width:10%;">☐ Malo</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Estado Garaje</td> <td>Bueno</td> <td>☐ Regular</td> <td>☐ Malo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Estado Fachada</td> <td>Bueno</td> <td>☐ Regular</td> <td>☐ Malo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Estado Portón</td> <td>Bueno</td> <td>☐ Regular</td> <td>☐ Malo</td> <td></td> </tr> </table>		1. Estado Antejardín	Bueno	☐ Regular	☐ Malo		2. Estado Garaje	Bueno	☐ Regular	☐ Malo		3. Estado Fachada	Bueno	☐ Regular	☐ Malo		4. Estado Portón	Bueno	☐ Regular	☐ Malo	
1. Estado Antejardín	Bueno	☐ Regular	☒ Malo																																								
2. Estado Garaje	Bueno	☐ Regular	☒ Malo																																								
3. Estado Fachada	Bueno	☐ Regular	☒ Malo																																								
4. Estado Portón/reja	Bueno	☐ Regular	☒ Malo																																								
1. Estado Antejardín	Bueno	☐ Regular	☐ Malo																																								
2. Estado Garaje	Bueno	☐ Regular	☐ Malo																																								
3. Estado Fachada	Bueno	☐ Regular	☐ Malo																																								
4. Estado Portón	Bueno	☐ Regular	☐ Malo																																								
4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS <u>7:00 am - 11:00 pm.</u>																																											
5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS <u>N/A</u>																																											
6. OBSERVACIONES GENERALES <u>Ancho de portón 3.0 mts aprox., rampa con desgaste y deterioro.</u>																																											

* Remítirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.

ACTA DE RAMPA Y ACCESO VEHICULAR
PROCESO
 Gestión Social y Participación Ciudadana

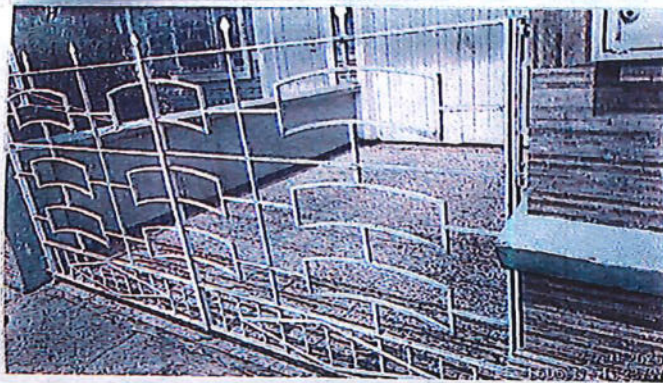


FOTO 1: ESTADO

OBSERVACIONES:
 Portón tipo reja
 con desgastes y
 catarsis.



FOTO 3: ESTADO

OBSERVACIONES:
 Rampa de acceso
 en concreto
 con desgastes

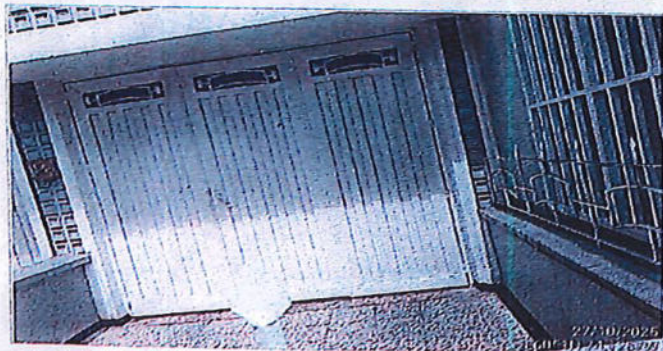


FOTO 2: ESTADO

OBSERVACIONES:
 Portón metálico
 con desgastes y
 corrosión y
 fendera.



FOTO 4: ESTADO

OBSERVACIONES:
 Sordines con
 desgastes y
 fillos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 10 de 2025.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)

Juan Aguirre
 Residente Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre)

 Residente Social - Contratista

REVISÓ:

(Firma)

(Nombre)

(Firma)

(Nombre)

 Residente Técnico - Interventoría
Angel Velazquez
Angel Velazquez
 Propietario

ACOMPANÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente Social-Interventoría



Consorcio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

CIV:16002834 contrato 846-2024

6 mensajes

Ángela Velandia <velandiangela@gmail.com> 7 de noviembre de 2025 a las 8:06 a.m.
Para: "socialpuentearanda846@gmail.com" <socialpuentearanda846@gmail.com>, consorciopavias2025@gmail.com, atencionalciudadano@umv.gov.co, "atención al ciudadano@ambientebogota.gov.co" <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo

No tuve conocimiento de la convocatoria a la reunión de inicio de obra y por esto no asistí.

Estoy esperando que remitan el acta de vecindad de la casa de mi propiedad ubicada en la carrera 51 C 24 21 sur, a este, mi correo electrónico, como lo informaron durante la visita. Principalmente porque el acta se firmó en blanco, indicaron que se completaría la información con el video que hicieron.

De otra parte, ayer en la noche una vecina me informó que los comerciantes interpondrán una tutela para evitar la intervención. Los vecinos propietarios estamos felices con la obra, pues la vía se ha venido deteriorando por los trabajos en espacio público que realizan los comerciantes, en el mantenimiento de neveras, lavadoras, microondas entre otros.

Ya que después de su labor, dejan los residuos sólidos, como diversas partes metálicas y plásticas en la calle. De igual manera los vertimientos del lavado profundo que realizan a los electrodomésticos, en el andén y la vía, corren al sumidero y también se quedan las aguas estancadas frente a las casas.

Por lo anterior, solicito que si tienen conocimiento de una acción de tutela, se me informe para intervenir en la acción o que se informe al juez la posición de otra parte de los vecinos propietarios de la cuadra.

También agradecería que como parte de la gestión social, se informara de los cuidados que se deben tener con la vía para prolongar su buen estado.

Quedo atenta a la respuesta a mi correo electrónico velandiangela@gmail.com.

Mil gracias por la atención prestada.

Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

10 de noviembre de 2025 a las 7:28 a.m.

Para: Ángela Velandia <velandiangela@gmail.com>
CC: "socialpuentearanda846@gmail.com" <socialpuentearanda846@gmail.com>, consorciopavias2025@gmail.com, atencionalciudadano@umv.gov.co

Cordial saludo.

Señor peticionario, su solicitud fue radicada exitosamente, para realizar seguimiento debe informar el número Forest 2025ER265592 07/11/2025 en cualquiera de los canales de atención (TELEFÓNICO, VIRTUAL Y/O PRESENCIAL).

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Para nosotros es importante conocer su percepción frente nuestro servicio DE RADICACIÓN/ASESORÍA Y/O LIQUIDACIÓN brindado por este medio, agradecemos responder la siguiente encuesta <https://forms.gle/zuSDHPyDqF8UzXx86>

Recuerde que una vez ya realizada la radicación por este medio, NO es necesario que la realice a través de ningún canal adicional ya que el aplicativo utilizado es el mismo y puede generar duplicidad en la información.



**SECRETARÍA DE
AMBIENTE**



GRUPO DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Secretaría Distrital de Ambiente

Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 3778899



[Texto citado oculto]



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Observatorio Ambiental de Bogotá: <https://oab.ambientebogota.gov.co/>

Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: <https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/>

Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: <https://ambientebogota.gov.co/>

Consorcio Vias de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>
Para: cviasdepuentearanda@gmail.com

10 de noviembre de 2025 a las 8:18 a.m.

[Texto citado oculto]

Consorcio Vias de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

18 de diciembre de 2025 a las
12:15 p.m.

Para: CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

Cordial saludo, me permito enviar la proyección de la respuesta para la PQR No. 16, aperturada el día 7 de noviembre de 2025, en el que se solicita información con respecto a la ejecución de las actividades a desarrollar en el CIV 16002834 en el barrio San Eusebio.

Quedo atenta a cualquier sugerencia.

Saludos

Diana Sandoval
Residente Social
Consortio Vías de Puente Aranda
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

 **COP-846-2024-081-2025 RESPUESTA PQR 16.docx**
105K

 **RESPUESTA PQR No. 16.pdf**
4314K

CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>
Para: Consortio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

22 de diciembre de 2025 a las 9:54 a.m.

Buenas tardes Diana cordial saludo remitir a la peticionaria y adelantar volantes para informar la no ejecución de este segmento vial

Cordialmente
[Texto citado oculto]

Consortio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>
Para: Ángela Velandia <velandiangela@gmail.com>
CC: consorciopavias2025@gmail.com

5 de enero de 2026 a las 11:56 a.m.

Bogotá D.C. 5 de enero de 2026

Señora

Angela Velandia

Referencia: Contrato 846-2024

Objeto: Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación.

Asunto: Respuesta por solicitud de información.

Cordial saludo,

De antemano ofrecemos disculpas por los tiempos de respuesta, nos permitimos hacer el envío de la respuesta mediante el oficio **COP-846-2024/081-2025**, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Agradecemos su comprensión

Diana Sandoval
Residente Social
Consortio Vias de Puente Aranda

[Texto citado oculto]



RESPUESTA PQR No. 16.pdf
4314K

COP- 846-2024			"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"																		
Hoja 1 de 1																					
FECHA																					
28	12 2025																				
DD	MM AA																				
ACTA No.	20	ATENCIÓN AL CIUDADANO																			
1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO																					
Nombre	Organización Vecinos de Veraguas	Organización	Comunidad																		
Dirección/Barrio	calle cra 31a bis con 5.	Teléfono	Ovpa2024@gmail.com																		
2. TIPO DE SOLICITUD																					
Queja	☒	Reclamo	☐	Sugerencia	☐	Solicitud información	☐	Otro	☐												
3. FORMA DE SOLICITUD																					
Personal	☐	Escrito	☒	Teléfono	☐	Otro	☐														
4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO																					
<p>Ciudadanos se comunican para solicitar información y acciones relacionadas con el avance de la obra que se adelanta en el barrio Veraguas Central, específicamente en la intersección de la carrera 31A Bis con calle 5. Manifiestan que la intervención presenta aparentes retrasos y/o se encuentra suspendida sin información clara para la comunidad, situación que ha generado afectaciones a la movilidad del sector, al desarrollo de las actividades comerciales, a la seguridad y a la calidad de vida de los residentes. Adicionalmente, señala que el estado actual de la vía representa riesgos para peatones, personas con movilidad reducida, adultos mayores y vehículos que transitan por el sector. En razón a lo anterior, solicita se informe el estado actual de la obra y las causas del retraso, se indique el cronograma actualizado de ejecución con fecha estimada de finalización y se adopten medidas que permitan acelerar el avance de los trabajos y mitigar las afectaciones a la comunidad.</p>																					
5. AREA DE LA SOLICITUD																					
Ambiental	☐	Social	☒	Seg. Integral	☐	Tráfico	☐	Construcción	☒	Otra	☐										
Fecha	Trámite				Solución																
28/12/2025	Verificación de los hechos				Realizar el seguimiento																
5/1/2026	Proyectar respuesta y enviarla a la interventoría para su revisión.				Se envía proyección de respuesta a la interventoría, mediante el oficio COP-846-2024/084-2025 para su revisión y posterior envío a los peticionarios.																
5/1/2026	Enviar respuesta a la comunidad peticionaria.				Luego de la revisión y aprobación por parte de la interventoría se envía respuesta a la comunidad.																
ELABORÓ. (Firma) (Nombre) Diana Sandoval Residente Social - Contratista											(Firma) _____ (Nombre) Ciudadano										
APROBÓ. (Firma) (Nombre) Doris Ortiz Profesional de Interventoría																					
Tercer copia. Dependencia ejecutora del contrato																					
Quinta copia. Interventoría																					
Sexta copia. Contratista																					



Consortio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

Solicitud de avance y finalización de obra en vía del barrio

5 mensajes

Organización Vecinos de Veraguas <ovpa2016@gmail.com>

28 de diciembre de 2025 a las 7:13 p.m.

Para: "socialpuentearanda846@gmail.com" <socialpuentearanda846@gmail.com>

CC: personeriapuentearanda@personeriabogota.gov.co

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente información y acciones relacionadas con el avance de una obra que se viene ejecutando en una vía del barrio **Veraguas Central**, específicamente en la calle cra 31a bis con 5.

La obra mencionada presenta retrasos significativos y/o se encuentra suspendida sin información clara para la comunidad, lo cual ha generado afectaciones a la movilidad, el comercio, la seguridad y la calidad de vida de los residentes del sector. Adicionalmente, el estado actual de la vía representa riesgos para peatones, personas con movilidad reducida, adultos mayores y vehículos que transitan por el lugar.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de manera atenta:

1. Se informe el estado actual de la obra y las razones del retraso, si las hay.
2. Se indique el cronograma actualizado de ejecución y fecha estimada de finalización.
3. Se adopten las medidas necesarias para acelerar el avance de la obra y mitigar las afectaciones a la comunidad.

Esta solicitud se realiza en representación del interés general de los habitantes del sector, quienes requieren una pronta solución y condiciones adecuadas de tránsito y seguridad.

Agradezco su atención y quedo atento(a) a una pronta respuesta.

Atentamente,

--

Organización Vecinos de Veraguas

Correo Electrónico: Ovpa2016@gmail.comCorreo Electrónico: Ovpa2024@gmail.com

Whatsapp: 3015166181



WhatsApp Image 2025-12-28 at 7.04.05 PM.jpeg
129K

Consortio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

5 de enero de 2026 a las 3:46 p.m.

Para: CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

Buen día

Cordial saludo, me permito enviar la respuesta proyectada a la solicitud remitida por la comunidad del CIV 16002708, para su revisión y fines pertinentes.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos

Diana Sandoval
Residente Social
Consorcio Vías de Puente Aranda
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos



WhatsApp Image 2025-12-28 at 7.04.05 PM.jpeg
129K



COP-846-2024-084-2025.docx
108K

CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>
Para: Consorcio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>

5 de enero de 2026 a las 3:53 p.m.

Buenas tardes Diana enviar la respuesta la peticionario gracias
[Texto citado oculto]

Consorcio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>
Para: CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>

5 de enero de 2026 a las 4:21 p.m.

Bogotá D.C. 5 de enero de 2026

Señores
Organización Vecinos de Veraguas

Referencia: Contrato de Obra Pública 846-2024

Objeto: "Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación".

Asunto: Respuesta a Solicitud de avance y finalización de obra en vía del barrio.

Cordial saludo

Nos permitimos enviar la respuesta a su requerimiento, mediante el oficio **COP-846-2024/084-2025**, reiterando nuestro compromiso por atender las inquietudes por parte de la comunidad.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Saludos

5/1/26, 16:25

Gmail - Solicitud de avance y finalización de obra en vía del barrio

Diana Sandoval
Residente Social
Consortio Vías de Puente Aranda

[Texto citado oculto]

 **COP-846-2024-084-2025.pdf**
179K

Consortio Vías de Puente Aranda <socialpuentearanda846@gmail.com>
Para: CONSORCIO PAVIAS 2025 <consorciopavias2025@gmail.com>
CC: cviasdepuentearanda@gmail.com

5 de enero de 2026 a las 4:24 p.m.

[Texto citado oculto]

 **COP-846-2024-084-2025.pdf**
179K

Bogotá D.C., 5 de enero de 2026

Señores:

Organización Vecinos de Veraguas

Bogotá, Barrio Veraguas central – Localidad de Puente Aranda

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLPA-846-2024

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.

ASUNTO: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN - SOLICITUD DE AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA EN VÍA DEL BARRIO "MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA" (CONTRATO CIN-850-2024).

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada, y en el marco del Contrato de Obra FDLPA-846-2024, a continuación, se expone de manera clara el estado actual de la obra, las condiciones que han incidido en su desarrollo y las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento del cronograma y la mitigación de posibles afectaciones a la comunidad.

1. Estado actual de la obra y razones del avance

En relación con el estado actual de la obra, se informa que las actividades se encuentran dentro de los plazos contractuales establecidos, conforme al cronograma aprobado para el contrato COP-846-2024. No obstante, durante el desarrollo de las actividades se presentó una situación técnica no prevista, relacionada con un bloqueo en la red residual existente en CIV aledaños, lo cual generó un taponamiento y el aumento del nivel de las aguas residuales. Esta condición obligó a realizar maniobras técnicas adicionales para el control y manejo

de la red, lo que limitó temporalmente el avance de algunas actividades, sin que ello represente un incumplimiento del cronograma contractual.

Adicionalmente, es importante señalar que, debido a la época del año, se ha presentado una reducción parcial del personal operativo, situación habitual en esta temporada; sin embargo, el frente de obra no ha sido suspendido en ningún momento, manteniéndose actividades en ejecución de manera continua.

2. Cronograma actualizado y fecha estimada de finalización

Respecto al cronograma de ejecución, se informa que el proyecto continúa rigiéndose por el cronograma inicial aprobado, el cual no ha requerido modificaciones sustanciales, dado que las situaciones presentadas han sido atendidas oportunamente y se encuentran contempladas dentro de los tiempos normales de ejecución de obra. En consecuencia, la fecha estimada de finalización se mantiene conforme a lo establecido contractualmente, es decir, para el 6 de marzo de 2026, sin que a la fecha se evidencien retrasos que comprometan la entrega de la intervención.

3. Medidas adoptadas para garantizar el avance y mitigar afectaciones

En cuanto a las medidas adoptadas para acelerar el avance de la obra y mitigar las afectaciones a la comunidad, el contratista ha dispuesto la continuidad de las labores, aun en escenarios de menor disponibilidad de personal. Asimismo, se han implementado acciones técnicas para superar las afectaciones derivadas del bloqueo en la red residual, permitiendo retomar progresivamente el ritmo normal de ejecución.

El **Consorcio Vías de Puente Aranda** reitera su disposición de atención a la comunidad a través de los siguientes canales oficiales: correo electrónico **socialpuentearanda846@gmail.com**, línea celular **3232061097**, y punto de atención presencial en la **Carrera 33 No. 4A-92, Barrio Veraguas**. Por estos

medios podrá comunicarse para resolver inquietudes y realizar seguimiento a las actividades.

Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud adicional que pueda surgir en el marco del desarrollo del proyecto.

Atentamente,



JULIAN CAMILO POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA



COP- 846-2024			"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"								
Hoja 1 de 1											
FECHA											
29	12 2025										
DD	MM AA										
ACTA No. 21											
ATENCIÓN AL CIUDADANO											
1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO											
Nombre	Maryori Vivas L		Organización	Comunidad							
Dirección/Barrio	Carrera 55 entre Calle 4B y Calle 4C BIS		Teléfono	310 3394376							
2. TIPO DE SOLICITUD											
Queja	☒	Reclamo	☐	Sugerencia	☐	Solicitud información	☐	Otro	☐		
3. FORMA DE SOLICITUD											
Personal	☐	Escrito	☒	Teléfono	☐	Otro	☐				
4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO											
<p>Comunidad residente del sector se comunica para manifestar inconformidad frente al aparente cese de actividades en el frente de obra correspondiente al CIV 16000839, objeto del Contrato 846 de 2024, señalando que desde el día 20 de diciembre no se evidencia avance alguno en la ejecución de los trabajos. Indican que el 22 de diciembre algunos vecinos establecieron contacto con el residente del contratista, quien informó que, debido a la no disponibilidad de asfalto, no era posible continuar con la intervención y que las labores se retomarían en el año 2026, sin precisar fechas ni compromisos concretos. Así mismo, una vecina consultó a personal del contratista presente en el campamento, quien manifestó que el contrato se encontraría vigente hasta el mes de marzo, aclarando no contar con información técnica adicional. Ese mismo día se realizaron de manera puntual algunos cortes en los andenes, tras lo cual el personal se retiró del sector. Desde esa fecha, la comunidad ha observado únicamente presencia intermitente de vigilancia diurna y nocturna, sin personal operativo constante ni avances visibles en la obra. A la fecha, 29 de diciembre, señalan que se completan aproximadamente 130 días de intervención. Adicionalmente, manifiestan haber recibido información contradictoria respecto a la reanudación de labores, relacionada con presuntos retrasos por falta de asfalto, priorización de otros frentes de obra, posibles dificultades técnicas en la red, ausencia de pagos al personal y ausencia de un cronograma definido, lo cual ha generado incertidumbre y afectaciones a la comunidad.</p>											
5. AREA DE LA SOLICITUD											
Ambiental	☐	Social	☒	Seg. Integral	☐	Tráfico	☐	Construcción	☒	Otra	☐
Fecha	Trámite				Solución						
28/12/2025	Verificación de los hechos				Realizar el seguimiento						
<div><div><p>ELABORÓ.</p><p>(Firma)</p><p>(Nombre) Diana Sandoval</p><p>Residente Social - Contratista</p></div><div><p>(Firma)</p><p>(Nombre) Ciudadano</p></div><div><p>APROBÓ.</p><p>(Firma)</p><p>(Nombre) Doris Ortiz</p><p>Profesional de Interventoría</p></div></div>											
<p>1era copia: Dependencia ejecutora del contrato 2da copia: Interventoría 3era copia: Contratista</p>											

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN". CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXO 4. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

- ✓ Entrega de plegables de sostenibilidad en el CIV
16000124 – Planillas de entrega – Registros
Fotográficos.

Conoce los beneficios que mejorarán la calidad de vida de los usuarios

- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector.
- Embellecimiento del entorno.
- Generación de interconexión vial.
- Fácil desplazamiento peatonal y vehicular.
- Valorización de los predios.
- Mayor seguridad.

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

a través del contrato
COP 846-2024
Cuyo objeto es:

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable de la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C."

Informa a la comunidad que han finalizado las actividades de mantenimiento de la vía: **CIV 16000124 En el barrio Puente Aranda** mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

Datos de contacto

Punto CREA: Carrera 33 No. 4ª - 92
Veraguas

Celular: 323-2061097

Correo electrónico:
socialpuentearanda846@gmail.com



CONTRATO COP 846-2024

Barrio Puente Aranda
CIV 16000124

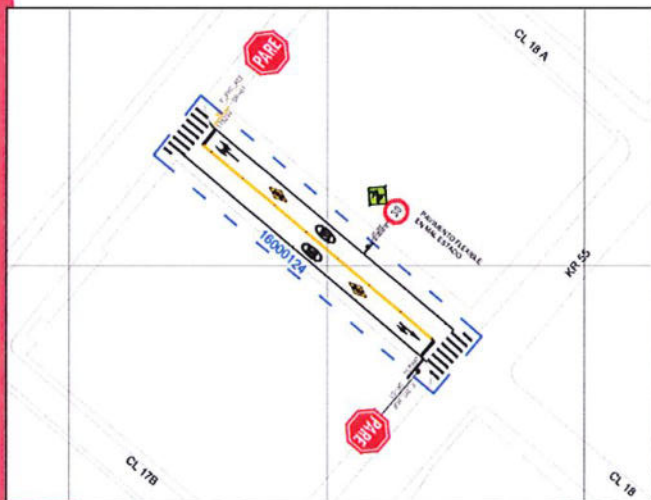


ENTIDAD CONTRATANTE
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
PUENTE ARANDA

FIRMA INTERVENTORA
CONSORCIO PAVIAS 2024


FIRMA CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE PUENTE
ARANDA
COP 846-2024

Propuesta para la demarcación de la Vía




En el plano se da a conocer la propuesta del contratista para la instalación de la señalización y la demarcación de la vía, dicha propuesta está bajo la revisión de la Secretaría Distrital de Movilidad y posterior a su aprobación se procede con su instalación.

ACTIVIDADES REALIZADAS



Antes

Durante



Después

- -Demolición de carpeta asfáltica.
- -Excavación mecánica
- -Retiro de material procedente de la excavación
- -Construcción de barrenos
- -Instalación de geotextil y material granular
- -Instalación de geocelda y relleno
- -Instalación de base granular estabilizada con cemento y aditivo al 5%
- -Instalación de carpeta asfáltica MCCh - 25
- -Instalación de carpeta asfáltica MDC - 19

**¡El cuidado de la es
responsabilidad de
todos!**

Recomendaciones

- 1 Evitar hacer mantenimiento o estacionar vehículos sobre el espacio público
 - 2 Evitar derrames de combustibles, químicos, aceites y líquidos corrosivos, entre otros
 - 3 No hacer quemas sobre la vía
 - 4 No realizar mezcla de concreto sobre la vía o andén
- Retirar o adecuar los desagües que generan golpe en el pavimento.
- 5
 - 6 Disponer las basuras en sitios autorizados

CONSEJO VIAL DE PUENTE ARANDA		FORMATO CONTROL DE PIEZAS DE INFORMACIÓN					BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda	
"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".								
TIPO DE PIEZA: Entrega volante de Convocatoria a reunion de finalización y pligable de sostenibilidad.								
CONTRATO N°: 846-2024		RESPONSABLE: Diana Sandoval				FECHA: 09/12/2025		
LOCALIDAD: Puente Aranda		BARRIO: Puente Aranda				TRAMO: 16000124		
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN	
1	Daniela Contreras	CL 18 # 55 60	4142594	Puente Aranda	Daniela Contreras	2		
2	Lot de patino	CL 18 # 55 51	310687915	Puente A.	Lot de patino	2		
3	Mahilde ochoa	CL 18 # 55 47	319719945	Puente A	Mahilde ochoa	2		
4	Miguel Cardoso	CL 18 # 55 41	310649960	Puente A	Miguel Cardoso	2		
5	Bajo puerta	CL 18 # 55 35	—	Puente A.	—	2		
6	Bajo puerta	CL 18 # 55 25	—	Puente A	—	2		
7	Bajo puerta	CL 13 # 55 21	—	Puente Aranda	—	2		
8	Bajo puerta	CL 18 # 55 17	—	Puente Aranda	—	2		
9	William Moreno	CL 18 # 55 05	320372839	Puente A	William Moreno	2		
10	Bajo puerta	CL 13 # 55 15	—	Puente A	—	2		
11	Omar Ramirez	CL 18 # 55 15	31625359	Puente A	Omar Ramirez	2		
12	Andres Pinilla	CL 18 # 55 16	3238040860	Puente	Andres Pinilla	2		
13	Teodolfo Cortez	CL 18 # 55 26	3158273402	Puente A	Teodolfo Cortez	2		
14	Hernando Carrillo	CL 18 # 55 36	3227630618	Puente A	Hernando Carrillo	2		
15	Jonh Castillo	CL 18 # 55 16/50	315528932	Puente A	Jonh Castillo	2		
16								
17								
18								
19								
20								

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

15

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Diana Sandoval	NOMBRE	Doris Ortiz
FIRMA	Diana Sandoval	FIRMA	Doris Ortiz



Contrato FDLPA No 846-2024



PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 09 DE 2025



DESCRIPCION: ENTREGA DE PLAGABLE DE SOSTENIBILIDAD CIV 16000124 BARRIO PUENTE ARANDA.

FECHA		TEMA		LUGAR		BARRIO	UPZ	LOCALIDAD	PUENTE ARANDA		
10/12/25.		Reunión de finalización de obra		Frentes de obra CIU 16000124		Puente Aranda	43				
No.	C. C. T. I. C. E.	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	S E X O	TÉLEFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		80-216-563	Daniel Pérez S.	39	JAC Puente Aranda	M	3103168517	Carrera 56 v. 15-39	P. Aranda	jac@puente.aranda.gov.co	[Firma]
2		35475226	Luz Dany Horta	47	Comunidad	F	3174018110	calle 18 ss 15	Puente Aranda		[Firma]
3		93772510	Escalante - Ibal	75	Comunidad	M	311 -	Calle 18 # 451	Puente Aranda		[Firma]
4		1000935380	Tatiana Escalante	74	Comunidad	F	3117028478	Cra 55 # 18-09	Puente Aranda		[Firma]
5		39.209.596	Nidia Ortiz S.	52	Comunidad	F	359.606.2066	Cra 18 # 55-46	Puente Aranda		[Firma]
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											



Contrato FDLPA No 846-2024



PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 10 DE 2025



DESCRIPCION: REUNION DE FINALIZACION CIV 16000124 BARRIO PUENTE ARANDA.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN". CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXO 5. PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS EN OBRA

- ✓ Plegable de capacitación – Planilla de asistencia – Registro fotográfico.

¿Cómo fortalecer las habilidades sociales?

1. Practicar la escucha activa.
2. Expresarse con respeto.
3. Controlar emociones.
4. Ser empático.
5. Pedir retroalimentación.
6. Aprender a aceptar críticas.



Atención a la ciudadanía

Punto CREA

Contratista: Consorcio Vías de Puente Aranda
Residente Social: Diana Sandoval
Contrato No. : 846-2024
Punto CREA: Carrera 33 No. 4* - 92 Veraguas
Horario lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Celular: 323-2061097
Correo electrónico: socialpuentearanda846@gmail.com

Interventoría: Consorcio PAVIAS 2025
Contrato: CIN 850-2024
Correo electrónico: consorciopavias2025@gmail.com

**Contrato de Obra Pública
No. 846 de 2024**

**“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A
MONTOS AGOTABLES LA
INTERVENCIÓN DE LA MALLA
VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE
LA LOCALIDAD DE PUENTE
ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y
ACTIVIDADES DE
CONSERVACIÓN”.**



**Capacitación N°8
Habilidades Sociales**

**Acciones de
formación
a empleados de obra.**



FORMATO SOCIAL
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



FECHA

23 de Diciembre de 2025

CONTRATO No.

846-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".

LUGAR Y FECHA:

Frentes de Obra

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Diana Sandoval

EMPRESA:

Consorcio Vías de Puente Aranda

TEMA:

Pavimentación

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN

☐

CAPACITACIÓN

☒

CHARLA INFORMATIVA

☐

ENTRENAMIENTO

☐

OTRO

☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Aurilio Pizarro	4071055	Tráfico		
Edwin M. Kober	1001844019	Operador	2. Rio	
Pamelo Gil Torres	202422	Asistente	Veraguas 1	
José López	79125658	Of.	Lia	
Javier Moreno	93129408	Maestro	Veraguas 2	
Juan Machado	12583705	Asistente	Veraguas 2	
Domingo Arango	55285	Asistente	Veraguas 2	
Carlos Fempipaz	20603618	Asistente	Veraguas 2	
Oscar Martínez	1193.245.734	Boal	Veraguas	
Carlos Torres	79514825	Boal	Colón	
Sergio Cortez	1021394174	Operador	San Francisco	
Edison Genes	1123991372	Boal	San Francisco	
Alejandro Jimenez	1010072016	Topógrafo	San Francisco	

(Firma)

(Nombre)

Diana Sandoval

Residente Social de Contratista

(Firma)

(Nombre)

Diana Sandoval

Residente Social Interventoria



Contrato FDLPA No 846-2024



PREGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA
CONTRATO No.:	846-2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 23 DE 2025



DESCRIPCION: CAPACITACION DE HABILIDADES SOCIALES A EMPLEADOS DE OBRA, EN LOS DIFERENTES FRENTE DE OBRA.

	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 9</p> <p align="center">"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN". CONSORCIO VÍAS DE PUENTE ARANDA COP 846-2024</p>	
---	---	---

ANEXO 6. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

- ✓ Consolidado de personal contratado.
- ✓ Copia de recibos públicos. – Certificado Sisbén.



FORMATO
REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO
PLAN DE GESTION SOCIAL



"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN".

CONTRATO N°: FDLPA-846-2024

PERIODO A REPORTAR: DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 6 DE ENERO DE 2026

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	GÉNERO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TELÉFONO	CARGO	MOG	MONC	FECHA INGRESO	TIPO DE VINCULACIÓN
PERSONAL CONTRACTUAL													
1	JULIAN CAMILO POVEDA MORENO	1,014,183,253	MASCULINO	22/2/1987	38	KR 74B #74-31	ENGATIVÁ	3142434304	DIRECTOR DE OBRA	X		08/04/25	DIRECTA
2	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	80,026,555	MASCULINO	31/1/1980	45	CARRERA 15 No. 93A - 84	ENGATIVÁ	3158795468	ESPECIALISTA VIAS Y PAVIMENTOS	X		08/04/25	DIRECTA
3	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10,766,686	MASCULINO	14/7/1980	45	CARRERA 15 No. 93A - 84	ENGATIVÁ	3142434304	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	X		08/04/25	DIRECTA
4	HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	11,000,758	MASCULINO	15/10/1977	48	AVENIDA CARRERA 50 #4A -02	KENNEDY	3105623114	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO	X		08/04/25	DIRECTA
5	JUAN CARLOS AGUIRRE GUTIERREZ	1,014,304,643	MASCULINO	16/3/1999	26	CRA 76 # 63F-26	KENNEDY	3194985464	RESIDENTE DE OBRA	X		08/04/25	DIRECTA
6	JULIETH STEFANNY ORTIZ ORTIZ	1,013,666,534	FEMENINO	25/4/1996	29	Calle 32 a Sur # 25b-04	RAFAEL URIBE URIBE	3012994937	RESIDENTE AMBIENTAL -SST	X		12/05/25	DIRECTA
7	DIANA MARCELA SANDOVAL AMAYA	1,023,936,212	FEMENINO	17/9/1994	30	CRA 6 ESTE # 47A-06	SAN CRISTÓBAL	3214946751	RESIDENTE SOCIAL	X		08/04/25	DIRECTA
8	JUAN CAMILO CUBILLOS MORALES	1,069,747,844	MASCULINO	22/5/1994	31	CRA 50A # 40A - 45	VILLA SONIA	3108807294	AUXILIAR AMBIENTAL- SST	X		09/07/25	DIRECTA
9	NICOLAS ANDRES OSORNO AMAYA	1,026,284,388	MASCULINO	9/6/1993	32	Diagonal 64a # 21-18	CHAPINERO	3105524081	INSPECTOR TECNICO	X		27/05/25	DIRECTA
10	NICOLAS STEVEN PIRAZAN VELANDIA	1.001.328.492	MASCULINO	8/10/2003	21	Calle 46 # 21 - 25	CHAPINERO	3212463125	AUXILIAR TÉCNICO	X		07/08/25	DIRECTA
11	PAULA ALEJANDRA RESTREPO RADA	1.002.752.016	FEMENINO	25/11/2000	24	CALLE 130B # 124 - 85	SUBA - VILLA MARÍA	3214745066	AUXILIAR SOCIAL	X		20/8/2025	DIRECTA
12	VALENTINA LÓPEZ GIL	1.193.581.333	FEMENINO	24/7/2001	24	CARRERA 109A # 150B - 79	SUBA	3244111638	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	X		03/03/25	DIRECTA
13	BRIAN ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ	1,010,072,046	MASCULINO	9/3/2000	25	CARRERA 55 # 5A - 59	PUENTE ARANDA	3208787396	TOPOGRAFO	X		27/05/25	DIRECTA
14	ELKIN JAVIER DIAZ AGUDELO	79,615,286	MASCULINO	27/09/72	54	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	3152517899	CADENERO 1	X		07/10/25	DIRECTA
15	JULIANA VALENTINA VARGAS ZAPATA	1,000,776,637	FEMENINO	9/4/2002	23	CARRERA 10F ESTE #24 70SUR	SAN BLAS II	3209282940	CADENERO 2	X		07/10/25	DIRECTA
16	CARLOS FRANCISCO TORRES	79,519,825	MASCULINO	6/2/1973	52	CARRERA 50 No. 37 - 08	SAN RAFAEL	SIN INFORMACION	BOAL		X	20/10/2025	DIRECTA
17	GERARDO CIFUENTES DIAZ	16,160,038	MASCULINO	27/11/1961	64	CRA 152 No. 143 - 75	SUBA	3216703693	BOAL		X	24/06/25	DIRECTA
18	OSCAR DAVID MARTINEZ ZAMORA	1,193,245,734	MASCULINO	18/5/2001	24	CLL 73 No. 77G - 47	BOSA	3248254777	BOAL		X	02/07/25	DIRECTA
19	DAVIS FERNANDO GUAYARA LOAIZA	1,005,821,005	MASCULINO	14/5/1999	26	CRA 80g #58J-40	BOSA	3152864026	BOAL		X	14/07/25	DIRECTA
20	ANGEL ALBERTO MONTEALEGRE	5,994,312	MASCULINO	14/2/1972	53	CRA 87 # 46B-47	KENNEDY	3167205213	OFICIAL	X		07/08/25	DIRECTA
21	JHON JAIRO MORA PEREZ	80,741,817	MASCULINO	29/6/1980	45	Cl. 16d #100-20	FONTIBON	3213669874	AYUDANTE		X	09/08/25	DIRECTA
22	JOSE GUILLERMO SALVADOR MOTAVITA	4,249,114	MASCULINO	15/5/1971	54	Cl. 27a # 32A-62	TEUSAQUILLO	3125789540	OFICIAL	X		07/08/25	DIRECTA
23	YOBANY RAMIREZ PRECIADO	1,022,971,329	MASCULINO	15/9/1991	34	CALLE 60B SUR # 67 - 31	CIUDAD BOLIVAR	314896754	AYUDANTE		X	10/11/25	DIRECTA
24	JAVIER MORENO PRADA	93,129,408	MASCULINO	27/11/1973	51	Cra. 78I BIs #50-43	BOSA	3103548900	AYUDANTE		X	26/08/25	DIRECTA
25	JHON JAIRO MATOS BARRIOS	1,006,889,235	MASCULINO	18/1/2001	24	CL 2B No. 41 - 51 APTO 301	PUENTE ARANDA	3245879635	BOAL		X	04/09/25	DIRECTA
26	DIONEDISON GENES ESQUIVEL	1,123,991,372	MASCULINO	5/4/2003	22	CRA 18D # 91A-70 SUR	CIUDAD BOLIVAR	3214689752	BOAL		X	18/11/25	DIRECTA

Total de personal contratado:	28
Total mano de obra no calificada:	9
Total mano de obra no calificada de la localidad:	2
Total Personal femenino:	5
Menores de 28 años:	10
Total población vulnerable:	1
Personal Directo:	28
Personal Indirecto:	4
Porcentaje de población vulnerable (5%)	11%
Porcentaje de vinculación femenina (13.6%)	17%
Porcentaje de MONC (50%)	32%
Porcentaje MONCL que aplica para el contrato (15%)	22%

		CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
NOMBRE		Diana M. Sandoval A.	Doris Ortiz
FIRMA			



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EBP
NIT. 898.898.094 - 1

LAG
Natalia Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!

Factura a nombre de
CARLOS JULIO PEREZ MONTAÑA

Dirección del predio
CL 2B 41 51 AP 301

Barrio: **MONTES** Localidad: **PUENTE ARANDA**

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: **Residencial**

Estrato: **3**

Unidades Habitacionales: **1**

Unidades No Habitacionales: **0**

Para el reparto **ZONA: 3 CICLO: T3 RUTA: T33750**

BIMESTRAL

12229240
Cuenta contrato
Núm. de identificación
de este predio

12442870718
Número para pagos
Número de esta factura
de servicios públicos



Escanea y
descarga el
documento
electrónico
equivalente

Período facturado

NOV/29/2024

ENE/28/2025

Pago oportuno

FEB/28/2025

Suspensión

MAR/05/2025

Fecha esperada próxima factura

ABR/24/2025

Fecha y hora de expedición factura

FEB/17/2025 05:28:00

Fecha y hora de generación factura

FEB/17/2025 12:44:45



**¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y
por eso la factura cambió**

Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.



En este período **consumiste más agua** que en el anterior.

Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓



Llámanos

116 Acueducto

110 Aseo

Entra a www.acueducto.com.co haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. NIT. 900.450.534 - C. 11.700.000.0000

20710

401504 54000

Powered by CamScanner

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Por favor dobla y rasga para abrir la

Aprovecha las ofertas
con tu cupo de crédito
Vanti Listo

Aliado
Comercial
vanti
Listo

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente contrata con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

* SOLICITA TU
**FACTURA
EN LÍNEA**
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, insíbete
en el formulario y empieza a recibirla
por correo desde el próximo mes.



Dile adiós al papel
y empieza a recibir
tu factura Vanti
en tu correo.

Inscríbete aquí



* SOLICITA TU
**FACTURA
EN LÍNEA**
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla,
tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/



Botón PSE



Botón Bancolombia

Recuerda que
puedes pagar
las facturas de
una o varias
cuentas con un
solo
transacción



Escanea para
pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades



*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.



Síguenos en nuestras redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

» Corresponsales Banco BBVA
» Corresponsales Scotiabank Colpatria
» Corresponsales Grupo Aval

» Corresponsales Banco Davivienda
» Red CADE
» Banco GNB Sudameris

» Grandes Superficies:
Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.



Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo
de energía se traduce en un ahorro
para la economía familiar y contribuye
a disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero, principal causa
del cambio climático.



Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164



Atención presencial

Ingresa a www.grupovanti.com
y conoce los pasos para agendar tu cita.



CARNAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048901082025 VANTI

iHola!

ANA D GUERRERO
AK 50 3 37 02 - SAN RAFAEL
BOGOTA

Medidor

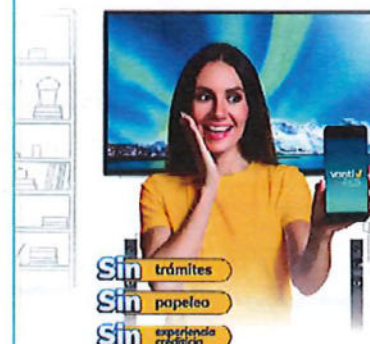
Lote: P01GN Ruta: 0011160122700005100 Código del Sector: 050

Cuenta o referencia de pago 60853343

vanti
Listo

Compra
televisor, calentador a gas,
moto y mucho más, y paga
a cuotas a través
de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO
APROBADO ES:



Compra con tu
Vanti Listo tod
Extracup

\$8.000

en tecnología, e
remodelac

Extracup

\$12.000

en m

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura d



Publicada a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Condorpetrol S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasvicer S.A. ESP
el servicio de financiación no bonifica el monto por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación, consulte

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes



Atención telefónica

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea gratuita 01 8000 942 794

Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención presencial

Gestiona tus p

Línea de Wh

Mi

<https://r>

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuer

Por favor dobla y rasga para abrir la

Nombres: JAVIER

Apellidos: MORENO PRADA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 93129408

Municipio: Espinal

Departamento: Tolima

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente:

Última actualización ciudadano:

Última actualización vía registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador:

ANDRE.

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX
