



NOMBRE DEL COMITÉ / REUNIÓN

ACTA No. 05

Lugar: Sala de juntas Secretaría Administrativa Gobernación Risaralda
Fecha: 24 de abril de 2026
Hora: 9:30 a.m.

Personas citadas:
Equipo de presupuesto participativo

Asistentes:

Se adjunta registro de asistencia de fecha 24/04/2026

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento formulación proyectos elegidos en vigencia 2025 y anteriores
2. Seguimiento a ejecución de proyectos
3. Propositiones

.....

DESARROLLO

1. Seguimiento formulación proyectos elegidos en vigencia 2025 y anteriores

Apia:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CASONA DE LA ANTIGUA SAGRADA FAMILIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES.


El municipio cuenta con presupuesto y se compromete a entregar proyecto formulado la primera semana de mayo. La Secretaría de Planeación municipal certificó que la edificación no se encuentra en zona de riesgo.

El Coordinador de presupuesto participativo solicita que se programe visita con el ingeniero estructural de EDUR con el propósito de determinar si la edificación amenaza estado de ruina o representa riesgo para la intervención propuesta. La Dra. Alejandra Murillo gestionará con

Versión. 05
Vigencia:05-2025



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



el comité de patrimonio para que certifique si la edificación se encuentra afectada con esta declaratoria.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL SANTO TOMÁS DE AQUINO.

Se solicitaron cotizaciones para estudios y diseños con el propósito de definir la viabilidad de incluirlos en los recursos asignados al proyecto, se prevé que la próxima semana se tenga información al respecto.

Balboa:

PROYECTO: ADQUISICIÓN MAQUINARIA AMARILLA

La asesora del BPIR informó que ya recibió por parte del municipio la documentación del proyecto, está en proceso de revisión.

Belén de umbria:

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BUS PARA EL TRANSPORTE DE DEPORTISTAS Y GRUPOS CULTURALES

Se recibieron varias cotizaciones, todas por encima de los recursos asignados, el coordinador de Presupuesto participativo reportó la información al Dr. Oscar Sanabria secretario de Planeación para revisar con el señor gobernador la posibilidad de mayor concurrencia. Hacer seguimiento la próxima semana-Francy Elena Abad.

El asesor BPIR informa que se está avanzando en formulación mientras se define la disponibilidad de recursos adicionales y las especificaciones técnicas del vehículo.

Dosquebradas: No se ha avanzado en la formulación, Juan Carlos Ospina debe hacer seguimiento exhaustivo con apoyo de la Ingeniera Adriana.

Guática:

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE RESCATE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS

Asesora BPIR les entregó modelos de proyecto de características similares. La próxima semana Jhon Jairo Gil hace seguimiento al avance.

La celia:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO.





La secretaria de Planeación Bibiana Ramírez informó que están haciendo presupuesto por valor total de la intervención que se requiere y están calculando una intervención parcial de acuerdo a los recursos disponibles. Estará listo para el 30 de abril.

La Virginia:

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS Y KIOSCO COMUNITARIO EN LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA"

En Ingeniero Edward- director de infraestructura del municipio de La Virginia entregó presupuesto el 23/04/2025 de acuerdo a lo pactado en reunión de definición de alcance. La asesora BPIR informa que se está avanzando en la formulación de acuerdo al cronograma.

Marsella:

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA

El municipio informa que el proyecto está en formulación, están pendientes las cotizaciones. Juan Carlos Ospina realizará seguimiento el 30/04/2026.

Mistrató:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (COLISEO MUNIPAL)

El municipio tiene una cotización para intervenir 910 metros cuadrados, están esperando otra cotización, se está avanzando en la formulación de acuerdo a información aportada por el secretario de planeación.

Es importante revisar el presupuesto a detalle y determinar si es posible ampliar la intervención de acuerdo a los recursos disponibles.

Pereira:

PROYECTOS:

Dotación de kits escolares y uniformes para Puerto Caldas
Ayudas audiovisuales para San Joaquín.

No se ha avanzado en la formulación, El municipio informa que la próxima semana realizará reunión para definir aspectos que permitan avanzar. Jhonatan hará seguimiento el 30/04/2026





Pueblo Rico:

PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL ADULTO MAYOR PARA LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA CECILIA Y VILLA CLARET*

El ingeniero Salgado informa que esta tarde se reunirá con José Miguel Castaño topógrafo de la Secretaría de infraestructura para realizar el ejercicio digital de ubicación en predio. No se reportan avances en formulación, se debe hacer seguimiento el 30/04/2026.

Quinchía:

PROYECTO: *AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL NAZARETH*

Carlos Eduardo informa que el Secretario de Planeación y ambiente de Risaralda manifestó que el lunes 27 de abril abordará el tema con el señor Gobernador.

Santa Rosa de Cabal:

PROYECTO: *COMPRA DE VEHÍCULOS PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL.*

La asesora BPIR envió modelos de proyecto de características similares al municipio. Jhonatan Uribe hará seguimiento al avance en formulación el 30/04/2026.

Santuario:

PROYECTO: *PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN ANIMAL DEL MUNICIPIO.*

El 23 de abril se realizó visita a lote del municipio (donde se había proyectado construir plan de vivienda) en compañía de funcionarios de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo y del municipio el concepto de la visita será entregado el 30/04/2026 por la CDGRD. El Ing. Jhon Anderson hará seguimiento al concepto para la toma de decisiones. Si no hay lote se configura la inviabilidad del proyecto.

2. Seguimiento a ejecución de proyectos

Contrato Interadministrativo 2306 de 2024

Se encuentran en ejecución los proyectos:


Sede ASOJUNTAS Guática, se cuenta con el compromiso del contratista de entregar en mayo.

Área rayos x y laboratorio del hospital Santuario, se cuenta con el compromiso del contratista de entregar en abril.

Versión. 05
Vigencia:05-2025



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



Los demás contratos derivados se encuentran ejecutados y en su mayoría liquidados.

Respecto al contrato a la intervención del teatro de Belén se recibió oficio de municipio argumentando los motivos para que, a la fecha no se haya firmado acta de recibo de obra. En comité del 21 de abril de 2026 se solicitó a EDUR programar visita con el municipio y contratista para dar respuesta.

EDUR está avanzando en la liquidación de los contratos derivados y los contratos de adhesión con los municipios, en comité de 21/04/2026, la secretaría de planeación y ambiente solicitó a EDUR que en el marco de este proceso se verifique el ingreso de los bienes al inventario del municipio y los comodatos por los que realiza la entrega a los beneficiarios, esto en los casos de dotación en los que sea aplicable esta figura.

Placa Huellas Quinchía: En comité del 21/04/2026 EDUR informa que se está presentando inconveniente en el proceso de liquidación del contrato de obra, el balance del contrato arroja un saldo a favor de EDUR y no se ha evidenciado interés por parte del contratista de tramitar la liquidación, previa devolución del saldo. La entidad está adelantando los trámites tendientes a superar la dificultad.

Contrato Interadministrativo 2191 de 2025

OBRAS

Caminos anchos municipio de Pueblo Rico: Se recibió respuesta a consulta realizada ante CARDER respecto a viabilidad de extracción de afirmado y disposición de RCD en el municipio sin la exigencia de licencias normativas. Se programa reunión para el 29/04/2026 con el municipio y delegados, Carlos Eduardo López solicita que se reúnan los ingenieros de presupuesto participativo con EDUR y lleven una propuesta clara para el municipio frente a respuesta de CARDER. Es relevante dejar las decisiones y compromisos plasmados en acta.

Placa Huellas Pereira: En el tramo de Tribunas se está presentando inconveniente por necesidad de cierre de vía a la altura de galpón. En comité del 21 de abril Carlos Eduardo solicitó que EDUR tome decisiones contundentes con el contratista sobre plan de contingencia.

Teatro La Virginia: Con avance del 95% de acuerdo a información reportada por el ejecutor el comité del 21/04/2026.

Caseta vereda El Rodeo Dosquebradas: Continúa pendiente entrega de estudios y diseños por parte del municipio.

Guática: (Hospital – ampliación sala de urgencias): En comité del 21/04/2026 EDUR informa que en el proceso de demolición se identificó una condición en la estructura que requirió valoración por parte del ingeniero estructural, el cuál determinó que debe ajustarse el diseño entregado por el municipio con el propósito de separar la estructura a intervenir, el





ajuste debe socializarse con el municipio y se debe tramitar licencia. La socialización se realizará el 27/04/2026

Mistrató (Mejoramiento de vivienda): En comité del 21/04/2026 EDUR informa que, el contrato inició el 13 de febrero, en visita realizada la semana pasada se evidencio bajo rendimiento, se le solicitó celeridad y el contratista se comprometió a tener 4 mejoramientos más para la próxima semana.

La Social informa que está en proceso de cruce de información de los 9 beneficiarios que faltan. Los demás se están ejecutando.

DOTACIONES

Santuario- Dotación asilo de ancianos y centro de capacitación de la mujer: Se realizó la entrega total de elementos asociados a las tipologías Tecnología y muebles y enseres, adicionalmente, se realizaron entregas parciales de equipos biomédicos. A la fecha solo queda pendiente la entrega de 3 patos (biomédicos) para completar la totalidad de la dotación.

Apía-dotación Juntas de Acción Comunal: Se entregó al municipio la totalidad de los elementos que componen la dotación solicitada por las JAC (Muebles y enseres y tecnología).

Santa Rosa-Dotación Juntas de Acción Comunal: Se entregó al municipio la totalidad de los elementos que componen la dotación solicitada por las JAC (Muebles y enseres y tecnología).

Maquinaria Amarilla: Ya se entregaron las motoniveladoras a los municipios de Marsella y La Celia

CCTV – Cámaras Pereira: Se debe hacer la socialización con la comunidad, ya que el contrato fue celebrado acorde a las solicitudes de la misma, sin embargo, en la etapa de ejecución está teniendo resistencia a la instalación de las cámaras en las fachadas.

Se debe realizar una reunión con Pereira para resolver estos temas y continuar con la ejecución.

3. Proposiciones

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

1. Programar visita con el ingeniero estructural de EDUR a edificación Sagrada Familia del municipio de Apía con el propósito de determinar si amenaza estado de ruina o representa riesgo frente a la intervención propuesta-Carlos Eduardo López.
2. Solicitar certificación al comité de patrimonio si la edificación Sagrada Familia del municipio de Apía hace parte del patrimonio arquitectónico-Dra. Alejandra Murillo.





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Planeación y Ambiente

SISTEMA DE PLANEACIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL

ACTA DE REUNIÓN


3. Seguimiento a consulta ante el señor Gobernador sobre mayor concurrencia de recursos para proyecto de Belén de Umbría la próxima semana. Responsable de la consulta secretario de Planeación y Ambiente-Dr. Oscar Sanabria -Responsable seguimiento Francy Abad.

FIRMA DE ASISTENTES: Se adjunta Listado de Asistencia Reuniones Internas


CARLOS EDUARDO LOPEZ SALAZAR
Coordinador Presupuesto Participativo
Responsable de la reunión


FRANCY ELENA ABAD SABÀS
Contratista CPS 762 2026
Elaboró

Anexo 1: Registro Fotográfico

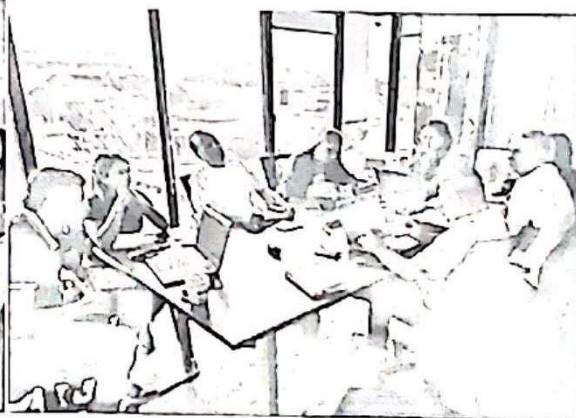

Versión. 05
Vigencia:05-2025



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

7

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Planeación y Ambiente
SISTEMA DE PLANEACIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Fecha: 24 de abril 2026 Lugar: Sala juntas Secretaría Administrativa Hora de inicio: 9:30 Hora de terminación: _____
 Seleccione con una X que tipo de actividad corresponde: Reunión: ☒ Capacitación: _____ Inducción: _____ Otro: _____ Cual?: _____
 Tema de la actividad: Comité seguimiento presupuesto Participativo Secretario(s) responsable: Planeación y ambiente
 Funcionario(s) responsable(s): Carlos Eduardo López

Conclusiones

Autoriza Tratamiento de datos según ley 1581 de 2012. Reglamentada parcialmente por el decreto No. 1377 de 2013

Nombres y apellidos	Secretaría / Dependencia	Cargo	Telefono oficina / Celular	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el uso de datos	
						SI	NO
Francy Elena Abad	Gestión Mpal	Contratista	3137446448	francy.abad-sabias@gmail.com	[Firma]	X	
Adriana Garcia	Gobernación	Contratista	3122592100	SopORTE.plataforma@gmail.com	[Firma]	X	
John Alexander Pérez	"	"	3022912603	prestreggion@gmail.com	[Firma]	X	
John Jairo A. Gestión Mpal	Gobernación	Contratista	3168265211	decoordinacion@gmail.com	[Firma]	X	
John Sebastian Vallis H. Gobernación	Gestión Mpal	Contratista	3104793383	Contratista	[Firma]	X	
Penela Robledo Guisado Planeación	Gobernación	Contratista	314510 9995	juansempoz17@gmail.com	[Firma]	X	
Carlos Edo López	Gestión Mpal	Prof Exp	3148712674	--	[Firma]	X	
Carlos Andrés Salgado Planeación	Gestión Mpal	Contratista	3164288545	eduardo.ribeiro@gmail.com	[Firma]	X	
Carlos Andrés Salgado Planeación	Gestión Mpal	Contratista	3188276262	salgadoacm@gmail.com	[Firma]	X	

Version: 07
Vigencia: 08-2024
