

(26)

en viga canal. Continúa instalación de estructura metálica Auditorio. AlgodraCaude

28/02/2026

Finaliza instalación de superboard en la circulación oficinas administrativas.

Continúa instalación de PVC punto fijo salones.

Continúa instalación de estructura metálica cubierta Auditorio. Finaliza aplicación de poliurea en placa y viga canal, aplicación de pintura amarilla fachada salones. AlgodraCaude

01/03/2026 DOMINGO

Instalación de p.v.c punto fijo salones, instalación de luminarias punto fijo.

Aplicación pintura amarilla fachada. AlgodraCaude

02/03/2026

Instalación estructura metálica Auditorio.

AlgodraCaude

03/03/2026

Instalación estructura metálica Auditorio.

Norma

AlgodraCaude.

27

04/03/2026

Continúa instalación estructura metálica
cubierta Auditorio. Aseo general. Alejandro

5) 2506 093997 50 257414
Domingo 01 de Febrero 2026

Lunes 02 de Febrero 2026

Observación Interventoria:

Se evidencia que en la zona donde se adebitan actividades de conformación del terreno mediante la aplicación de recebo y posterior compactación, las fuertes precipitaciones presentadas han afectado la calidad del material, debido a que este no se encontraba debidamente protegido. Como consecuencia, se presenta saturación, arrastre parcial y pérdidas de las propiedades granulométricas del recebo, lo cual incide negativamente en el grado de compactación alcanzado.

Importante intervenir en este asunto.

Se tapa o cubrio con plástico la parte recibida y compactada de la placa. Alguacil.

(16)

MARTES 03 FEBRERO 2026

Personal en obra 1 Oficial y un ayudante,
se realiza corte y demolición de un fragmento
de placa junto al ingreso peatonal.


No se realizan las otras actividades
programadas debido al clima, en la tarde
de ayer llovió mucho y se encharcó el
sendero para frasegar la tierra y
de más escaubros.

Alejandra Cauda.

Miércoles 04 Febrero 2026.

Se reúne por parte del Contratista de Obra
el Director y el Residente de Obra y
por parte de la Intendencia los Directores,
el lug. de apoyo a la Dirección y el Residente
y se establece la Estructura a utilizar
teniendo en cuenta las condiciones climáticas
y el espacio de trabajo, donde se llega a
la siguiente Estructura.

Espesores

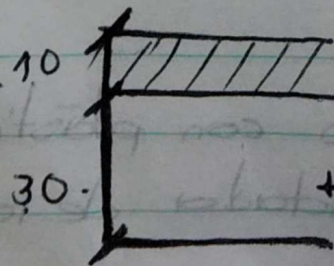

+ Placa en concreto 15x25
reforzada con malla

+ Subbase N=5


Norma

(17)


(81)


La Capa de Sub base se dividira en 2 (dos) Capas en 20 cm de Sub base B 400 y 1 Capa de 10 cm de Material Sub base SBG - PEA mejorada con Cemento la cual se tiene en cuenta por las siguientes Caracteristicas (1) .
Mejora la Impermeabilidad y a su vez para cumplir con el porcentaje de aprachamiento de los materiales.

Ing. Luis Blanco .




Ing. Juana Rodriguez.





Ing. William Penagos .



Ing. Robinson Danero .

18

Jueves 05 Febrero 2026

FL

Nota de observación: En el recorrido de inspección del (5 Febrero) se constató ausencia de personal en la obra.

Firma: Inspector de Interventoría

Viernes 06 -02-2026

No se realizan actividades, espera de material de compactación (Recebo), se deja materia existente tapado.

Sábado 07-02-2026

No se realizan actividades. (material tapado en plástico).

Domingo 08-02-2026

No se realizan actividades

Norma

19

02

Lunes 9-02-2026

Se inician labores con el leuante de capa de 10cm en el area ya compactada, ya que por el clima se debe cambiar el material, Personas en Obra 4, 2 oficiales 2 Ayudantes, Se realiza excavacion manual de zona Frente al Bloque 3, Se presentan lluvias sobre las 3:30 pm., Se cubre material compactado.

Martes 10-02-2026

Se reemplaza capa retirada de recebo, con recebo B400 el cual llega sobre las 9:00 am, se realiza el descargue y se inicia el llenado restante, Llegada de cilindro compactador (Benetton) para una mejor compactación en la solista intersección en visita de obra. Se presentan lluvias sobre las 3:00 pm., Se procede a tapar con plastico zona compactada y recebo.

Norma

(22)

(15)

Martes. 17 Feb/2026.

Personal EN OBRA:

Daniel Suspes (Oficial)

Alfredo Hernandez (Ayudante)

Diego Mendez (Oficial)

Javier Ruiz (Contratista)

Alfonso Michaels (Inspector obra Contratista).

Actividades programadas Para hoy:


* HONDADO placa; xupen; carcamo.

* Alisado placa.

* ALANADO MECANICO CON Helicoptero (ALISADO).

* (Registro fotografico - Video).

TAADANA SOLADA. TARDE DE LUNA.


Inspector obra.
Contratista.

MIÉRCOLES 18/Febrero/2026.

Fraguado de placa, aplicación de agua.

Alisado de carcamo.

Alexandra Cande

JUEVES : 19/Febrero

Continua aplicación o riego de agua en

Norma

la placa, - alistado de carcama y extensión de recebo en los mismos. Algodora Cande

Descanso de mixta

VIERNES 20/02/2026

Se suspenden actividades.

SABADO 21/02/2026

No se realizan actividades.

DOMINGO 22/02/2026 DOMINGO. DESCANSO

LUNES 23/02/2026

No se realizan actividades.

MARTES 24/02/26

No se realizan actividades.

MIERCOLES 25/2026

No se realizan actividades.

JUEVES 26/02/2026

No se realizan actividades.

(24)

VIERNES 27/02/2026

Descargue de material (cemento), se fundió el anden tramo pendiente, se suspenden actividades por lluvias.
Alejandra Caude

SABADO 28/02/2026

Alistado de cárcamo, se funde un tramo de cárcamo.
Alejandra Caude

DOMINGO 01/03/2026. DESLANSO.

LUNES (09/.) 02/03/2026

Retiro de dos viajes de escauleros. en volqueta sencilla, cerramiento en polisorbra muro colindante casa de vecino, continua fundida tramo de cárcamo, coseo general anden fachada posterior.
Alejandra Caude

⑦

LUNES 22 DIC 2025

③

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

Algodora Caude

MARTES 23 DIC 2025

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

Algodora Caude

MIERCOLES 24 DE DIC 2025

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

Algodora Caude

JUEVES 25 DIC 2025 Festivo

VIERNES 26 DIC 2025

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

Algodora Caude

SHABADO 27 DIC 2025

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

Algodora Caude

DOMINGO 28 DIC 2025 DESCANSO

Norma

⑤ sobre muros resacados, lijado, armado de andamio, asco general. Alejandro Caude

Jueves 11 - Dic - 2025.

Armado de andamio, lijado de muros, corrección detalles de estuco. Alejandro Caude

VIERNES 12 - Dic - 2025.

Armado de andamio, detalle de distribuciones Fachada Occidental o de ingreso, asco general. Alejandro Caude

SABADO 13 - Dic - 2025.

Armado andamio, detalles Fachada Occidental con estuco plástico, lijado, asco general. Alejandro Caude

DOMINGO 14 - Dic - 2025

Descanso personal operativo.

LUNES 15 - Dic - 2025.

Armado de andamio, aplicación de Keros azul en muros, asco general. Alejandro Caude

Norma

VIERNES 05 DE DICIEMBRE 2025.

Aplicación de estuco Fachada, oriental y
Fachada sur. Alejandra Caude

2500-310-12-2000

SABADO 06 DIC-2025.

Lavado con agua y jabón, lijado de
fachada exterior o perimetral donde está
la reja, para retirar grasa y pintura
desprendida. Alejandra Caude

DOMINGO 07 DIC-2025.

Descanso personal 500-310-12-2000 Alejandra Caude

LUNES 08 DIC-2025.

Festivo Descanso personal Alejandra Caude

MARTES 09 DIC-2025.

Aplicación de estuco plástico sobre muros
re-mojados, Aplicación primera mano de
Korosa azul, Fachada sur. Alejandra Caude

MIÉRCOLES 10 DIC-2025.

Continúa aplicación de estuco plástico

Norma

③

DOMINGO 30 NOV - 2025

Descanso personal. Alejandro Caude.

LUNES 01 DIC. 2025.

Armado de andamio, lijado de fachada.
Aseo general. Alejandro Caude.

MARTES 02 DIC. 2025.

Armado de andamio, aplicación de estuco.
en muros, aseo general. Alejandro Caude

MIÉRCOLES 03 DIC. 2025.

Armado de andamios, aplicación de estuco
fachada occidental, limpieza de canal
perimetral, aseo general. Alejandro Caude.

JUEVES 04 DIC. 2025.

Armado de andamio parte exterior sobre
el orden o vía pública para resanar la
parte exterior de la fachada occidental,
raspado de toda la fachada exterior o
perimetral donde esta la rga, cerramiento
con colombines y ciuita. Alejandro Caude

Norma

⑥ MARTES 16 DIC-2025.

Armado andamio, corrección detalles,
aplicación segunda mano de Koraza
Pachada sur. **Alejandro Caude**

MIÉRCOLES 17 DIC-2025.

Armado de andamio, corrección de dilataciones
Pachada oriental, sur y occidental.
Aplicación de Koraza. **Alejandro Caude**

JUEVES 18 DIC-2025.

Armado de andamio, aplicación de Koraza,
aseo general. **Alejandro Caude**

VIERNES 19 DIC-2025.

Corrección detalles pintura Koraza, aseo
general. **Alejandro Caude**

SÁBADO 20 DIC-2025.

Aseo general. **Alejandro Caude.**

⑧ VIERNES 26 DIC-2025.
Curado de placa. Alexandra Cande

SABADO 27 DIC-2025
Curado de placa. Alexandra Cande

DOMINGO 28 -DIC-2025.
DESCANSO.

LUNES 29 DIC -2025.
Curado de placa. Alexandra Cande

MARTES 30 DIC 2025
Curado de placa. Alexandra Cande


MIERCOLES 31 DIC -2025.
Curado de placa. Alexandra Cande

JUEVES 01 ENERO 2026
Curado de placa. Alexandra Cande

VIERNES 02 ENERO 2025.
Curado de placa. Alexandra Cande

Norma


Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración
1				Charry				67 días
2			9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1	M	6,90	\$ 3.182.915,00	4 días
3			NP	INSTALACIÓN DE ESCOTILLA	UN	1,00	\$ 1.500.000,00	3 días
4			13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	120,00	\$ 14.787.000,00	5 días
5			1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	120	\$ 4.446.000,00	10 días
6			P-004-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM COLOR OPAL CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE FIJACIONES, SELLOS DE HERMETICIDAD, CONECTOR OMEGAL BASE DE ALUMINIO, CONECTOR TAPA CRISTAL, U DE REMATE DE ALVEOLO, CINTA ANTIDUST MICROPERFORADA AN	M2	120	\$ 37.418.751,29	15 días
7			P-003-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES ESTRUCTURALES CERTIFICADOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 5.000 LBF (22.2 KN), DISEÑADOS PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJOS EN ALTURAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN COL	UNIDAD	16	\$ 9.713.170,71	2 días
8			NP	INSTALACIÓN LINEA DE VIDA VERTICAL	UNIDAD	1	\$ 7.500.000,00	2 días
9			18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	656	\$ 3.083.856,00	1 día

Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2026	ene	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may
lun 16/02/26	sáb 25/04/26								
lun 16/02/26	jue 19/02/26								
jue 19/02/26	lun 23/02/26	2							
mar 10/03/26	sáb 14/03/26	3FC+15 días							
mié 25/03/26	sáb 4/04/26	4FC+10 días							
sáb 4/04/26	mar 21/04/26	5							
mar 21/04/26	mié 22/04/26	6							
mié 22/04/26	vie 24/04/26	7							
vie 24/04/26	sáb 25/04/26	8							

Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración																																										
11			18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	194,00	\$ 911.994,00	1 día																																										
<div>Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26</div> <table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>solo duración</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td>Progreso manual</td><td></td></tr><tr><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>solo el comienzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hito inactivo</td><td></td><td>solo fin</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas		División		Tarea manual		Hito externo		Hito		solo duración		Fecha límite		Resumen		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual		Tarea inactiva		solo el comienzo				Hito inactivo		solo fin			
									Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas																																					
									División		Tarea manual		Hito externo																																					
									Hito		solo duración		Fecha límite																																					
									Resumen		Informe de resumen manual		Progreso																																					
									Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual																																					
									Tarea inactiva		solo el comienzo																																							
Hito inactivo		solo fin																																																
Página 2																																																		

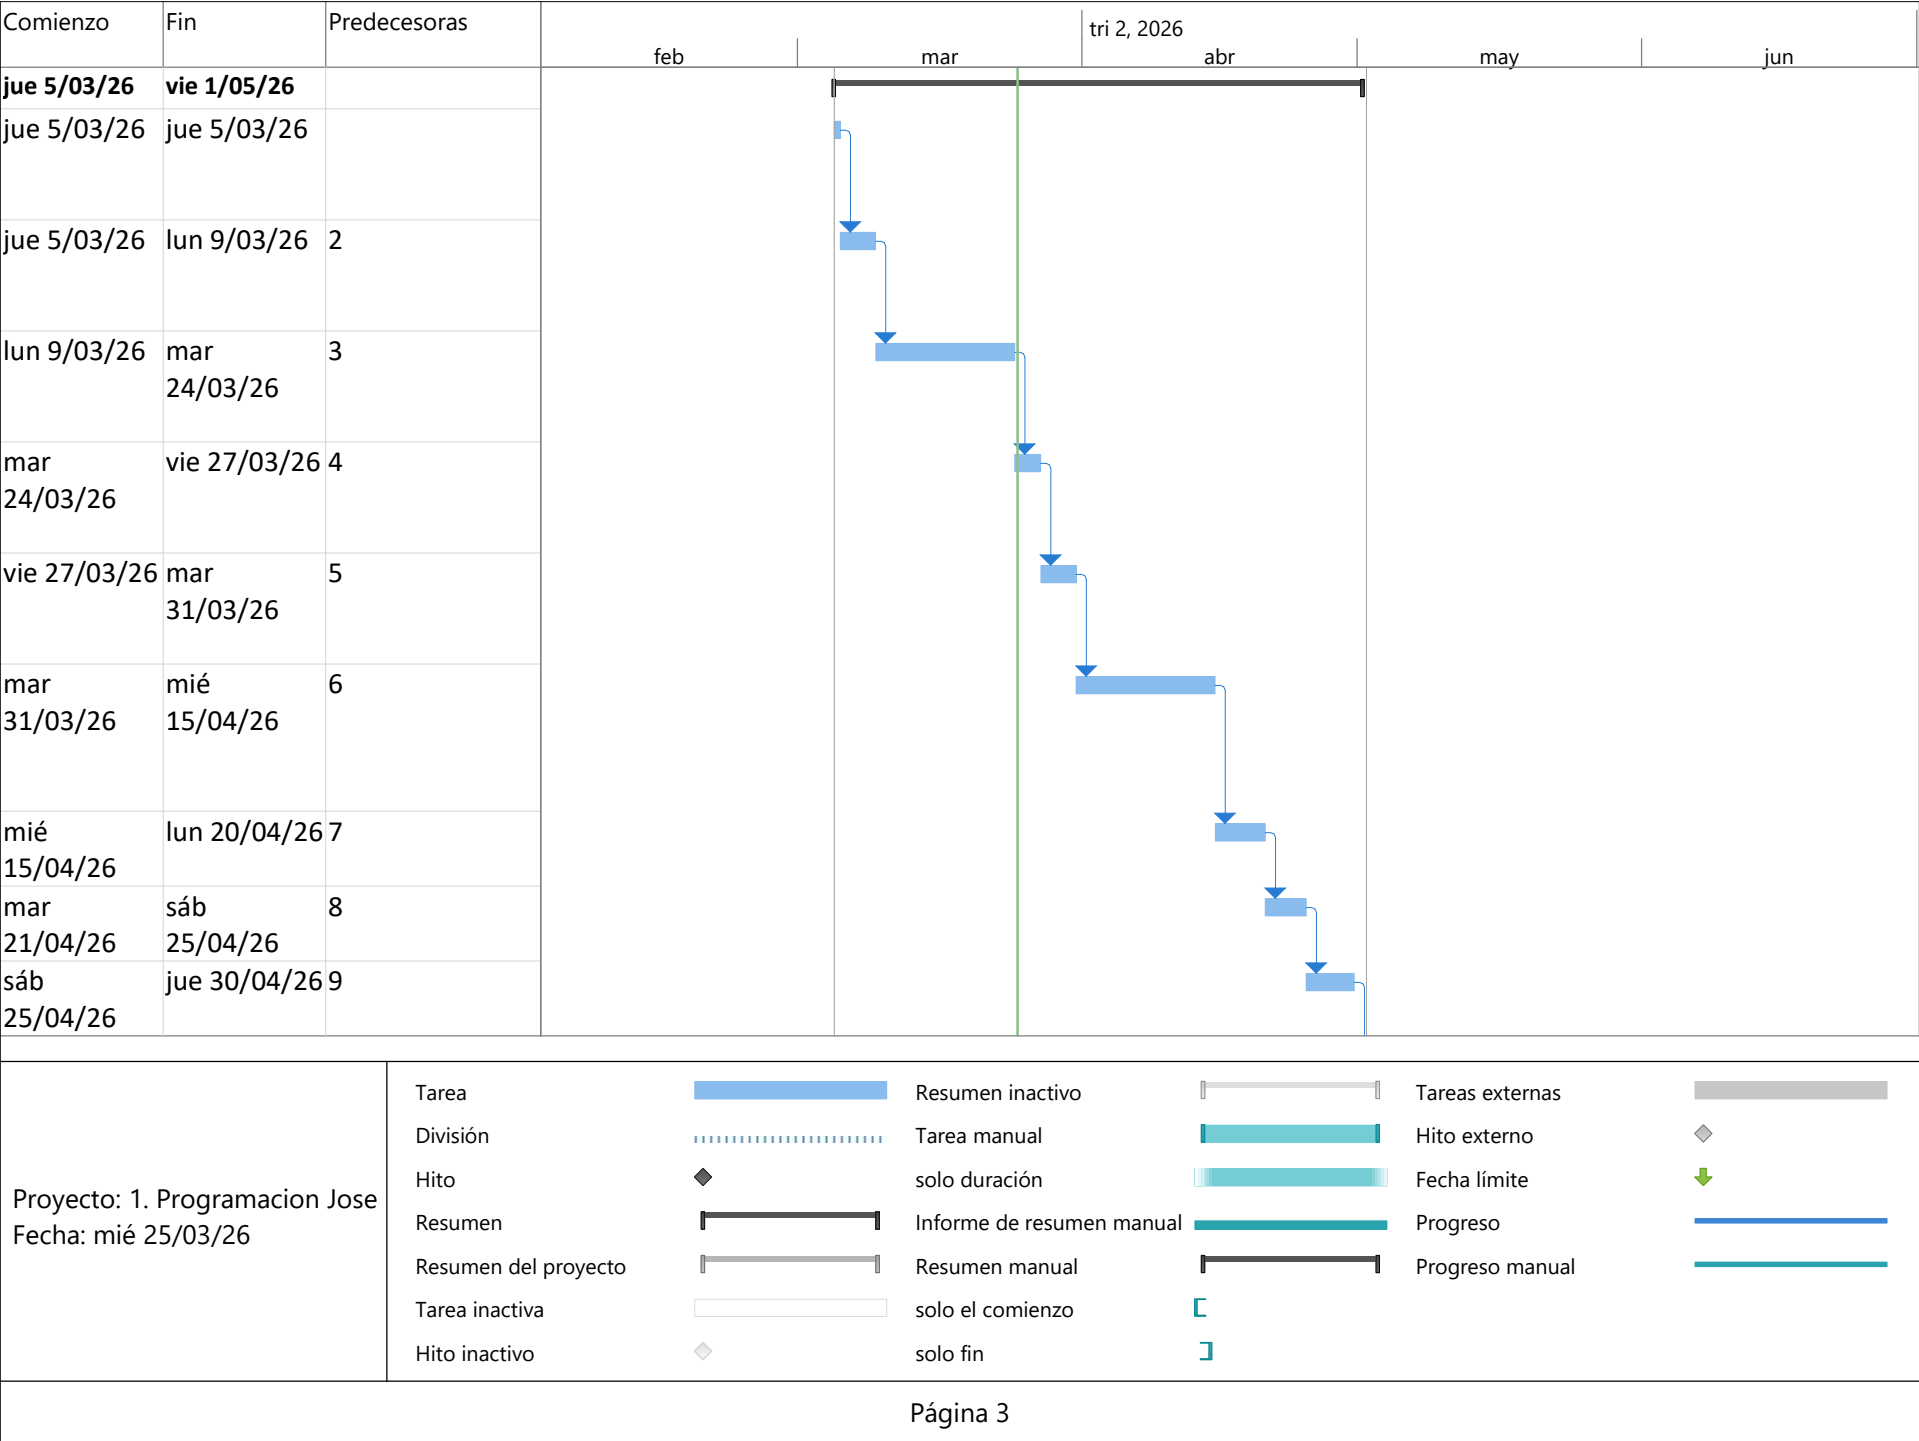


Comienzo	Fin	Predecesoras	<div> <div>feb</div> <div>mar</div> <div>tri 2, 2026</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> </div>			
jue 30/04/26	vie 1/05/26	10				

<div> <div>Proyecto: 1. Programacion Jose</div> <div>Fecha: mié 25/03/26</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL
1			Republica China			
2			Parqueadero			
3		1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfálticas y placas de cancha se debe	M2	500	\$ 3.550.500,00
4		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	20,00	\$ 3.119.680,00
5		1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	20	\$ 48.880,00
6		1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	90,00	\$ 1.496.160,00
7		1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	245,04	\$ 18.005.539,00
8		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	74,00	\$ 6.862.242,00
9		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	63,00	\$ 11.794.986,00
10		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	510,00	\$ 3.651.600,00
11		7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A	M2	160,00	\$ 23.271.200,00

--

Proyecto: Programacion Repub Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL
21		1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	90,00	\$ 6.613.200,00
22		4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	69,60	\$ 10.628.338,00
23		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCs 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	30,00	\$ 2.769.960,00
24		4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	6,00	\$ 5.298.294,00
25		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC	M2	90,00	\$ 3.334.500,00
26		16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	90,00	\$ 24.876.810,00
27		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	5,00	\$ 936.110,00
28		2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	90,00	\$ 11.031.570,00
29		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	90	\$ 20.149.560,00
30		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	60,00	\$ 5.513.460,00
31		1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	85,00	\$ 904.825,00
32		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	500,00	\$ 2.350.500,00

--	--

<div> <div>Proyecto: Programacion Repub</div> <div>Fecha: mié 25/03/26</div> </div>	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	<div> <div>feb '26</div> <div>1 8 15 22</div> <div>mar '26</div> <div>1 8 15 22</div> <div>abr '26</div> <div>5 12 19 26</div> <div>ma</div> <div>3</div> </div>
64 días	vie 20/02/26	mar 28/04/26			
64 días	vie 20/02/26	mar 28/04/26			
1 día	vie 20/02/26	sáb 21/02/26			
2 días	sáb 21/02/26	lun 23/02/26	3		
2 días	sáb 21/02/26	lun 23/02/26	4CC		
2 días	sáb 21/02/26	lun 23/02/26	4CC		
5 días	sáb 21/02/26	jue 26/02/26	6CC		
5 días	mié 4/03/26	lun 9/03/26	7FC+5 días		
10 días	lun 9/03/26	jue 19/03/26	8		
4 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26	9		
4 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	10		

--

<div> <div>Proyecto: Programacion Repub</div> <div>Fecha: mié 25/03/26</div> </div>	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	feb '26 1 8 15 22	mar '26 1 8 15 22	abr '26 5 12 19 26	may '26 3 10 17 24
3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	11					
5 días	sáb 11/04/26	vie 17/04/26	11FC+15 días					
4 días	mar 31/03/26	vie 3/04/26	11FC+3 días					
15 días	mar 7/04/26	mié 22/04/26	11FC+10 días					
3 días	mié 22/04/26	sáb 25/04/26	15					
5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	15					
15 días	mar 7/04/26	mié 22/04/26	11FC+10 días					
5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	7FC+10 días					
33 días	lun 9/03/26	sáb 11/04/26						

Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	feb '26	mar '26	abr '26	ma
					1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3
4 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26	9CC					
4 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	21					
4 días	mar 17/03/26	sáb 21/03/26	22					
4 días	sáb 21/03/26	mié 25/03/26	23					
5 días	mié 25/03/26	mar 31/03/26	24					
4 días	mar 31/03/26	vie 3/04/26	25					
4 días	sáb 21/03/26	mié 25/03/26	23					
3 días	mié 25/03/26	sáb 28/03/26	27					
4 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	28;26					
2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26	29					
1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	30					
1 día	vie 10/04/26	sáb 11/04/26	31					

--

<div> <div>Proyecto: Programacion Repub</div> <div>Fecha: mié 25/03/26</div> </div>	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo
1				Jose Asunción Silva				55 días	lun 23/02/26
2			8.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	11,25	\$ 2.656.418,00	10 días	lun 23/02/26
3			13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,00	\$ 138.611,00	4 días	mié 4/03/26
4			4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	\$ 767.010,00	4 días	lun 16/03/26
5			4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	10,00	\$ 798.540,00	4 días	vie 20/03/26
6			9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,41	\$ 2.042.394,00	2 días	mar 24/03/26
7			NP 002	REALIZAR CCTV TUBERIA AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUAL	UN	1,00	\$ 16.607.042,55	4 días	jue 26/03/26
8			4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	120,00	\$ 9.523.800,00	3 días	mar 31/03/26
9			10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4	\$ 142.792,00	3 días	jue 2/04/26

Proyecto: Programacion Jose A

Fecha: mié 25/03/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo
10			4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	\$ 767.010,00	8 días	lun 6/04/26
11			4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	150,00	\$ 841.500,00	4 días	mar 14/04/26
12			18.1.1	ASEO FINAL	M2	300,00	\$ 1.410.300,00	2 días	sáb 18/04/26

Proyecto: Programacion Jose A
Fecha: mié 25/03/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual













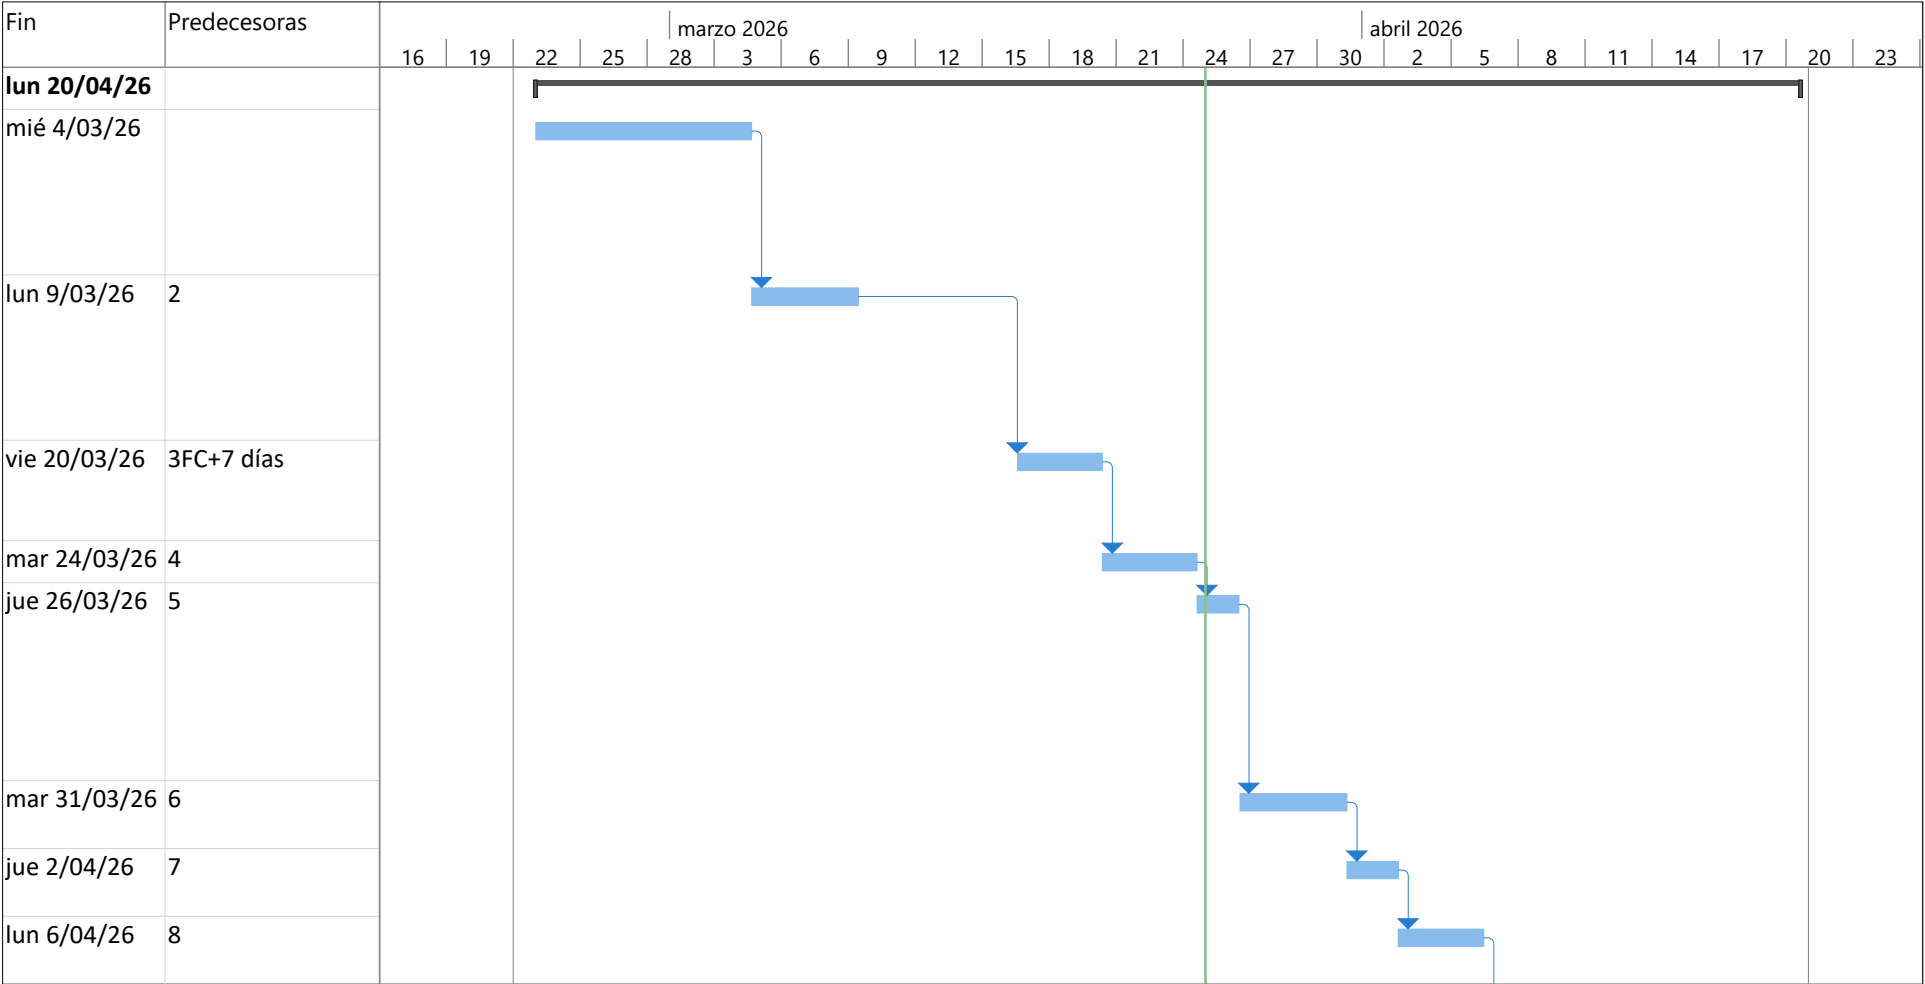

Proyecto: Programacion Jose A Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

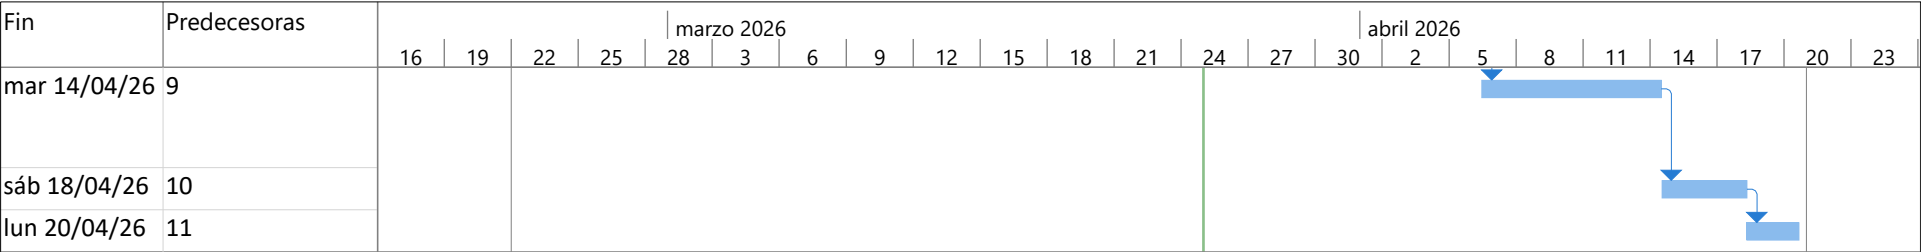

Proyecto: Programacion Jose A Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin
1				Manuela Beltran				90 días	jue 29/01/26	vie 1/05/26
2			1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfálticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	224,35	\$ 1.593.109,00	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26
3			1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	38,77	\$ 6.047.500,00	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26
4			1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	90,20	\$ 220.449,00	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26
5			1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	180,00	\$ 6.669.000,00	8 días	vie 30/01/26	sáb 7/02/26

Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin
6			1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	7,20	\$ 240.797,00	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
7			1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,40	\$ 426.672,00	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
8			1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	190,00	\$ 5.198.970,00	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
9			1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	20,00	\$ 158.880,00	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
10			1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	143,52	\$ 4.715.780,00	5 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26
11			1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	215,00	\$ 15.798.200,00	10 días	sáb 14/02/26	mié 25/02/26
12			2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	86,00	\$ 1.854.660,00	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26

Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin
13			2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30	\$ 5.616.660,00	4 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26
14			2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	300,00	\$ 2.194.200,00	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26
15			2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	500,00	\$ 3.580.000,00	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26
16			2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	230,00	\$ 28.191.790,00	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26
17			2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	2,60	\$ 3.450.161,00	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26
18			15.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, A	UN	4,00	\$ 898.832.604,00	40 días	lun 16/03/26	sáb 25/04/26
19			7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	168,00	\$ 7.223.328,00	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
20			7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	172,00	\$ 24.993.664,00	2 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26

Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD1	CANTIDAD1	COSTO TOTAL	Duración	Comienzo	Fin
21			7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	85,00	\$ 2.191.980,00	1 día	jue 30/04/26	vie 1/05/26
22			18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230,00	\$ 1.081.230,00	1 día	vie 1/05/26	vie 1/05/26

Proyecto: 1. Programacion Jose
Fecha: mié 25/03/26

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual














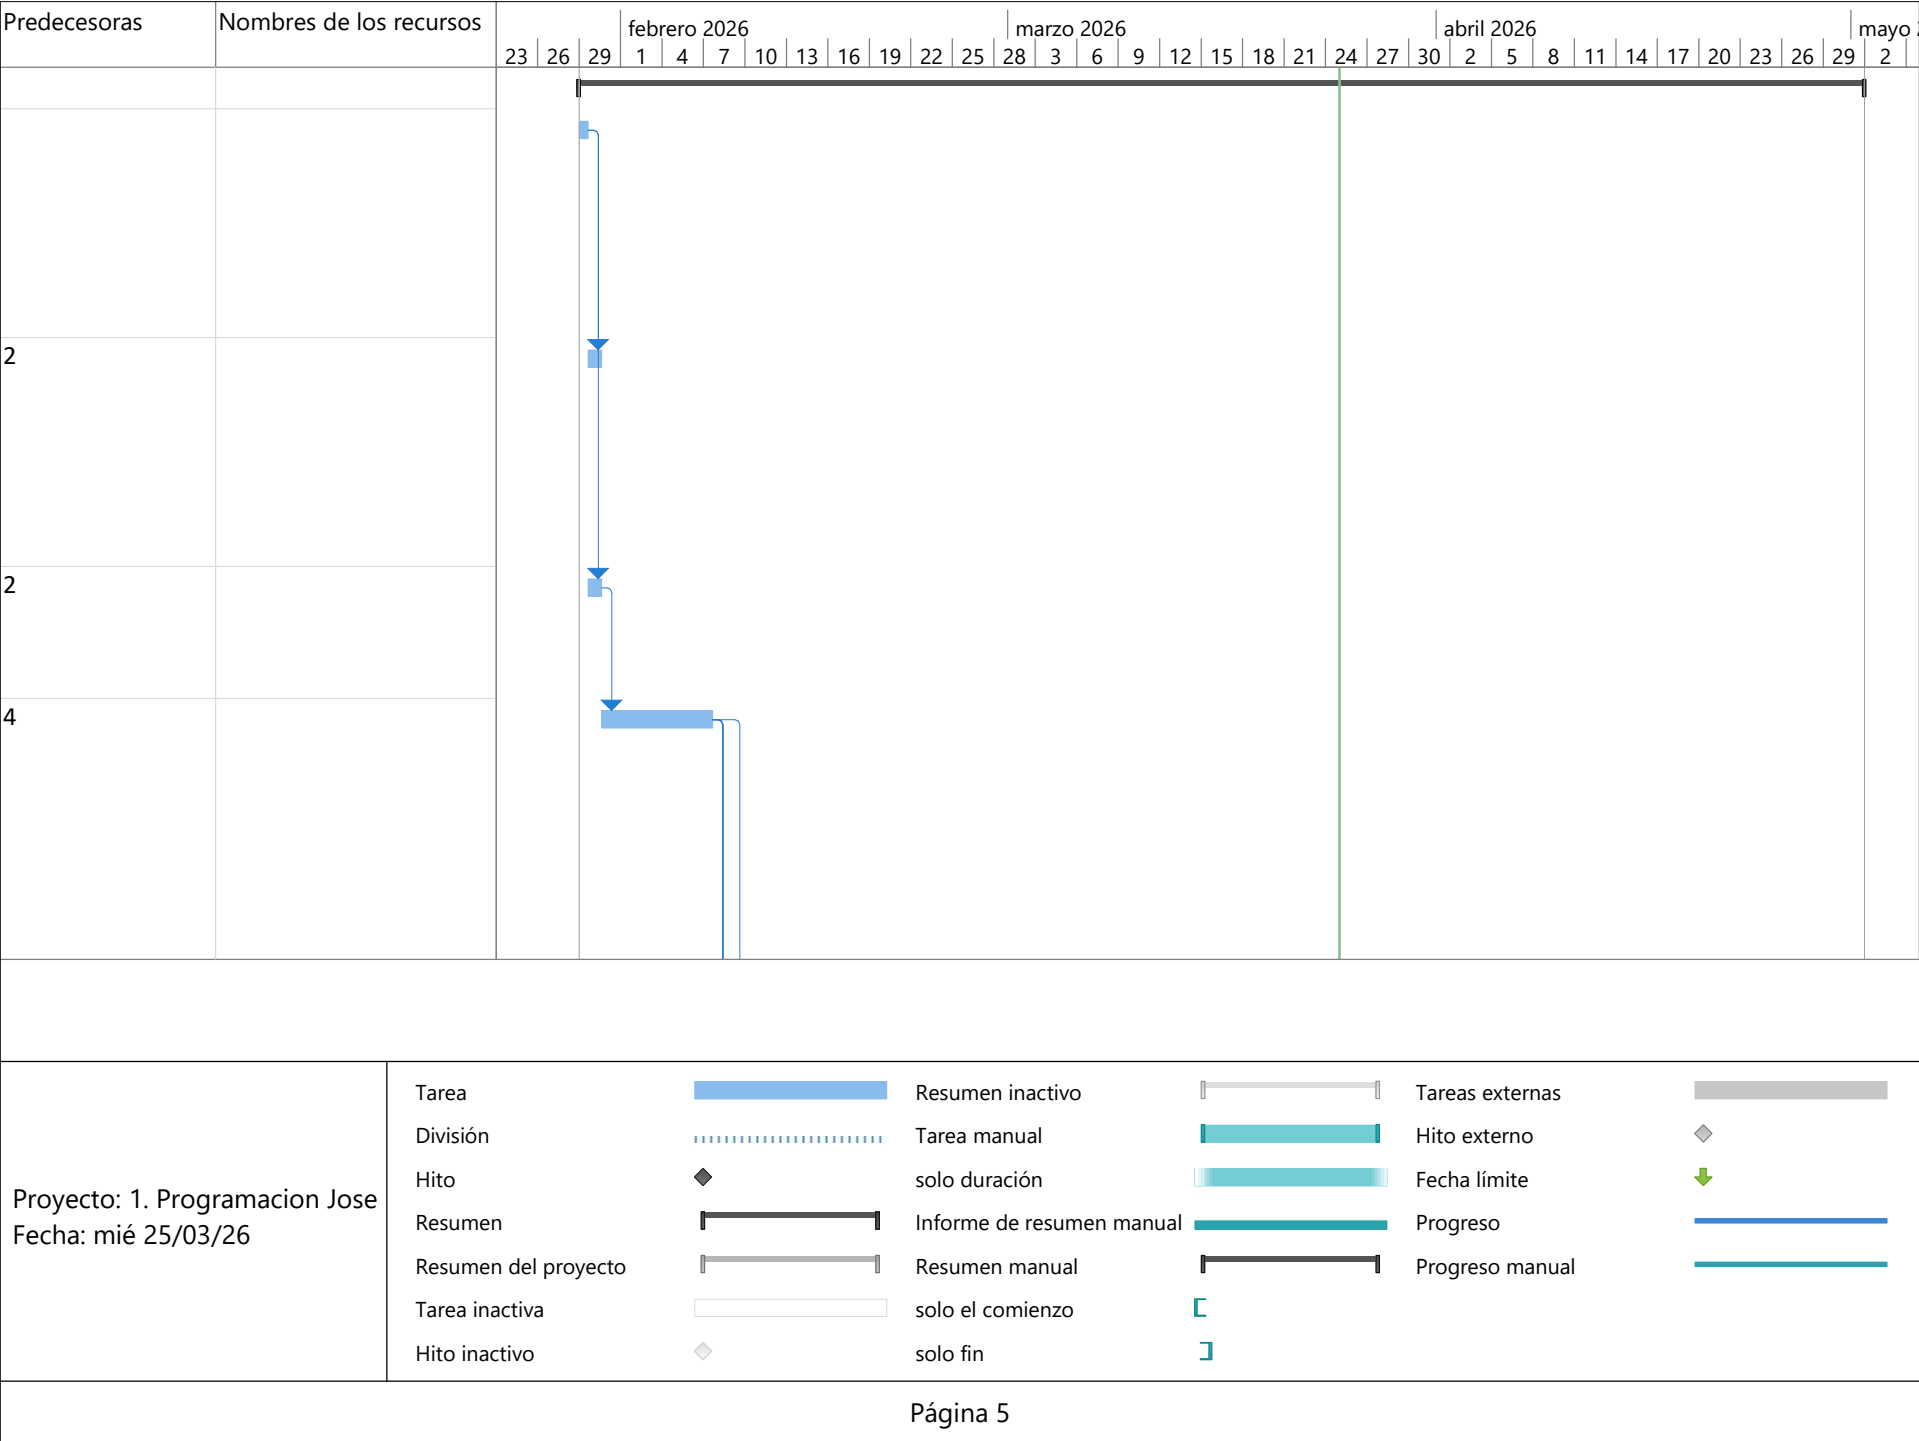

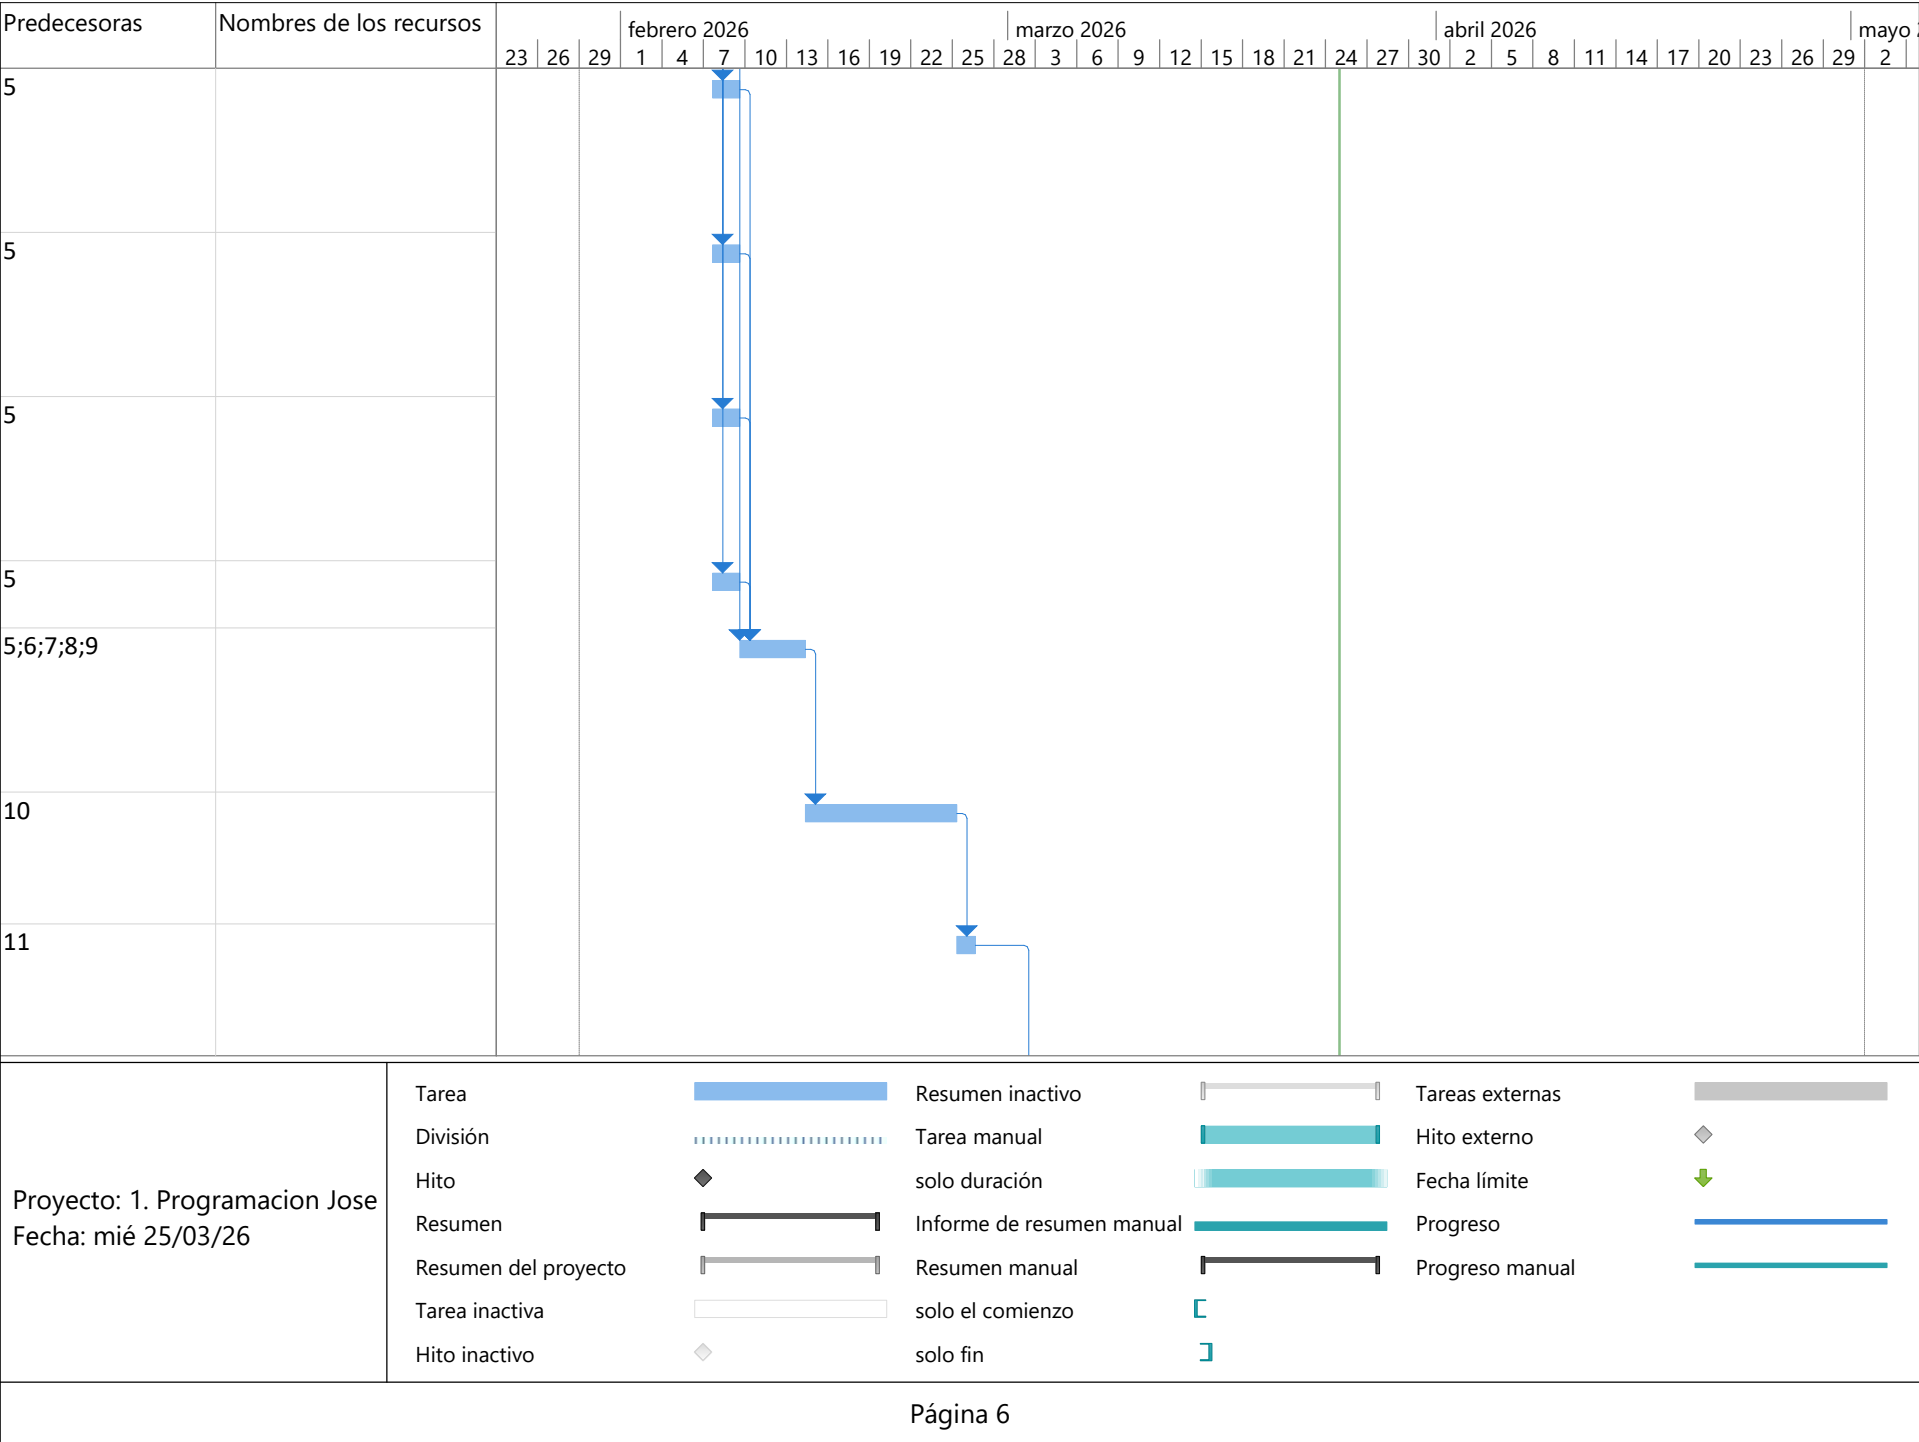

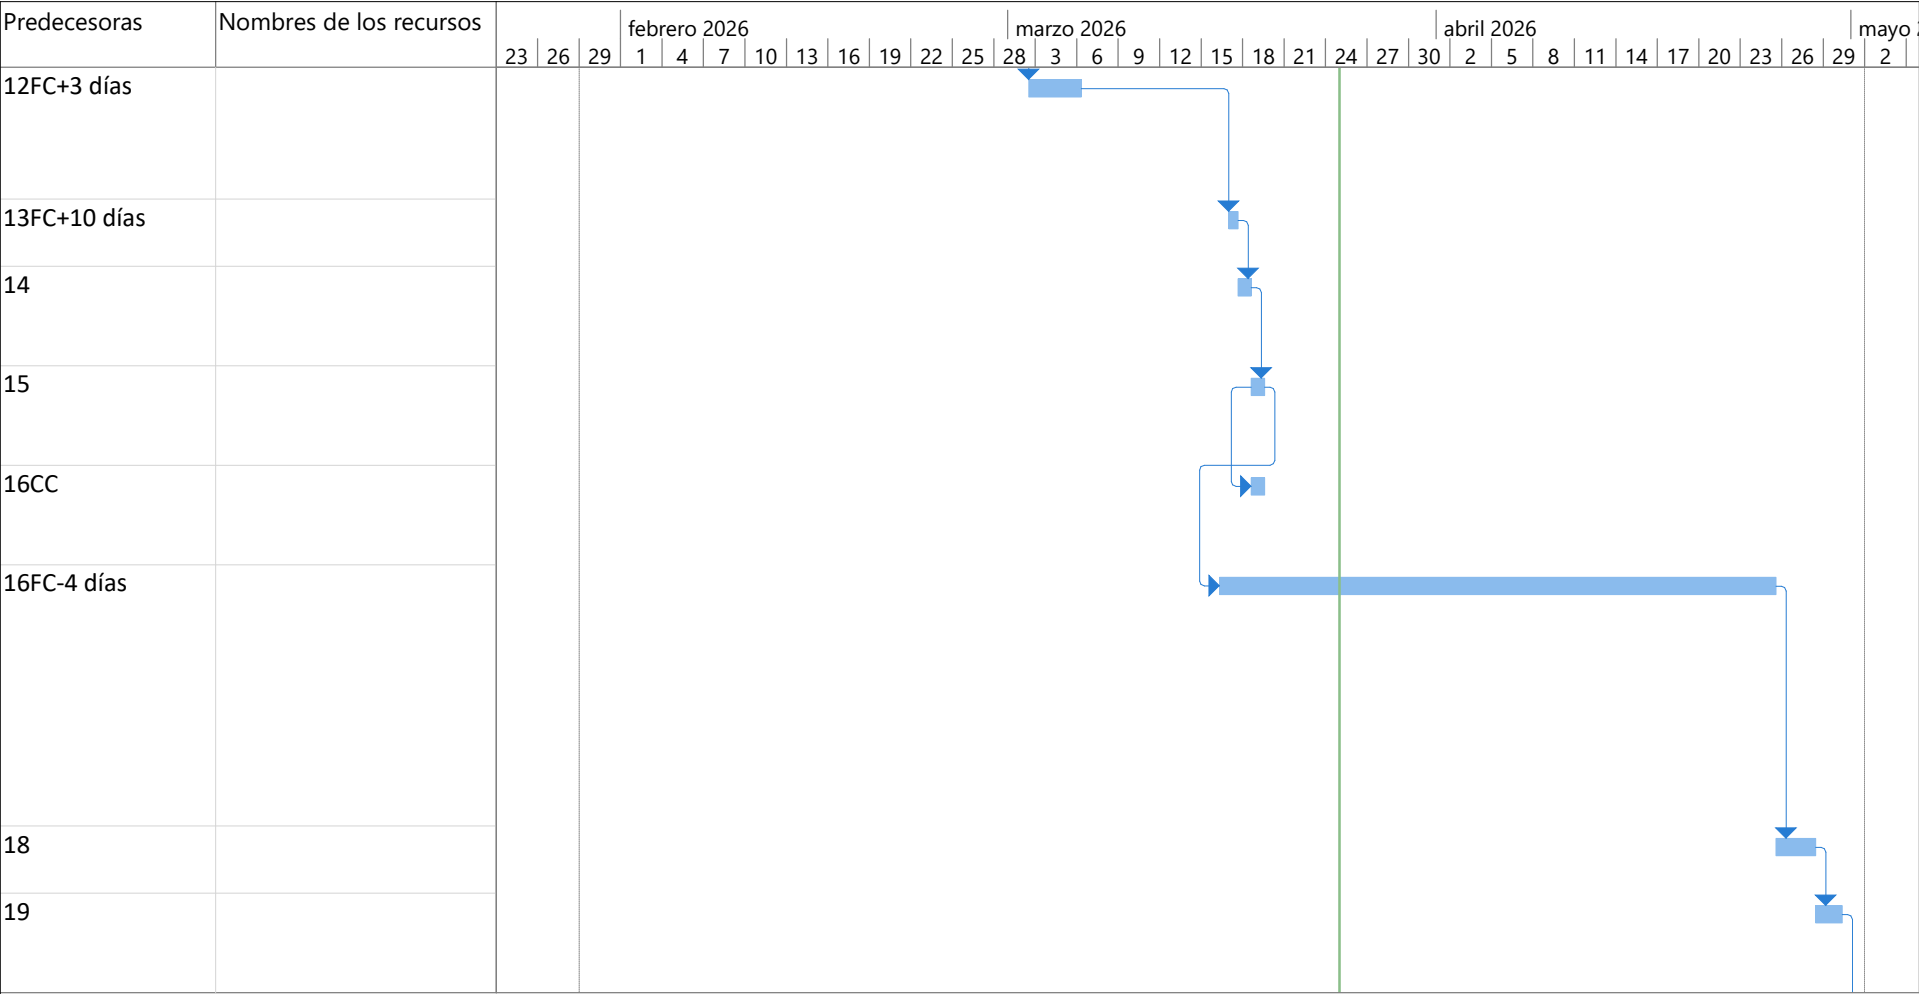

Proyecto: 1. Programacion Jose Fecha: mié 25/03/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
