


PRESUPUESTO DE PROYECTO																			
Nº.	COD. PROYECTO	CIV.	ESTADO	RUBRO	UPC	K/R VIAL	SECTOR	HECTA	AREA DECAL	DESCRIPC.	LONGITUD DEL ENCAMPO	ANCHO DEL ENCAMPO	AREA DEL ENCAMPO	PROF. ANTERIOR EN CAMPO	AREA ANTERIOR EN CAMPO	ANCHO EQUIVADO	ANCHO DERECHO	COSTO OBRAS PUBLICAS	COSTO TOTAL DE INVENTARIO
1	N1	8009428	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	KR 77W	CL 50 S	CL 50BIS S	114.3	0.0305	31.3	3.9	122.07	1.2	37.56	\$ 27,646,081.00	\$ 27,646,081.00	\$ 55,292,162.00	\$ 410,937,694.84
2	N2	8007237	SIN EJECUTAR	HIPOTECHO SUR	AMERICAS	KR 68BIS	CL 4 S	CL 8 S	506.61	0.1351	81.5	6.2	506.3	1.2	97.8	\$ 73,384,015.00	\$ 73,384,015.00	\$ 146,768,030.00	\$ 874,185,420.92
3	N3	8009327	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	KR 77XBISA	CL 48A S	CL 49 S	277.2	0.0739	55.5	5	277.5	1.3	72.15			\$ 0.00	\$ 533,782,191.01
4	N4	8006945	SIN EJECUTAR	HIPOTECHO SUR	AMERICAS	KR 68ABIS	CL 1 S	CL 3 S	374.24	0.0998	102	4	408	1.5	153	\$ 96,868,783.00	\$ 96,868,783.00	\$ 193,737,566.00	\$ 831,591,530.14
5	N5	8006739	SIN EJECUTAR	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KENNEDY CENTRAL	CL 38B S	KR 78B	KR 78C	196.47	0.0524	39.2	5	196	3	117.8	\$ 54,691,901.00	\$ 54,691,901.00	\$ 109,383,802.00	\$ 417,780,008.57
6	N6	8009556	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	KR 77V	CL 46B S	CL 47A S	310.11	0.0827	78.8	4	315.2	1.2	94.56	\$ 68,363,269.00	\$ 68,363,269.00	\$ 136,726,538.00	\$ 624,089,487.58
7	N7	8006953	SIN EJECUTAR	HIPOTECHO SUR	AMERICAS	KR 69C	CL 2 S	CL 3 S	497.83	0.1328	70.5	6	423	2.2	155.1			\$ 0.00	\$ 680,633,750.92
8	N8	8006610	SIN EJECUTAR	HIPOTECHO SUR	AMERICAS	CL 2 S	KR 69C	KR 69D	209.02	0.0557	34.7	6	208.2	2	69.4			\$ 0.00	\$ 261,327,303.03
9	N9	8006814	SIN EJECUTAR	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KENNEDY CENTRAL	CL 40A S	KR 78H	KR 78I	328.63	0.0876	41.3	4	165.2	1.3	53.69			\$ 0.00	\$ 83,328,216.24
10	N10	8007134	SIN EJECUTAR	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KENNEDY CENTRAL	TV 78A	CL 40 S	CL 40B S	300.38	0.0801	38.2	5	191	2.5	95.5			\$ 0.00	\$ 328,070,099.15
11	N11	8009456	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	KR 77VBISB	CL 49 S	CL 50 S	245.38	0.0654	46.7	5.8	270.88	1.2	56.04			\$ 0.00	\$ 443,874,344.20
12	N12	8009473	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	KR 77VBISB	CL 48A S	CL 49 S	314.88	0.0840	54.5	5.8	316.1	1.2	65.4			\$ 0.00	\$ 459,478,153.91
13	N13	8009022	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	CL 43A S	KR 78	KR 78A	122.38	0.0326	33.5	3.4	113.9	1.2	40.2	\$ 30,457,337.00	\$ 30,457,337.00	\$ 60,914,674.00	\$ 272,730,028.03
14	N14	8006916	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	CL 43A S	KR 78A	KR 78B	105.25	0.0281	36	3.5	126	1.2	43.2	\$ 31,593,312.00	\$ 31,593,312.00	\$ 63,186,624.00	\$ 256,945,090.80
15	N15	8008802	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	CL 43A S	KR 78B	KR 78C	112.42	0.0300	34.2	3.6	123.12	1.2	41.04	\$ 30,817,960.00	\$ 30,817,960.00	\$ 61,635,920.00	\$ 286,000,481.98
16	N16	8008713	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	KR 78C	CL 43BIS S	CL 43A S	115.5	0.0308	46.7	3.4	158.78	2.4	112.08	\$ 56,195,879.00	\$ 56,195,879.00	\$ 112,391,758.00	\$ 416,410,359.89
17	N17	8008803	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	KR 78B	CL 43BIS S	CL 43A S	116.53	0.0311	42	3	126	2.6	109.2	\$ 52,229,932.00	\$ 52,229,932.00	\$ 104,459,864.00	\$ 363,931,077.36
18	N18	8008842	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	KR 78B	CL 43A S	CL 44 S	112.39	0.0300	33.6	3	100.8	2.5	84	\$ 42,012,360.00	\$ 42,012,360.00	\$ 84,024,720.00	\$ 291,938,366.07
19	N19	8008888	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	KR 78B	CL 44 S	CL 45 S	176.93	0.0472	59.2	3	177.6	2.5	148	\$ 72,118,515.00	\$ 72,118,515.00	\$ 144,237,030.00	\$ 491,294,165.51
20	N20	8008792	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	KR 78C	CL 44 S	CL 45 S	233.79	0.0623	71.7	3.3	236.61	2.6	186.42	\$ 88,997,662.00	\$ 88,997,662.00	\$ 177,995,324.00	\$ 601,739,478.03
21	N21	8008743	SIN EJECUTAR	TOCAREMA	TIMIZA	KR 78C	CL 43A S	CL 44 S	111.09	0.0296	34.6	3.7	128.02	2.4	83.04	\$ 42,058,710.00	\$ 42,058,710.00	\$ 84,117,420.00	\$ 318,045,205.56
22	N22	8008637	SIN EJECUTAR	TIMIZA B	TIMIZA	CL 40 H SUR	KR 73 C	KR 74	73.3	0.0195	12	3	36	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,963,725.80
23	N23	8008582	SIN EJECUTAR	TIMIZA B	TIMIZA	KR 74	TV 74	Sin Elementos	314.87	0.0840	120.2	3	360.6	0	0	\$ 65,158,545.00	\$ 65,158,545.00	\$ 130,317,090.00	\$ 579,186,869.71
24	N24	8007698	SIN EJECUTAR	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CARVAJAL	KR 72QBIS	CL 37C S	CL 38 S	446.52	0.1191	62.5	7	437.5	4	250			\$ 0.00	\$ 1,163,262,044.83
25	N25	8008350	SIN EJECUTAR	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	AMERICAS	KR 69A	CL 24 S	CL 25 S	1158.29	0.3089	163.2	7	1142.4	2.5	408			\$ 0.00	\$ 1,516,900,096.41
26	N26	8010914	SIN EJECUTAR	LA CAMPINA	CARVAJAL	CL 39 S	TV 72F	KR 72FBIS	635.73	0.1695	85.5	7	596.5	4.5	384.75	\$ 150,732,541.00	\$ 150,732,541.00	\$ 301,467,082.00	\$ 1,308,608,426.52
27	N27	8010695	SIN EJECUTAR	LA CAMPINA	CARVAJAL	CL 39 S	KR 72FBIS	KR 72FBISA	423.73	0.1130	60.5	7	423.5	4	242			\$ 0.00	\$ 614,827,383.51
28	N28	8009549	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	CL 47A S	KR 77U	KR 77W	184.79	0.0493	46	4	184	2.8	128.8			\$ 0.00	\$ 411,892,966.29
29	N29	8010626	SIN EJECUTAR	NEUEVA YORK	CARVAJAL	TV 68BIS	CL 39A S	CL 39B S	253.97	0.0677	34.5	7	241.5	5	172.5			\$ 0.00	\$ 475,286,868.41
30	N30	8009019	SIN EJECUTAR	TIMIZA	TIMIZA	KR 72PBIS	KR 72 Q	CL 40C S	194.13	0.0518	35.5	6	213	2	71			\$ 0.00	\$ 346,409,158.24
31	N31	8008835	SIN EJECUTAR	TIMIZA	TIMIZA	CL 41B SUR	TV 74	CL 41A S	660.93	0.1762	89.45	7.5	670.88	0	0			\$ 0.00	\$ 794,976,605.02
32	N32	8008578	SIN EJECUTAR	TIMIZA	TIMIZA	CL 41B SUR	CL 41A S	KR 75A BIS	290.01	0.0773	36.8	7.5	276	0	0			\$ 0.00	\$ 351,751,928.62
33	N33	8008465	SIN EJECUTAR	TIMIZA	TIMIZA	CL 41B SUR	KR 75A BIS	TV 78	508.1	0.1355	94.5	5.7	538.65	0	0			\$ 0.00	\$ 261,773,290.39
34	N34	8008128	SIN EJECUTAR	TIMIZA	TIMIZA	CL 41B SUR	TV 78	KR 78B	254.13	0.0678	51.5	5	257.5	2	103			\$ 0.00	\$ 195,417,785.67
35	N35	8009192 EXCLUIDO RUCO ESTADO	SIN EJECUTAR	VALLADOLID	CASTILLA	CL 8A	KR 81B	KR 81C	230.58	0.0615	33.5	7	234.5	4	134			\$ 0.00	\$ 0.00
36	N36	8009623 INCLUIDO	SIN EJECUTAR	JACQUELINE	TIMIZA	CL 47A	KR 77U	KR 77V		0.0000	31.82	4.49	142.87		0			\$ 0.00	\$ 254,864,425.56
																			\$ 3,966,655,604.00

		EJECUCION
		TERMINADA
		SIN EJECUTAR


JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

COSTO SEGMENTOS		\$ 17,827,133,983.72
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA)		\$ 285,447,701.00
RUBRO DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		\$ 1,503,904,503.26
TOTAL		\$ 19,616,486,188.98

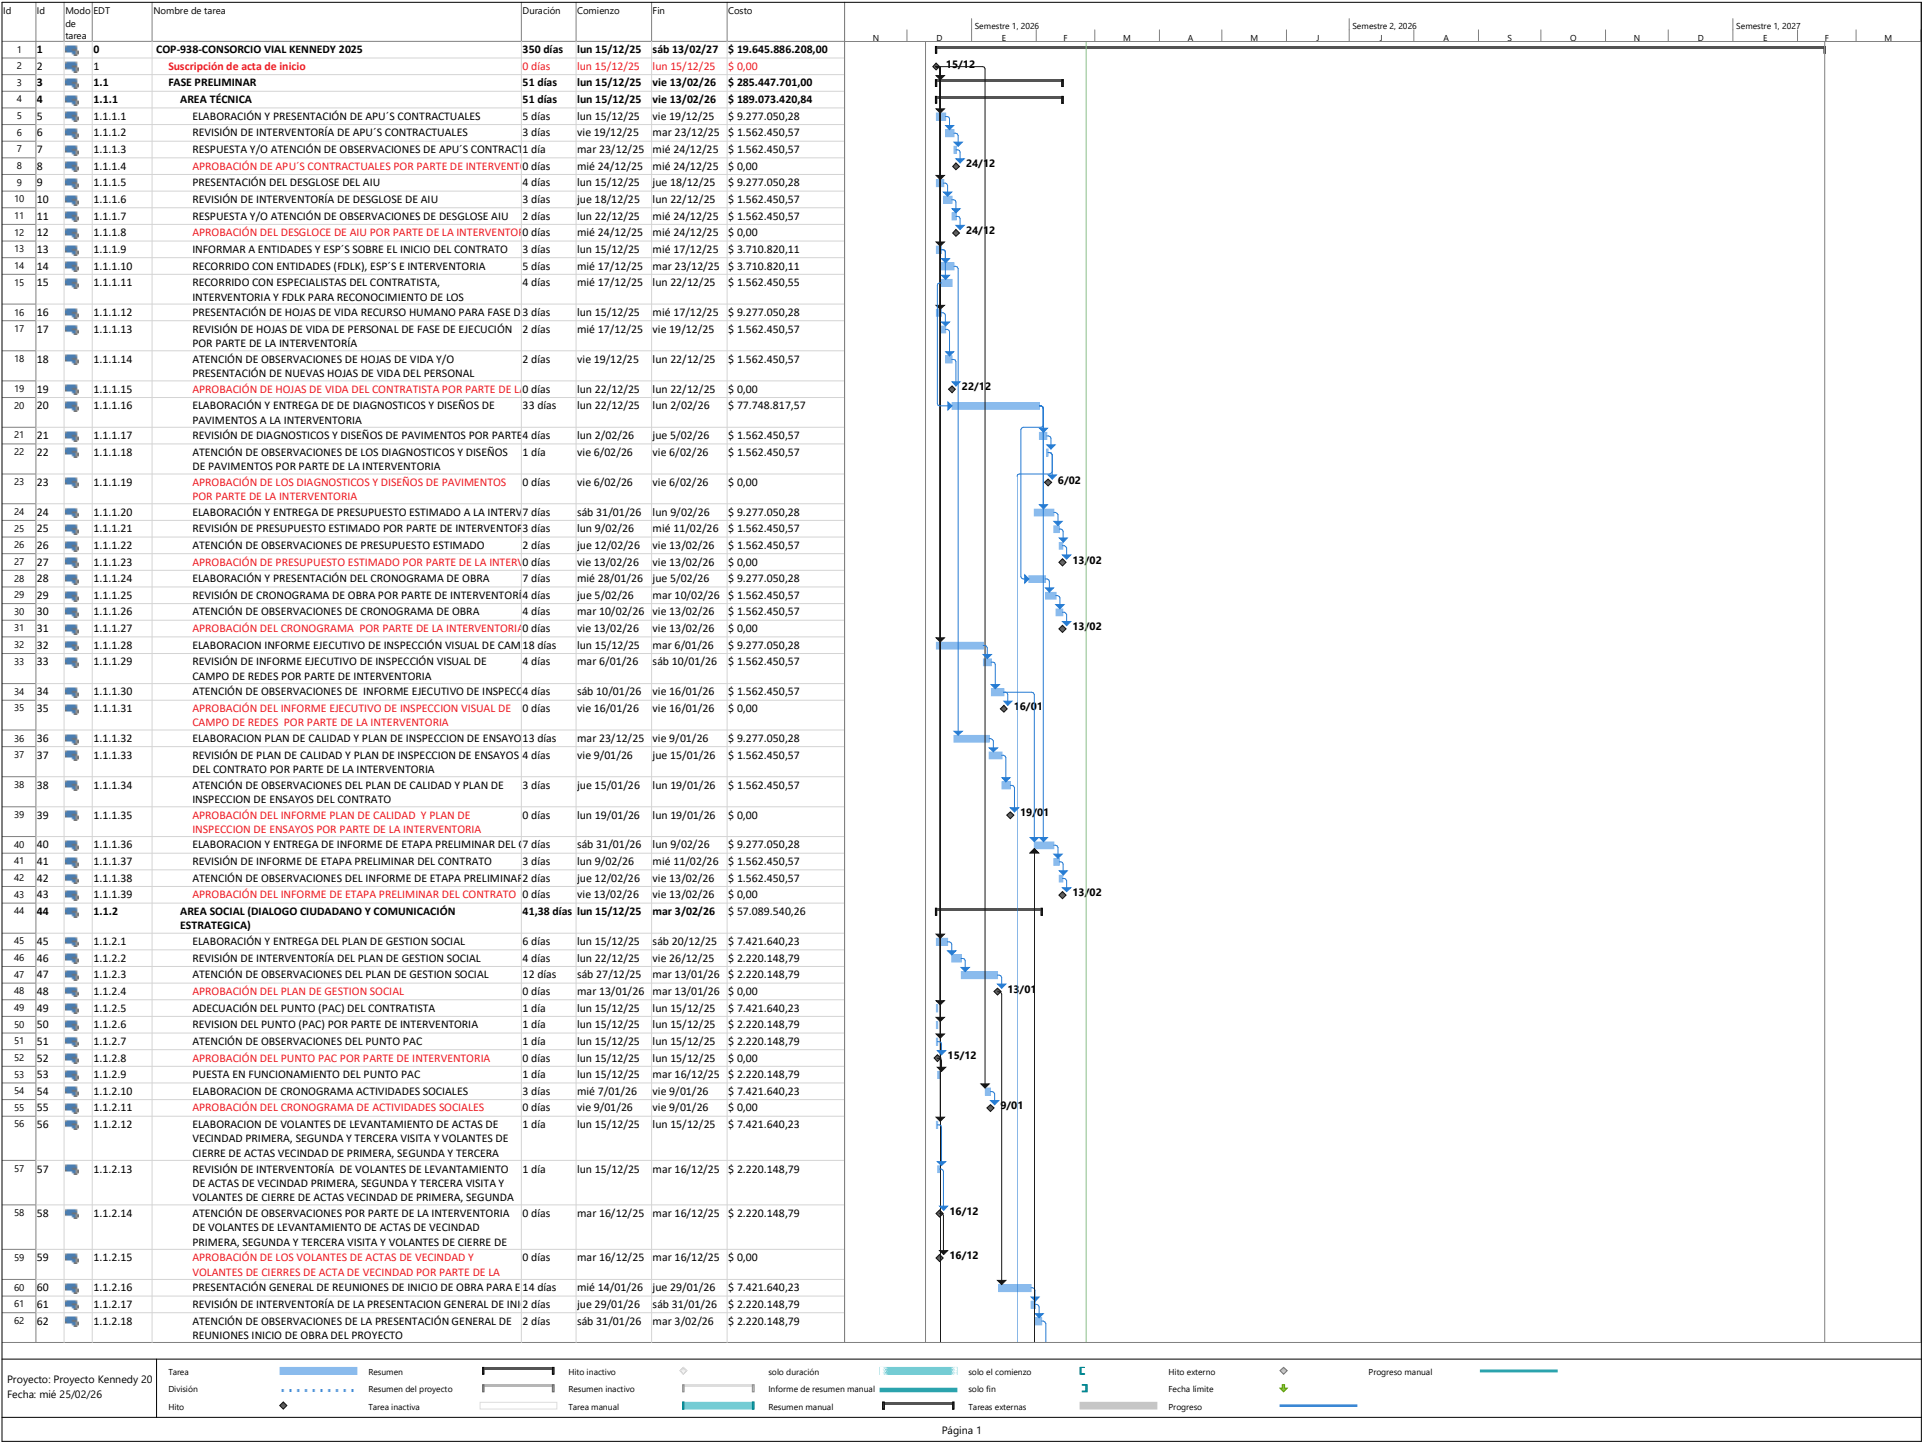

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026								Semestre 1, 2027							
								N	D	E	F	M	A	M	J	S	O	N	D	E	F	M													
63	63		1.1.2.19		APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REUNIONES DE INICIO DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	0 días	mar 3/02/26	mar 3/02/26	\$ 0,00																										
64	64		1.1.3	23 días	AREA AMBIENTAL , SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	lun 15/12/25	mar 13/01/26	\$ 26.796.402,95																											
65	65		1.1.3.1	9 días	ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MANUAL AMBIENTAL DE OBRA (MACO)	lun 15/12/25	mié 24/12/25	\$ 4.852.610,92																											
66	66		1.1.3.2	5 días	REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DEL DOCUMENTO MAO	mié 24/12/25	mié 31/12/25	\$ 1.748.367,17																											
67	67		1.1.3.3	9 días	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL MAO	mié 31/12/25	mar 13/01/26	\$ 1.748.367,17																											
68	68		1.1.3.4	0 días	APROBACIÓN DEL MANUAL AMBIENTAL DE OBRA	mar 13/01/26	mar 13/01/26	\$ 0,00																											
69	69		1.1.3.5	9 días	ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN)	lun 15/12/25	mié 24/12/25	\$ 4.852.610,92																											
70	70		1.1.3.6	4 días	REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DEL PLAN RCD	mié 24/12/25	mar 30/12/25	\$ 1.748.367,17																											
71	71		1.1.3.7	9 días	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DEL PLAN RCD	mar 30/12/25	sáb 10/01/26	\$ 1.748.367,17																											
72	72		1.1.3.8	0 días	APROBACIÓN DEL PLAN RCD	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	\$ 0,00																											
73	73		1.1.3.9	1 día	APERTURA DEL PIN AMBIENTAL	sáb 10/01/26	mar 13/01/26	\$ 1.748.367,17																											
74	74		1.1.3.10	9 días	ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	lun 15/12/25	mié 24/12/25	\$ 4.852.610,92																											
75	75		1.1.3.11	4 días	REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	mié 24/12/25	mar 30/12/25	\$ 1.748.367,17																											
76	76		1.1.3.12	9 días	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	mar 30/12/25	sáb 10/01/26	\$ 1.748.367,17																											
77	77		1.1.3.13	0 días	APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	\$ 0,00																											
78	78		1.1.4	17 días	PLANES DE MANEJO DE TRANSITO	lun 26/01/26	vie 13/02/26	\$ 12.488.336,95																											
79	79		1.1.4.1	5 días	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO PARA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) DE LOS SEGMENTOS INICIALES	lun 26/01/26	vie 30/01/26	\$ 892.024,07																											
80	80		1.1.4.2	2 días	ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	\$ 7.136.192,53																											
81	81		1.1.4.3	2 días	REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) DE LOS SEGMENTOS INICIALES	mar 3/02/26	jue 5/02/26	\$ 892.024,07																											
82	82		1.1.4.4	2 días	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) DE LOS SEGMENTOS INICIALES	jue 5/02/26	vie 6/02/26	\$ 892.024,07																											
83	83		1.1.4.5	0 días	APROBACION DEL PLAN DE MENEJO DE TRAFICO (PMT) POR INTERVENTORIA DE LOS SEGMENTOS INICIALES	vie 6/02/26	vie 6/02/26	\$ 0,00																											
84	84		1.1.4.6	1 día	ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) A SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LOS SEGMENTOS INICIALES	vie 6/02/26	lun 9/02/26	\$ 892.024,07																											
85	85		1.1.4.7	4 días	REVISIÓN DE SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) DE LOS SEGMENTOS INICIALES	lun 9/02/26	jue 12/02/26	\$ 892.024,07																											
86	86		1.1.4.8	1 día	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) DE LOS SEGMENTOS INICIALES	jue 12/02/26	vie 13/02/26	\$ 892.024,07																											
87	87		1.1.4.9	0 días	APROBACION DEL PLAN DE MENEJO DE TRAFICO (PMT) POR SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LOS SEGMENTOS INICIALES	vie 13/02/26	vie 13/02/26	\$ 0,00																											
88	88		1.2	296 días	ETAPA DE EJECUCION	mar 17/02/26	vie 12/02/27	\$ 16.324.640.620,68																											
89	89		1.2.5	178 días	6. 8009556 KR77V CL46BS CL47AS	mar 17/02/26	mar 22/09/26	\$ 754.634.186,01																											
90	90		1.3.1.1	113 días	VIA	mar 17/02/26	lun 6/07/26	\$ 617.907.648,05																											
91	91		1.3.1.1.1	2 días	REPLANTEO GENERAL	jue 26/02/26	sáb 28/02/26	\$ 359.958,40																											
92	92		1.3.1.1.2	3 días	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	\$ 2.301.543,12																											
93	93		1.3.1.1.3	20 días	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	mié 4/03/26	vie 27/03/26	\$ 1.067.496,84																											
94	94		1.3.1.1.4	17 días	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	mié 4/03/26	mié 25/03/26	\$ 11.023.279,20																											
95	95		1.3.1.1.5	3 días	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM	sáb 13/06/26	jue 18/06/26	\$ 26.996.013,20																											
96	96		1.3.1.1.6	14 días	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	lun 25/05/26	mié 10/06/26	\$ 693.304,00																											
97	97		1.3.1.1.7	16 días	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM))	mié 11/03/26	mar 31/03/26	\$ 11.009.999,04																											
98	98		1.3.1.1.8	16 días	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM))	mié 11/03/26	mar 31/03/26	\$ 17.961.548,16																											
99	99		1.3.1.1.9	18 días	RELLENO EN TIRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	sáb 14/03/26	mié 8/04/26	\$ 8.928.138,85																											
100	100		1.3.1.1.10	4 días	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	vie 8/05/26	mié 13/05/26	\$ 756.480,00																											
101	101		1.3.1.1.11	16 días	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN	jue 4/06/26	jue 25/06/26	\$ 47.561,00																											
102	102		1.3.1.1.12	2 días	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	jue 11/06/26	sáb 13/06/26	\$ 46.178.573,02																											
103	103		1.3.1.1.13	13 días	GEOTEJLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	mié 13/05/26	vie 29/05/26	\$ 31.520.945,60																											
104	104		1.3.1.1.14	15 días	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR 8-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	mié 8/04/26	vie 24/04/26	\$ 15.802.499,95																											
105	105		1.3.1.1.15	4 días	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM.	lun 23/02/26	jue 26/02/26	\$ 182.838.064,00																											
106	106		1.3.1.1.16	15 días	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	sáb 14/03/26	sáb 4/04/26	\$ 24.710.104,00																											
107	107		1.3.1.1.17	3 días	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	\$ 1.496.884,80																											
108	108		1.3.1.1.18	6 días	TUBERÍA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	jue 30/04/26	vie 8/05/26	\$ 14.184,00																											
109	109		1.3.1.1.19	6 días	UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	jue 30/04/26	vie 8/05/26	\$ 20.116,00																											
110	110		1.3.1.1.20	7 días	DEMOLICION MANUAL SÁRDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	sáb 28/03/26	mié 8/04/26	\$ 1.658.740,00																											
111	111		1.3.1.1.21	18 días	AGREGADOS RECLICADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBC50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	mié 13/05/26	jue 4/06/26	\$ 16.236.141,12																											
112	112		1.3.1.1.22	14 días	GEOTEXTIL TEIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH=15CM	mar 12/05/26	jue 28/05/26	\$ 10.637.054,40																											
113	113		1.3.1.1.23	3 días	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	jue 18/06/26	lun 22/06/26	\$ 1.952.979,20																											
114	114		1.3.1.1.24	3 días	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA U=3 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	\$ 8.100.955,20																											
115	115		1.3.1.1.25	3 días	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	jue 25/06/26	mar 30/06/26	\$ 450.807,50																											
116	116		1.3.1.1.26	3 días	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIAL3 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	\$ 3.021.239,28																											
117	117		1.3.1.1.27	2 días	ESTOPOLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	jue 25/06/26	sáb 27/06/26	\$ 1.327.800,00																											
118	118		1.3.1.1.28	3 días	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE C33 días	sáb 27/06/26	jue 2/07/26	\$ 496.776,00																											
119	119		1.3.1.1.29	3 días	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	sáb 27/06/26	jue 2/07/26	\$ 106.052,00																											
120	120		1.3.1.1.30	3 días	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CO33 días	jue 2/07/26	lun 6/07/26	\$ 1.247.012,00																											

Proyecto: Proyecto Kennedy 20
Fecha: mié 25/02/26

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027											
							N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																			
121	121	1.3.1.1.31	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE C3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	\$ 2.303.008,80																																				
122	122	1.3.1.1.32	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C2 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26	\$ 1.387.037,60																																				
123	123	1.3.1.1.33	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	16 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26																																				
124	124	1.3.1.1.34	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	16 días	jue 21/05/26	mié 10/06/26																																				
125	125	1.3.1.1.35	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" 3 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	\$ 33.812.134,40																																				
126	126	1.3.1.1.36	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIAL	2 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26																																				
127	127	1.3.1.1.37	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLU	2 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26																																				
128	128	1.3.1.1.38	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINIS	4 días	mié 8/04/26	lun 13/04/26																																				
129	129	1.3.1.1.39	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLI	7 días	vie 24/04/26	mar 5/05/26																																				
130	130	1.3.1.1.40	AGREGADOS RECLICADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	14 días	jue 21/05/26	sáb 6/06/26																																				
131	131	1.3.1.2	ANDEN DERECHO	45 días	mié 10/06/26	mar 4/08/26																																				
132	132	1.3.1.2.1	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	3 días	mié 10/06/26	sáb 13/06/26																																				
133	133	1.3.1.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	7 días	sáb 13/06/26	mar 23/06/26																																				
134	134	1.3.1.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	12 días	sáb 13/06/26	mar 30/06/26																																				
135	135	1.3.1.2.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	12 días	mar 21/07/26	mar 4/08/26																																				
136	136	1.3.1.2.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8 días	mar 23/06/26	vie 3/07/26																																				
137	137	1.3.1.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	8 días	jue 9/07/26	vie 17/07/26																																				
138	138	1.3.1.2.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	12 días	mié 22/07/26	mar 4/08/26																																				
139	139	1.3.1.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PE, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	10 días	mar 21/07/26	vie 31/07/26																																				
140	140	1.3.1.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PE, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN	10 días	mar 21/07/26	vie 31/07/26																																				
141	141	1.3.1.2.10	CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINIS	10 días	mar 21/07/26	vie 31/07/26																																				
142	142	1.3.1.2.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	8 días	mar 23/06/26	vie 3/07/26																																				
143	143	1.3.1.2.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	4 días	jue 16/07/26	mié 22/07/26																																				
144	144	1.3.1.2.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	10 días	mié 15/07/26	mar 28/07/26																																				
145	145	1.3.1.2.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	3 días	jue 30/07/26	lun 3/08/26																																				
146	146	1.3.1.2.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	11 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																				
147	147	1.3.1.2.16	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	13 días	mar 23/06/26	jue 9/07/26																																				
148	148	1.3.1.2.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	4 días	jue 9/07/26	mar 14/07/26																																				
149	149	1.3.1.2.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	5 días	jue 9/07/26	mié 15/07/26																																				
150	150	1.3.1.2.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	3 días	jue 30/07/26	lun 3/08/26																																				
151	151	1.3.1.3	ANDEN IZQUIERDO	45 días	jue 30/07/26	mar 22/09/26																																				
152	152	1.3.1.3.1	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	3 días	jue 30/07/26	lun 3/08/26																																				
153	153	1.3.1.3.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	7 días	lun 3/08/26	mar 11/08/26																																				
154	154	1.3.1.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	10 días	lun 3/08/26	vie 14/08/26																																				
155	155	1.3.1.3.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	12 días	lun 7/09/26	lun 21/09/26																																				
156	156	1.3.1.3.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8 días	mié 12/08/26	vie 21/08/26																																				
157	157	1.3.1.3.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	8 días	jue 27/08/26	sáb 5/09/26																																				
158	158	1.3.1.3.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	12 días	mar 8/09/26	mar 22/09/26																																				
159	159	1.3.1.3.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PE, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	10 días	lun 7/09/26	vie 18/09/26																																				
160	160	1.3.1.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PE, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN	10 días	lun 7/09/26	vie 18/09/26																																				
161	161	1.3.1.3.10	CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINIS	10 días	lun 7/09/26	vie 18/09/26																																				
162	162	1.3.1.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	8 días	mié 12/08/26	vie 21/08/26																																				
163	163	1.3.1.3.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	4 días	jue 3/09/26	mar 8/09/26																																				
164	164	1.3.1.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	10 días	mié 2/09/26	lun 14/09/26																																				
165	165	1.3.1.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	3 días	mié 16/09/26	sáb 19/09/26																																				
166	166	1.3.1.3.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	11 días	jue 3/09/26	mié 16/09/26																																				
167	167	1.3.1.3.16	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	13 días	mié 12/08/26	jue 27/08/26																																				
168	168	1.3.1.3.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	4 días	jue 27/08/26	mar 1/09/26																																				
169	169	1.3.1.3.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	5 días	jue 27/08/26	mié 2/09/26																																				
170	170	1.3.1.3.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	3 días	mié 16/09/26	sáb 19/09/26																																				
171	171	1.2.3	27. 8010695 CL39IS KR72FBIS KR72FBISA	107 días	mié 18/02/26	mar 30/06/26																																				
172	172	1.3.2.1	VIA	107 días	mié 18/02/26	mar 30/06/26																																				
173	173	1.3.2.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26																																				
174	174	1.3.2.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	5 días	mar 24/02/26	lun 2/03/26																																				
175	175	1.3.2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	18 días	lun 2/03/26	mar 24/03/26																																				
Proyecto: Proyecto Kennedy 20 Fecha: mié 25/02/26		Tarea	Resumen	Hitro inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hitro externo	Progreso manual																																		
División			Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso																																		
Hitro			Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso																																			
Página 3																																										

										Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027						
										N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M				
176	176		1.3.2.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	16 días	jun 2/03/26	vie 20/03/26	\$ 15.442.207,20																						
177	177		1.3.2.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26	\$ 36.280.175,10																						
178	178		1.3.2.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	10 días	jue 30/04/26	mar 12/05/26	\$ 1.213.282,00																						
179	179		1.3.2.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	15 días	sáb 7/03/26	jue 26/03/26	\$ 8.453.108,40																						
180	180		1.3.2.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	15 días	sáb 7/03/26	jue 26/03/26	\$ 13.790.050,56																						
181	181		1.3.2.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	10 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	\$ 6.855.048,09																						
182	182		1.3.2.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN; INCLUYE TAPA)	4 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	\$ 4.759.702,00																						
183	183		1.3.2.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	4 días	sáb 7/03/26	jue 12/03/26	\$ 1.857.292,00																						
184	184		1.3.2.1.12	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	3 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	\$ 512.085,00																						
185	185		1.3.2.1.13	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	13 días	vie 13/03/26	lun 30/03/26	\$ 13.417.145,50																						
186	186		1.3.2.1.14	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	12 días	sáb 21/03/26	mié 8/04/26	\$ 7.389.167,50																						
187	187		1.3.2.1.15	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	jue 9/04/26	mar 14/04/26	\$ 1.016.400,00																						
188	188		1.3.2.1.16	(DOVELAS) ACERO USO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26	\$ 10.811,00																						
189	189		1.3.2.1.17	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	3 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	\$ 62.066.849,05																						
190	190		1.3.2.1.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDOC	3 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26	\$ 2.067.103,50																						
191	191		1.3.2.1.19	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	11 días	lun 20/04/26	lun 4/05/26	\$ 42.351.270,50																						
192	192		1.3.2.1.20	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	14 días	vie 13/03/26	mar 31/03/26	\$ 16.176.514,20																						
193	193		1.3.2.1.21	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INC	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	\$ 1.517.446,00																						
194	194		1.3.2.1.22	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON 3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	\$ 3.328.401,00																							
195	195		1.3.2.1.23	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PAREALES METÁLICOS. IN	14 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	\$ 18.971.590,00																						
196	196		1.3.2.1.24	IMPRESIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO. 3 días	mié 3/06/26	sáb 6/06/26	\$ 2.011.201,50																							
197	197		1.3.2.1.25	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCL	6 días	mar 24/02/26	mar 3/03/26	\$ 1.273.525,00																						
198	198		1.3.2.1.26	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGSO) (Sumin	13 días	lun 20/04/26	mié 6/05/26	\$ 27.269.711,64																						
199	199		1.3.2.1.27	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH	15 días	mar 14/04/26	jue 30/04/26	\$ 14.291.854,50																						
200	200		1.3.2.1.28	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y AP	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	\$ 1.499.432,00																						
201	201		1.3.2.1.29	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA U	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26	\$ 6.219.642,00																						
202	202		1.3.2.1.30	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26	\$ 605.605,00																						
203	203		1.3.2.1.31	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIAL	3 días	mar 23/06/26	vie 26/06/26	\$ 4.060.269,54																						
204	204		1.3.2.1.32	ESTOPEPOLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	2 días	vie 26/06/26	mar 30/06/26	\$ 1.903.180,00																						
205	205		1.3.2.1.33	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE D	2 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	\$ 1.643.785,00																						
206	206		1.3.2.1.34	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26	\$ 1.064.921,00																						
207	207		1.3.2.1.35	GEOMALLA MULTIAJIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	mié 13/05/26	sáb 30/05/26	\$ 32.956.346,50																						
208	208		1.3.2.1.36	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	16 días	mié 13/05/26	lun 1/06/26	\$ 44.618.564,55																						
209	209		1.3.2.1.37	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE	4 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26	\$ 45.429.692,00																						
210	210		1.3.2.1.38	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIAL	2 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	\$ 269.294,00																						
211	211		1.3.2.1.39	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLU	3 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	\$ 76.232.541,00																						
212	212		1.3.2.1.40	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINIS	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	\$ 19.410.368,00																						
213	213		1.3.2.1.41	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBL	8 días	sáb 7/03/26	mar 17/03/26	\$ 800.384,00																						
214	214		1.3.2.1.42	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro	18 días	mié 13/05/26	mié 3/06/26	\$ 18.901.368,00																						
215	215		1.2.4	28. 8009549 CL47AS KR77U KR77W	137 días	mié 18/02/26	mié 5/08/26	\$ 377.178.107,63																						
216	216		1.3.3.1	VIA	137 días	mié 18/02/26	mié 5/08/26	\$ 377.178.107,63																						
217	217		1.3.3.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	\$ 210.128,00																						
218	218		1.3.3.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	\$ 1.343.540,40																						
219	219		1.3.3.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	12 días	vie 27/02/26	vie 13/03/26	\$ 636.433,92																						
220	220		1.3.3.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	15 días	vie 27/02/26	mar 17/03/26	\$ 6.582.600,00																						
221	221		1.3.3.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM	2 días	lun 27/07/26	mié 29/07/26	\$ 15.759.094,00																						
222	222		1.3.3.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	14 días	vie 29/05/26	mié 17/06/26	\$ 693.304,00																						
223	223		1.3.3.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	14 días	jue 5/03/26	sáb 21/03/26	\$ 13.925.506,40																						
224	224		1.3.3.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZAD	14 días	jue 5/03/26	sáb 21/03/26	\$ 22.717.493,76																						
225	225		1.3.3.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, E	12 días	vie 6/03/26	vie 20/03/26	\$ 11.003.327,88																						
226	226		1.3.3.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	\$ 4.759.702,00																						
227	227		1.3.3.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	5 días	sáb 7/03/26	vie 13/03/26	\$ 4.643.230,00																						
228	228		1.3.3.1.12	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	\$ 341.390,00																						
229	229		1.3.3.1.13	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	mié 11/03/26	sáb 28/03/26	\$ 15.523.970,00																						
230	230		1.3.3.1.14	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 14/03/26	vie 27/03/26	\$ 5.618.210,00																						
231	231		1.3.3.1.15	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	\$ 441.600,00																						

Proyecto: Proyecto Kennedy 20
Fecha: mié 25/02/26

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Resumen externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 4

Resumen de actividades							Semestre 1, 2026														Semestre 2, 2026														Semestre 1, 2027													
Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																									
232	232	1.3.3.1.16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	1 día	jue 23/07/26	vie 24/07/26	\$ 26.961.922,96																																									
233	233	1.3.3.1.17	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO	2 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	\$ 898.104,00																																									
234	234	1.3.3.1.18	GEOTEXELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	10 días	lun 11/05/26	vie 22/05/26	\$ 18.400.552,00																																									
235	235	1.3.3.1.19	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	18 días	mar 17/03/26	vie 10/04/26	\$ 26.795.335,80																																									
236	236	1.3.3.1.20	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. INI	12 días	jue 5/03/26	jue 19/03/26	\$ 14.424.680,00																																									
237	237	1.3.3.1.21	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).	2 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26	\$ 873.816,00																																									
238	238	1.3.3.1.22	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	6 días	vie 13/03/26	vie 20/03/26	\$ 968.300,00																																									
239	239	1.3.3.1.23	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	5 días	mar 14/07/26	mar 21/07/26	\$ 544.170,00																																									
240	240	1.3.3.1.24	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA. EL VIAJE ES	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	\$ 4.948.496,00																																									
241	241	1.3.3.1.25	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Sumin	16 días	lun 11/05/26	vie 29/05/26	\$ 9.477.950,40																																									
242	242	1.3.3.1.26	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH/12	12 días	jue 7/05/26	vie 22/05/26	\$ 6.209.448,00																																									
243	243	1.3.3.1.27	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mié 29/07/26	jue 30/07/26	\$ 1.140.064,00																																									
244	244	1.3.3.1.28	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO DE A=12CM PARA UI/2	12 días	vie 31/07/26	lun 3/08/26	\$ 4.728.984,00																																									
245	245	1.3.3.1.29	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mié 29/07/26	jue 30/07/26	\$ 263.120,00																																									
246	246	1.3.3.1.30	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCAS VIAL/2	2 días	vie 31/07/26	lun 3/08/26	\$ 1.763.667,60																																									
247	247	1.3.3.1.31	ESTOPELOS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	2 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26	\$ 1.903.180,00																																									
248	248	1.3.3.1.32	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DI	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26	\$ 1.249.820,00																																									
249	249	1.3.3.1.33	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C	2 días	jue 19/02/26	jue 23/02/26	\$ 809.692,00																																									
250	250	1.3.3.1.34	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	16 días	mar 9/06/26	mar 30/06/26	\$ 14.318.696,00																																									
251	251	1.3.3.1.35	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	16 días	mar 9/06/26	mar 30/06/26	\$ 18.245.031,15																																									
252	252	1.3.3.1.36	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4	2 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	\$ 19.738.048,00																																									
253	253	1.3.3.1.37	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLI	16 días	vie 10/04/26	mié 29/04/26	\$ 30.259.812,00																																									
254	254	1.3.3.1.38	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLI	3 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	\$ 1.792.776,00																																									
255	255	1.3.3.1.39	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLU	2 días	mié 29/04/26	jue 30/04/26	\$ 33.121.104,00																																									
256	256	1.3.3.1.40	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1,22m (PREFABRICADO INCLUYE SUMINIS	4 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	\$ 19.410.368,00																																									
257	257	1.3.3.1.41	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLI	7 días	vie 10/04/26	vie 17/04/26	\$ 6.002.880,00																																									
258	258	1.3.3.1.42	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro	12 días	mar 30/06/26	mar 14/07/26	\$ 7.728.559,36																																									
259	259	1.2.31	36. 8009629 CL47A KR77U KR77V	116 días	vie 20/02/26	lun 13/07/26	\$ 233.384.129,83																																									
260	260	1.3.4.1	VIA	116 días	vie 20/02/26	lun 13/07/26	\$ 233.384.129,83																																									
261	261	1.3.4.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	\$ 163.157,54																																									
262	262	1.3.4.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	\$ 1.043.190,97																																									
263	263	1.3.4.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	12 días	vie 6/03/26	vie 20/03/26	\$ 494.187,48																																									
264	264	1.3.4.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	12 días	mar 10/03/26	mar 24/03/26	\$ 5.094.360,00																																									
265	265	1.3.4.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM	2 días	mar 23/06/26	mié 24/06/26	\$ 12.230.427,30																																									
266	266	1.3.4.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	16 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	\$ 778.233,74																																									
267	267	1.3.4.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	12 días	lun 16/03/26	mar 31/03/26	\$ 4.446.032,29																																									
268	268	1.3.4.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	12 días	mié 18/03/26	sáb 4/04/26	\$ 7.252.999,68																																									
269	269	1.3.4.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	12 días	mié 18/03/26	sáb 4/04/26	\$ 3.604.827,86																																									
270	270	1.3.4.1.10	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26	\$ 4.759.702,00																																									
271	271	1.3.4.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	\$ 4.643.230,00																																									
272	272	1.3.4.1.12	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M. (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	\$ 341.390,00																																									
273	273	1.3.4.1.13	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT. USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	vie 20/03/26	jue 9/04/26	\$ 3.886.335,70																																									
274	274	1.3.4.1.14	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	4 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	\$ 342.888,00																																									
275	275	1.3.4.1.15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26	\$ 20.933.170,00																																									
276	276	1.3.4.1.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO	2 días	vie 19/06/26	lun 22/06/26	\$ 697.348,47																																									
277	277	1.3.4.1.17	GEOTEXELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTUR	13 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	\$ 14.287.428,61																																									
278	278	1.3.4.1.18	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	9 días	vie 20/03/26	mié 1/04/26	\$ 1.620.131,21																																									
279	279	1.3.4.1.19	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTE	11 días	jue 9/04/26	mié 22/04/26	\$ 9.116.398,40																																									
280	280	1.3.4.1.20	CODO 45° C/E PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	\$ 232.862,00																																									
281	281	1.3.4.1.21	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACI	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26	\$ 294.664,00																																									
282	282	1.3.4.1.22	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. INI	11 días	lun 16/03/26	lun 30/03/26	\$ 9.978.115,60																																									
283	283	1.3.4.1.23	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 2 días	mar 16/06/26	mié 17/06/26	\$ 678.489,63																																										
284	284	1.3.4.1.24	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCL	7 días	mar 31/03/26	vie 10/04/26	\$ 669.811,00																																									
285	285	1.3.4.1.25	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	5 días	mié 24/06/26	mié 1/07/26	\$ 544.170,00																																									
286	286	1.3.4.1.26	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN	2 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26	\$ 4.948.496,00																																									
287	287	1.3.4.1.27	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Sumin	13 días	mar 5/05/26	jue 21/05/26	\$ 7.358.289,21																																									
288	288	1.3.4.1.28	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH/13	13 días	sáb 2/05/26	mar 19/05/26	\$ 4.821.433,89																																									
289	289	1.3.4.1.29	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mié 1/07/26	vie 3/07/26	\$ 788.626,88																																									
290	290	1.3.4.1.30	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO DE A=12CM PARA UI/2	12 días	vie 3/07/26	lun 6/07/26	\$ 3.271.223,28																																									
291	291	1.3.4.1.31	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mié 8/07/26	mié 8/07/26	\$ 204.132,50																																									
292	292	1.3.4.1.32	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCAS VIAL/2	2 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26	\$ 1.368.759,42																																									
293	293	1.3.4.1.33	ESTOPELOS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	2 días	vie 10/07/26	lun 13/07/26	\$ 1.903.180,00																																									
Proyecto: Proyecto Kennedy 20 Fecha: mié 25/02/26							<div><div><div><div></div><div>Resumen</div></div><div><div></div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div>Tarea inactiva</div></div></div><div><div><div></div><div>Hito inactivo</div></div><div><div></div><div>Hito inactivo</div></div><div><div></div><div>Resumen manual</div></div></div><div><div><div></div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div>Informe de resumen manual</div></div><div><div></div><div>Resumen manual</div></div></div><div><div><div></div><div>solo el comienzo</div></div><div><div></div><div>solo fin</div></div><div><div></div><div>Tareas externas</div></div></div><div><div><div></div><div>Hito externo</div></div><div><div></div><div>Fecha limite</div></div><div><div></div><div>Progreso</div></div></div><div><div><div></div><div>Progreso manual</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>																																									

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027											
							N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																			
294		1.3.4.1.34	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON 2	2 días	mié 25/02/26	jue 26/02/26	\$ 5.096.615,00																																			
295		1.3.4.1.35	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE D=2	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	\$ 864.549,40																																			
296		1.3.4.1.36	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C2	2 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26	\$ 560.095,64																																			
297		1.3.4.1.37	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	13 días	mié 27/05/26	jue 11/06/26	\$ 11.118.000,53																																			
298		1.3.4.1.38	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	13 días	jue 28/05/26	mar 16/06/26	\$ 14.168.861,40																																			
299		1.3.4.1.39	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4"	2 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26	\$ 15.325.950,64																																			
300		1.3.4.1.40	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUY	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	\$ 25.717.457,22																																			
301		1.3.4.1.41	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINIS	4 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26	\$ 19.410.368,00																																			
302		1.3.4.1.42	CONEXIONES KIT SILLA YEE 355 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	10 días	mar 24/03/26	mar 7/04/26	\$ 2.323.355,00																																			
303		1.3.4.1.43	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	13 días	jue 28/05/26	mar 16/06/26	\$ 6.001.184,34																																			
304		1.2.2	26. 8010914 CL3915 TV72F KR72FBIS	206 días	mié 4/03/26	mié 11/11/26	\$ 1.198.317.254,99																																			
305		1.3.5.1	VIA	151 días	mié 4/03/26	lun 7/09/26	\$ 896.850.173,83																																			
306		1.3.5.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	\$ 683.487,00																																			
307		1.3.5.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE	6 días	jue 12/03/26	jue 19/03/26	\$ 4.370.400,62																																			
308		1.3.5.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	20 días	jue 19/03/26	mié 15/04/26	\$ 2.113.303,62																																			
309		1.3.5.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO	20 días	jue 19/03/26	mié 15/04/26	\$ 21.823.322,40																																			
310		1.3.5.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO	2 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26	\$ 51.268.443,90																																			
311		1.3.5.1.6	ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y																																							
312		1.3.5.1.7	COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM	20 días	vie 17/07/26	mié 12/08/26	\$ 1.213.282,00																																			
313		1.3.5.1.8	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	15 días	mié 1/04/26	mar 21/04/26	\$ 23.145.914,90																																			
314		1.3.5.1.9	SCM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	15 días	mié 1/04/26	mar 21/04/26	\$ 37.758.993,60																																			
315		1.3.5.1.10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO	15 días	mié 1/04/26	mar 21/04/26	\$ 37.758.993,60																																			
316		1.3.5.1.11	AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR	12 días	mar 7/04/26	mar 21/04/26	\$ 20.451.837,70																																			
317		1.3.5.1.12	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO,	3 días	sáb 2/05/26	mié 6/05/26	\$ 4.759.702,00																																			
318		1.3.5.1.13	EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	4 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26	\$ 1.857.292,00																																			
319		1.3.5.1.14	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE	3 días	mar 28/04/26	sáb 2/05/26	\$ 512.085,00																																			
320		1.3.5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	10 días	mar 21/04/26	lun 4/05/26	\$ 5.322.504,00																																			
321		1.3.5.1.16	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.25M (INC. SUMIN. Y	18 días	lun 4/05/26	mar 26/05/26	\$ 45.818.253,00																																			
322		1.3.5.1.17	CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	15 días	jue 7/05/26	mar 26/05/26	\$ 10.442.542,50																																			
323		1.3.5.1.18	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO	5 días	mar 2/06/26	mar 9/06/26	\$ 1.436.400,00																																			
324		1.3.5.1.19	EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	3 días	sáb 15/08/26	jue 20/08/26	\$ 87.709.982,30																																			
325		1.3.5.1.20	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1	3 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	\$ 2.921.278,50																																			
326		1.3.5.1.21	D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	12 días	jue 18/06/26	vie 3/07/26	\$ 59.851.795,50																																			
327		1.3.5.1.22	RIEGO DE LUGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDC3	24 días	jue 7/05/26	jue 4/06/26	\$ 53.479.263,10																																			
328		1.3.5.1.23	GEOTEXTELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	\$ 1.517.446,00																																			
329		1.3.5.1.24	ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	15 días	mié 1/04/26	mar 21/04/26	\$ 26.811.090,00																																			
330		1.3.5.1.25	IMPRESIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 3	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	\$ 2.842.276,50																																			
331		1.3.5.1.26	BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	8 días	jue 12/03/26	sáb 21/03/26	\$ 1.799.775,00																																			
332		1.3.5.1.27	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCL	17 días	jue 18/06/26	jue 9/07/26	\$ 38.537.655,40																																			
333		1.3.5.1.28	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS0) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	12 días	mié 17/06/26	mié 1/07/26	\$ 20.197.579,50																																			
334		1.3.5.1.29	GEOTEXTIL TEIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA																																							
335		1.3.5.1.30	ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL PARA SEPARACION																																							
336		1.3.5.1.31	SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E																																							
337		1.3.5.1.32	INSTALACION)																																							
338		1.3.5.1.33	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP. CON 3	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	\$ 16.610.004,00																																			
339		1.3.5.1.34	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y API2	2 días	mié 26/08/26	jue 27/08/26	\$ 2.119.032,00																																			
340		1.3.5.1.35	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LI3	3 días	vie 28/08/26	mar 1/09/26	\$ 8.789.742,00																																			
341		1.3.5.1.36	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	\$ 855.855,00																																			
342		1.3.5.1.37	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIA	3 días	jue 3/09/26	lun 7/09/26	\$ 5.737.670,79																																			
343		1.3.5.1.38	ESTOPELOS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	2 días	jue 3/09/26	vie 4/09/26	\$ 1.903.180,00																																			
344		1.3.5.1.39	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	\$ 2.323.035,00																																			
345		1.3.5.1.40	DIÁMETRO Y CON GRADO DE COMATACIÓN MENOR DEL 30%, INCL																																							
346		1.3.5.1.41	MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE																																							
347		1.3.5.1.42	COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA																																							
348		1.3.5.1.43	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	\$ 1.504.971,00																																			
349		1.3.5.1.44	DÍAMETROS ENTRE 6" A 36"																																							
350		1.3.5.1.45	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	17 días	vie 3/07/26	vie 24/07/26	\$ 46.574.671,50																																			
351		1.3.5.1.46	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	17 días	lun 6/07/26	lun 27/07/26	\$ 63.059.061,20																																			
352		1.3.5.1.47	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE	3 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26	\$ 64.202.292,00																																			
353		1.3.5.1.48	4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE																																							
354		1.3.5.1.49	1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).																																							
355		1.3.5.1.50	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIAL	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	\$ 269.294,00																																			
356		1.3.5.1.51	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO	3 días	mar 9/06/26	jue 11/06/26	\$ 107.733.591,00																																			
357		1.3.5.1.52	(INCLUYE AYOADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE																																							
358		1.3.5.1.53	BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)																																							
Proyecto: Proyecto Kennedy 20							Tarea																																			
Fecha: mié 25/02/26							División																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			
							Hito																																			

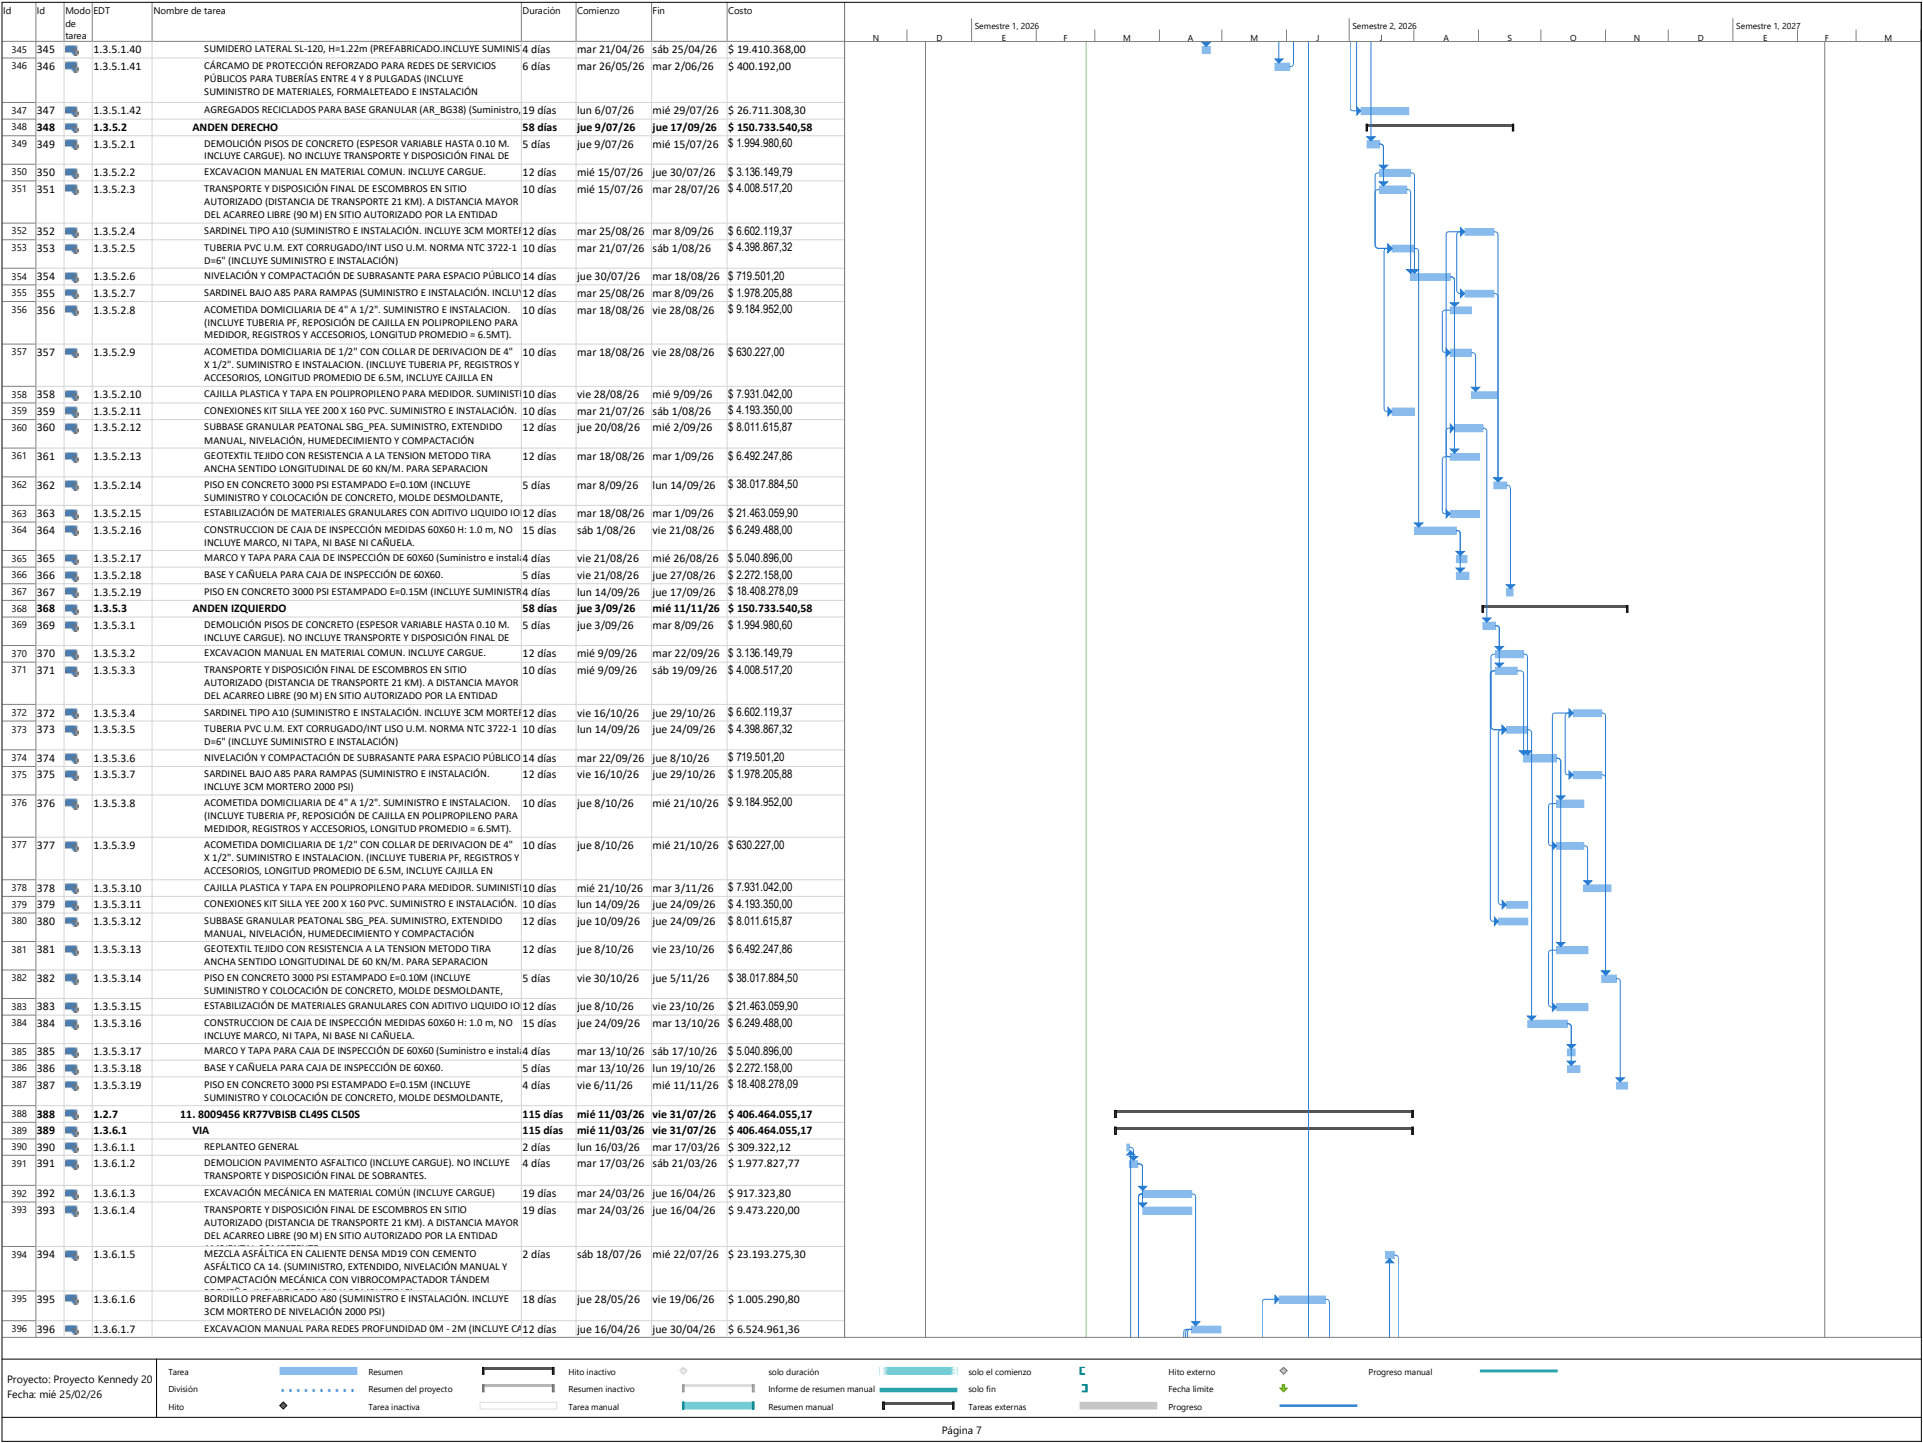

id		Modo de tarea	Modo EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027			
									N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
397	397			1.3.6.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	11 días	sáb 18/04/26	sáb 2/05/26	\$ 10.644.259,20																			
398	398			1.3.6.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	13 días	vie 17/04/26	lun 4/05/26	\$ 5.291.836,94																			
399	399			1.3.6.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	\$ 4.759.702,00																			
400	400			1.3.6.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	\$ 1.857.292,00																			
401	401			1.3.6.1.12	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	vie 17/04/26	mar 5/05/26	\$ 12.346.639,40																			
402	402			1.3.6.1.13	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	9 días	sáb 25/04/26	jue 7/05/26	\$ 2.851.852,25																			
403	403			1.3.6.1.14	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	\$ 650.064,00																			
404	404			1.3.6.1.15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	mar 14/07/26	jue 16/07/26	\$ 39.689.290,32																			
405	405			1.3.6.1.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	jue 16/07/26	sáb 18/07/26	\$ 1.322.067,66																			
406	406			1.3.6.1.17	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	vie 22/05/26	mar 9/06/26	\$ 27.086.812,58																			
407	407			1.3.6.1.18	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	12 días	lun 27/04/26	mar 12/05/26	\$ 9.364.680,20																			
408	408			1.3.6.1.19	ENTIBADO TIPO E-3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	21 días	jue 16/04/26	mar 12/05/26	\$ 14.644.186,00																			
409	409			1.3.6.1.20	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	lun 13/07/26	mar 14/07/26	\$ 1.286.314,14																			
410	410			1.3.6.1.21	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	8 días	vie 27/03/26	mié 8/04/26	\$ 983.035,00																			
411	411			1.3.6.1.22	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	\$ 37.298.695,00																			
412	412			1.3.6.1.23	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	14 días	vie 22/05/26	mar 9/06/26	\$ 13.951.646,01																			
413	413			1.3.6.1.24	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	13 días	jue 21/05/26	jue 4/06/26	\$ 9.140.712,42																			
414	414			1.3.6.1.25	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	\$ 1.157.412,80																			
415	415			1.3.6.1.26	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LUJ	2 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	\$ 4.800.946,80																			
416	416			1.3.6.1.27	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	lun 27/07/26	mié 29/07/26	\$ 387.172,50																			
417	417			1.3.6.1.28	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIAJ	2 días	mié 29/07/26	vie 31/07/26	\$ 2.595.658,62																			
418	418			1.3.6.1.29	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	\$ 1.268.839,00																			
419	419			1.3.6.1.30	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C2	2 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	\$ 822.013,40																			
420	420			1.3.6.1.31	GEOMALLA MULTIAJAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	17 días	vie 19/06/26	vie 10/07/26	\$ 21.078.054,34																			
421	421			1.3.6.1.32	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	17 días	lun 22/06/26	sáb 11/07/26	\$ 25.181.670,90																			
422	422			1.3.6.1.33	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4"	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26	\$ 29.055.693,92																			
423	423			1.3.6.1.34	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCL	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26	\$ 48.756.425,16																			
424	424			1.3.6.1.35	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINIS	4 días	lun 30/03/26	lun 6/04/26	\$ 19.410.368,00																			
425	425			1.3.6.1.36	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	\$ 4.001.920,00																			
426	426			1.3.6.1.37	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	17 días	lun 22/06/26	sáb 11/07/26	\$ 11.377.573,46																			
427	427			1.2.8	12. 8009473 KR77VBISB CL48A5 CL495	86 días	lun 16/03/26	mié 1/07/26	\$ 420.752.754,77																			
428	428			1.3.7.1	VIA	86 días	lun 16/03/26	mié 1/07/26	\$ 420.752.754,77																			
429	429			1.3.7.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 19/03/26	sáb 21/03/26	\$ 360.986,20																			
430	430			1.3.7.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	sáb 21/03/26	jue 26/03/26	\$ 2.308.358,18																			
431	431			1.3.7.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	20 días	jue 26/03/26	mar 21/04/26	\$ 1.070.595,42																			
432	432			1.3.7.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	20 días	jue 26/03/26	mar 21/04/26	\$ 11.055.333,60																			
433	433			1.3.7.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM	2 días	vie 19/06/26	lun 22/06/26	\$ 27.081.660,45																			
434	434			1.3.7.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	18 días	vie 15/05/26	vie 5/06/26	\$ 1.005.290,80																			
435	435			1.3.7.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M (INCL	12 días	lun 6/04/26	sáb 18/04/26	\$ 7.614.783,60																			
436	436			1.3.7.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	12 días	lun 6/04/26	sáb 18/04/26	\$ 12.422.442,24																			
437	437			1.3.7.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	13 días	mar 7/04/26	mié 22/04/26	\$ 6.175.208,61																			
438	438			1.3.7.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	sáb 25/04/26	mié 29/04/26	\$ 4.759.702,00																			
439	439			1.3.7.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE	3 días	mié 22/04/26	sáb 25/04/26	\$ 1.857.292,00																			
440	440			1.3.7.1.12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	mié 8/04/26	lun 20/04/26	\$ 6.656.357,50																			
441	441			1.3.7.1.13	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	lun 4/05/26	vie 8/05/26	\$ 758.640,00																			
442	442			1.3.7.1.14	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO,	2 días	mar 16/06/26	mié 17/06/26	\$ 46.325.105,21																			
443	443			1.3.7.1.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26	\$ 1.542.884,10																			

Id	Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026											
								N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M							
444	444		1.3.7.1.16	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	3 días	sáb 18/04/26	mié 22/04/26	\$ 852.604,00																							
445	445		1.3.7.1.17	GEOTECIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E	15 días	jue 7/05/26	mar 26/05/26	\$ 31.610.948,30																							
446	446		1.3.7.1.18	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y	15 días	vie 10/04/26	mar 28/04/26	\$ 16.133.542,35																							
447	447		1.3.7.1.19	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS	15 días	lun 6/04/26	mié 22/04/26	\$ 17.090.110,00																							
448	448		1.3.7.1.20	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMIN	3 días	mié 10/06/26	mar 16/06/26	\$ 1.501.158,90																							
449	449		1.3.7.1.21	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE).	18 días	mar 31/03/26	sáb 11/04/26	\$ 1.147.225,00																							
450	450		1.3.7.1.22	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	15 días	jue 7/05/26	mar 26/05/26	\$ 16.282.500,66																							
451	451		1.3.7.1.23	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA	12 días	mié 6/05/26	mié 21/05/26	\$ 10.667.426,70																							
452	452		1.3.7.1.24	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTR	2 días	mar 23/06/26	mié 24/06/26	\$ 1.350.728,00																							
453	453		1.3.7.1.25	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO DE A=12CM	2 días	mié 24/06/26	vie 26/06/26	\$ 5.602.818,00																							
454	454		1.3.7.1.26	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLIC	2 días	mié 24/06/26	vie 26/06/26	\$ 451.880,00																							
455	455		1.3.7.1.27	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCA	3 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26	\$ 3.030.824,43																							
456	456		1.3.7.1.28	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26	\$ 1.592.817,00																							
457	457		1.3.7.1.29	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	\$ 959.309,00																							
458	458		1.3.7.1.30	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALA	16 días	lun 25/05/26	vie 12/06/26	\$ 24.598.585,90																							
459	459		1.3.7.1.31	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQU	16 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	\$ 29.386.561,80																							
460	460		1.3.7.1.32	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SEC	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	\$ 33.908.679,20																							
461	461		1.3.7.1.33	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO	2 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	\$ 56.899.896,60																							
462	462		1.3.7.1.34	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO. INCLUYE	5 días	sáb 18/04/26	jue 23/04/26	\$ 19.410.368,00																							
463	463		1.3.7.1.35	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIO	20 días	lun 6/04/26	mar 28/04/26	\$ 4.001.920,00																							
464	464		1.3.7.1.36	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	12 días	mié 27/05/26	mié 10/06/26	\$ 13.278.211,02																							
465	465		1.2.9	1. 8009428 KR77W CL50S CL50BISS	129 días	mar 24/03/26	lun 31/08/26	\$ 376.303.346,99																							
466	466		1.3.8.1	VIA	114 días	mar 24/03/26	mié 12/08/26	\$ 321.011.184,99																							
467	467		1.3.8.1.1	REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	\$ 139.403,94																							
468	468		1.3.8.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26	\$ 891.312,49																							
469	469		1.3.8.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	13 días	lun 13/04/26	lun 27/04/26	\$ 422.199,54																							
470	470		1.3.8.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	13 días	lun 13/04/26	lun 27/04/26	\$ 4.359.970,80																							
471	471		1.3.8.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON	1 día	lun 3/08/26	mar 4/08/26	\$ 10.448.964,50																							
472	472		1.3.8.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	\$ 675.971,40																							
473	473		1.3.8.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCL	17 días	vie 17/04/26	vie 8/05/26	\$ 12.435.151,20																							
474	474		1.3.8.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	17 días	vie 17/04/26	vie 8/05/26	\$ 20.286.190,08																							
475	475		1.3.8.1.9	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	14 días	sáb 2/05/26	mié 20/05/26	\$ 98.440,00																							
476	476		1.3.8.1.10	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	14 días	mié 22/04/26	sáb 9/05/26	\$ 8.963.809,44																							
477	477		1.3.8.1.11	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	\$ 2.379.851,00																							
478	478		1.3.8.1.12	CIINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE	3 días	sáb 18/04/26	mié 22/04/26	\$ 1.857.292,00																							
479	479		1.3.8.1.13	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y	3 días	mié 22/04/26	sáb 25/04/26	\$ 512.085,00																							
480	480		1.3.8.1.14	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC	15 días	jue 23/04/26	mar 12/05/26	\$ 21.435.440,00																							
481	481		1.3.8.1.15	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC	10 días	mié 29/04/26	mar 12/05/26	\$ 6.106.750,00																							
482	482		1.3.8.1.16	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 17/06/26	mar 18/06/26	\$ 292.968,00																							
483	483		1.3.8.1.17	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCH25-A CON CEMENTO ASFÁ	2 días	mié 29/07/26	vie 31/07/26	\$ 17.876.927,18																							
484	484		1.3.8.1.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, B	2 días	vie 31/07/26	lun 3/08/26	\$ 595.823,67																							
485	485		1.3.8.1.19	GEOTECIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON	12 días	lun 22/06/26	lun 6/07/26	\$ 12.207.366,21																							
486	486		1.3.8.1.20	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTR	18 días	sáb 2/05/26	lun 25/05/26	\$ 25.496.631,00																							
487	487		1.3.8.1.21	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCL. SUN	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26	\$ 1.517.446,00																							
488	488		1.3.8.1.22	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	14 días	lun 20/04/26	jue 7/05/26	\$ 4.907.527,00																							
489	489		1.3.8.1.23	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMIN	2 días	lun 27/07/26	mié 29/07/26	\$ 579.710,43																							
490	490		1.3.8.1.24	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE).	17 días	mié 15/04/26	jue 23/04/26	\$ 658.865,00																							
491	491		1.3.8.1.25	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	12 días	jue 16/04/26	jue 30/04/26	\$ 6.360.965,28																							
492	492		1.3.8.1.26	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	4 días	mié 15/07/26	mar 21/07/26	\$ 3.939.292,00																							
493	493		1.3.8.1.27	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI,	5 días	mié 15/07/26	mié 22/07/26	\$ 544.170,00																							
494	494		1.3.8.1.28	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	2 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	\$ 4.948.496,00																							
495	495		1.3.8.1.29	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	12 días	lun 22/06/26	lun 6/07/26	\$ 6.286.868,73																							

Proyecto: Proyecto Kennedy 20
Fecha: mié 25/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Tarea inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Página 9

ID	Modo de tarea	EDT	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	COSTO
496		1.3.8.1.30	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA	12 días	jue 18/06/26	vie 3/07/26	\$ 4.119.496,29
497		1.3.8.1.31	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTR	2 días	mar 4/08/26	jue 6/08/26	\$ 775.739,20
498		1.3.8.1.32	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILOTO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 6/08/26	lun 10/08/26	\$ 3.217.765,20
499		1.3.8.1.33	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLI	2 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	\$ 174.460,00
500		1.3.8.1.34	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILOTO PARA MARC	2 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	\$ 1.169.388,30
501		1.3.8.1.35	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARRILLADO ENTRE 6° Y 162	días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	\$ 850.421,00
502		1.3.8.1.36	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARRILLADO CON SISTEMAS CCTV	2 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26	\$ 550.942,60
503		1.3.8.1.37	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	mar 7/07/26	vie 24/07/26	\$ 9.499.365,33
504		1.3.8.1.38	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M ³ + CEMENTO 5%	14 días	jue 9/07/26	lun 27/07/26	\$ 12.104.555,55
505		1.3.8.1.39	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	7 días	lun 25/05/26	mar 2/06/26	\$ 912.881,00
506		1.3.8.1.40	INYECCION DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	2 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	\$ 13.094.693,04
507		1.3.8.1.41	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORIZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	11 días	sáb 23/05/26	jue 4/06/26	\$ 7.893.864,00
508		1.3.8.1.42	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORIZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	15 días	mié 20/05/26	vie 5/06/26	\$ 17.927.760,00
509		1.3.8.1.43	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECION EN CONCRETO (INCLUYE M/2	días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	\$ 269.294,00
510		1.3.8.1.44	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	\$ 21.973.332,42
511		1.3.8.1.45	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE S/4	días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	\$ 19.410.368,00
512		1.3.8.1.46	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIO	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	\$ 20.712.055,10
513		1.3.8.1.47	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORIZADO PARA REDES DE SERVICIO	8 días	jue 4/06/26	mié 17/06/26	\$ 4.001.920,00
514		1.3.8.1.48	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Sum:	14 días	jue 9/07/26	lun 27/07/26	\$ 5.126.996,07
515		1.3.8.2	ANDEN DERECHO	28 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	\$ 27.466.081,00
516		1.3.8.2.1	DEMOLUCION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 m. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	2 días	mar 7/07/26	mié 8/07/26	\$ 194.748,60
517		1.3.8.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	10 días	mié 8/07/26	mar 21/07/26	\$ 306.221,42
518		1.3.8.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE ≥ 1 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M.) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	10 días	mié 8/07/26	mar 21/07/26	\$ 391.521,60
519		1.3.8.2.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTEL	10 días	sáb 18/07/26	vie 31/07/26	\$ 3.222.303,70
520		1.3.8.2.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	lun 13/07/26	mar 21/07/26	\$ 896.882,13
521		1.3.8.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLIC	6 días	sáb 18/07/26	lun 27/07/26	\$ 70.237,20
522		1.3.8.2.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	10 días	sáb 18/07/26	vie 31/07/26	\$ 462.630,00
523		1.3.8.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, reposición de CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	lun 13/07/26	mar 21/07/26	\$ 3.280.340,00
524		1.3.8.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPYLENO PARA MEDIDOR)	10 días	lun 13/07/26	vie 24/07/26	\$ 630.227,00
525		1.3.8.2.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLUPROPYLENO PARA MEDIDOR. SUMINI	7 días	vie 24/07/26	sáb 1/08/26	\$

ID		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027																																																																																																											
									N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																			
544	544			1.3.8.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN	10 días	sáb 1/08/26	vie 14/08/26	\$ 630.227,00																																																																																																																																			
545	545			1.3.8.3.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO	7 días	vie 14/08/26	lun 24/08/26	\$ 2.832.515,00																																																																																																																																			
546	546			1.3.8.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	lun 3/08/26	mié 12/08/26	\$ 1.497.625,00																																																																																																																																			
547	547			1.3.8.3.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL 58G. PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	vie 14/08/26	mié 19/08/26	\$ 781.959,62																																																																																																																																			
548	548			1.3.8.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	\$ 633.768,66																																																																																																																																			
549	549			1.3.8.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	vie 28/08/26	lun 31/08/26	\$ 3.712.573,75																																																																																																																																			
550	550			1.3.8.3.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	sáb 15/08/26	vie 28/08/26	\$ 2.092.910,55																																																																																																																																			
551	551			1.3.8.3.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	10 días	lun 3/08/26	sáb 15/08/26	\$ 2.231.960,00																																																																																																																																			
552	552			1.3.8.3.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60 (Suministro e instal	3 días	vie 21/08/26	mar 25/08/26	\$ 1.800.320,00																																																																																																																																			
553	553			1.3.8.3.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60.	4 días	sáb 15/08/26	vie 21/08/26	\$ 811.485,00																																																																																																																																			
554	554			1.3.8.3.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	2 días	vie 28/08/26	lun 31/08/26	\$ 1.795.851,77																																																																																																																																			
555	555			1.2.10	3. 8009327 KR7XBISA CL48AS CL49S	103 días	mar 31/03/26	mié 5/08/26	\$ 488.794.354,00																																																																																																																																			
556	556			1.3.9.1	VIA	103 días	mar 31/03/26	mié 5/08/26	\$ 488.794.354,00																																																																																																																																			
557	557			1.3.9.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	\$ 316.905,00																																																																																																																																			
558	558			1.3.9.1.2	DEMOLUCION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	\$ 2.026.506,77																																																																																																																																			
559	559			1.3.9.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	19 días	jue 16/04/26	sáb 9/05/26	\$ 959.839,20																																																																																																																																			
560	560			1.3.9.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (30 MI) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	19 días	jue 16/04/26	sáb 9/05/26	\$ 9.911.678,40																																																																																																																																			
561	561			1.3.9.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	\$ 23.775.676,60																																																																																																																																			
562	562			1.3.9.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	17 días	jue 11/06/26	jue 2/07/26	\$ 866.630,00																																																																																																																																			
563	563			1.3.9.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	14 días	mié 22/04/26	sáb 9/05/26	\$ 7.754.504,40																																																																																																																																			
564	564			1.3.9.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	14 días	mié 22/04/26	sáb 9/05/26	\$ 12.650.376,96																																																																																																																																			
565	565			1.3.9.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	14 días	sáb 25/04/26	mié 13/05/26	\$ 8.963.809,44																																																																																																																																			
566	566			1.3.9.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	\$ 2.379.851,00																																																																																																																																			
567	567			1.3.9.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONCT, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	\$ 1.857.292,00																																																																																																																																			
568	568			1.3.9.1.12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26	\$ 21.435.440,00																																																																																																																																			
569	569			1.3.9.1.13	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26	\$ 6.106.750,00																																																																																																																																			
570	570			1.3.9.1.14	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	\$ 666.000,00																																																																																																																																			
571	571			1.3.9.1.15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH-25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	mié 15/07/26	vie 17/07/26	\$ 40.673.149,31																																																																																																																																			
572	572			1.3.9.1.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	3 días	vie 17/07/26	mié 22/07/26	\$ 1.354.477,50																																																																																																																																			
573	573			1.3.9.1.17	GEOTECIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	14 días	vie 5/06/26	mié 24/06/26	\$ 27.750.832,50																																																																																																																																			
574	574			1.3.9.1.18	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	17 días	jue 7/05/26	jue 28/05/26	\$ 15.899.584,50																																																																																																																																			
575	575			1.3.9.1.19	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, IN	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	\$ 1.517.446,00																																																																																																																																			
576	576			1.3.9.1.20	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PAREALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	12 días	jue 23/04/26	vie 8/05/26	\$ 8.701.845,00																																																																																																																																			
577	577			1.3.9.1.21	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO,	3 días	lun 13/07/26	mié 15/07/26	\$ 1.317.847,50																																																																																																																																			
578	578			1.3.9.1.22	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	mié 3/06/26	jue 11/06/26	\$ 17.730,00																																																																																																																																			
579	579			1.3.9.1.23	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	mié 3/06/26	jue 11/06/26	\$ 20.116,00																																																																																																																																			
580	580			1.3.9.1.24	DEMOLUCION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCL	8 días	mié 22/04/26	sáb 2/05/26	\$ 1.168.275,00																																																																																																																																			
581	581			1.3.9.1.25	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMI	7 días	vie 24/04/26	lun 4/05/26	\$ 6.360.965,28																																																																																																																																			
582	582			1.3.9.1.26	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	5 días	mié 17/06/26	mar 23/06/26	\$ 544.170,00																																																																																																																																			
583	583			1.3.9.1.27	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO E	2 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	\$ 4.948.496,00																																																																																																																																			
584	584			1.3.9.1.28	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_58G50) (Sumin	14 días	vie 5/06/26	mié 24/06/26	\$ 14.294.191,50																																																																																																																																			
585	585			1.3.9.1.29	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH	12 días	jue 4/06/26	vie 19/06/26	\$ 9.364.792,50																																																																																																																																			
586	586			1.3.9.1.30	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y AP	2 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	\$ 1.375.512,00																																																																																																																																			
587	587			1.3.9.1.31	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO DE A=12CM PARA U	2 días	lun 27/07/26	mié 29/07/26	\$ 5.705.622,00																																																																																																																																			
588	588			1.3.9.1.32	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mié 29/07/26	vie 31/07/26	\$ 396.825,00																																																																																																																																			
589	589			1.3.9.1.33	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	2 días	vie 31/07/26	lun 3/08/26	\$ 2.660.837,64																																																																																																																																			
590	590			1.3.9.1.34	ESTOPERILES METÁLICOS CON ESPÍGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26	\$ 885.200,00																																																																																																																																			
591	591			1.3.9.1.35	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE D	2 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	\$ 1.507.935,00																																																																																																																																			
592	592			1.3.9.1.36	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	\$ 976.911,00																																																																																																																																			
593	593			1.3.9.1.37	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	16 días	vie 19/06/26	jue 9/07/26	\$ 21.594.772,50																																																																																																																																			
594	594			1.3.9.1.38	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO I	17 días	lun 22/06/26	lun 13/07/26	\$ 27.517.721,40																																																																																																																																			
595	595			1.3.9.1.39	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRAN	7 días	jue 28/05/26	jue 4/06/26	\$ 912.881,00																																																																																																																																			
Proyecto: Proyecto Kennedy 20 Fecha: mié 25/02/26																																																																																																																																												
División									Resumen												Hito inactivo												solo duración												solo el comienzo												Resumen inactivo												Informe de resumen manual												solo fin												Hito externo												Fecha limite												Progreso manual																							
Hito									Resumen del proyecto												Tarea inactiva												Tarea manual												Resumen manual												Resumen externas												Progreso																																																																							

[illegible]

ID	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027											
650	650		1.3.11.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUEÑO, INCLUIVE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	mié 30/09/26	vie 2/10/26	\$ 37.479.236,60	N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	E	F	M																			
651	651		1.3.11.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	20 días	jue 11/06/26	mar 7/07/26	\$ 1.213.282,00																																			
652	652		1.3.11.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	14 días	mié 20/05/26	vie 5/06/26	\$ 19.648.237,50																																			
653	653		1.3.11.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	14 días	mié 20/05/26	vie 5/06/26	\$ 32.053.320,00																																			
654	654		1.3.11.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	12 días	sáb 23/05/26	vie 5/06/26	\$ 14.950.173,80																																			
655	655		1.3.11.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	mié 13/05/26	sáb 16/05/26	\$ 4.759.702,00																																			
656	656		1.3.11.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST., ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	mar 12/05/26	mié 13/05/26	\$ 1.857.292,00																																			
657	657		1.3.11.1.12	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H+0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	3 días	mié 13/05/26	sáb 16/05/26	\$ 512.085,00																																			
658	658		1.3.11.1.13	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 6/06/26	vie 19/06/26	\$ 5.322.504,00																																			
659	659		1.3.11.1.14	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	sáb 13/06/26	jue 25/06/26	\$ 7.633.437,50																																			
660	660		1.3.11.1.15	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	jue 23/07/26	mar 28/07/26	\$ 1.050.000,00																																			
661	661		1.3.11.1.16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A con CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	3 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26	\$ 64.118.299,70																																			
662	662		1.3.11.1.17	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	3 días	lun 28/09/26	mié 30/09/26	\$ 2.135.437,50																																			
663	663		1.3.11.1.18	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM.. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	10 días	jue 11/06/26	mié 24/06/26	\$ 43.751.312,50																																			
664	664		1.3.11.1.19	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	22 días	vie 26/06/26	jue 23/07/26	\$ 42.375.018,80																																			
665	665		1.3.11.1.20	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INST.)	2 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	\$ 1.517.446,00																																			
666	666		1.3.11.1.21	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	3 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	\$ 2.077.687,50																																			
667	667		1.3.11.1.22	DEMOLUCIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	7 días	mar 21/04/26	mié 29/04/26	\$ 1.315.625,00																																			
668	668		1.3.11.1.23	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL DIÁMETRO 24". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGI)	3 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26	\$ 356.106.125,00																																			
669	669		1.3.11.1.24	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	18 días	sáb 15/08/26	lun 7/09/26	\$ 22.535.887,50																																			
670	670		1.3.11.1.25	GEOTEXTIL TEJADO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	15 días	mar 28/07/26	sáb 15/08/26	\$ 14.764.312,50																																			
671	671		1.3.11.1.26	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A≈1SCM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26	\$ 1.549.000,00																																			
672	672		1.3.11.1.27	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO DE A≈12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROSEFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	\$ 6.425.250,00																																			
673	673		1.3.11.1.28	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26	\$ 625.625,00																																			
674	674		1.3.11.1.29	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROSEFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	3 días	vie 9/10/26	mié 14/10/26	\$ 4.194.461,64																																			
675	675		1.3.11.1.30	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	\$ 1.903.180,00																																			
676	676		1.3.11.1.31	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	\$ 1.862.910,00																																			
677	677		1.3.11.1.32	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	2 días	mié 14/10/26	vie 16/10/26	\$ 1.325.650,00																																			
678	678		1.3.11.1.33	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA	2 días	vie 16/10/26	lun 19/10/26	\$ 4.676.295,00																																			
679	679		1.3.11.1.34	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	jue 23/07/26	mar 11/08/26	\$ 43.973.062,50																																			
680	680		1.3.11.1.35	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL. MAND. DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26	\$ 1.698.125,00																																			
681	681		1.3.11.1.36	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	2 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	\$ 1.100.125,00																																			
682	682		1.3.11.1.37	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	12 días	sáb 15/08/26	lun 31/08/26	\$ 34.045.812,50																																			
683	683		1.3.11.1.38	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LÍQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	12 días	lun 7/09/26	lun 21/09/26	\$ 40.671.116,00																																			
684	684		1.3.11.1.39	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	3 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	\$ 46.931.500,00																																			
685	685		1.3.11.1.40	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN)	15 días	mié 29/07/26	mar 18/08/26	\$ 60.923.312,50																																			
								Proyecto: Proyecto Kennedy 20												Progreso manual																							
Fecha: mié 25/02/26								División												Fecha límite																							
Hito								Resumen												Progreso																							
								Resumen del proyecto												Progreso manual																							
								Tarea inactiva												Progreso																							

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027											
ID	Modo de tarea						N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	E	F	M												
737	737	1.3.12.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, POSICION DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	10 días	vie 4/09/26	mié 16/09/26	\$ 3.936.408,00																											
738	738	1.3.12.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	mié 16/09/26	lun 28/09/26	\$ 630.227,00																											
739	739	1.3.12.2.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	7 días	mié 16/09/26	jue 24/09/26	\$ 3.399.018,00																											
740	740	1.3.12.2.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	7 días	vie 14/08/26	lun 24/08/26	\$ 1.797.150,00																											
741	741	1.3.12.2.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	9 días	vie 18/09/26	mar 29/09/26	\$ 1.728.177,03																											
742	742	1.3.12.2.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	mié 16/09/26	lun 28/09/26	\$ 1.401.175,44																											
743	743	1.3.12.2.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mar 29/09/26	mié 30/09/26	\$ 8.204.364,50																											
744	744	1.3.12.2.15	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	8 días	vie 18/09/26	lun 28/09/26	\$ 4.633.961,40																											
745	745	1.3.12.2.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	10 días	jue 20/08/26	mar 1/09/26	\$ 2.678.352,00																											
746	746	1.3.12.2.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60 (Suministro e instalacion)	3 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	\$ 2.160.384,00																											
747	747	1.3.12.2.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60.	3 días	vie 4/09/26	mar 8/09/26	\$ 973.782,00																											
748	748	1.3.12.2.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mar 29/09/26	mié 30/09/26	\$ 3.974.478,34																											
749	749	1.3.12.3	ANDEN IZQUIERDO	48 días	lun 28/09/26	mié 25/11/26	\$ 42.058.710,50																											
750	750	1.3.12.3.1	DEMOLUCION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	2 días	lun 28/09/26	mié 30/09/26	\$ 430.562,40																											
751	751	1.3.12.3.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	mié 30/09/26	lun 5/10/26	\$ 677.063,71																											
752	752	1.3.12.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	10 días	jue 1/10/26	mié 14/10/26	\$ 865.468,80																											
753	753	1.3.12.3.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	10 días	lun 26/10/26	sáb 7/11/26	\$ 2.671.526,55																											
754	754	1.3.12.3.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	9 días	lun 5/10/26	jue 15/10/26	\$ 940.976,63																											
755	755	1.3.12.3.6	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PUBLICO	9 días	jue 15/10/26	lun 26/10/26	\$ 155.284,80																											
756	756	1.3.12.3.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	10 días	lun 26/10/26	sáb 7/11/26	\$ 800.349,90																											
757	757	1.3.12.3.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICION DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	lun 26/10/26	mié 4/11/26	\$ 3.936.408,00																											
758	758	1.3.12.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	mié 4/11/26	mar 17/11/26	\$ 630.227,00																											
759	759	1.3.12.3.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	7 días	mié 4/11/26	jue 12/11/26	\$ 3.399.018,00																											
760	760	1.3.12.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACION.	7 días	lun 5/10/26	mar 13/10/26	\$ 1.797.150,00																											
761	761	1.3.12.3.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	10 días	mar 10/11/26	lun 23/11/26	\$ 1.728.177,03																											
762	762	1.3.12.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	sáb 7/11/26	vie 20/11/26	\$ 1.401.175,44																											
763	763	1.3.12.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	lun 23/11/26	mié 25/11/26	\$ 8.204.364,50																											
764	764	1.3.12.3.15	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	mar 10/11/26	lun 23/11/26	\$ 4.633.961,40																											
765	765	1.3.12.3.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	10 días	jue 8/10/26	mié 21/10/26	\$ 2.678.352,00																											
766	766	1.3.12.3.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60 (Suministro e instalacion)	3 días	mié 21/10/26	sáb 24/10/26	\$ 2.160.384,00																											
767	767	1.3.12.3.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 60X60.	3 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26	\$ 973.782,00																											
768	768	1.3.12.3.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	lun 23/11/26	mié 25/11/26	\$ 3.974.478,34																											
769	769	1.2.22	20. 8008792 KR78C CL44S CL45S	212 días	mar 5/05/26	mar 19/01/27	\$ 551.024.114,81																											
770	770	1.3.13.1	VIA	107 días	mar 5/05/26	sáb 12/09/26	\$ 973.028.790,59																											
771	771	1.3.13.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26	\$ 270.208,62																											
772	772	1.3.13.1.2	DEMOLUCION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES.	3 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26	\$ 1.727.617,71																											
773	773	1.3.13.1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	17 días	jue 14/05/26	jue 4/06/26	\$ 801.379,26																											
774	774	1.3.13.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	17 días	sáb 16/05/26	sáb 6/06/26	\$ 8.275.186,80																											
775	775	1.3.13.1.5	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	2 días	vie 28/08/26	lun 31/08/26	\$ 20.264.139,35																											
776	776	1.3.13.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 2000 PSI)	13 días	vie 17/07/26	lun 3/08/26	\$ 571.975,80																											

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo el fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite


Progreso


Progreso manual


Proyecto: Proyecto Kennedy 20

Fecha: mié 25/02/26

Página 15

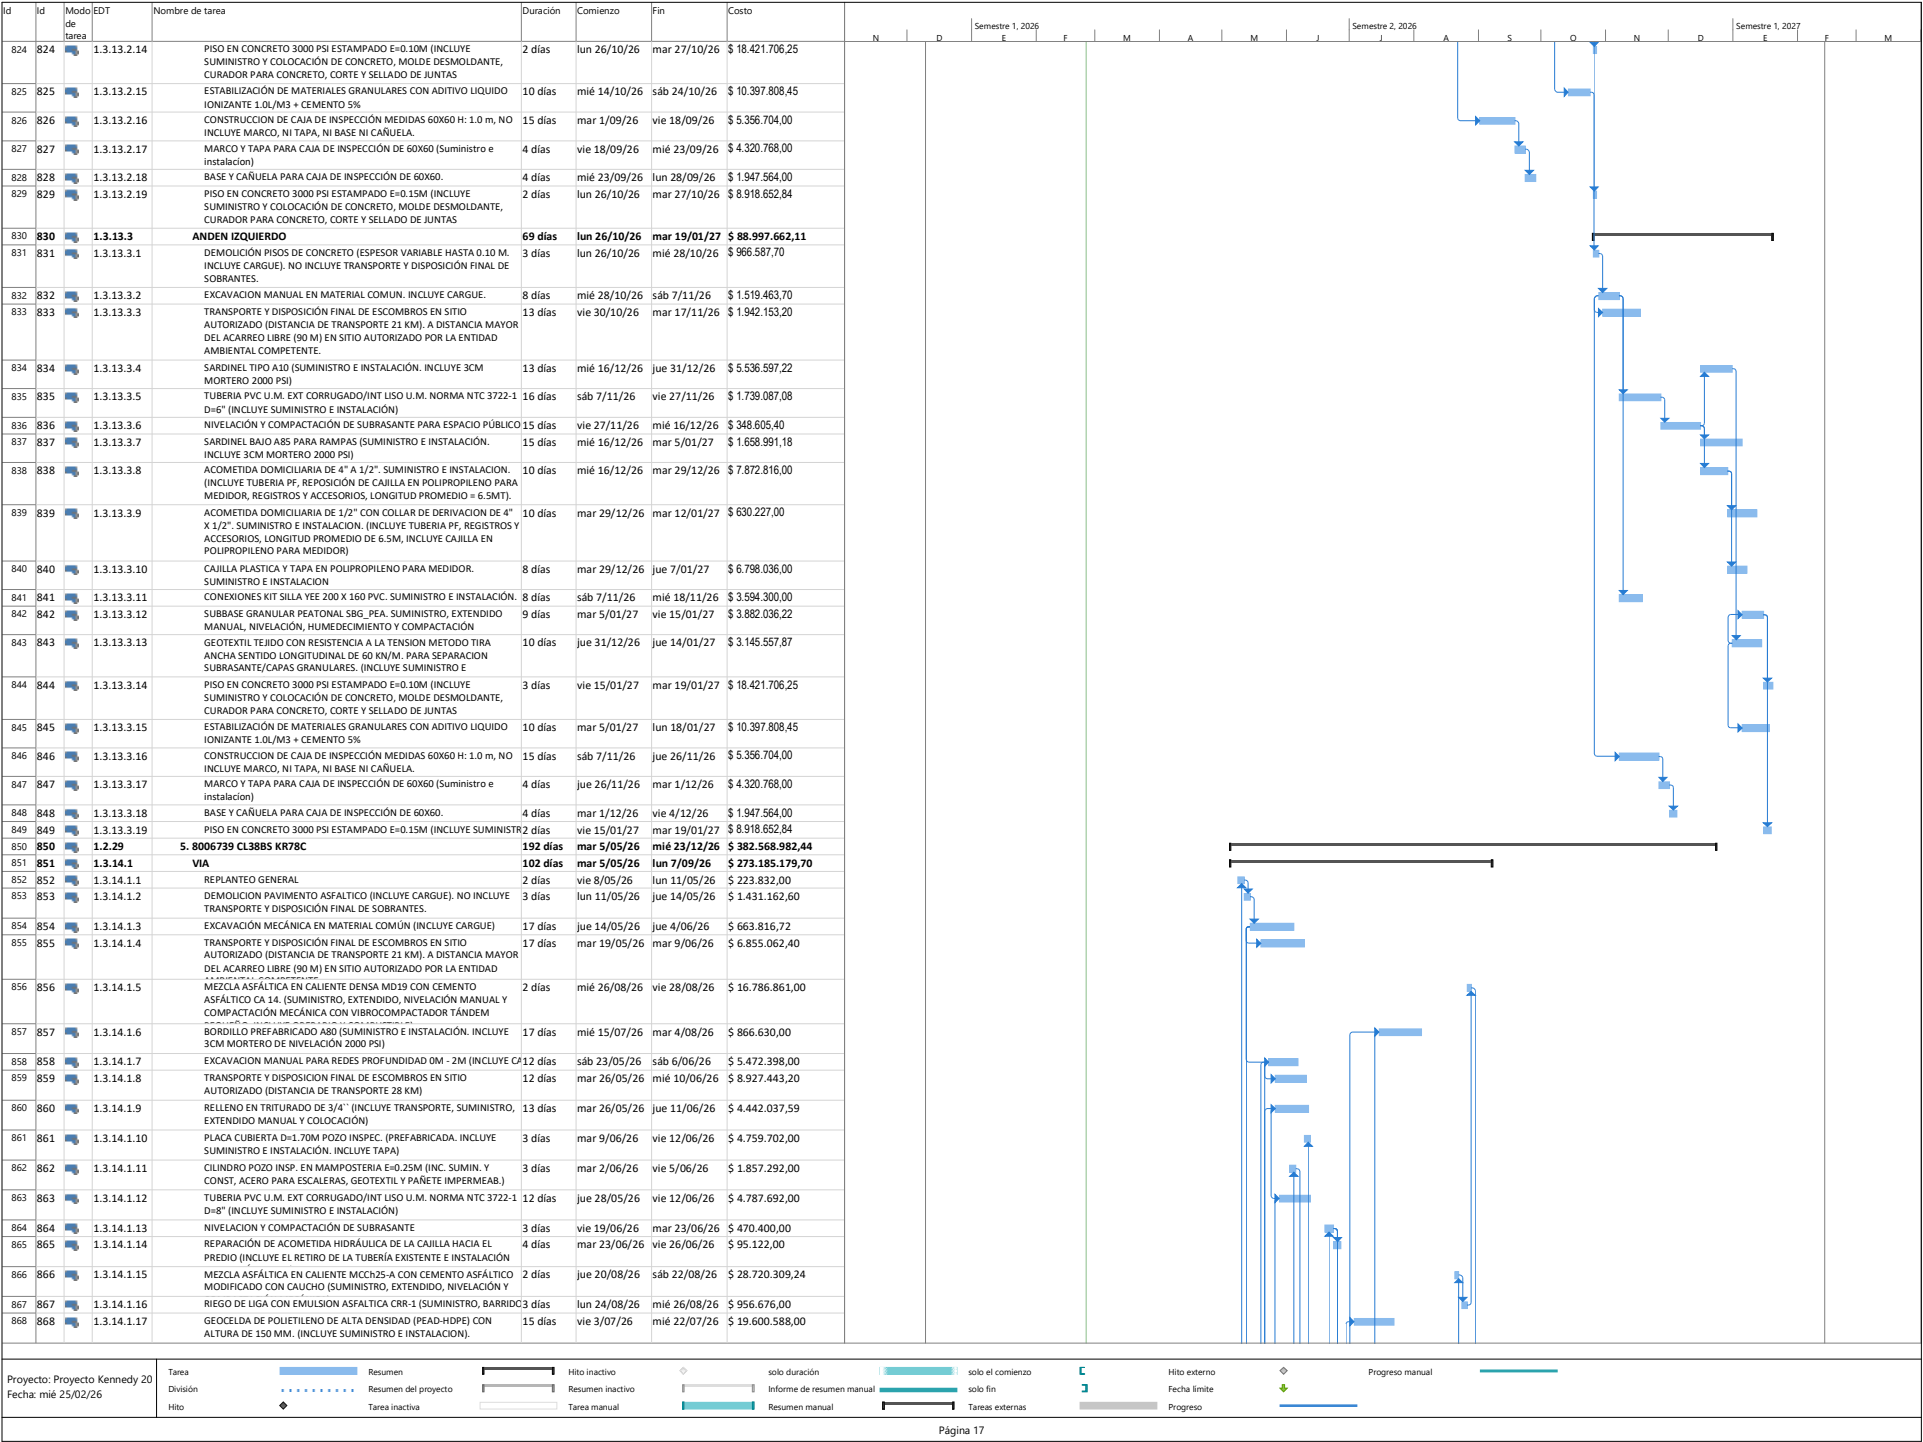


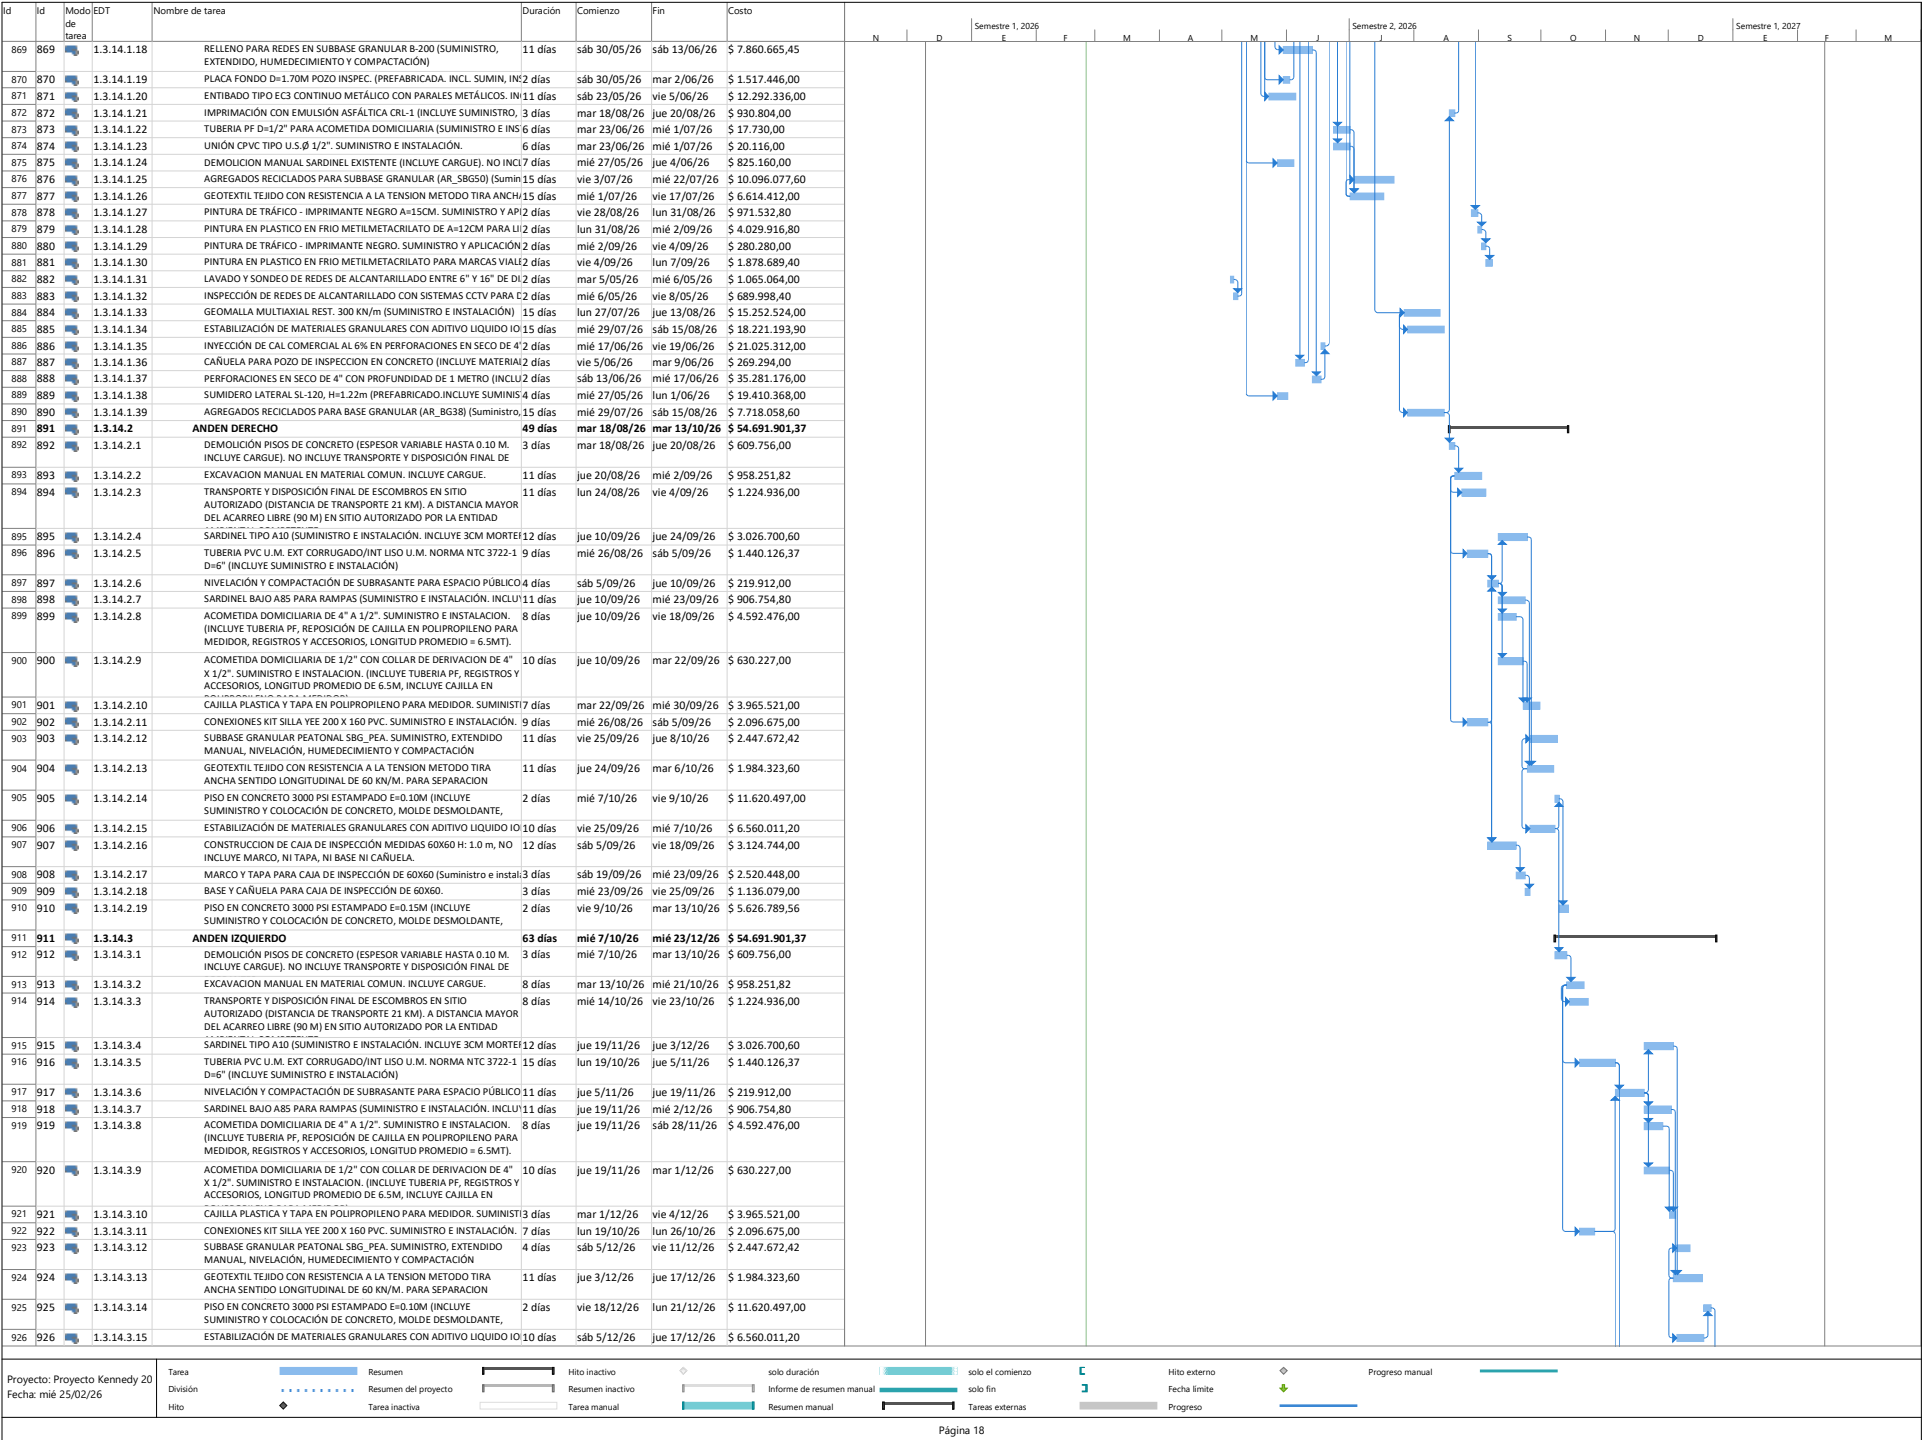

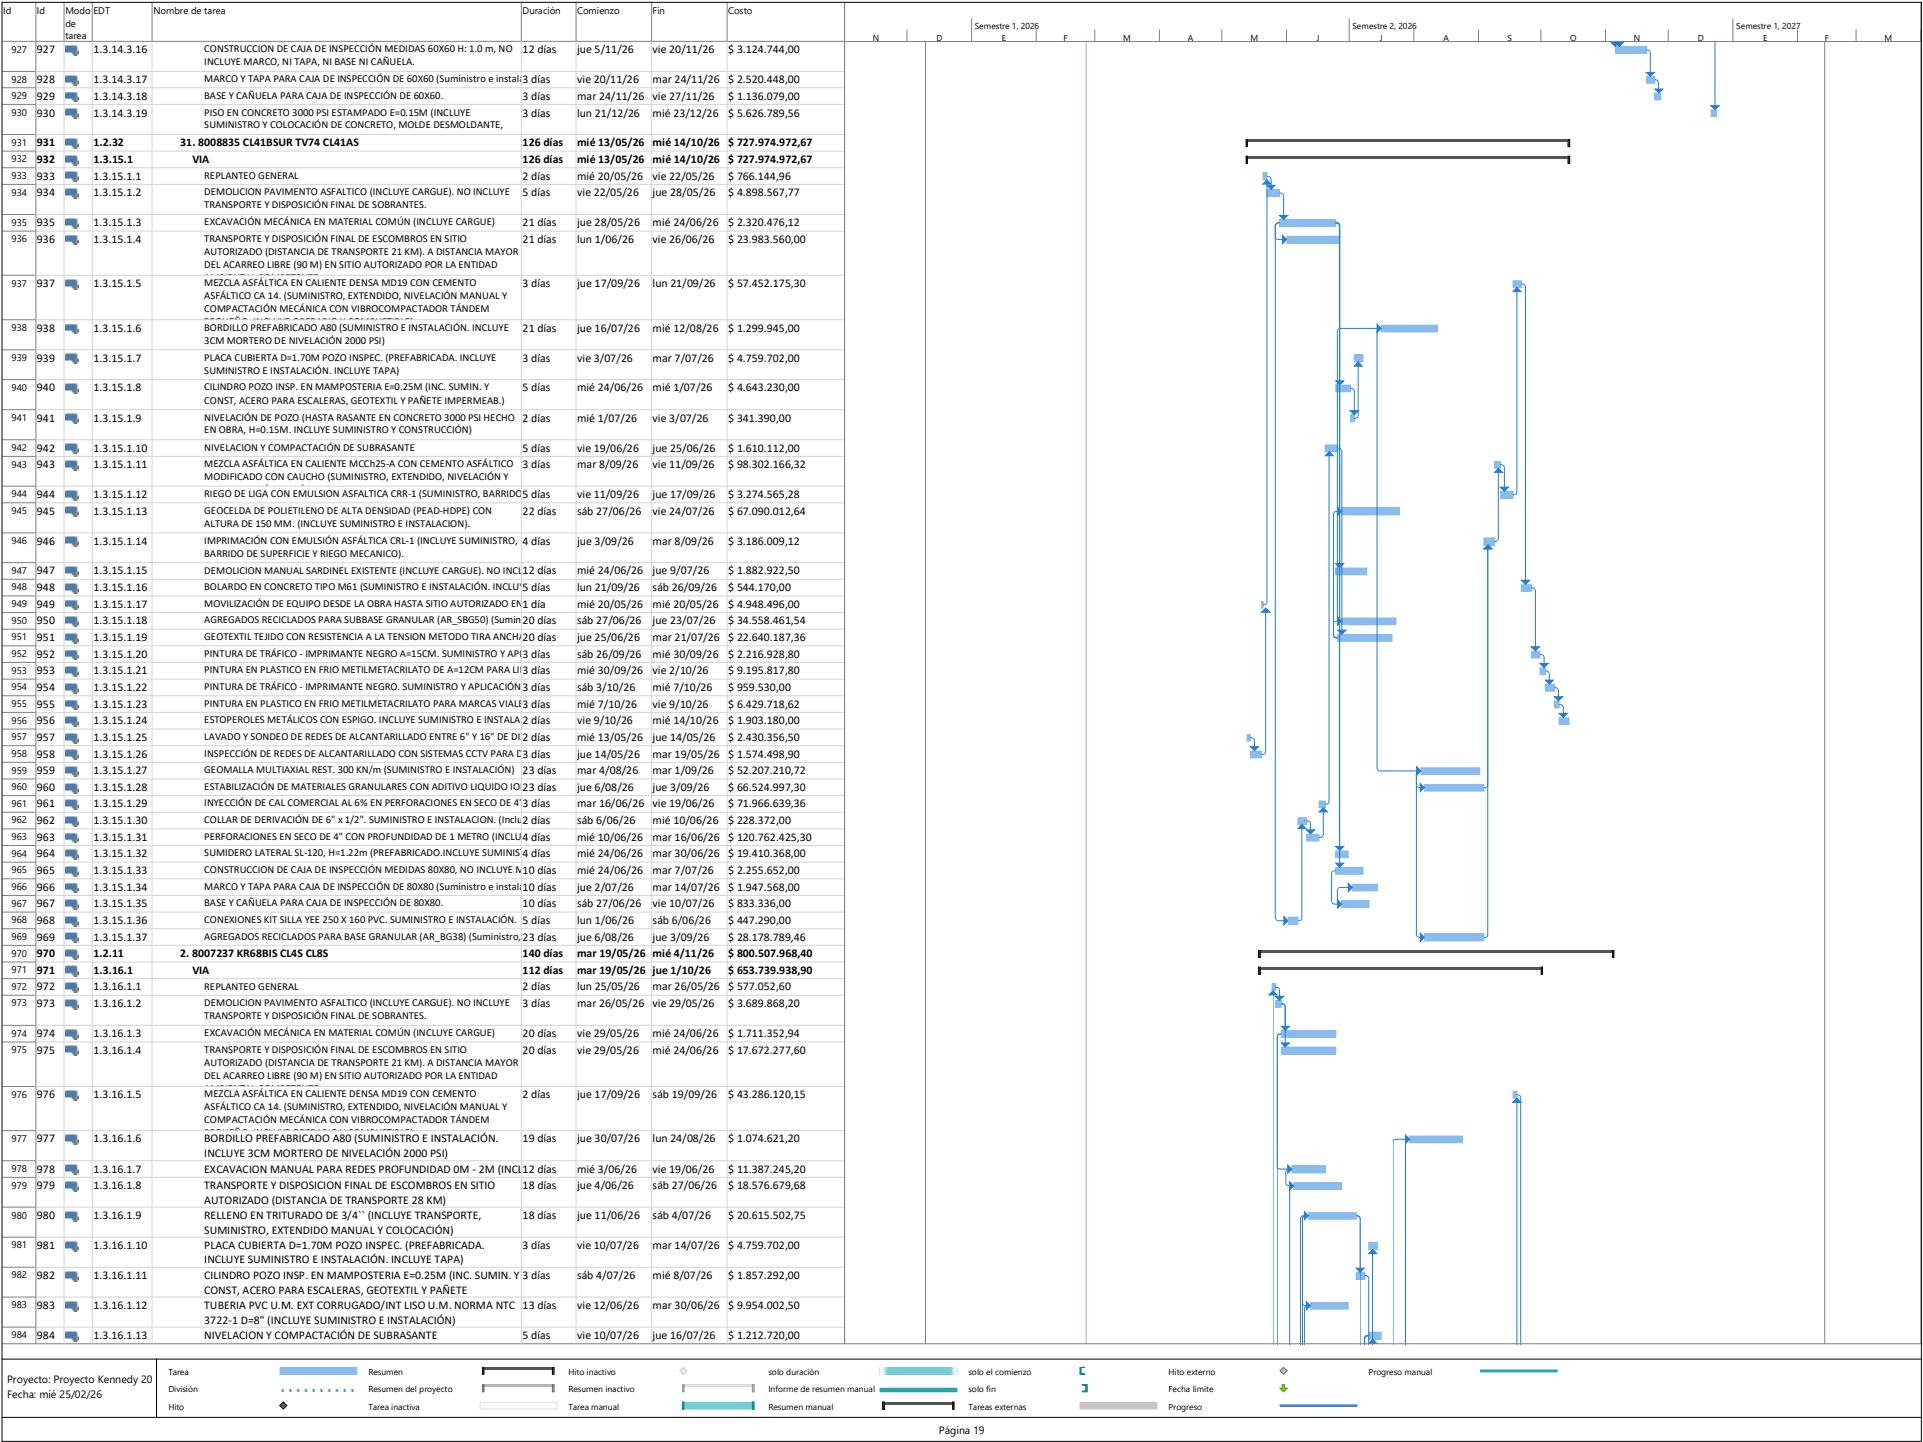

[illegible]


[illegible]

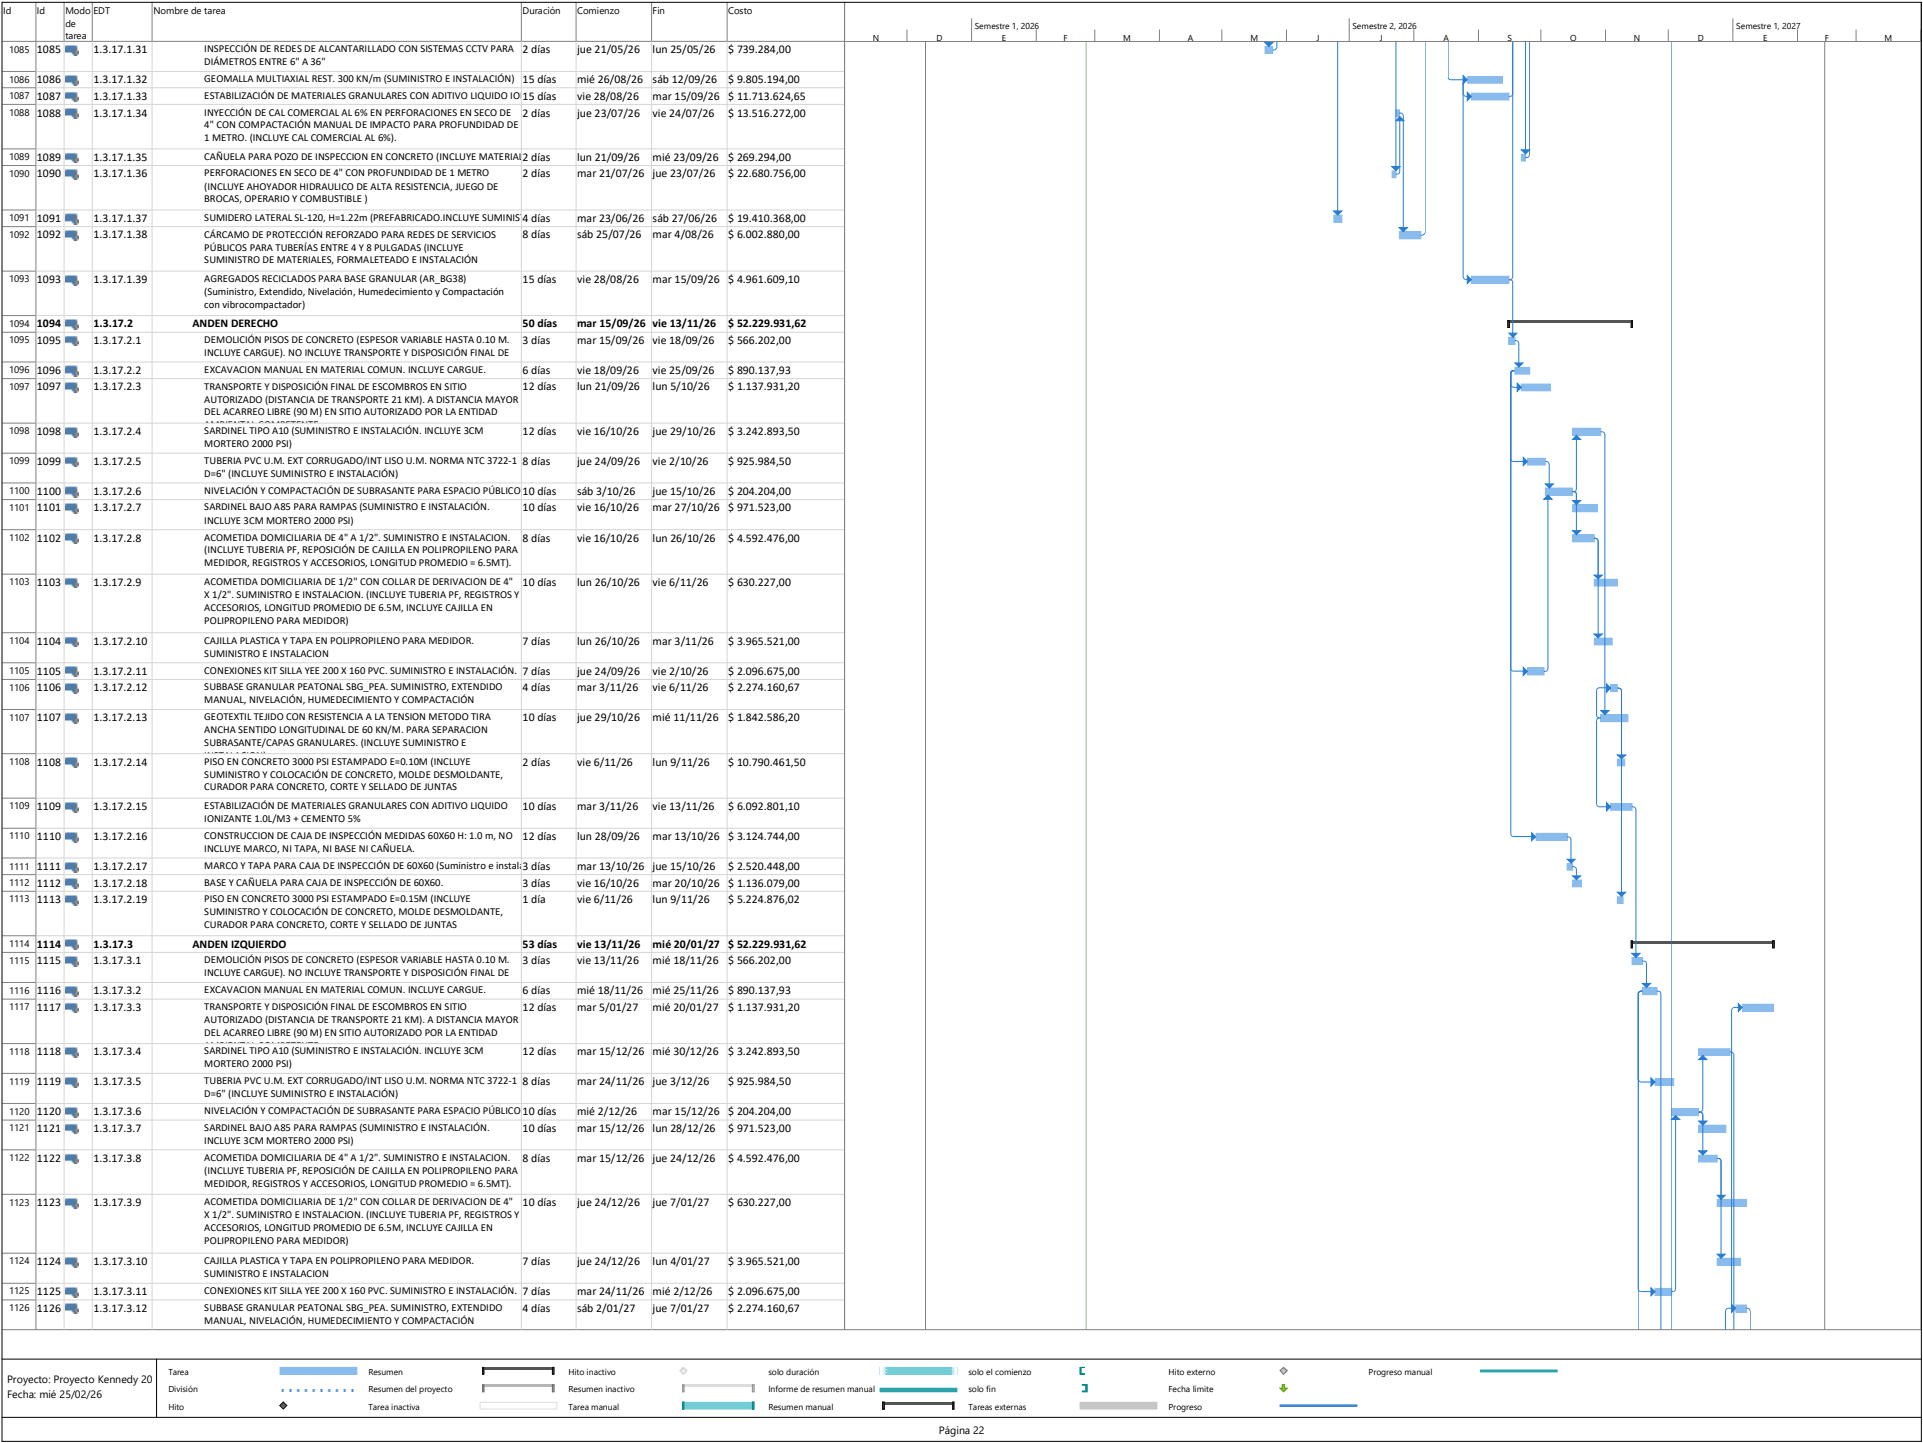

Página 22

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1127	1127	1.3.17.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	mié 30/12/26	mié 13/01/27	\$ 1.842.586,20	N		D		E		F		M		A		M		J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]

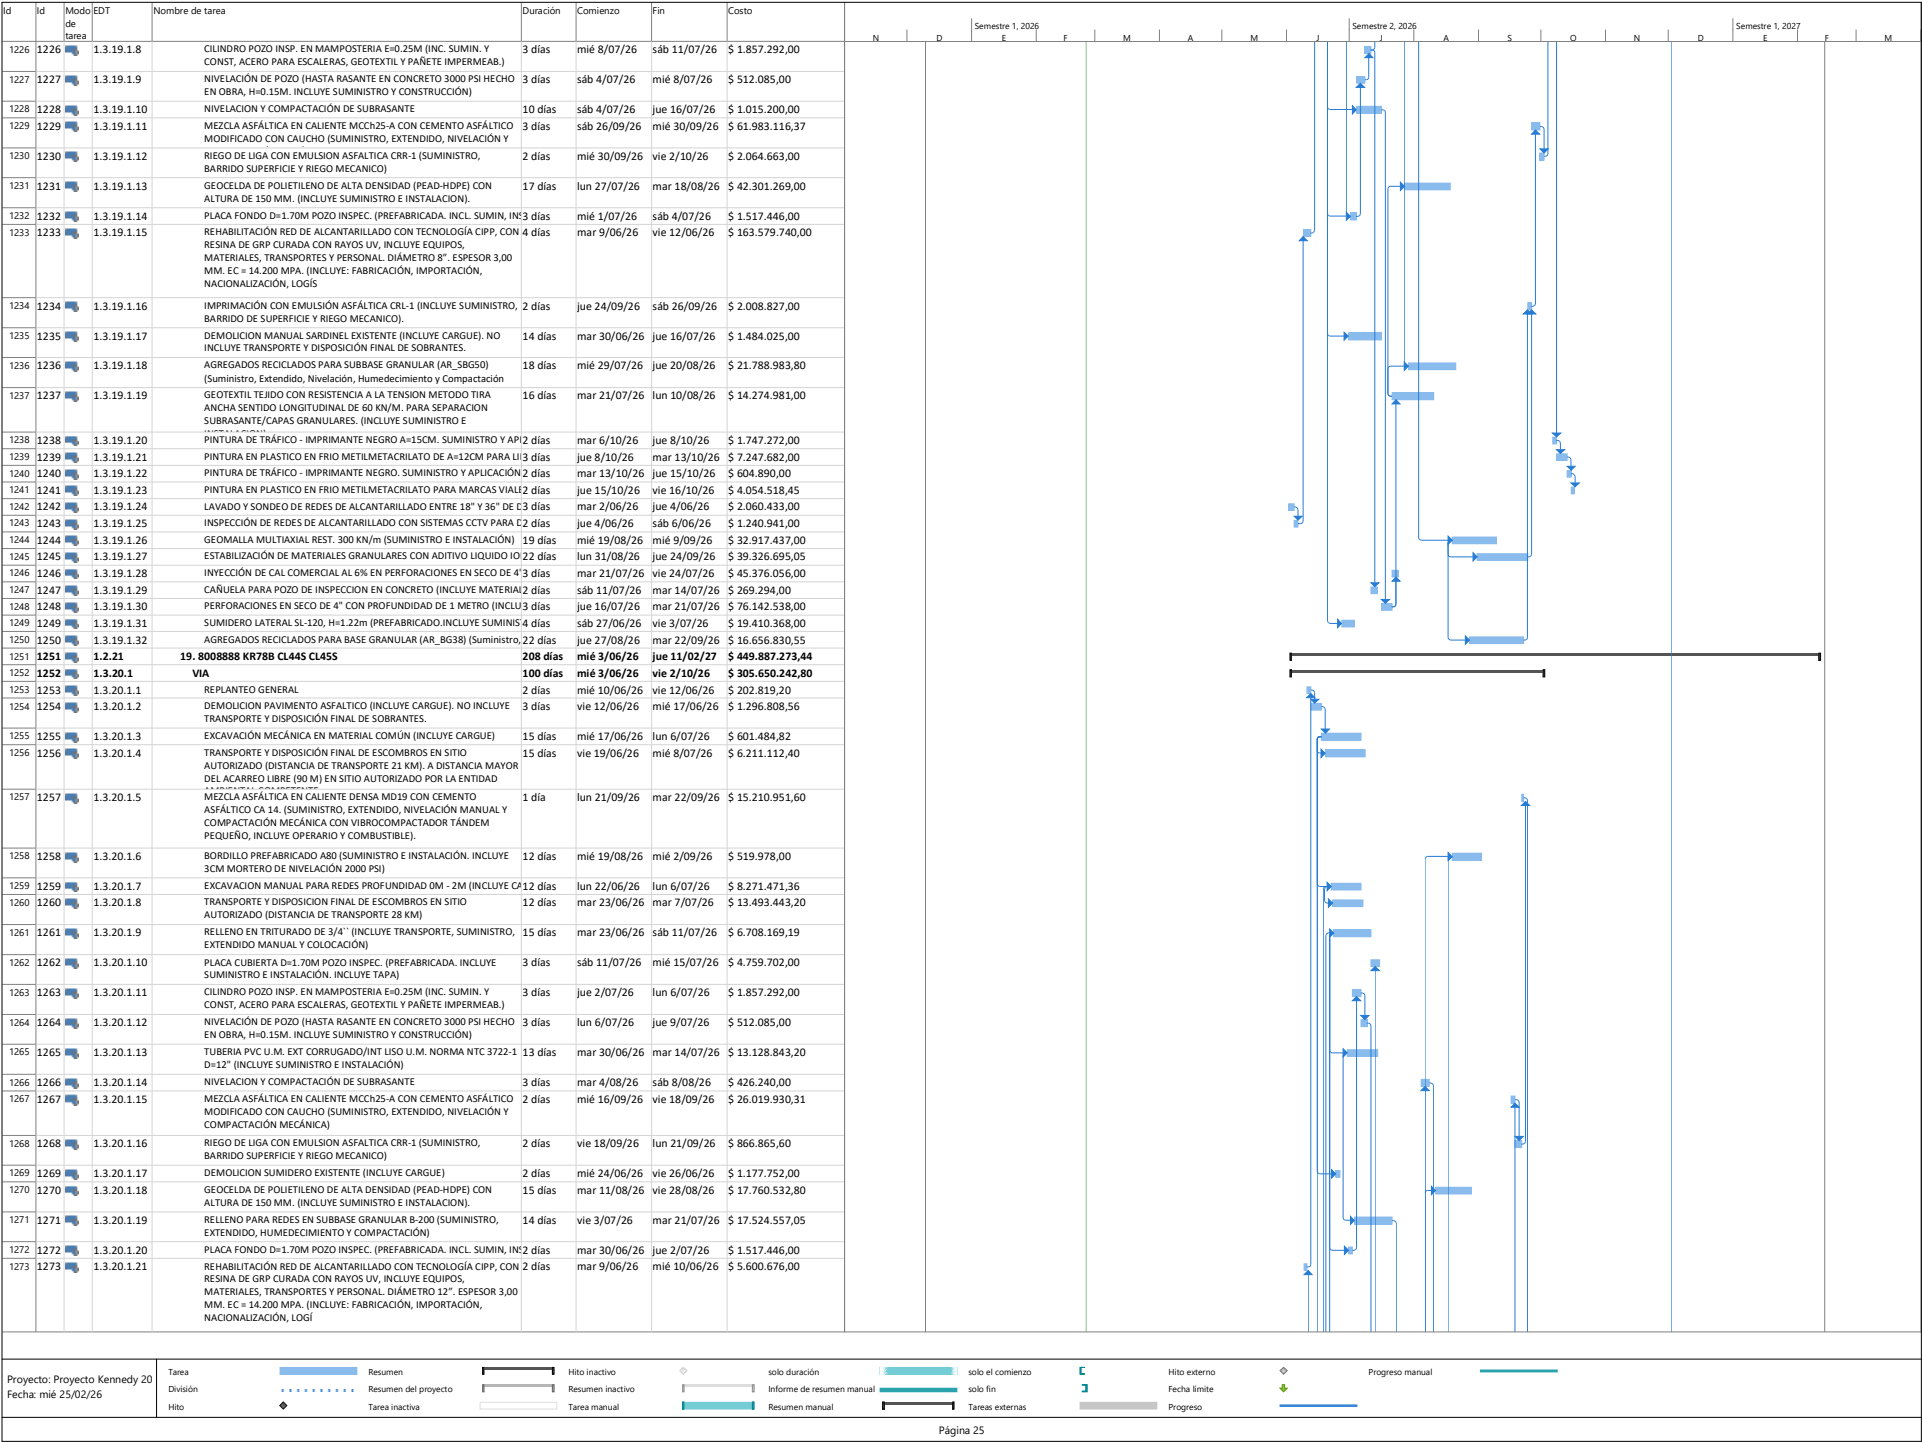

[illegible]

id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026									
								N	D	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	A	S	O	N	D	E	F	M
1316	1316		1.3.20.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	12 días	mié 2/12/26	jue 17/12/26																	
1317	1317		1.3.20.3.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	14 días	mar 12/01/27	jue 28/01/27																	
1318	1318		1.3.20.3.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC-3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	13 días	jue 10/12/26	sáb 26/12/26																	
1319	1319		1.3.20.3.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	12 días	sáb 26/12/26	mar 12/01/27																	
1320	1320		1.3.20.3.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	14 días	mar 12/01/27	jue 28/01/27																	
1321	1321		1.3.20.3.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	9 días	mar 12/01/27	vie 22/01/27																	
1322	1322		1.3.20.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	vie 22/01/27	mié 3/02/27																	
1323	1323		1.3.20.3.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	8 días	vie 22/01/27	lun 1/02/27																	
1324	1324		1.3.20.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	jue 10/12/26	vie 18/12/26																	
1325	1325		1.3.20.3.12	SUBBASE GRANULAR PENTONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	4 días	sáb 30/01/27	jue 4/02/27																	
1326	1326		1.3.20.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	13 días	jue 28/01/27	jue 11/02/27																	
1327	1327		1.3.20.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E+0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	jue 4/02/27	vie 5/02/27																	
1328	1328		1.3.20.3.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	sáb 30/01/27	mié 10/02/27																	
1329	1329		1.3.20.3.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H.: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	14 días	jue 10/12/26	lun 28/12/26																	
1330	1330		1.3.20.3.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalación)	4 días	lun 28/12/26	sáb 2/01/27																	
1331	1331		1.3.20.3.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	4 días	sáb 2/01/27	jue 7/01/27																	
1332	1332		1.3.20.3.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E+0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	jue 4/02/27	vie 5/02/27																	
1333	1333		1.2.1.14	8. 8006810 CL2S KR68C KR6BD	119 días	mar 9/06/26	jue 29/10/26																	
1334	1334		1.2.1.11	VIA	119 días	mar 9/06/26	jue 29/10/26																	
1335	1335		1.3.21.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26																	
1336	1336		1.3.21.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES.	3 días	mar 16/06/26	vie 19/06/26																	
1337	1337		1.3.21.1.3	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	18 días	vie 19/06/26	sáb 11/07/26																	
1338	1338		1.3.21.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	18 días	lun 22/06/26	mar 14/07/26																	
1339	1339		1.3.21.1.5	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	19 días	mié 2/09/26	jue 24/09/26																	
1340	1340		1.3.21.1.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	sáb 18/07/26	jue 23/07/26																	
1341	1341		1.3.21.1.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	2 días	lun 19/10/26	mié 21/10/26																	
1342	1342		1.3.21.1.8	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN	6 días	jue 23/07/26	jue 30/07/26																	
1343	1343		1.3.21.1.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26																	
1344	1344		1.3.21.1.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	3 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26																	
1345	1345		1.3.21.1.11	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO	4 días	jue 2/07/26	mar 7/07/26																	
1346	1346		1.3.21.1.12	GEOTÉXTEL DE POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	16 días	mar 25/08/26	vie 11/09/26																	
1347	1347		1.3.21.1.13	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, IN2 días	mar 7/07/26	jue 9/07/26																		
1348	1348		1.3.21.1.14	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	2 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26																	
1349	1349		1.3.21.1.15	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INS	6 días	jue 23/07/26	jue 30/07/26																	
1350	1350		1.3.21.1.16	UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	jue 23/07/26	jue 30/07/26																	
1351	1351		1.3.21.1.17	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES.	8 días	jue 2/07/26	sáb 11/07/26																	
1352	1352		1.3.21.1.18	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Sumin	16 días	mar 25/08/26	vie 11/09/26																	
1353	1353		1.3.21.1.19	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH	13 días	mié 19/08/26	mié 2/09/26																	
1354	1354		1.3.21.1.20	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y API2 días	mié 21/10/26	jue 22/10/26																		
1355	1355		1.3.21.1.21	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA UI2 días	vie 23/10/26	lun 26/10/26																		
1356	1356		1.3.21.1.22	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN2 días	lun 26/10/26	mié 28/10/26																		
1357	1357		1.3.21.1.23	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALE2 días	mié 28/10/26	jue 29/10/26																		
1358	1358		1.3.21.1.24	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE C2 días	mar 9/06/26	mié 10/06/26																		
1359	1359		1.3.21.1.25	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C2 días	mié 10/06/26	jue 12/06/26																		
1360	1360		1.3.21.1.26	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	16 días	lun 14/09/26	jue 1/10/26																	
1361	1361		1.3.21.1.27	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO18 días	vie 18/09/26	vie 9/10/26																		
1362	1362		1.3.21.1.28	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4"3 días	mié 15/07/26	sáb 18/07/26																		
1363	1363		1.3.21.1.29	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	2 días	jue 9/07/26	sáb 11/07/26																	

Proyecto: Proyecto Kennedy 20

Fecha: mié 25/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 27

Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027									
Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	E	F	M										
1364	1364	1.3.2.1.1.30	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUY	3 días	sáb 11/07/26	mié 15/07/26	\$ 37.477.249,20																									
1365	1365	1.3.2.1.1.31	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINIS	4 días	sáb 11/07/26	jue 16/07/26	\$ 19.410.368,00																									
1366	1366	1.3.2.1.1.32	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLI	15 días	jue 30/07/26	mié 19/08/26	\$ 2.000.960,00																									
1367	1367	1.3.2.1.1.33	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	18 días	vie 18/09/26	vie 9/10/26	\$ 8.198.468,37																									
1368	1368	1.2.15	13. 8009022 CL43AS KR78 KR78A	152 días	mar 16/06/26	mié 16/12/26	\$ 249.743.995,52																									
1369	1369	1.3.2.2.1	VIA	105 días	mar 16/06/26	mar 20/10/26	\$ 188.829.323,38																									
1370	1370	1.3.2.2.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 19/06/26	lun 22/06/26	\$ 130.073,80																									
1371	1371	1.3.2.2.1.2	DEMOLUCION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	\$ 831.924,11																									
1372	1372	1.3.2.2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	14 días	jue 25/06/26	lun 13/07/26	\$ 385.737,18																									
1373	1373	1.3.2.2.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	14 días	sáb 27/06/26	mié 15/07/26	\$ 3.983.331,60																									
1374	1374	1.3.2.2.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26	\$ 9.763.786,50																									
1375	1375	1.3.2.2.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	12 días	mié 9/09/26	mié 23/09/26	\$ 589.308,40																									
1376	1376	1.3.2.2.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	11 días	sáb 4/07/26	vie 17/07/26	\$ 4.680.646,80																									
1377	1377	1.3.2.2.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	11 días	mar 7/07/26	mar 21/07/26	\$ 7.635.813,12																									
1378	1378	1.3.2.2.1.9	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	12 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	\$ 3.795.770,43																									
1379	1379	1.3.2.2.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	\$ 4.759.702,00																									
1380	1380	1.3.2.2.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26	\$ 1.857.292,00																									
1381	1381	1.3.2.2.1.12	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	3 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	\$ 273.360,00																									
1382	1382	1.3.2.2.1.13	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERIA EXISTENTE E INSTALACIÓN	1 día	lun 24/08/26	mar 25/08/26	\$ 47.561,00																									
1383	1383	1.3.2.2.1.14	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCch25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	sáb 3/10/26	mar 6/10/26	\$ 16.683.736,49																									
1384	1384	1.3.2.2.1.15	RIEGO DE LACA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26	\$ 555.945,90																									
1385	1385	1.3.2.2.1.16	DEMOLUCION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	1 día	vie 3/07/26	sáb 4/07/26	\$ 1.177.752,00																									
1386	1386	1.3.2.2.1.17	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTUF	12 días	mié 2/09/26	mar 15/09/26	\$ 11.390.341,70																									
1387	1387	1.3.2.2.1.18	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTE	12 días	jue 23/07/26	jue 6/08/26	\$ 9.916.948,05																									
1388	1388	1.3.2.2.1.19	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. IN	2 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26	\$ 1.517.446,00																									
1389	1389	1.3.2.2.1.20	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. IN	12 días	lun 6/07/26	mar 21/07/26	\$ 10.504.930,00																									
1390	1390	1.3.2.2.1.21	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 2 días	jue 1/10/26	sáb 3/10/26	\$ 540.911,10																										
1391	1391	1.3.2.2.1.22	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	6 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	\$ 20.116,00																									
1392	1392	1.3.2.2.1.23	DEMOLUCION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCL	8 días	vie 3/07/26	lun 13/07/26	\$ 705.175,00																									
1393	1393	1.3.2.2.1.24	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBGS0) (Sumin	12 días	mié 2/09/26	mar 15/09/26	\$ 5.867.057,34																									
1394	1394	1.3.2.2.1.25	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	13 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	\$ 3.843.783,30																									
1395	1395	1.3.2.2.1.26	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APl	2 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26	\$ 830.264,00																									
1396	1396	1.3.2.2.1.27	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA UI	2 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26	\$ 3.443.934,00																									
1397	1397	1.3.2.2.1.28	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	jue 15/10/26	vie 16/10/26	\$ 163.020,00																									
1398	1398	1.3.2.2.1.29	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIAL	2 días	sáb 17/10/26	mar 20/10/26	\$ 1.092.707,10																									
1399	1399	1.3.2.2.1.30	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DI	2 días	mar 16/06/26	mié 17/06/26	\$ 910.195,00																									
1400	1400	1.3.2.2.1.31	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C	2 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26	\$ 589.667,00																									
1401	1401	1.3.2.2.1.32	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	jue 17/09/26	sáb 3/10/26	\$ 8.863.584,10																									
1402	1402	1.3.2.2.1.33	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	10 días	sáb 19/09/26	jue 1/10/26	\$ 10.588.506,45																									
1403	1403	1.3.2.2.1.34	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4"	2 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	\$ 12.218.280,80																									
1404	1404	1.3.2.2.1.35	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIAL	2 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	\$ 269.294,00																									
1405	1405	1.3.2.2.1.36	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHORADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	2 días	jue 6/08/26	lun 10/08/26	\$ 20.502.683,40																									
1406	1406	1.3.2.2.1.37	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINIS	4 días	jue 23/07/26	mar 28/07/26	\$ 19.410.368,00																									
1407	1407	1.3.2.2.1.38	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLI	6 días	mié 12/08/26	jue 20/08/26	\$ 4.001.920,00																									
1408	1408	1.3.2.2.1.39	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	6 días	sáb 19/09/26	sáb 26/09/26	\$ 4.486.449,71																									
1409	1409	1.3.2.2.2	ANDEN DERECHO	34 días	sáb 26/09/26	vie 6/11/26	\$ 30.457.336,07																									
1410	1410	1.3.2.2.2.1	DEMOLUCION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	2 días	sáb 26/09/26	mar 29/09/26	\$ 208.437,00																									
1411	1411	1.3.2.2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	8 días	mar 29/09/26	jue 8/10/26	\$ 327.761,71																									
1412	1412	1.3.2.2.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	8 días	jue 1/10/26	vie 9/10/26	\$ 418.996,80																									
1413	1413	1.3.2.2.2.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTER	8 días	lun 26/10/26	mié 4/11/26	\$ 2.587.108,37																									
1414	1414	1.3.2.2.2.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	sáb 3/10/26	mar 13/10/26	\$ 836.913,61																									
1415	1415	1.3.2.2.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	7 días	mar 13/10/26	mié 21/10/26	\$ 75.174,00																									
1416	1416	1.3.2.2.2.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	9 días	lun 26/10/26	jue 5/11/26	\$ 775.367,88																									
1417	1417	1.3.2.2.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	mié 21/10/26	mié 28/10/26	\$ 3.936.408,00																									
1418	1418	1.3.2.2.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN	7 días	mié 21/10/26	mié 28/10/26	\$ 630.227,00																									
Proyecto: Proyecto Kennedy 20 Fecha: mié 25/02/26							<div><div><div><div></div><div>Resumen</div></div><div><div></div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div>Tarea inactiva</div></div></div><div><div><div></div><div>Hito inactivo</div></div><div><div></div><div>Resumen inactivo</div></div><div><div></div><div>Informe de resumen manual</div></div></div><div><div><div></div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div>solo el comienzo</div></div><div><div></div><div>solo fin</div></div><div><div></div><div>Resumen manual</div></div><div><div></div><div>Tareas externas</div></div></div><div><div><div></div><div>Hito externo</div></div><div><div></div><div>Fecha limite</div></div><div><div></div><div>Progreso manual</div></div><div><div></div><div>Progreso</div></div></div></div>																									
Página 28																																

Modo de tarea								Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027											
id	id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																			
1419	1419		1.3.22.2.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	jue 29/10/26	mié 4/11/26	\$ 3.399.018,00																																			
1420	1420		1.3.22.2.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	sáb 3/10/26	mar 13/10/26	\$ 1.797.150,00																																			
1421	1421		1.3.22.2.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBC_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	vie 23/10/26	mar 27/10/26	\$ 837.483,38																																			
1422	1422		1.3.22.2.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	11 días	mié 21/10/26	mié 4/11/26	\$ 678.314,70																																			
1423	1423		1.3.22.2.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26	\$ 3.972.312,75																																			
1424	1424		1.3.22.2.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	vie 23/10/26	mié 4/11/26	\$ 2.240.701,50																																			
1425	1425		1.3.22.2.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	10 días	mar 13/10/26	vie 23/10/26	\$ 2.678.352,00																																			
1426	1426		1.3.22.2.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	3 días	vie 23/10/26	mié 28/10/26	\$ 2.160.384,00																																			
1427	1427		1.3.22.2.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	4 días	mié 28/10/26	mar 3/11/26	\$ 973.782,00																																			
1428	1428		1.3.22.2.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26	\$ 1.923.443,37																																			
1429	1429		1.3.22.3	ANDEN IZQUIERDO	34 días	jue 5/11/26	mié 16/12/26	\$ 30.457.336,07																																			
1430	1430		1.3.22.3.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26	\$ 208.437,00																																			
1431	1431		1.3.22.3.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE	8 días	vie 6/11/26	mar 17/11/26	\$ 327.761,71																																			
1432	1432		1.3.22.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR	8 días	mar 10/11/26	jue 19/11/26	\$ 418.996,80																																			
1433	1433		1.3.22.3.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	8 días	jue 3/12/26	lun 14/12/26	\$ 2.587.108,37																																			
1434	1434		1.3.22.3.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	mié 11/11/26	vie 20/11/26	\$ 836.913,61																																			
1435	1435		1.3.22.3.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO P17	7 días	vie 20/11/26	sáb 28/11/26	\$ 75.174,00																																			
1436	1436		1.3.22.3.7	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	9 días	jue 3/12/26	mar 15/12/26	\$ 775.367,88																																			
1437	1437		1.3.22.3.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS,	7 días	lun 30/11/26	lun 7/12/26	\$ 3.936.408,00																																			
1438	1438		1.3.22.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	7 días	lun 30/11/26	lun 7/12/26	\$ 630.227,00																																			
1439	1439		1.3.22.3.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	lun 7/12/26	lun 14/12/26	\$ 3.399.018,00																																			
1440	1440		1.3.22.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	mié 11/11/26	vie 20/11/26	\$ 1.797.150,00																																			
1441	1441		1.3.22.3.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBC_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	3 días	mar 1/12/26	vie 4/12/26	\$ 837.483,38																																			
1442	1442		1.3.22.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE	11 días	lun 30/11/26	sáb 12/12/26	\$ 678.314,70																																			
1443	1443		1.3.22.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO	2 días	lun 14/12/26	mié 16/12/26	\$ 3.972.312,75																																			
1444	1444		1.3.22.3.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	mar 1/12/26	lun 14/12/26	\$ 2.240.701,50																																			
1445	1445		1.3.22.3.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	10 días	vie 20/11/26	mié 2/12/26	\$ 2.678.352,00																																			
1446	1446		1.3.22.3.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	3 días	mié 2/12/26	sáb 5/12/26	\$ 2.160.384,00																																			
1447	1447		1.3.22.3.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	4 días	sáb 5/12/26	vie 11/12/26	\$ 973.782,00																																			
1448	1448		1.3.22.3.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO	2 días	lun 14/12/26	mié 16/12/26	\$ 1.923.443,37																																			
1449	1449		1.2.30	25. 8008350 KR69A CL245 CL255	193 días	mié 17/06/26	vie 5/02/27	\$ 1.389.053.841,28																																			
1450	1450		1.3.23.1	VIA	138 días	mié 17/06/26	lun 30/11/26	\$ 1.187.967.788,26																																			
1451	1451		1.3.23.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	mar 23/06/26	jue 25/06/26	\$ 1.304.620,80																																			
1452	1452		1.3.23.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	5 días	jue 25/06/26	jue 2/07/26	\$ 8.341.633,44																																			
1453	1453		1.3.23.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	17 días	jue 2/07/26	jue 23/07/26	\$ 3.869.117,58																																			
1454	1454		1.3.23.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	17 días	lun 6/07/26	sáb 25/07/26	\$ 39.954.092,40																																			
1455	1455		1.3.23.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM	5 días	mar 3/11/26	lun 9/11/26	\$ 97.843.418,40																																			
1456	1456		1.3.23.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	20 días	lun 31/08/26	mar 22/09/26	\$ 1.213.282,00																																			
1457	1457		1.3.23.1.7	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	\$ 4.759.702,00																																			
1458	1458		1.3.23.1.8	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	vie 10/07/26	mar 14/07/26	\$ 1.857.292,00																																			
1459	1459		1.3.23.1.9	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	3 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26	\$ 512.085,00																																			
1460	1460		1.3.23.1.10	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	mar 4/08/26	lun 10/08/26	\$ 2.741.760,00																																			
1461	1461		1.3.23.1.11	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	5 días	mié 21/10/26	mar 27/10/26	\$ 167.402.560,50																																			
1462	1462		1.3.23.1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDOS	5 días	mar 27/10/26	mar 3/11/26	\$ 5.576.054,40																																			

Proyecto: Proyecto Kennedy 20
Fecha: mié 25/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

<

Id	Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026			Semestre 1, 2027		
									N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	
1463	1463			1.3.23.1.13	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	23 días	mié 12/08/26	mar 8/09/26	\$ 114.243.427,20																	
1464	1464			1.3.23.1.14	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. E INSTALACIÓN).	2 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26	\$ 1.517.446,00																	
1465	1465			1.3.23.1.15	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).	5 días	jue 15/10/26	mié 21/10/26	\$ 5.425.257,60																	
1466	1466			1.3.23.1.16	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	15 días	mar 14/07/26	sáb 1/08/26	\$ 3.435.360,00																	
1467	1467			1.3.23.1.17	AGREGADOS RECIKLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	22 días	mié 12/08/26	mar 8/09/26	\$ 58.845.709,44																	
1468	1468			1.3.23.1.18	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	22 días	lun 10/08/26	vie 4/09/26	\$ 38.552.572,80																	
1469	1469			1.3.23.1.19	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	4 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26	\$ 4.044.748,80																	
1470	1470			1.3.23.1.20	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744.	4 días	jue 12/11/26	mié 18/11/26	\$ 16.777.612,80																	
1471	1471			1.3.23.1.21	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	3 días	jue 19/11/26	lun 23/11/26	\$ 1.633.775,00																	
1472	1472			1.3.23.1.22	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, MARCAS DE PISO, ENTRE OTROS.	5 días	lun 23/11/26	vie 27/11/26	\$ 10.950.075,36																	
1473	1473			1.3.23.1.23	ESTOPERÓLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 27/11/26	lun 30/11/26	\$ 1.903.180,00																	
1474	1474			1.3.23.1.24	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COIMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL. MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN. DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	3 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26	\$ 4.434.144,00																	
1475	1475			1.3.23.1.25	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	3 días	vie 19/06/26	mar 23/06/26	\$ 2.872.646,40																	
1476	1476			1.3.23.1.26	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	24 días	mar 15/09/26	mar 13/10/26	\$ 88.900.425,60																	
1477	1477			1.3.23.1.27	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	24 días	mié 16/09/26	jue 15/10/26	\$ 106.204.483,70																	
1478	1478			1.3.23.1.28	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	mié 29/07/26	mar 4/08/26	\$ 122.547.532,80																	
1479	1479			1.3.23.1.29	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	2 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	\$ 269.294,00																	
1480	1480			1.3.23.1.30	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHORAYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	\$ 205.638.854,40																	
1481	1481			1.3.23.1.31	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	\$ 19.410.368,00																	
1482	1482			1.3.23.1.32	AGREGADOS RECIKLADOS PARA BASE GRANULAR (AR, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	24 días	mié 16/09/26	jue 15/10/26	\$ 44.985.255,84																	
1483	1483			1.3.23.2	ANDEN IZQUIERDO	93 días	jue 15/10/26	vie 5/02/27	\$ 201.086.053,02																	
1484	1484			1.3.23.2.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	5 días	jue 15/10/26	mié 21/10/26	\$ 2.115.480,00																	
1485	1485			1.3.23.2.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	14 días	mié 21/10/26	vie 6/11/26	\$ 3.325.355,04																	
1486	1486			1.3.23.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	15 días	vie 23/10/26	mié 11/11/26	\$ 4.250.642,40																	
1487	1487			1.3.23.2.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTEI)	16 días	vie 11/12/26	jue 31/12/26	\$ 12.600.957,60																	
1488	1488			1.3.23.2.5	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT. USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	22 días	mar 27/10/26	mar 24/11/26	\$ 8.395.592,80																	
1489	1489			1.3.23.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	15 días	mar 24/11/26	vie 11/12/26	\$ 762.960,00																	
1490	1490			1.3.23.2.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CARGUE)	22 días	vie 11/12/26	vie 8/01/27	\$ 3.775.060,80																	
1491	1491			1.3.23.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	16 días	vie 11/12/26	jue 31/12/26	\$ 17.713.836,00																	
1492	1492			1.3.23.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	10 días	vie 11/12/26	mié 23/12/26	\$ 630.227,00																	
1493	1493			1.3.23.2.10	CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	13 días	jue 31/12/26	lun 18/01/27	\$ 15.295.581,00																	
1494	1494			1.3.23.2.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	11 días	mar 27/10/26	mar 10/11/26	\$ 8.087.175,00																	
1495	1495			1.3.23.2.12	SUBBASE GRANULAR PATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	12 días	mar 12/01/27	mar 26/01/27	\$ 8.495.135,28																	
1496	1496			1.3.23.2.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	vie 8/01/27	mar 26/01/27	\$ 6.884.388,00																	
1497	1497			1.3.23.2.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	4 días	sáb 30/01/27	jue 4/02/27	\$ 40.316.010,00																	
1498	1498			1.3.23.2.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	16 días	mar 12/01/27	vie 29/01/27	\$ 22.759.806,30																	
1499	1499			1.3.23.2.16	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60x60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	18 días	mar 24/11/26	mar 15/12/26	\$ 12.052.584,00																	
1500	1500			1.3.23.2.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalación)	5 días	mar 15/12/26	lun 21/12/26	\$ 9.721.728,00																	
1501	1501			1.3.23.2.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	4 días	lun 21/12/26	sáb 26/12/26	\$ 4.382.019,00																	
1502	1502			1.3.23.2.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	2 días	jue 4/02/27	vie 5/02/27	\$ 19.521.514,80																	
1503	1503			1.2.16	14. 8008916 CL43AS KR78A KR78B	165 días	mar 30/06/26	sáb 16/01/27	\$ 270.910.894,37																	
1504	1504			1.3.24.1	VIA	107 días	mar 30/06/26	jue 5/11/26	\$ 207.724.268,11																	
1505	1505			1.3.24.1.1	REPLANTEO GENERAL.	2 días	vie 3/07/26	lun 6/07/26	\$ 143.892,00																	
1506	1506			1.3.24.1.2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	lun 6/07/26	jue 9/07/26	\$ 920.033,10																	
1507	1507			1.3.24.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	18 días	jue 9/07/26	vie 31/07/26	\$ 426.739,32																	
1508	1508			1.3.24.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	18 días	lun 13/07/26	mar 4/08/26	\$ 4.406.907,60																	
1509	1509			1.3.24.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26	\$ 10.791.553,50																	
Proyecto: Proyecto Kennedy 20 Fecha: mié 25/02/26																										
Tarea									Hito inactivo																	
División									Hito externo																	
Hito									Progreso																	
Resumen									Progreso manual																	
Resumen del proyecto									Fecha límite																	
Tarea inactiva									Progreso																	
									Tareas externas																	

</

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027						
								N	D	E	F	M	A	M	J		A	S	O	N	D	E	F	M				
1562	1562		1.3.24.2.16 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60x60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	10 días	lun 26/10/26	vie 6/11/26	\$ 2.678.352,00																					
1563	1563		1.3.24.2.17 MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60 (Suministro e instal	3 días	vie 30/10/26	jue 5/11/26	\$ 2.160.384,00																					
1564	1564		1.3.24.2.18 BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60.	4 días	jue 5/11/26	mar 10/11/26	\$ 973.782,00																					
1565	1565		1.3.24.2.19 PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mié 25/11/26	jue 26/11/26	\$ 2.066.983,92																					
1566	1566		1.3.24.3 ANDEN IZQUIERDO	39 días	vie 27/11/26	sáb 16/01/27	\$ 31.593.313,13																					
1567	1567		1.3.24.3.1 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO [ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE]. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	2 días	vie 27/11/26	lun 30/11/26	\$ 223.992,00																					
1568	1568		1.3.24.3.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	9 días	mar 1/12/26	vie 11/12/26	\$ 352.212,85																					
1569	1569		1.3.24.3.3 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	9 días	mar 1/12/26	sáb 12/12/26	\$ 450.478,80																					
1570	1570		1.3.24.3.4 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	8 días	mie 30/12/26	sáb 9/01/27	\$ 2.779.623,00																					
1571	1571		1.3.24.3.5 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6"	8 días	jue 3/12/26	lun 14/12/26	\$ 925.984,50																					
1572	1572		1.3.24.3.6 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	8 días	lun 14/12/26	mié 23/12/26	\$ 80.784,00																					
1573	1573		1.3.24.3.7 SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	8 días	mie 30/12/26	sáb 9/01/27	\$ 832.734,00																					
1574	1574		1.3.24.3.8 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	mié 23/12/26	sáb 2/01/27	\$ 3.936.408,00																					
1575	1575		1.3.24.3.9 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN	10 días	mié 23/12/26	mié 6/01/27	\$ 630.227,00																					
1576	1576		1.3.24.3.10 CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	8 días	mié 6/01/27	sáb 16/01/27	\$ 3.399.018,00																					
1577	1577		1.3.24.3.11 CONEXIONES KIT SILA VEZ 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	jue 3/12/26	sáb 12/12/26	\$ 1.797.150,00																					
1578	1578		1.3.24.3.12 SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	lun 28/12/26	jue 31/12/26	\$ 899.947,61																					
1579	1579		1.3.24.3.13 GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	mié 23/12/26	mié 6/01/27	\$ 728.935,20																					
1580	1580		1.3.24.3.14 PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mié 6/01/27	vie 8/01/27	\$ 4.268.754,00																					
1581	1581		1.3.24.3.15 ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	lun 28/12/26	sáb 9/01/27	\$ 2.407.562,25																					
1582	1582		1.3.24.3.16 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60x60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	10 días	lun 7/12/26	vie 18/12/26	\$ 2.678.352,00																					
1583	1583		1.3.24.3.17 MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60 (Suministro e instal	3 días	lun 14/12/26	mié 16/12/26	\$ 2.160.384,00																					
1584	1584		1.3.24.3.18 BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60.	4 días	mié 16/12/26	lun 21/12/26	\$ 973.782,00																					
1585	1585		1.3.24.3.19 PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mié 6/01/27	vie 8/01/27	\$ 2.066.983,92																					
1586	1586		1.2.17 15. 8008802 CL43AS KR78B KR78C	149 días	mié 8/07/26	mar 5/01/27	\$ 261.895.980,35																					
1587	1587		1.3.25.1 VIA	91 días	mié 8/07/26	sáb 24/10/26	\$ 200.260.061,69																					
1588	1588		1.3.25.1.1 REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 13/07/26	mar 14/07/26	\$ 140.603,04																					
1589	1589		1.3.25.1.2 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26	\$ 899.101,13																					
1590	1590		1.3.25.1.3 EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	13 días	vie 17/07/26	lun 3/08/26	\$ 417.011,22																					
1591	1591		1.3.25.1.4 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	13 días	mar 21/07/26	mié 5/08/26	\$ 4.306.165,20																					
1592	1592		1.3.25.1.5 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26	\$ 10.551.741,20																					
1593	1593		1.3.25.1.6 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	12 días	mar 15/09/26	lun 28/09/26	\$ 623.973,60																					
1594	1594		1.3.25.1.7 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	11 días	jue 23/07/26	mié 5/08/26	\$ 4.778.451,36																					
1595	1595		1.3.25.1.8 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	11 días	vie 24/07/26	jue 6/08/26	\$ 7.795.075,20																					
1596	1596		1.3.25.1.9 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	12 días	jue 30/07/26	vie 14/08/26	\$ 3.875.504,69																					
1597	1597		1.3.25.1.10 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TAPA)	3 días	vie 14/08/26	mié 19/08/26	\$ 4.759.702,00																					
1598	1598		1.3.25.1.11 CLINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PÁÑETE IMPERMEAB.)	3 días	mar 4/08/26	sáb 8/08/26	\$ 1.857.292,00																					
1599	1599		1.3.25.1.12 NIVELACIÓN DE POZO (HASTA BASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	3 días	sáb 8/08/26	mié 12/08/26	\$ 512.085,00																					
1600	1600		1.3.25.1.13 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	vie 31/07/26	jue 13/08/26	\$ 4.177.017,00																					
1601	1601		1.3.25.1.14 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	mié 26/08/26	sáb 29/08/26	\$ 295.488,00																					
1602	1602		1.3.25.1.15 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	jue 8/10/26	sáb 10/10/26	\$ 18.044.392,54																					
1603	1603		1.3.25.1.16 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	sáb 10/10/26	mié 14/10/26	\$ 600.948,72																					
1604	1604		1.3.25.1.17 GEOCELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTUF	12 días	mar 1/09/26	mar 15/09/26	\$ 12.312.369,36																					
1605	1605		1.3.25.1.18 RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXT	12 días	mié 5/08/26	vie 21/08/26	\$ 10.123.849,55																					
1606	1606		1.3.25.1.19 PLACA FONDO D=1.70M POZO INSP. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. IN	2 días	sáb 1/08/26	mar 4/08/26	\$ 1.517.446,00																					
1607	1607		1.3.25.1.20 ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PAREALES METÁLICOS. IN	12 días	jue 23/07/26	jue 6/08/26	\$ 10.724.436,00																					
1608	1608		1.3.25.1.21 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, 2 días	2 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26	\$ 584.696,88																					
1609	1609		1.3.25.1.22 DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCL	7 días	mié 5/08/26	vie 14/08/26	\$ 719.910,00																					
1610	1610		1.3.25.1.23 CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLO	4 días	jue 13/08/26	mié 19/08/26	\$ 1.969.646,00																					
1611	1611		1.3.25.1.24 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Sumi	13 días	mar 1/09/26	mié 16/09/26	\$ 6.340.954,86																					

Proyecto: Proyecto Kennedy 20
Fecha: mié 25/02/26

Tarea

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 32

Resumen de actividades							Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027											
Modo de tarea		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	E	F	M																				
1612	1612	1.3.25.1.25	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCH	12 días	sáb 29/08/26	vie 11/09/26	\$ 4.154.930,64																																			
1613	1613	1.3.25.1.26	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y AP	2 días	jue 15/10/26	sáb 17/10/26	\$ 847.612,80																																			
1614	1614	1.3.25.1.27	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA UI	2 días	sáb 17/10/26	mar 20/10/26	\$ 3.515.896,80																																			
1615	1615	1.3.25.1.28	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mar 20/10/26	jue 22/10/26	\$ 175.890,00																																			
1616	1616	1.3.25.1.29	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALE	2 días	jue 22/10/26	sáb 24/10/26	\$ 1.180.890,48																																			
1617	1617	1.3.25.1.30	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DI	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26	\$ 929.214,00																																			
1618	1618	1.3.25.1.31	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C	2 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26	\$ 601.988,40																																			
1619	1619	1.3.25.1.32	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	14 días	mié 23/09/26	jue 8/10/26	\$ 9.581.075,28																																			
1620	1620	1.3.25.1.33	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	10 días	jue 24/09/26	mar 6/10/26	\$ 11.446.647,45																																			
1621	1621	1.3.25.1.34	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4	2 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26	\$ 13.207.328,64																																			
1622	1622	1.3.25.1.35	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIAL	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	\$ 269.294,00																																			
1623	1623	1.3.25.1.36	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLU	2 días	vie 21/08/26	lun 24/08/26	\$ 22.162.338,72																																			
1624	1624	1.3.25.1.37	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINIS	4 días	vie 14/08/26	jue 20/08/26	\$ 19.410.368,00																																			
1625	1625	1.3.25.1.38	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	10 días	jue 24/09/26	mar 6/10/26	\$ 4.848.725,93																																			
1626	1626	1.3.25.2	ANDEN DERECHO	39 días	mar 6/10/26	mar 24/11/26	\$ 30.817.959,33																																			
1627	1627	1.3.25.2.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	2 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26	\$ 212.792,40																																			
1628	1628	1.3.25.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	9 días	jue 8/10/26	mar 20/10/26	\$ 334.747,75																																			
1629	1629	1.3.25.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	9 días	vie 9/10/26	mié 21/10/26	\$ 428.155,20																																			
1630	1630	1.3.25.2.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	8 días	sáb 7/11/26	mié 18/11/26	\$ 2.640.641,85																																			
1631	1631	1.3.25.2.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8 días	mar 13/10/26	jue 22/10/26	\$ 904.819,14																																			
1632	1632	1.3.25.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	8 días	jue 22/10/26	sáb 31/10/26	\$ 76.744,80																																			
1633	1633	1.3.25.2.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	8 días	sáb 7/11/26	mié 18/11/26	\$ 791.097,30																																			
1634	1634	1.3.25.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	sáb 31/10/26	mar 10/11/26	\$ 3.936.408,00																																			
1635	1635	1.3.25.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	sáb 31/10/26	vie 13/11/26	\$ 630.227,00																																			
1636	1636	1.3.25.2.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	8 días	vie 13/11/26	mar 24/11/26	\$ 3.399.018,00																																			
1637	1637	1.3.25.2.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	mar 13/10/26	mié 21/10/26	\$ 1.797.150,00																																			
1638	1638	1.3.25.2.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_16A. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	jue 5/11/26	lun 9/11/26	\$ 853.677,81																																			
1639	1639	1.3.25.2.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	sáb 31/10/26	vie 13/11/26	\$ 692.488,44																																			
1640	1640	1.3.25.2.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	vie 13/11/26	mar 17/11/26	\$ 4.054.187,00																																			
1641	1641	1.3.25.2.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	jue 5/11/26	mié 18/11/26	\$ 2.288.376,00																																			
1642	1642	1.3.25.2.16	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	10 días	jue 15/10/26	mar 27/10/26	\$ 2.678.352,00																																			
1643	1643	1.3.25.2.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	3 días	mié 21/10/26	sáb 24/10/26	\$ 2.160.384,00																																			
1644	1644	1.3.25.2.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	4 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	\$ 973.782,00																																			
1645	1645	1.3.25.2.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	1 día	vie 13/11/26	vie 13/11/26	\$ 1.964.910,64																																			
1646	1646	1.3.25.3	ANDEN IZQUIERDO	39 días	mié 18/11/26	mar 5/01/27	\$ 30.817.959,33																																			
1647	1647	1.3.25.3.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	2 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	\$ 212.792,40																																			
1648	1648	1.3.25.3.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	3 días	vie 20/11/26	mar 24/11/26	\$ 334.747,75																																			
1649	1649	1.3.25.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM.). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	9 días	sáb 21/11/26	mié 2/12/26	\$ 428.155,20																																			
1650	1650	1.3.25.3.4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	8 días	vie 18/12/26	mar 29/12/26	\$ 2.640.641,85																																			
1651	1651	1.3.25.3.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT USO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	8 días	mar 24/11/26	mié 2/12/26	\$ 904.819,14																																			
1652	1652	1.3.25.3.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	8 días	jue 3/12/26	lun 14/12/26	\$ 76.744,80																																			
1653	1653	1.3.25.3.7	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	8 días	vie 18/12/26	mar 29/12/26	\$ 791.097,30																																			
1654	1654	1.3.25.3.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	lun 14/12/26	lun 21/12/26	\$ 3.936.408,00																																			
1655	1655	1.3.25.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	lun 14/12/26	jue 24/12/26	\$ 630.227,00																																			
1656	1656	1.3.25.3.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	8 días	jue 24/12/26	mar 5/01/27	\$ 3.399.018,00																																			
1657	1657	1.3.25.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	mar 24/11/26	mié 2/12/26	\$ 1.797.150,00																																			
1658	1658	1.3.25.3.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_16A. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	mié 16/12/26	lun 21/12/26	\$ 853.677,81																																			
1659	1659	1.3.25.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	lun 14/12/26	jue 24/12/26	\$ 692.488,44																																			
1660	1660	1.3.25.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	jue 24/12/26	lun 28/12/26	\$ 4.054.187,00																																			
Proyecto: Proyecto Kennedy 20 Fecha: mié 25/02/26							<div><div><div><div></div><div>Resumen</div></div><div><div></div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div>Tarea inactiva</div></div></div><div><div><div></div><div>Hito inactivo</div></div><div><div></div><div>Resumen inactivo</div></div><div><div></div><div>Informe de resumen manual</div></div></div><div><div><div></div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div>solo el comienzo</div></div><div><div></div><div>solo fin</div></div></div><div><div><div></div><div>Hito externo</div></div><div><div></div><div>Fecha limite</div></div><div><div></div><div>Progreso manual</div></div></div><div><div><div></div><div>Progreso</div></div><div><div></div><div>Progreso</div></div><div><div></div><div>Progreso</div></div></div></div>																																			
Página 33																																										

Nombre de tarea										Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1661	1661		1.3.25.3.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	mié 16/12/26	mar 29/12/26	\$ 2.288.376,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027			
								N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M			
1705	1705		1.3.26.1.38	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO).INCLUYE SUMINIS	4 días	mié 19/08/26	lun 24/08/26	\$ 19.410.368,00																			
1706	1706		1.3.26.1.39	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	14 días	vie 2/10/26	mar 20/10/26	\$ 3.969.287,28																			
1707	1707		1.3.26.2	ANDEN DERECHO	47 días	mié 21/10/26	jue 17/12/26	\$ 42.012.359,51																			
1708	1708		1.3.26.2.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPOSOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	3 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26	\$ 435.540,00																			
1709	1709		1.3.26.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	vie 23/10/26	vie 30/10/26	\$ 684.631,92																			
1710	1710		1.3.26.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	11 días	mar 27/10/26	lun 9/11/26	\$ 875.199,60																			
1711	1711		1.3.26.2.4	SÁRDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	10 días	vie 20/11/26	mié 2/12/26	\$ 2.594.314,80																			
1712	1712		1.3.26.2.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	vie 30/10/26	lun 9/11/26	\$ 740.787,60																			
1713	1713		1.3.26.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	9 días	lun 9/11/26	vie 20/11/26	\$ 157.080,00																			
1714	1714		1.3.26.2.7	SÁRDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	9 días	vie 20/11/26	mar 1/12/26	\$ 777.218,40																			
1715	1715		1.3.26.2.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	vie 20/11/26	sáb 28/11/26	\$ 3.936.408,00																			
1716	1716		1.3.26.2.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	sáb 28/11/26	vie 11/12/26	\$ 630.227,00																			
1717	1717		1.3.26.2.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	7 días	sáb 28/11/26	lun 7/12/26	\$ 3.399.018,00																			
1718	1718		1.3.26.2.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	vie 30/10/26	lun 9/11/26	\$ 1.797.150,00																			
1719	1719		1.3.26.2.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	vie 4/12/26	mié 9/12/26	\$ 1.748.998,44																			
1720	1720		1.3.26.2.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	mié 2/12/26	mar 15/12/26	\$ 1.417.374,00																			
1721	1721		1.3.26.2.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26	\$ 8.300.355,00																			
1722	1722		1.3.26.2.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	10 días	vie 4/12/26	jue 17/12/26	\$ 4.686.403,35																			
1723	1723		1.3.26.2.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	10 días	mar 3/11/26	sáb 14/11/26	\$ 2.678.352,00																			
1724	1724		1.3.26.2.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	3 días	sáb 14/11/26	jue 19/11/26	\$ 2.160.384,00																			
1725	1725		1.3.26.2.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	3 días	jue 19/11/26	lun 23/11/26	\$ 973.782,00																			
1726	1726		1.3.26.2.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	2 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26	\$ 4.019.135,40																			
1727	1727		1.3.26.3	ANDEN IZQUIERDO	47 días	jue 17/12/26	vie 12/02/27	\$ 42.012.359,51																			
1728	1728		1.3.26.3.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPOSOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	3 días	jue 17/12/26	lun 21/12/26	\$ 435.540,00																			
1729	1729		1.3.26.3.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	lun 21/12/26	mar 29/12/26	\$ 684.631,92																			
1730	1730		1.3.26.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	11 días	mié 23/12/26	jue 7/01/27	\$ 875.199,60																			
1731	1731		1.3.26.3.4	SÁRDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	10 días	mar 19/01/27	vie 29/01/27	\$ 2.594.314,80																			
1732	1732		1.3.26.3.5	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	7 días	mar 29/12/26	jue 7/01/27	\$ 740.787,60																			
1733	1733		1.3.26.3.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	9 días	jue 7/01/27	mar 19/01/27	\$ 157.080,00																			
1734	1734		1.3.26.3.7	SÁRDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	9 días	mar 19/01/27	jue 28/01/27	\$ 777.218,40																			
1735	1735		1.3.26.3.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	7 días	mar 19/01/27	mar 26/01/27	\$ 3.936.408,00																			
1736	1736		1.3.26.3.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	10 días	mié 27/01/27	sáb 6/02/27	\$ 630.227,00																			
1737	1737		1.3.26.3.10	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	7 días	mié 27/01/27	mié 3/02/27	\$ 3.399.018,00																			
1738	1738		1.3.26.3.11	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	7 días	mar 29/12/26	jue 7/01/27	\$ 1.797.150,00																			
1739	1739		1.3.26.3.12	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	3 días	mar 2/02/27	jue 4/02/27	\$ 1.748.998,44																			
1740	1740		1.3.26.3.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E	10 días	vie 29/01/27	mié 10/02/27	\$ 1.417.374,00																			
1741	1741		1.3.26.3.14	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTR	2 días	jue 4/02/27	sáb 6/02/27	\$ 8.300.355,00																			
1742	1742		1.3.26.3.15	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO I	10 días	mar 2/02/27	vie 12/02/27	\$ 4.686.403,35																			
1743	1743		1.3.26.3.16	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO	10 días	jue 31/12/26	jue 14/01/27	\$ 2.678.352,00																			
1744	1744		1.3.26.3.17	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instal	3 días	jue 14/01/27	lun 18/01/27	\$ 2.160.384,00																			
1745	1745		1.3.26.3.18	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	3 días	lun 18/01/27	mié 20/01/27	\$ 973.782,00																			
1746	1746		1.3.26.3.19	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTR	2 días	jue 4/02/27	sáb 6/02/27	\$ 4.019.135,40																			
1747	1747		1.2.18	16. 8008713 KR78C CL43BISS CL43AS	164 días	mar 28/07/26	jue 11/02/27	\$ 381.314.768,09																			
1748	1748		1.3.27.1	VIA	109 días	mar 28/07/26	vie 4/12/26	\$ 268.923.010,63																			
1749	1749		1.3.27.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	vie 31/07/26	lun 3/08/26	\$ 181.326,76																			
1750	1750		1.3.27.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRAINTES.	5 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	\$ 1.159.533,78																			
1751	1751		1.3.27.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	17 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	\$ 537.783,78																			

[illegible]

Id	Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1845	1845			1.3.28.1.15	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	vie 25/09/26	jue 8/10/26	\$ 12.169.168,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027						
1943	1943		1.3.30.1.18	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS.	2 días	mar 22/12/26	jue 24/12/26	\$ 1.583.466,78	N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	
1944	1944		1.3.30.1.19	PISO EN CONCRETO MR#1 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA	3 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	\$ 8.578.637,76																				
1945	1945		1.3.30.1.20	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación	15 días	mar 17/11/26	jue 3/12/26	\$ 15.178.848,58																				
1946	1946		1.2.28	10. 8007134 TV78A CL40S CL40BS	94 días	mar 1/09/26	mar 22/12/26	\$ 300.419.937,28																				
1947	1947		1.3.31.1	VIA	94 días	mar 1/09/26	mar 22/12/26	\$ 300.419.937,28																				
1948	1948		1.3.31.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	jue 3/09/26	sáb 5/09/26	\$ 218.122,00																				
1949	1949		1.3.31.1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	19 días	mié 16/09/26	jue 8/10/26	\$ 550.538,40																				
1950	1950		1.3.31.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	19 días	vie 18/09/26	vie 9/10/26	\$ 5.685.076,80																				
1951	1951		1.3.31.1.4	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	9 días	lun 7/09/26	mié 16/09/26	\$ 1.980.670,00																				
1952	1952		1.3.31.1.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	9 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	\$ 14.759.334,00																				
1953	1953		1.3.31.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	10 días	jue 5/11/26	mié 18/11/26	\$ 3.310.526,60																				
1954	1954		1.3.31.1.7	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26	\$ 341.390,00																				
1955	1955		1.3.31.1.8	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	15 días	lun 19/10/26	jue 5/11/26	\$ 8.737.638,80																				
1956	1956		1.3.31.1.9	DEMOLICIÓN DE POZO, DIÁMETRO INTERIOR D=1.20M, DIÁMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL,	4 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	\$ 1.705.208,00																				
1957	1957		1.3.31.1.10	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	7 días	lun 28/09/26	mar 6/10/26	\$ 804.110,00																				
1958	1958		1.3.31.1.11	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 4.20	3 días	mar 1/09/26	jue 3/09/26	\$ 217.652.063,60																				
1959	1959		1.3.31.1.12	MALLA ELECTROSOLDADA Ø.15XØ.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINI	2 días	sáb 5/12/26	mié 9/12/26	\$ 3.784.030,88																				
1960	1960		1.3.31.1.13	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	11 días	lun 5/10/26	lun 19/10/26	\$ 6.445.677,00																				
1961	1961		1.3.31.1.14	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	sáb 12/12/26	mar 15/12/26	\$ 946.748,80																				
1962	1962		1.3.31.1.15	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN	2 días	mar 15/12/26	jue 17/12/26	\$ 3.927.112,80																				
1963	1963		1.3.31.1.16	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	jue 17/12/26	sáb 19/12/26	\$ 273.130,00																				
1964	1964		1.3.31.1.17	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS,	2 días	sáb 19/12/26	mar 22/12/26	\$ 1.830.763,65																				
1965	1965		1.3.31.1.18	PISO EN CONCRETO MR#1 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA	3 días	mié 9/12/26	sáb 12/12/26	\$ 9.918.400,80																				
1966	1966		1.3.31.1.19	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación	15 días	mié 18/11/26	sáb 5/12/26	\$ 17.549.395,15																				
1967	1967		1.2.33	32. 8008578 CL41BSUR CL41AS KR75ABIS	113 días	mar 8/09/26	vie 22/01/27	\$ 322.105.831,41																				
1968	1968		1.3.32.1	VIA	113 días	mar 8/09/26	vie 22/01/27	\$ 322.105.831,41																				
1969	1969		1.3.32.1.1	REPLANTEO GENERAL	2 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26	\$ 315.192,00																				
1970	1970		1.3.32.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	3 días	mié 16/09/26	sáb 19/09/26	\$ 2.015.310,60																				
1971	1971		1.3.32.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	17 días	sáb 19/09/26	vie 9/10/26	\$ 954.650,88																				
1972	1972		1.3.32.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	17 días	mar 22/09/26	mar 13/10/26	\$ 9.845.280,00																				
1973	1973		1.3.32.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM	2 días	sáb 2/01/27	mar 5/01/27	\$ 23.638.641,00																				
1974	1974		1.3.32.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	21 días	mié 11/11/26	lun 7/12/26	\$ 1.299.945,00																				
1975	1975		1.3.32.1.7	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26	\$ 4.759.702,00																				
1976	1976		1.3.32.1.8	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	5 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	\$ 4.643.230,00																				
1977	1977		1.3.32.1.9	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	vie 16/10/26	lun 19/10/26	\$ 341.390,00																				
1978	1978		1.3.32.1.10	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	jue 15/10/26	mar 20/10/26	\$ 662.400,00																				
1979	1979		1.3.32.1.11	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	2 días	sáb 26/12/26	mar 29/12/26	\$ 40.442.884,44																				
1980	1980		1.3.32.1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO	3 días	mar 29/12/26	sáb 2/01/27	\$ 1.347.156,00																				
1981	1981		1.3.32.1.13	GEOTELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	17 días	jue 22/10/26	mié 11/11/26	\$ 27.600.828,00																				
1982	1982		1.3.32.1.14	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).	2 días	mié 23/12/26	sáb 26/12/26	\$ 1.310.724,00																				
1983	1983		1.3.32.1.15	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	7 días	mar 29/09/26	mié 7/10/26	\$ 774.640,00																				
1984	1984		1.3.32.1.16	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	5 días	mar 5/01/27	mar 12/01/27	\$ 544.170,00																				
1985	1985		1.3.32.1.17	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES	2 días	vie 11/09/26	lun 14/09/26	\$ 4.948.496,00																				
1986	1986		1.3.32.1.18	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación	17 días	jue 22/10/26	mié 11/11/26	\$ 14.216.925,60																				
1987	1987		1.3.32.1.19	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	17 días	mar 20/10/26	mar 10/11/26	\$ 9.314.172,00																				
1988	1988		1.3.32.1.20	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mar 12/01/27	jue 14/01/27	\$ 912.051,20																				

Proyecto: Proyecto Kennedy 20

Fecha: mié 25/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

<

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027						
							N	D	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D		F	M					
1989	1989	1.3.32.1.21	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCAÇÃO, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN	2 días	jue 14/01/27	sáb 16/01/27	\$ 3.783.187,20																				
1990	1990	1.3.32.1.22	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	sáb 16/01/27	mar 19/01/27	\$ 394.680,00																				
1991	1991	1.3.32.1.23	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIAL	2 días	mar 19/01/27	jue 21/01/27	\$ 2.645.501,40																				
1992	1992	1.3.32.1.24	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	2 días	jue 21/01/27	vie 22/01/27	\$ 1.903.180,00																				
1993	1993	1.3.32.1.25	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARRILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DI	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	\$ 999.856,00																				
1994	1994	1.3.32.1.26	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARRILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C	2 días	mie 9/09/26	vie 11/09/26	\$ 647.753,60																				
1995	1995	1.3.32.1.27	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	20 días	jue 26/11/26	lun 21/12/26	\$ 21.478.044,00																				
1996	1996	1.3.32.1.28	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IO	20 días	lun 30/11/26	mié 23/12/26	\$ 27.369.930,45																				
1997	1997	1.3.32.1.29	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4"	2 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26	\$ 29.607.072,00																				
1998	1998	1.3.32.1.30	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incl	4 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26	\$ 380.620,00																				
1999	1999	1.3.32.1.31	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLU	2 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26	\$ 49.681.656,00																				
2000	2000	1.3.32.1.32	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINIS	4 días	mar 29/09/26	sáb 3/10/26	\$ 19.410.368,00																				
2001	2001	1.3.32.1.33	CONEXIONES KIT SILLA YEE 355 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	3 días	mar 29/09/26	vie 2/10/26	\$ 2.323.355,00																				
2002	2002	1.3.32.1.34	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	13 días	lun 30/11/26	mar 15/12/26	\$ 11.592.839,04																				
2003	2003	1.3.34	34. 8008128 CL14HSUR TV78 KR78B	95 días	mar 29/09/26	sáb 23/01/27	\$ 178.947.727,47																				
2004	2004	1.3.33.1	VIA	95 días	mar 29/09/26	sáb 23/01/27	\$ 178.947.727,47																				
2005	2005	1.3.33.1.1	REPLANTE GENERAL	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26	\$ 294.065,00																				
2006	2006	1.3.33.1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	13 días	mar 13/10/26	mié 28/10/26	\$ 742.218,00																				
2007	2007	1.3.33.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	13 días	jue 15/10/26	vie 30/10/26	\$ 7.664.436,00																				
2008	2008	1.3.33.1.4	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	6 días	lun 5/10/26	mar 13/10/26	\$ 2.670.275,00																				
2009	2009	1.3.33.1.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	6 días	mié 7/10/26	jue 15/10/26	\$ 19.898.341,20																				
2010	2010	1.3.33.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	10 días	jue 19/11/26	mar 1/12/26	\$ 4.463.144,50																				
2011	2011	1.3.33.1.7	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE C	12 días	mar 20/10/26	mié 4/11/26	\$ 7.195.621,20																				
2012	2012	1.3.33.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	12 días	jue 22/10/26	vie 6/11/26	\$ 11.738.638,08																				
2013	2013	1.3.33.1.9	RELLENO EN TIRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	14 días	jue 22/10/26	lun 9/11/26	\$ 5.835.288,87																				
2014	2014	1.3.33.1.10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	vie 6/11/26	mar 10/11/26	\$ 4.759.702,00																				
2015	2015	1.3.33.1.11	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	5 días	mié 28/10/26	mié 4/11/26	\$ 4.643.230,00																				
2016	2016	1.3.33.1.12	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	mié 4/11/26	vie 6/11/26	\$ 341.390,00																				
2017	2017	1.3.33.1.13	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTE	15 días	mié 25/11/26	lun 14/12/26	\$ 11.779.801,00																				
2018	2018	1.3.33.1.14	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	14 días	mié 28/10/26	vie 13/11/26	\$ 15.245.457,45																				
2019	2019	1.3.33.1.15	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARRALES METÁLICOS. IN	21 días	mar 20/10/26	vie 13/11/26	\$ 16.149.370,00																				
2020	2020	1.3.33.1.16	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	11 días	mar 20/10/26	mar 3/11/26	\$ 1.084.075,00																				
2021	2021	1.3.33.1.17	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINIS	3 días	mar 5/01/27	jue 7/01/27	\$ 5.101.507,60																				
2022	2022	1.3.33.1.18	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	13 días	sáb 14/11/26	mar 1/12/26	\$ 6.869.852,50																				
2023	2023	1.3.33.1.19	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLI	2 días	mar 12/01/27	jue 14/01/27	\$ 1.276.376,00																				
2024	2024	1.3.33.1.20	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LI	2 días	jue 14/01/27	sáb 16/01/27	\$ 5.294.406,00																				
2025	2025	1.3.33.1.21	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	lun 18/01/27	mar 19/01/27	\$ 368.225,00																				
2026	2026	1.3.33.1.22	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIAL	2 días	mar 19/01/27	jue 21/01/27	\$ 2.469.134,64																				
2027	2027	1.3.33.1.23	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	2 días	jue 21/01/27	sáb 23/01/27	\$ 1.903.180,00																				
2028	2028	1.3.33.1.24	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARRILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DI	2 días	mar 29/09/26	mié 30/09/26	\$ 1.399.255,00																				
2029	2029	1.3.33.1.25	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARRILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA C	2 días	mié 30/09/26	vie 2/10/26	\$ 906.503,00																				
2030	2030	1.3.33.1.26	PISO EN CONCRETO MR41 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO	3 días	jue 7/01/27	mar 12/01/27	\$ 13.373.396,96																				
2031	2031	1.3.33.1.27	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro,	17 días	lun 14/12/26	lun 4/01/27	\$ 23.660.837,47																				
2032	2032	1.3.24	22. 8008637 CL14HSUR KR73C KR74	87 días	mar 13/10/26	mié 27/01/27	\$ 59.488.501,46																				
2033	2033	1.3.34.1	VIA	87 días	mar 13/10/26	mié 27/01/27	\$ 59.488.501,46																				
2034	2034	1.3.34.1.1	REPLANTE GENERAL	2 días	vie 16/10/26	lun 19/10/26	\$ 41.112,00																				
2035	2035	1.3.34.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	4 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26	\$ 262.866,60																				
2036	2036	1.3.34.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	11 días	vie 23/10/26	vie 6/11/26	\$ 121.925,52																				
2037	2037	1.3.34.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	11 días	sáb 24/10/26	sáb 7/11/26	\$ 1.259.280,00																				
2038	2038	1.3.34.1.5	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	1 día	mar 19/01/27	mar 19/01/27	\$ 3.083.301,00																				
2039	2039	1.3.34.1.6	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	14 días	mié 9/12/26	jue 24/12/26	\$ 519.978,00																				
2040	2040	1.3.34.1.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 11/11/26	vie 13/11/26	\$ 86.400,00																				
2041	2041	1.3.34.1.8	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	1 día	vie 15/01/27	lun 18/01/27	\$ 5.275.158,84																				
2042	2042	1.3.34.1.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	lun 18/01/27	lun 18/01/27	\$ 175.716,00																				
2043	2043	1.3.34.1.10	GEOTEXILO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	10 días	mar 17/11/26	vie 27/11/26	\$ 3.600.108,00																				
2044	2044	1.3.34.1.11	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, IN	2 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	\$ 1.517.446,00																				

Proyecto: Proyecto Kennedy 20
Fecha: mié 25/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

</

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	N	D	E	F	M	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2045	2045	1.3.34.1.12	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO).	2 días	mié 13/01/27	vie 15/01/27	\$ 170.964,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
