

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO

20254674

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN LA
VEREDA SAN FERNANDO CENTRO, CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO
DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

PASTO - NARIÑO

MARZO DE 2026



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

INTRODUCCION

El presente informe técnico corresponde a los 15 días posteriores del mes de marzo de 2026, cuyo objeto es la construcción de un paso peatonal en la vereda San Fernando Centro, corregimiento de San Fernando, municipio de Pasto, bajo la modalidad de precios unitarios fijos.

El documento tiene como propósito exponer el avance físico de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, así como detallar las condiciones técnicas identificadas en campo y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad operativa y la estabilidad del proyecto.

Durante el presente periodo se realizaron visitas técnicas de seguimiento al taller encargado de la fabricación de la estructura metálica del paso peatonal, con el fin de verificar los procesos de corte, ensamble y cumplimiento de las especificaciones establecidas en los planos de diseño. Estas inspecciones permitieron llevar control sobre la calidad de los elementos y el avance en la producción, previo a su posterior traslado e instalación en obra.

De manera complementaria, se desarrollaron actividades de revisión y ajuste de cantidades de obra, como resultado de la necesidad de tramitar una adición contractual. Este proceso incluyó el análisis de ítems que presentaron variaciones respecto a lo inicialmente proyectado, la actualización de metrados y la consolidación de soportes técnicos, con el propósito de sustentar el incremento en las cantidades requeridas para la correcta ejecución del proyecto.



OBJETIVOS

GENERAL

Presentar de manera clara y detallada el avance físico de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado para la Construcción de Paso Peatonal en la Vereda San Fernando Centro, Corregimiento de San Fernando del Municipio de Pasto, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones reales de obra y las acciones implementadas para garantizar la estabilidad y continuidad del proyecto

ESPECIFICOS

- Detallar las actividades ejecutadas durante el proceso de excavación y fundida de las pilas de cimentación.
- Informar el estado actual de la obra al cierre del periodo reportado.
- Registrar el avance físico alcanzado durante el periodo evaluado en relación con las actividades programadas.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, municipio de San Juan de Pasto, en el sector rural de San Fernando. La intervención corresponde a la construcción de un puente peatonal, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito y conectividad para la comunidad del sector.

El área donde se desarrolla la obra presenta condiciones propias de zona rural. La localización del proyecto fue definida de acuerdo con las necesidades de movilidad de la población y las características del entorno.

La ejecución de esta obra contribuye al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y a la mejora de las condiciones de seguridad para los usuarios.





ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

NODOS PIEZA B




CERCHAS COMPLETAS SIN UNIONES





NIT : 901765653-0

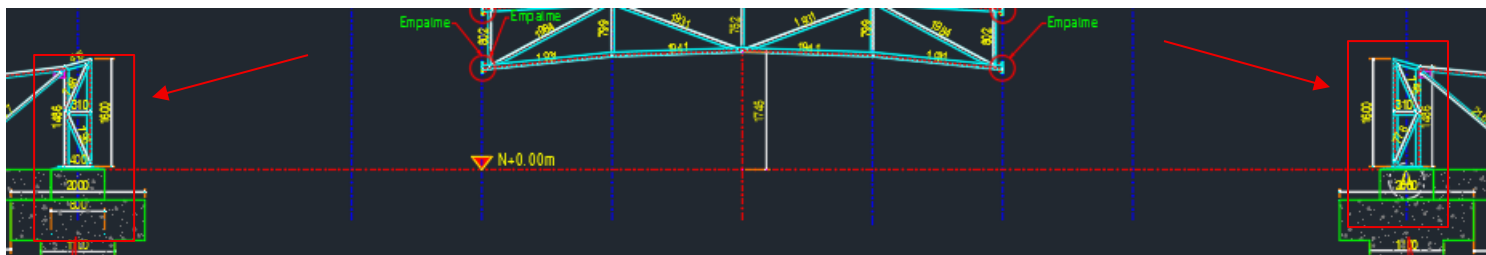

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 – 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ALFAJOR 50 MM X 2,5 MM PARA PISO, CON ANTICORROSIVO, CORTE, DOBLADO Y PINTURA ESMALTE.

FORMA DE PAGO: **UND**
CANTIDAD EJECUTADA: **0 UND**
CANTIDAD POR EJECUTAR: **95 UND**

Para el ítem correspondiente al suministro e instalación de lámina alfajor de 50 mm x 2,5 mm para piso, con aplicación de anticorrosivo, corte, doblado y pintura esmalte, se deja constancia que, a la fecha del presente informe, no se ha iniciado la actividad de doblado de las láminas.

No obstante, se cuenta con la totalidad de los insumos requeridos, incluyendo el material base y los productos para protección y acabado, así como la disponibilidad de los equipos necesarios para su procesamiento en taller. En ese sentido, se tiene programado dar inicio a las labores de corte y doblado aproximadamente una semana y media antes del inicio del montaje en obra, con el fin de garantizar la correcta sincronización de actividades y optimizar los tiempos de ejecución del proyecto.

Atentamente



Sergio Fernando Portilla
Representante legal
