

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u> 3 </u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4151.010.26.1.0667-2026	
Nombre del contratista: GESTIÓN Y SERVICIOS CORPORATIVOS E.S.T. S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: NIT. 900.158.315-9	
Nombre (s) del supervisor (es): SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ	
Organismo: Secretaría de Infraestructura	No. Teléfono: 6026614040
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA PARA LA PROVISIÓN DE TALENTO HUMANO Y EQUIPOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005375 RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURÍSTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
04/FEB/2026	30/JUN/2026
Modificación al contrato: Modificación 1, del 10 de marzo de 2026. A pesar de haber intervenido entre las vigencias 2024 y 2025 alrededor de 300 kilómetros carril de la malla vial de la ciudad, el estado de las vías en el Distrito de Santiago de Cali amerita la intervención de múltiples frentes de trabajo de forma permanente, bajo la necesidad no	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

sólo de cumplir con las metas del plan de desarrollo sino de mejorar la calidad de vida de los caleños a través de las obras de infraestructura, lo que reduce los riesgos y tiempos en la movilidad en la zona urbana y garantiza la conectividad de la zona rural. Adicionalmente, los rendimientos presentados por el contratista Gestión y Servicios Corporativos E.S.T. han garantizado el cumplimiento del objeto contractual y de las metas previstas con el contrato de prestación de servicios celebrado, razón por la cual se hace necesario para la Secretaría de Infraestructura garantizar un mayor tiempo en la disponibilidad de la maquinaria que presta servicios a 3 cuadrillas operativas para intervención de pavimento asfáltico, Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes: ACUERDAN:

1. Adicionar la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.194.500.000)
2. Prorrogar el plazo para el cumplimiento de la meta de 750 metros lineales en mantenimiento de andenes y obras complementarias, en dos puntos cinco (2.5) semanas adicionales a los 30 días pactados inicialmente.
3. MODIFICAR el numeral cuarto (4) de la Cláusula segunda del contrato, adicionando 15 perfiles a la bolsa por monto agotable para contratación de personal
4. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato FORMA DE PAGO, la cual quedará así: Primer pago: Un primer pago por el valor de \$1.431.344.170, correspondiente, una vez se realice la presentación del plan de acción y de los contratos del director del proyecto, ingeniero de control, ingeniero residente, SISO, profesional de apoyo y del auxiliar de seguimiento de campo.
 Segundo pago: Un segundo pago por el valor de \$1.460.571.460, una vez se verifique la intervención del personal suministrado con una incidencia de 8 km/carril en mantenimiento de la malla vial.
 Tercer pago: Un tercer pago por valor de \$3.020.214.325
 Cuarto pago: Un cuarto pago por valor de \$1.825.714.325
 Quinto pago: Un quinto pago por valor de \$759.513.018

Modificación 2, del 5 de mayo de 2026, la Secretaría de Infraestructura en ejercicio de sus funciones, y en ejecución de su compromiso misional, es decir, la intervención de la infraestructura vial, evidenció que requiere realizar la modificación del alcance y actividades específicas del contrato por lo tanto las partes ACUERDAN:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. MODIFICAR la Cláusula Segunda del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, técnica, logística y operativa No. 4151.010.26.1.0667-2026, en el acápite correspondiente a los perfiles requeridos adicionando aquellos previamente definidos en la justificación.

2. ADICIONAR un numeral sexto a la Cláusula Segunda del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, técnica, logística y operativa No. 4151.010.26.1.0667-2026, incluyendo la prestación de los siguientes servicios dentro de la bolsa a monto agotable.

3. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato FORMA DE PAGO, la cual quedará así:
 Primer pago: Un primer pago por el valor de \$1.431.344.170, correspondiente, una vez se realice la presentación del plan de acción y de los contratos del director del proyecto, ingeniero de control, ingeniero residente, SISO, profesional de apoyo y del auxiliar de seguimiento de campo.

Segundo pago: Un segundo pago por el valor de \$1.460.571.460, una vez se verifique la intervención del personal suministrado con una incidencia de 8 km/carril en mantenimiento de la malla vial.

Tercer pago: Un tercer pago por valor de \$3.020.214.325

Cuarto pago: Un cuarto pago por valor de \$1.825.714.325

Quinto pago: Un quinto pago por valor de \$759.513.018

4. ACLARAR la Cláusula Segunda, Numeral Primero, Literal B, indicando que efectivamente la meta de intervención de 750 metros lineales de andenes estaba supeditada al suministro de herramientas necesarias para la intervención a cargo de Gestión y Servicios, plazo que se cumplió en los términos establecidos en la MODIFICACIÓN No. 1 al presente contrato.

Suspensión: N/A

Reanudación/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: SIETE MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$7.302.857.298) incluido IVA del 19%

Adición: \$1.194.500.000

Prórroga: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
8.497.357.298	\$3.020.214.325	\$2.891.915.630	\$2.585.227.343

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 4 de mayo de 2026

Camilo Andrés Valencia Quintero identificado con C.C 1.151.934.390 de Cali, en condición de Revisor Fiscal de Gestión y Servicios Corporativos E.S.T. S.A.S., Certifica que "GESTIÓN Y SERVICIOS CORPORATIVOS E.S.T. SAS identificada con NIT 900.158.315-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del Pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma , durante los últimos 6 meses"

Periodo de Pago de la Seguridad Social: Pensión - Abril y Salud Mayo de 2026.

Observaciones al informe contable y financiero:

La forma de Pago se encuentra condicionado a lo contenido en la Clausula Cuarta del contrato No 4151.010.26.1.0667-2026:

(...) "SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600012291 del 28 de enero de 2026 Y No. 3600012416 de fecha 06 de marzo de 2026, por valor de OCHO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$8.502.857.298,00) El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

El Distrito Especial De Santiago de Cali – Secretaria de infraestructura cancelará al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, que asciende a la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$8.482.857.298,00) incluido IVA del 19% y demás descuentos de Ley como gravámenes, impuestos, costos directos e indirectos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, tasas y descuentos legales y todas las deducciones que por concepto de estampillas que se efectúan en el Distrito especial, los cuales serán a cargo del Contratista. Dicho valor se pagará en cinco cuotas así:

Primer pago: Un primer pago por el valor de \$1.431.344.170, correspondiente, una vez se realice la presentación del plan de acción y de los contratos del director del proyecto, ingeniero de control, ingeniero residente, SISO, profesional de apoyo y del auxiliar de seguimiento de campo.

Segundo pago: Un segundo pago por el valor de \$1.460.571.460, una vez se verifique la intervención del personal suministrado con una incidencia de 8 km/carril en mantenimiento de la malla vial.

Tercer pago: Un tercer pago por valor de \$3.020.214.325

Cuarto pago: Un cuarto pago por valor de \$1.825.714.325

Quinto pago: Un quinto pago por valor de \$759.513.018

No obstante, la forma de pago pactada, se presentarán informes mensuales donde se realizará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y a la inversión del monto agotable por bolsa definido en el proceso, con el objetivo de garantizar la adecuada inversión de los recursos

5. INFORME TÉCNICO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

El contratista cumplió con la condición establecida para el tercer pago, así:

1. Verificación de intervención de mantenimiento de la malla vial en kilómetros carril con la adición presupuestal:

Anexo 1. Paquete de fichas técnicas de la maquinaria y equipos.

https://drive.google.com/drive/folders/1XrUf9PloYijT_jM_SNaO55gziPSv34MO

Anexo 2. Paquete de actas de visitas técnicas.

<https://drive.google.com/drive/folders/1wdMw7jFzjuC4xvh9nqt4cmqJhMsoEoA0>

Anexo 3. Actas de comités técnicos

<https://drive.google.com/drive/folders/18YE9U4cL14H8v1izdaEKZsdRz7njNNJx>

Anexo 4. Paquete de cronogramas de intervención mantenimiento vial.

https://drive.google.com/drive/folders/1ao0cPbmYQTQMB_Re3aQTBnYssYqEp2aQ

Anexo 5. Informe de ejecución de intervención mantenimiento vial.

https://drive.google.com/drive/folders/1qdw9dUQ1RB2rmzNytKQ4_6prXyllQw-

Anexo 6. Paquete de fichas técnicas de entrega de mantenimiento vial.

<https://drive.google.com/drive/folders/1V4lGRJXlvYLZshem8i8UHOeZtUojbTcw>

Las actividades se realizaron en los siguientes frentes de obra:

- CARRERA 24B ENTRE CALLE 2 OESTE Y 2A OESTE
- AVENIDA SIMON BOLIVAR ENTRE CRA 80 Y DIAG 58 SENTIDO SUR -NORTE
- CLL 4B ENTRE CRA 36B Y 34
- CLL 6A ENTRE CRA 43 Y 44
- CLL 6B ENTRE CRA 43 Y 44
- CALLE 78 ENTRE LA CARRERA 8 Y 8ª
- CRA 118 ENTRE AV CAÑAS GORDAS Y CALLE 25
- AV 6 N ENTRE CLL 15 N Y 34 N
- CRA 8 ENTRE CLL 78 Y 70
- AV 3F NORTE ENTRE CLL 52 NORTE Y 58 NORTE
- AV 6A NORTE ENTRE CLL 45 NORTE Y 47 NORTE SENTIDO NORTE-SUR

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

- CRA 86 ENTRE CLL 13 Y 25
- AVENIDA SIMON BOLÍVAR ENTRE LAS CARRERAS 86 Y 85e SENTIDO SUR-NORTE

UBICACIÓN	KM/CARRIL
CARRERA 24B ENTRE CALLE 2 OESTE Y 2A OESTE	0,20
AVENIDA SIMON BOLIVAR ENTRE CRA 80 Y DIAG 58 SENTIDO SUR -NORTE	0,29
CLL 4B ENTRE CRA 36B Y 34	0,73
CLL 6A ENTRE CRA 43 Y 44	0,11
CLL 6B ENTRE CRA 43 Y 44	0,10
CALLE 78 ENTRE LA CARRERA 8 Y 8A	0,11
CRA 118 ENTRE AV CAÑAS GORDAS Y CALLE 25	1,47
AV 6 N ENTRE CLL 15 N Y 34 N	1,70
CRA 8 ENTRE CLL 78 Y 70	1,56
AV 3F NORTE ENTRE CLL 52 NORTE Y 58 NORTE	0,47
AV 6A NORTE ENTRE CLL 45 NORTE Y 47 NORTE SENTIDO NORTE-SUR	1,70
CRA 83 ENTRE CLL 13 Y 25	3,96
AVENIDA SIMON BOLÍVAR ENTRE LAS CARRERAS 86 Y 85e SENTIDO SUR-NORTE	4,26
TOTAL, EJECUTADO (KM/CARRIL)	17,10

Las intervenciones ejecutadas contribuyeron significativamente al mejoramiento de las condiciones de seguridad vial, la optimización de la movilidad urbana y la reducción de riesgos asociados al deterioro de la infraestructura existente. A continuación, se evidencia el proceso realizado en una de las zonas intervenidas. Para ver la intervención realizada en cada una de las zonas indicadas anteriormente, por favor remitirse al informe de ejecución de intervención.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

2. Verificación de la conformación del personal administrativo

Anexo 7. Piezas gráficas de las convocatorias para los cargos administrativos.

<https://drive.google.com/drive/folders/16bf6rlG7Wy5sH7f2DCEg63u4ne3LCVgd>

Anexo 8. Hojas de vida del personal administrativo seleccionado.

https://drive.google.com/drive/folders/1y_QSUZKdSez9mvW4Vex1YW6cRWeeD5L1

Anexo 9. Acta de entrega de dotación.

https://drive.google.com/drive/folders/1G6kWQ90CBM7Y5h8eB4aL0xEiE0p_f7Qw

Anexo 10. Acta de Entrega elementos de protección personal.

<https://drive.google.com/drive/folders/1uXh-C-qe7vDmdfuxoqjYW3F0KOPIkWk>

El contratista relacionó el personal administrativo activo y no activo a corte del 30 de mayo de 2026, donde indica que el mismo cuenta con la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la operación del proyecto.

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PERIODO DE INGRESO	ESTADO
1.	Juan Fernando Sarasti Berni	Director Proyecto	1	Activo
2.	Leydi Johana Salcedo Quejuan	Ingeniero de Control	1	Activo
3.	Julio Cesar Luna Balanta	Ingeniero Residente	1	Activo
4.	Mauricio Antonio Rosales Benvides	Profesional S.S.T.	1	Activo
5.	Katherine Sierra Gómez	Profesional de apoyo	1	Activo
6.	Juan David Escobar Cuaces	Profesional de apoyo	1	Activo
7.	Isabel Hernández Muñoz	Auxiliar administrativo de Campo	1	Activo
8.	María Alejandra Sánchez	Auxiliar administrativo de Campo	1	Activo
9.	Santiago Escobar Reina	Auxiliar administrativo de Campo	1	Activo
10.	Natalia Rengifo González	Profesional de socialización	1	Activo
11.	María Camila Silva Moreno	Profesional de socialización	1	Activo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

12.	Catalina Lasso Cadena	Profesional de socialización	1	Activo
13.	Heider Fernando Burbano Bolaños	Coordinador	1	Inactivo
14.	Paola Andrea Blanco García	Coordinador	2	Activo
15.	Linda Natalia Cruz López	Coordinador	3	Inactivo
16.	Milton Valencia	Coordinador	4	Activo
17.	Claudia Rocío Valdés	Coordinador	4	Activo
18.	Alexander León Rodríguez	Coordinador	4	Activo
19.	Juan Diego Mera	Profesional de apoyo	4	Activo

3. Verificación de la realización de la estrategia de socialización del proyecto

Anexo 11. Acta de Aprobación del documento de diseño de campaña.

<https://drive.google.com/drive/folders/1CL08tRf-FMgUWp3mOgdZMew4LH2nfxli>

Anexo 12. Informe de comunicaciones

<https://drive.google.com/drive/folders/1sF6wub-0i4j2f6ldwMMVOewg0Da6Opis>

Se realizaron jornadas de socialización a las comunidades donde se comunicaron las intervenciones de la secretaría de infraestructura incentivando el principio de transparencia institucional, mitigando los impactos socioambientales en el entorno de las obras y fomentando los canales de participación ciudadana, también se realizaron piezas gráficas y difusión de las mismas con el fin de consolidar la apropiación social del proyecto por parte de las comunidades beneficiarias en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



4. Verificación del recurso humano requerido para la realización de las labores de mantenimiento de la malla vial en la ciudad de Cali.

Anexo 13. Piezas gráficas de las convocatorias para los cargos operativos.
https://drive.google.com/drive/folders/17PDPf_BIW3ofrJ89oeqZIREN5EmYdVAA

Anexo 14. Hojas de vida del personal operativo seleccionado.
https://drive.google.com/drive/folders/1-SavzKWmZVX1koKW8m_nInpNXQsBsLuD

Anexo 15. Paquete de cronogramas de intervención mantenimiento vial cuadrilla asfalto.
https://drive.google.com/drive/folders/14CPQTNf_7mZ5rKCNFwiGNyFVfyIV-rCx

Anexo 16. Informe de ejecución de intervención mantenimiento vial cuadrilla asfalto.
https://drive.google.com/drive/folders/1dVoRxTtPfM31uGygd414Y7_-ctCSsnAg

Anexo 17. Fichas técnicas de entrega de mantenimiento vial cuadrilla asfalto.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

<https://drive.google.com/drive/folders/1VolkUMJdEYbf7Ux6OabFcqJfxSRNKSZ8>

Anexo 18. Actas de entrega de dotación.

https://drive.google.com/drive/folders/1k6Jtgu_yLk9pVTwQ-TDqWrDBVMzZCWmk

Anexo 19. Paquete de acta de Entrega de elementos de protección.

https://drive.google.com/drive/folders/1wsbYP9EI12uausZqxXG2_jMxK-4RHDT

El contratista relacionó el personal operativo activo y no activo a corte del 30 de mayo de 2026, donde indica que el mismo cuenta con la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la operación del proyecto, también indicó que por motivos de optimización operativa derivados de los comités de obra y en concordancia con la ampliación presupuestal de la maquinaria, las cuadrillas 02 y 03 se encuentran operando bajo la modalidad de bolsa con monto agotable, mientras que la cuadrilla 01, tras la finalización de la adición presupuestal, continuó con la ejecución de las actividades de mejoramiento de la infraestructura vial. Estas labores se financiaron y apoyaron directamente con recursos de la Secretaría de Infraestructura, incluyendo equipos, maquinaria, insumos y materiales

No	NOMBRE	CARGO	PERIODO DE INGRESO	ESTADO	MODIFICACION
1.	Bladimiro Villareal Forero	Líder De Campo	1	Activo	No aplica
2.	Anyi Valentina Obregón Obregón	Líder De Campo	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
3.	José Alberto Ruiz Amaya	Líder De Campo	1	Inactivo	No aplica
4.	Oscar Eduardo Martínez Meneses	Inspector	1	Activo	No aplica
5.	Nilo Emide Obando Biojo	Inspector	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
6.	Jesús Alfonso Almendra Girón	Inspector	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
7.	Segundo Alberto Cifuentes Gómez	Rastrillero	1	Activo	No aplica
8.	Ángel María Belalcazar Vallecilla	Rastrillero	1	Activo	No aplica

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

9.	Dubler Fernández Bolaños	Rastrillero	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
10.	Alfonso Encarnación	Rastrillero	1	Inactivo	No aplica
11.	Argeli Pino Zuñiga	Rastrillero	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
12.	Paola Andrea Zuñiga	Rastrillero	1	Inactivo	No aplica
13.	Luis Marquínez Rojas	Ayudante de asfalto	1	Activo	No aplica
14.	John Anderson Cubillos Alcalde	Ayudante de asfalto	1	Activo	No aplica
15.	Ubaldo José Ortiz Meza	Ayudante de asfalto	1	Activo	No aplica
16.	Harly Javier Murillo Murillo	Ayudante de asfalto	1	Activo	No aplica
17.	Jaider David Rosales	Ayudante de asfalto	1	Activo	No aplica
18.	Cleymar Potes Tordecilla	Ayudante de asfalto	1	Inactivo	No aplica
19.	Deivi Fabian Rodríguez Mancipe	Ayudante de asfalto	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
20.	Héctor Fabio Arce Rodríguez	Ayudante de asfalto	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
21.	Andrés Elías Nieto Acosta	Ayudante de asfalto	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
22.	José Florencio Burbano Riascos	Ayudante de asfalto	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
23.	Oscar Iván Pestana Zambrano	Ayudante de asfalto	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
24.	Ulises Joel Freites Chirinos	Ayudante de asfalto	1	Inactivo	No aplica
25.	Yustin José Rodríguez Casaran	Auxiliar de tráfico	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
26.	Endeix Garrido De La Cruz	Auxiliar de tráfico	1	Inactivo	No aplica
27.	Haminson David Berona Jiménez	Auxiliar de tráfico	1	Activo	No aplica
28.	Marlon Stiven Correa Zuñiga	Auxiliar de tráfico	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
29.	Julio Cesar Urbano Sanclemente	Auxiliar de tráfico	1	Modificación periodo 2	Grupo operativo
30.	Carlos Alberto Domínguez	Rastrillero	2	Modificación periodo 2	Grupo operativo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

31.	Anderson Fajardo	Angulo	Ayudante de asfalto	2	Modificación periodo 2	Grupo operativo
32.	Wilder Pérez	Sánchez	Líder De Campo	2	Modificación periodo 2	Grupo operativo
33.	Sebastián Morales	Castro	Ayudante de asfalto	2	Modificación periodo 2	Grupo operativo

El equipo conformado para la cuadrilla 1 que opera con recurso asignados de la secretaría realizó una intervención total de 1,94 kilómetros carril desde el 13 de abril al 30 de mayo de 2026.

UBICACIÓN	KM/CARRIL
Avenida 6a norte entre calles 44 norte y 34 norte	0,51
Carrera 85c entre calle 16 y 14a	0,73
Avenida Roosevelt entre carrera 39 y 44	0,48
Avenida 4 norte entre calle 52 norte y 49 norte	0,22
Carrera 80ª entre calle 48 y 48a	0,15
Carrera 9norte entre calle 70a y 72c	0,70
TOTAL, EJECUTADO (KM/CARRIL)	1,94



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



5. Verificación de labores de mejoramiento de andenes y obras complementarias en la ciudad.

Anexo 20. Piezas gráficas de las convocatorias para los cargos operativos.

https://drive.google.com/drive/folders/1e0b3V8WMOzXE5NDb23O2y1dH03NKeK_aL

Anexo 21. Hojas de vida del personal operativo seleccionado.

<https://drive.google.com/drive/folders/1d7Ic1-oKid-bFbqc4gqTu58BYUySLkcm>

Anexo 22. Actas de entrega de dotación.

<https://drive.google.com/drive/folders/1hr9Gs4ang3dekVtvvYrjBEIDpBE5chTi>

Anexo 23. Paquete de acta de Entrega de elementos de protección.

https://drive.google.com/drive/folders/1zWsCJePcV4US4rDS5dll1e1LGzzwP_gL

Anexo 24. Paquete de cronogramas de mejoramiento de andenes y obras complementarias.

<https://drive.google.com/drive/folders/17XQX2bd7-c15QYiNgJlb7sK2-jawxy5n>

Anexo 25. Informe de ejecución de mejoramiento de andenes y obras complementarias.

<https://drive.google.com/drive/folders/1URtbsohPWBQ0U4IXAQdyPMggxyDzcXbq>

Anexo 26. Paquete de fichas técnicas de entrega del mejoramiento de andenes y obras complementarias

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

<https://drive.google.com/drive/folders/1VMxowBNwVOuXSCCZfp3pTxrr8YkrJ3SO>

El contratista relacionó el personal operativo activo y no activo a corte del 30 de mayo de 2026, donde indica que el mismo cuenta con la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la operación del proyecto

No	NOMBRE	CARGO	PERIODO DE INGRESO	ESTADO
1.	Jhonathan Alexander Cortez Angulo	Profesional De Campo	1	Activo
2.	Víctor Alfonso Quiñonez Suarez	Maestro	1	Activo
3.	Fernando Andrés Ordoñez Cundumi	Oficial De Construcción	1	Activo
4.	Otoniel Rodríguez Moreno	Oficial De Construcción	1	Activo
5.	Ángel Rafael Vidal Bandes	Ayudante De Construcción	1	Inactivo
6.	Juan David Páez Cortes	Ayudante De Construcción	1	Activo
7.	Omar Alexis Uzcanga Vera	Ayudante De Construcción	1	Inactivo
8.	Jhon Kevin Quintana	Ayudante De Construcción	2	Activo
9.	Javier Alejandro Gonzalo	Ayudante De Construcción	2	Activo
10.	Oscar Yamil Meneses Mosquera	Ayudante De Construcción	2	Activo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



El contratista en su informe relaciono que el 11 de abril de 2026 cumplió con la meta estipulada en el contrato de recuperación de setecientos cincuenta (750) metros lineales (ML)

UBICACIÓN	ML
Calle 73 entre carrera 1ª4 y 1ª5	160
Calle 4b entre carrera 37 y 36b	318
Carrera 8 entre calles 78 Y 76	272
AVANCE EJECUTADO ML	750

Y que concluida la meta y en el marco de la continuidad de las actividades de mantenimiento de andenes, se ejecutaron intervenciones adicionales en los siguientes puntos específicos, donde el último punto referenciado se encuentra en un avance del 50%:

UBICACIÓN	ML
Calle 73 entre carrera 1ª6 y 1ª5e	71,37
Calle 73 entre carrera 1ª5e y 1ª5c	65,25
Calle 74 con carrera 1c	12,00
Calle 73 entre carrera 1ª5c y 1ª5a	65,93
AVANCE EJECUTADO ML	214,55

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

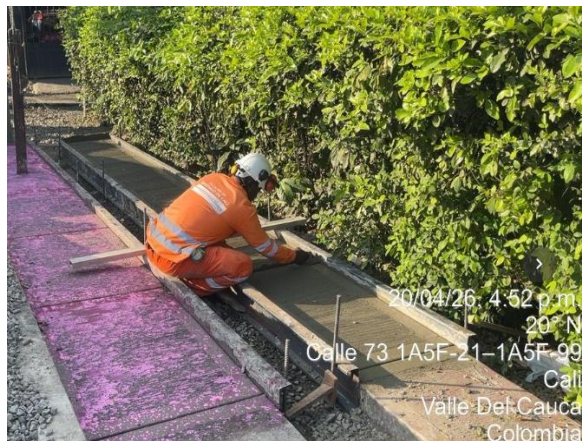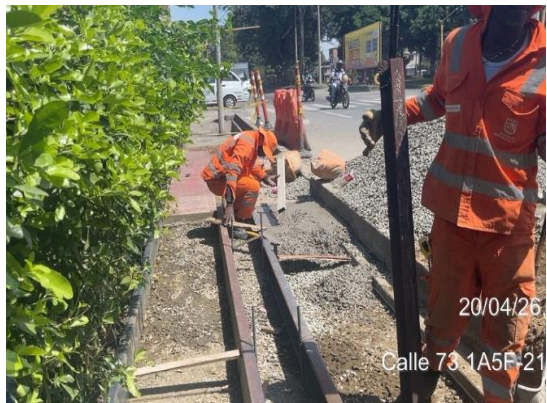

6. Verificar el cumplimiento de la ejecución de la bolsa a monto agotable.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Anexo 27. Piezas gráficas de las convocatorias para los cargos operativos.
<https://drive.google.com/drive/folders/173Emb0XOmrebPR8Hf5IN-7I0VYGK13LI>

Anexo 28. Hojas de vida del personal operativo seleccionado.
https://drive.google.com/drive/folders/1O0sQPpv_WFeTvlaYvjdI7jktDcH2hHbC

Anexo 29. Actas de entrega de dotación.
<https://drive.google.com/drive/folders/1z1Ou34HoCvEdWEd1IIB-SkmvIKM7iVus>

Anexo 30. Paquete de acta de Entrega de elementos de protección.
<https://drive.google.com/drive/folders/1Eh6EeWQjL-IYCWsWhAvA24BiJIWtkLvK>

Anexo 31. Informe de gestión del grupo operativo.
https://drive.google.com/drive/folders/1URi10_Rns3vV_n0iLH-Mq6kJ89zxKPI

Anexo 31.1. Cronograma de cuadrillas grupo operativo cuadrillas de asfalto, andenes y sumideros
<https://drive.google.com/drive/folders/1T1PrTXu-L742tYFRPk-45jzwIW8ROJQ9>

Anexo 31.2. Fichas técnicas de cuadrillas grupo operativo cuadrillas de asfalto
https://drive.google.com/drive/folders/1eiCIVUVHvI5aqx9f_O0zmiquiRxwjbPn

Anexo 31.3. Informe de intervención de grupo operativo cuadrillas de asfalto
<https://drive.google.com/drive/folders/1NIWuS7xLod21sezIsh5aziOrmPXXK3Aa4>

Anexo 31.4. Fichas técnicas de grupo operativo cuadrillas de andenes y sumideros
<https://drive.google.com/drive/folders/1UcSNWjZ0wppl6griPnTYYcD43kdYtlB6>

Anexo 31.5. Informe de intervención de grupo operativo cuadrillas de andenes y sumideros
<https://drive.google.com/drive/folders/1RLtgiVmm1V6hMJJvjGI0Uvm2gNaxTMO1>

Anexo 32. Informe de actividades conexas
<https://drive.google.com/drive/folders/1TygmKLUVb2AwwHvyzceZdwfriS4teDEO>

Anexo 33. Cartas de aprobación de las cotizaciones de actividades conexas
<https://drive.google.com/drive/folders/16gBGtKMW2Bgc-1GMALyNphT93coE0aeY>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Anexo 34. Cartas de solicitud de las cotizaciones de actividades conexas
<https://drive.google.com/drive/folders/1gB7BMYUFxYUf644WgXGz5eye3cb7JAmR>

Anexo 35. Cotizaciones
https://drive.google.com/drive/folders/1-yg_0UU8KSH4xKSsn0slceNpuyyedDhg

Para este punto el contratista relacionó todo el personal que se ha contratado desde el inicio del proyecto, indicando si se encuentran activos o no, al igual que si se les ha realizado alguna modificación en su contrato obra -labor producto de las modificaciones que ha tenido el contrato entre la empresa Gestión y Servicios Corporativos EST SAS y la Secretaría de Infraestructura.

No	NOMBRE	CARGO	PERIODO INGRESO	ESTADO	MODIFICACION
1.	Luis Camilo Salazar López	Obreros Rastrilleros - Flexible	1	Activo	No aplica
2.	William Andrés Macuace Vásquez	Obreros - Adoquines	1	Activo	No aplica
3.	Luis Carlos Amaya Torres	Obreros Flexible	1	Activo	No aplica
4.	Paulo Andrés Velasco Berrio	Obreros -Andenes	1	Activo	No aplica
5.	Steven Escobar Lemus	Obreros Rastrilleros - Flexible	1	Activo	No aplica
6.	William Noe Libreros Erazo	Obreros Flexible	1	Activo	No aplica
7.	Juan Carlos González Zúñiga	Conductor Camiones Y Volquetas	1	Activo	No aplica
8.	Carlos Alberto Escobar Balanta	Obrero Pavimento Flexible	1	Activo	No aplica
9.	Carlos Fernando Maglioni Posso	Obreros Flexible	1	Activo	No aplica

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

10	Claudia Patricia Estupiñan Castillo	Obreros - Adoquines	1	Activo	No aplica
11	Luis Esteban Cortes Angulo	Obreros Flexible	1	Activo	No aplica
12	Jimmy Balanta	Obreros - Adoquines	1	Activo	No aplica
13	Katherine Arce	Obreros -Andenes	1	Inactivo	No aplica
14	Julio Alberto Hernández	Conductor Camiones Y Volquetas	1	Activo	No aplica
15	Walter Molina	Obreros -Andenes	1	Activo	No aplica
16	Yovany Núñez Castro	Obreros -Andenes	1	Activo	No aplica
17	Yeison Esau Gascón Ríos	Obreros Flexible	1	Modificaci n	Auxiliar de conteo vehicular
18	Samuel David Pineda Ríos	Obreros Flexible	1	Modificaci n	Auxiliar de conteo vehicular
19	Nicolas Valencia Aguirre	Obreros Flexible	1	Modificaci n	Auxiliar de conteo vehicular
20	Julián Andrés Osorio	Obreros Flexible	1	Modificaci n	Auxiliar de conteo vehicular
21	Juan Esteban Padilla	Obreros Flexible	1	Modificaci n	Auxiliar de conteo vehicular
22	Cristhian Mondragón	Obreros Flexible	1	Modificaci n	Auxiliar de conteo vehicular
23	Luz Viviana Álvarez Cuero	Obreros Flexible	1	Inactivo	No aplica
24	Carlos Javier Linares	Obreros Flexible	2	Activo	No aplica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

25	Andres Felipe Matajudios Vega	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de conteo vehicular
26	Juan Manuel Solano Escobar	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de conteo vehicular
27	Juan Camilo Fori Mancilla	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de conteo vehicular
28	Juan Fernando Chicangana	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de campo
29	Derly Katherine Giraldo Rojas	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de campo
30	Luis David Grisales Prieto	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de campo
31	Jhostin Felipe Ortega Abelarde	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de conteo vehicular
32	Jean Carlo Mendoza Meneses	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de conteo vehicular
33	Juan Camilo Lopez Alba	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de conteo vehicular
34	Jose Miguel Quiñonez Sanchez	Obreros Flexible	2	Modificació n	Auxiliar de campo
35	Diego Alejandro Velasco	Técnico administrativo mecánico	2	Activo	No aplica
36	John Jairo Conde Toro	Auxiliar de campo	2	Activo	No aplica
37	Jairon Steel Rodriguez	Ayudante de pavimento rigido	2	Activo	No aplica
38	Anyi Valentina Obregón Obregón	Líder De Campo	1	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

39	Nilo Emide Obando Biojo	Inspector de obra	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
40	Jesús Alfonso Almendra Girón	Inspector de obra	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
41	Dubler Fernández Bolaños	Rastrillero	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
42	Argeli Pino Zuñiga	Rastrillero	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
43	Alfonso Encarnación	Rastrillero	1	Inactivo	Grupo operativo Periodo 2
44	Endeix Garrido De La Cruz	Ayudante de asfalto	1	Inactivo	Grupo operativo Periodo 2
45	Deivi Fabian Rodríguez Mancipe	Ayudante de asfalto	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
46	Héctor Fabio Arce Rodríguez	Ayudante de asfalto	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
47	Andrés Elías Nieto Acosta	Ayudante de asfalto	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
48	José Florencio Burbano Riascos	Ayudante de asfalto	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
49	Oscar Iván Pestana Zambrano	Ayudante de asfalto	1	Modificaci n	Grupo operativo Periodo 2
50	Yustin José Rodríguez Casaran	Auxiliar de tráfico	1	Inactivo	Grupo operativo Periodo 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

51	Marlon Stiven Correa Zuñiga	Auxiliar de tráfico	1	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2
52	Julio Cesar Urbano Sanclemente	Auxiliar de tráfico	1	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2
53	Carlos Alberto Domínguez	Rastrillero	2	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2
54	Anderson Angulo Fajardo	Ayudante de asfalto	2	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2
55	Wilder Sánchez Pérez	Líder De Campo	2	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2
56	Sebastián Castro Morales	Ayudante de asfalto	2	Modificació n	Grupo operativo Periodo 2
57	Carlos Andrés Álvarez Ávila	Auxiliar de conteo vehicular	3	Inactivo	No aplica
58	Ilman Josué Tenorio Castillo	Líder De Campo	3	Activo	No aplica
59	Jaime Alexis Varón Gallego	Inspector de obra	3	Activo	No aplica
60	Oscar David Orobio	Oficial de construcción	3	Activo	No aplica
61	Johao Antonio Camilo	Oficial de construcción	3	Activo	No aplica
62	Reinaldo Soto Sierra	Ayudante de pavimento rígido	3	Activo	No aplica
63	Rusber Rubiano Ramírez	Ayudante de pavimento rígido	3	Activo	No aplica
64	Leonardo Campo Quintero	Ayudante de pavimento rígido	3	Inactivo	No aplica
65	Luis Fernando Larrea	Inspector de obra	3	Inactivo	No aplica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

66	Pedro García Lasso	Ayudante de construcción	3	Activo	No aplica
67	Andrés Camilo Plata González	Ayudante de construcción	3	Activo	No aplica
68	Andres Felipe Pinedo	Auxiliar de conteo vehicular	4	Activo	No aplica
69	Pedro Antonio Nuñez	Técnico administrativo mecánico	4	Activo	No aplica
70	Maria Valentina Moya	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
71	Daniel Steven Cortes	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
72	Kevin Francisco Valencia	Líder de campo	4	Activo	No aplica
73	Jefferson Murillas Rivas	Líder de campo	4	Activo	No aplica
74	Nelson Golu Fajardo	Inspector de obra	4	Activo	No aplica
75	Mauricio Andres Angulo	Inspector de obra	4	Activo	No aplica
76	Luis Enrique Avila Cortes	Oficial de construcción	4	Activo	No aplica
77	Alexander Hurtado Estupiñan	Oficial de construcción	4	Activo	No aplica
78	Jhonson Eduardo Rojas	Oficial de construcción	4	Activo	No aplica
79	Gregory Arias	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
80	Yeison Viveros Caicedo	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
81	Juan Pablo Mina Escobar	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
82	Álvaro Efrén Bravo Saa	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

83	Jhon Carlo Rebolledo	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
84	Juan Camilo Asprilla Aguilar	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
85	Sebastián Silva	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
86	Jhon Mosquera	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
87	Hernan Norvey Garcia	Oficial de construcción	4	Activo	No aplica
88	Yurlenys Paola Moreno	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
89	Marcos Perez Mena	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
90	Zulma Tabera	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
91	Edwin Ali Prado	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
92	Ana Milena Guerrero	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
93	Maira Alejandra Rojas	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
94	Maria Camila Ramirez	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
95	Yessica Lenis Martinez	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
96	Maria Victoria Montañó	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
97	Guerrero Ramirez Lizeth	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
98	Carabali Gonzalez Miguel	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
99	Brayan Andres Cortes	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

100.	Juan Camilo Cortes Melendez	Auxiliar de campo	4	Activo	No aplica
101.	Jhon Montoya	Obrero flexible	4	Activo	No aplica
102.	Luis Evelio Mosquera	Obrero flexible	4	Activo	No aplica
103.	Cristian Evelio Marroquin	Obrero flexible	4	Activo	No aplica
104.	Jhon Jairo Sanchez	Obrero flexible	4	Activo	No aplica
105.	Hawer Antonio Mosquera	Obrero flexible	4	Activo	No aplica
106.	Hector Fabio Asprilla	Operador de compresor	4	Activo	No aplica
107.	Yeinson Alexander Mutiz	Conductor de volqueta y carro tanque doble troque	4	Activo	No aplica
108.	Diego Mauricio Sastoque	Operador de retroexcavadora	4	Activo	No aplica
109.	Miller Wilson Gomez	Operador de minicargador	4	Activo	No aplica
110.	Jose Orley Serna	Operador de retrocargador	4	Activo	No aplica
111.	Javier Hernando Ararat	Operador de pavimentadora finisher	4	Activo	No aplica
112.	Juan Carlos Suarez Sanchez	Conductor de camión	4	Activo	No aplica
113.	Sebastian Quesada Lozada	Operador de vibrocompactador	4	Activo	No aplica
114.	Kenner Sinisterra Caicedo	Conductor volqueta sencilla	4	Activo	No aplica
115.	Jose Luis Velez	Conductor de volqueta y carro tanque doble troque	4	Activo	No aplica
116.	Fernando Torres	Conductor volqueta sencilla	4	Activo	No aplica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

117.	Jair Valencia Potes	Operador de minicargador	4	Activo	No aplica
118.	Ruben Dario Rios Marin	Conductor de volqueta y carro tanque doble troque	4	Activo	No aplica
119.	Luis Miguel Alvarez	Conductor volqueta sencilla	4	Activo	No aplica
120.	Luis Eduardo Paez	Conductor volqueta sencilla	4	Activo	No aplica
121.	Jader Alexander Canizales	Conductor de volqueta y carro tanque doble troque	4	Activo	No aplica
122.	Oscar Daniel Insuasti	Conductor de fresadora	4	Activo	No aplica
123.	Mauricio Restrepo Roman	Operador de minicargador	4	Activo	No aplica
124.	Jaime Zambrano Rodriguez	Conductor volqueta sencilla	4	Activo	No aplica
125.	Cesar Andres Bejarano	Topógrafo	4	Activo	No aplica
126.	Carlos Julio Quiñonez Riascos	Cadenero 1	4	Activo	No aplica
127.	Wilmer Angulo Cuero	Cadenero 2	4	Activo	No aplica
128.	Hernán Buitrón	Topógrafo	4	Activo	No aplica
129.	Juan Carlos Tonguino	Cadenero 1	4	Activo	No aplica
130.	Anderson Muriel Oliva	Cadenero 2	4	Activo	No aplica
131.	Geiser Hurtado	Almacenista	4	Activo	No aplica
132.	Juan Diego Mera	Profesional de apoyo	4	Activo	No aplica
133.	Joaquín Evelio Anaya	Operador retro excavadora	4	Activo	No aplica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

13 4.	Andrés Felipe Amaya	Líder de campo	4	Activo	No aplica
13 5.	Jacobo Antonio Calderón	Auxiliar de conteo vehicular	4	Activo	No aplica
13 6.	Robert Camilo Mejía	Operador de minicargador	4	Activo	No aplica
13 7.	Luis Gabriel Batalla	Oficial de construcción	4	Activo	No aplica
13 8.	Johann Sánchez Castañeda	Ayudante de construcción	4	Activo	No aplica
13 9.	Bebeto Sánchez	Oficial de construcción	4	Activo	No aplica

El contratista también rescató que La articulación constante con la entidad ejecutora ha permitido el cumplimiento estricto de la programación diaria en los siguientes frentes de trabajo:

- **Infraestructura Vial:** Ejecución de labores de pavimentación, recarpeteo, fresado y bacheo, mediante el despliegue de cuadrillas especializadas integradas por obreros flexibles y rastrilleros.
- **Logística y Transporte:** Operación, cargue y conducción de vehículos pesados y maquinaria especializada, actividades ejecutadas por el personal de conductores asignado.
- **Desmantelamiento y Demolición:** Actividades de desmonte de cubiertas y demolición técnica estructural a cargo de personal operativo flexible.
- **Estudios de Tránsito (Aforos):** Levantamiento de aforos manuales vehiculares, peatonales y ciclistas (bicicletas), orientados a evaluar los flujos de tráfico y la capacidad de servicio en zonas estratégicas de la ciudad.
- **Conservación de Espacio Público (Andenes y Sumideros):** Obras enfocadas en la construcción, adecuación y reconstrucción estructural de andenes y sumideros que presentaban fallas o avanzado estado de deterioro. El proceso administrativo incluyó una supervisión técnica en campo y un estricto control de asistencia, asegurando la permanencia del personal y el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



El contratista para esta actividad da cuenta de los compromisos establecidos por medios de los comités técnicos, ya que manejó y distribuyó el personal de la siguiente forma, para el personal del grupo operativo asignado a líderes o inspectores directos de la secretaria de infraestructura, la supervisión de este grupo operativo la realizaron los coordinadores designados por la misma secretaria; mientras que las cuadrillas que ejecutan actividades tales como: mantenimiento de la malla vial, mejoramiento de andenes, sumideros y obras complementarias; y que adicionalmente, contaron con líderes de campo financiados mediante el grupo operativo de la bolsa con monto agotable y supervisados por los coordinadores del grupo administrativo del proyecto; el operador entregó el reporte de las intervenciones realizadas:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

MANTENIMIENTO VIAL		
UBICACIÓN	KM/CARRIL	% EJECUCION
Avenida 6ª norte entre calle 38 norte y 50 norte	2,50	100
Calle 12 entre carrera 36 y 36a	0,11	100
Carrera 86 entre calle 14 y 13	1,48	100
Carrera 80 entre calle 14 y 16	0,87	100
Carrera 29 entre calle 7 y 9	0,37	100
Carrera 27 entre calle 6 y 8	0,55	100
Carrera 44 entre avenida Roosevelt y avenida Joaquín Borrero	0,40	100
Avenida Joaquín Borrero entre carrera 42 y 44	0,25	100
Carrera 38ª con avenida Roosevelt	0,05	100
Avenida Roosevelt entre carrera 44 y 50	0,39	100
AVANCE EJECUTADO ML	6,97	

MEJORAMIENTO DE ANDENES, SUMIEDEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
UBICACIÓN	ML	% EJECUCION
Avenida 15 oeste entre Calles 8 y	29,30	20
AVANCE EJECUTADO ML	13	
UBICACIÓN	UND	% EJECUCION
Calle 73 entre carrera 1ª 3 y 1ª 6	13	100
Carrera 11 entre calles 75 y 81	13	65
AVANCE EJECUTADO ML	13	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Finalmente, el contratista en coherencia con la modificación No.2 realizó las cotizaciones para cada uno de los once (11) servicios solicitados, donde a corte del 30 de mayo de 2026 se inició con la utilización de los siguientes servicios, los cuales se encuentran reportados en el anexo 32. Informe de actividades conexas:

- Servicio de Movilización de Elementos de SST, el cual tiene como finalidad asegurar el traslado logístico, oportuno y seguro de los recursos de materiales indispensables para las obras para el normal desarrollo de las cuadrillas, se inició desde el 6 de mayo de 2026, con un total de 22 puntos de trabajo reportados y 26 servicios prestados.

FECHA	PUNTO DE TRABAJO
6/05/2026	Traslado de maquinaria Petecuy.
7/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
8/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
9/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
11/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
12/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
13/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
14/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
15/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
16/05/2026	Transporte de señalización Bodega a los diferentes puntos de intervención.
17/05/2026	Transporte de tinas con material entre frentes.
20/05/2026	Traslado de material a puerto Mallarino.
21/05/2026	Traslado de material a puerto Mallarino.
22/05/2026	Traslado de tinas con material entre frentes.
23/05/2026	Transporte de señalización Bodega - Floraría
24/05/2026	Transporte de señalización Bodega -floralia.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

25/05/2026	Traslado de maquinaria y herramienta entre frentes.
26/05/2026	Traslado de maquinaria y herramienta entre frentes.
27/05/2026	Transporte de Maquinaria florialia.
28/05/2026	Transporte de Maquinaria florialia.
29/05/2026	Traslado de tinas con material entre frentes.
30/05/2026	Traslado de maletines de bodega a florialia.

- Servicio de Movilización de personal entre frentes de obra a partir del 12 de mayo: este servicio inició desde el 12 de mayo de 2026, donde para el servicio de busetas con disponibilidad de 12 horas y capacidad para 17 pasajeros se prestaron 37 servicios y para el servicio de camionetas tipo Duster con disponibilidad 12 Horas y capacidad 4 Pasajeros se prestaron un total de 12 servicios

FECHA DE INTERVENCIÓN	PUNTO DE TRABAJO
12/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
13/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
14/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
15/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
16/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
17/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
18/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
19/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

20/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
21/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
22/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
23/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
24/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
25/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
26/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
27/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
28/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
29/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.
30/05/2026	Transporte de personal desde talleres del municipio al punto de intervención programado por la Secretaria de Infraestructura.

- Servicio de atención en horario no habitual: este servicio se prestó en días específicos por parte del contratista, los cuales se presentan a continuación para un total de 82 servicios prestados, correspondientes a soporte y asistencia directa para los operadores debido a extensión extraordinaria las actividades en sitio de las intervenciones de la malla vial, donde se garantizó el suministro oportuno de alimentación e hidratación adecuada para evitar descompensaciones físicas.

FECHA DE INTERVENCIÓN	PUNTO DE TRABAJO
27/06/2026	Guaduales
28/05/2026	Guaduales
29/06/2026	Guaduales y Olímpico



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

30/06/2026		Guaduales
Servicio de difusión en sitio, el cual fue requerido para divulgar y dar a conocer directamente a la ciudadanía, residentes y comerciantes los lugares específicos donde se ejecutarán las obras viales, detallando las posibles afectaciones y cierres, con el fin de permitirles evaluar y adoptar alternativas de movilidad vial por el periodo exacto que dure la intervención en su sector, de las 3 tipologías de actividades para la difusión, a corte del 30 de mayo de 2026 se realizaron 7 jornadas puerta a puerta.		
FECHA DE INTERVENCIÓN	PUNTO DE TRABAJO	
23/05/2026	Avenida Roosevelt	
25/05/2026	Sector Alfonso López Sector Puente Juanchito Sector Puerto Mallarino Urbanización Ángeles del Hogar Avenida Sexta (Granada, Calle 18 y Chipichape)	
26/05/2026	Sector Tequendama Barrio Guasalupe Ciudad de Cali Sector Aguacatal Avenida Roosevelt	
27/05/2026	Sector El Ingenio Simón Bolívar Sector HUV San Fernando Avenida Roosevelt	
28/05/2026	Sector Santa Teresita Sector La Flora Avenida Roosevelt	
29/05/2026	Sector Benjamín Sector Santa Fe Barrio Marroquín Avenida Roosevelt	
30/05/2026	Sector Cañaveralejo Sector Parcelaciones Pance Avenida Roosevelt	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se presentan recomendaciones para este trámite
7. FIRMAS RESPONSABLES
 SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ Supervisor
 VICTORIA NARANJO DUQUE Apoyo a la Supervisión
 JUAN GUILLERMO MARTÍNEZ Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 18 de junio de 2026
