



BITÁCORA CUADRILLAS

TUESTO SOLUCIONES SAS
NIT: 901489264-5

DATOS DE LA CONTRATISTA

NOMBRE RL:	GINA VANESSA CUESTA REINA
LOCALIZACIÓN:	Base Aérea "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES". Marandúa – Vichada
NIT	901489264-5

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA FIRMA CTO:	08 DE ABRIL 2026
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE (Supervisor Principal)

Esta bitácora es realizada de manera digital de acuerdo con las políticas institucionales FAC - Campaña cero papel <https://www.fac.mil.co/es/noticias/politica-cero-papel>

RESPONSABLES PERSONAL CUADRILLAS

DEL CONTRATISTA:		DEL SUPERVISOR
GINA VANESSA CUESTA REINA		TE. NIXON G DURAN S.

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
19 MAYO 2026	INICIO EJECUCION DEL CTO, INGRESA VUELO DE APOYO A LA UNIDAD 10 AM – CON EL PERSONAL APROBADOS SEGÚN ACTA DE INICIO. ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: - Revisión cuarto Frio del ESDEB – e iniciar Mantenimiento cuarto Frio OPERARIO CONSTRUCCION 01 Y 02: - Inicio Mantenimiento Piso cuarto Frio, remover las laminar y lavar el cuarto Para mantenimiento. <i>Neuza Due</i> SUPERVISOR FAC <i>Vanesa Cuesta R.</i> RL CONTRATISTA SOPORTE EJECUCIÓN 19 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION(UN OPERARIO)  SOPORTE EJECUCIÓN 19 MAYO 2026 – 02 OP CONSTRUCCION (02 OPERARIOS)  Personal debido que ingresaron a trabajar 10 AM por vuelo de apoyo, Laboraron hasta 18:30 horas, para reponer el tiempo, almuerzan en 30 min



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

20 MAYO 2026

ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:

OPERARIO REFRIGERACIÓN:

- Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU **BK 8 HAB 8**
- Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU **BK 8 HAB 9**
- Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU **BK 1 HAB 2**
- Mantenimiento Aire Acondicionado 60.000 BTU **SUBESTACION ELECTRICA**

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Mantenimiento Cuarto Frio, Casino Principal (Se avanza)
- Mantenimiento Piso Monumento ED ESCOM

OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP

- Mantenimiento Despacho Principal (Se avanza), pega enchape y pintura Interna lado posterior


Neufeld Duz
SUPERVISOR FAC

Vanesa Cuesta R.
RL CONTRATISTA

SOPORTE EJECUCIÓN 20 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION



SOPORTE EJECUCIÓN 20 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)





ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS



SOPORTE EJECUCIÓN 20 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)



21 MAYO 2026

ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:

OPERARIO REFRIGERACIÓN:

- Mantenimiento aire 60.000 BTU **Sector Bravo**
- Mantenimiento Aire 18.000 BTU **Sector Bravo**
- Mantenimiento Aire 18.000 BTU **Sector Delta (Dos equipos)**
- Mantenimiento Aire 12.000 BTU **Sector Delta**
- Mantenimiento Aire 60.000 BTU **Segundo aire Subestación Eléctrica**

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Mantenimiento Despacho (Estuco y Pintura interno) (Avance)

OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP

- Mantenimiento Cuarto Frio, se rompe desagüe cuarto Frio y se aplica Epóxido

Neufeld D. x
SUPERVISOR FAC


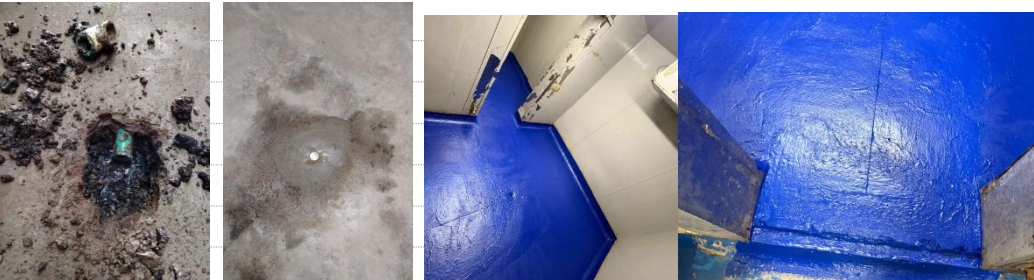

Vanesa Cueto R.
RL CONTRATISTA

SOPORTE EJECUCIÓN 21 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION





ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	
	SOPORTE EJECUCIÓN 21 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)
	
	SOPORTE EJECUCIÓN 21 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)
	
22 MAYO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Mantenimiento Aire 24.000 BTU alojamiento soldado (Dos equipos) • Reparación y mantenimiento Aire 12.000 BTU Peluquería Soldados OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Tapado Goteras Casa SECOM (Aplicación emulsión y Sika Felt) OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP • Se pega "A" Letrero Despacho • Mantenimiento Fachada lateral Despacho (Se avanza) • Inicio Mantenimiento Troncos ingreso despacho- se retira cuerda existente  SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

SOPORTE EJECUCIÓN 22 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION



SOPORTE EJECUCIÓN 22 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)



SOPORTE EJECUCIÓN 22 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)



23 MAYO 2026

ANOTACIÓN


Personal de Cuadrillas no Labora el día sábado 23 de mayo, debido que según el Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS


SUPERVISOR FAC


RL CONTRATISTA

25 MAYO 2026

ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:

OPERARIO REFRIGERACIÓN:

- Mantenimiento Aire 18.000 BTU **Capilla**
- Mantenimiento Aire 60.000 BTU **Despacho (Dos Aires)**
- Mantenimiento Aire 18.000 BTU **Despacho**

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Mantenimiento Despacho (Instalación Cerramiento- cuerdas) Terminación Despacho
- Segunda Mano Pintura Palos Despacho

OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP

- Mantenimiento Casino Oficiales (Inicio Mantenimiento)

SOPORTE EJECUCIÓN 25 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION



SOPORTE EJECUCIÓN 25 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)



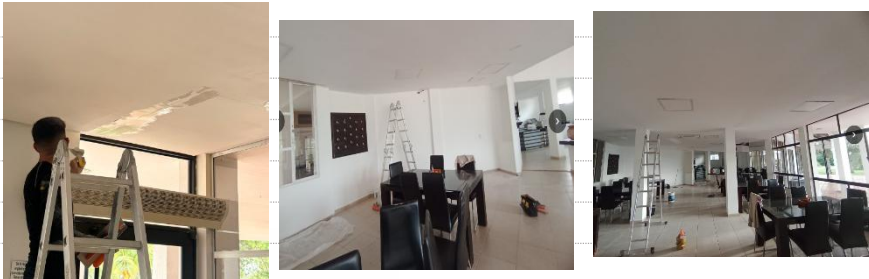



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	SOPORTE EJECUCIÓN 25 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)    
26 MAYO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Seguimiento al funcionamiento cuarto Frio ESDEB • Diagnostico cuarto Frio, Casino principal • Mantenimiento Aire 60.000 BTU (ESDEB) Dos equipos • Mantenimiento Aire 24.000 BTU Almacén Armamento Terrestre OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Mantenimiento cubiertas Estado Mayor (Aplicar Cinta Flanche) • Limpieza Canales OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP • Mantenimiento Casino Oficiales (Avance) SOPORTE EJECUCIÓN 26 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION 



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026		
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS		
			
	SOPORTE EJECUCIÓN 26 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)		
			
	SOPORTE EJECUCIÓN 26 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)		
			
	 SUPERVISOR FAC		
	 RL CONTRATISTA		
27 MAYO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:		
	OPERARIO REFRIGERACIÓN:		
	• Instalar 02 Aires Nuevos 18.000 BTU (subestación Eléctrica)		
	OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP		
	• Mantenimiento Casino Oficiales (Avanzar)- instalar Biscochos sanitarios		
	OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP		
	• Mantenimiento Bolardos ingreso Casino (lijar y pintar) • Mantenimiento BK 8 HAB 13 tratamiento Humedades		
	 SUPERVISOR FAC		
	 RL CONTRATISTA		




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	SOPORTE EJECUCIÓN 27 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION 
	SOPORTE EJECUCIÓN 27 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO) 
	SOPORTE EJECUCIÓN 27 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO) 
28 MAYO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Mantenimiento Aire 18.000 BTU Casa Secom • Mantenimiento Aire 24.000 BTU Shelters EPM (Dos Equipos) • Instalar Aire 12.000 BTU BK1 HAB 13 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Culminación Trabajos Casino Oficiales • Inicio Mantenimiento Segundo Piso Fuera del Bar Tomo OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP • Mantenimiento Bolardos Ingreso Estado Mayor (Lijar y Pintar) • Culminación Trabajos Mantenimiento BK 8 HAB 13 • Inicio Mantenimiento Tratamiento Humedades BK 8 HAB 9  SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	SOPORTE EJECUCIÓN 28 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION     
	SOPORTE EJECUCIÓN 28 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)     
	SOPORTE EJECUCIÓN 28 MAYO 2026 –OP CONSTRUCCION (UN OPERARIO)    
29 MAYO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Seguimiento cuarto Frio ESDEB • Mantenimiento 60.000 BTU Casino oficiales (02 Equipos) OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Seguir Mantenimiento 2do piso Casino OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Culminar Mantenimiento BK 8 HAB 9 • Apoyo Mantenimiento 2d Piso Casino  SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026


FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

SOPORTE EJECUCIÓN 29 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION



SOPORTE EJECUCIÓN 29 MAYO 2026- OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP



SOPORTE EJECUCIÓN 29 MAYO 2026 -OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP



30 MAYO 2026

ANOTACIÓN

Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención
Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso

31 MAYO 2026

Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención

ANOTACIÓN

Se presenta nuevamente Falla en el cuarto Frio del ESDEB
Equipo está muy viejo por lo que requiere mantenimiento Correctivo, con cambio
De Partes y repuestos, operario reacciona por 04 Horas e inyecta gas al Equipo


SUPERVISOR FAC


RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

SOPORTE EJECUCIÓN 31 MAYO 2026 – OP REFRIGERACION



01 JUNIO 2026

ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:

OPERARIO REFRIGERACIÓN:

- Instalación 02 Aires 24.000 BTU
- Revisión y seguimiento cuarto Frio ESDEB

OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Limpieza de canales estado mayor
- Sello de canal con icopor y gasolina estado mayor


OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP

- Resane Segundo Piso Casino Principal
- Inicio trabajos BK 4 HAB 2 Raspado y tratamiento humedades

SOPORTE EJECUCIÓN 01 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACION



SOPORTE EJECUCIÓN 01 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN




SOPORTE EJECUCIÓN 01 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN



Neuquén
SUPERVISOR FAC

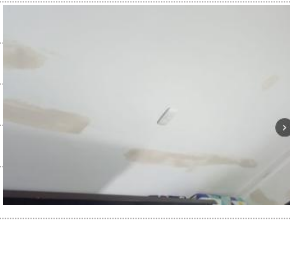



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
02 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN: • Mantenimiento aire 18.000 BTU Oficina Instalaciones • Mantenimiento Aire 18.000 BTU Rack Estado mayor • Mantenimiento Aire 24.000 BTU oficina TJC • Ajuste Desagüe Aire Despacho 60.000 BTU OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Seguimiento trabajos Segundo Piso Casino (Se terminan trabajos) OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Se inician trabajos oficina Comandante ESALO SOPORTE EJECUCIÓN 02 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 02 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 02 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA

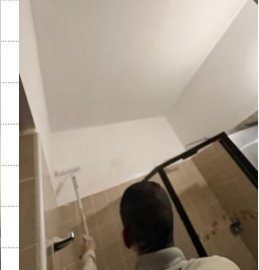




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
03 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire 18.000 BTU Oficina ESCEA • Mantenimiento Aire 18.000 BTU Oficina Comandante inteligencia • Mantenimiento Aire 18.000 BTU Oficina Inteligencia Aérea • Mantenimiento Aire 18.000 BTU Emisora OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Mantenimiento BK 8 HAB 8 inicio intervención • Mantenimiento BK 4 HAB 2 tratamiento humedades OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Destape canales Casino • Inicio trabajos Oficina Instalaciones • Seguimiento tratamiento humedades oficina Comandante ESALO SOPORTE EJECUCIÓN 03 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 03 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 03 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
04 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Bar Arpía • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Comandante ESCOM • Reinstalación Aire Acondicionado 18.000 BTU BK 6 HAB 4 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Continuidad Mantenimiento Oficina Comandante Esalo • Continuidad mantenimiento Oficina Instalaciones OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Termino Mantenimiento BK 4 HAB 2 SOPORTE EJECUCIÓN 04 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 04 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 04 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
05 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU shelter Automotores • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU Radar • Mantenimiento Aire Acondicionado 24.000 BTU Radar • Instalación Aire Acondicionado 24.000 BTU Rack Comunicaciones OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance Trabajos Oficina Instalaciones • Apoyo Marcación puntos de referencia plazo CODAF OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Termino Mantenimiento BK 8 HAB 8 • Termino Mantenimiento Oficina Comandante ESALO SOPORTE EJECUCIÓN 05 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 05 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 05 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
06 JUNIO 2026	ANOTACIÓN Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención <i>Neude Due</i> SUPERVISOR FAC <i>Vanesa Cuesta R.</i> RL CONTRATISTA
07 JUNIO 2026	ANOTACIÓN Día no Laboral – (domingo) <i>Neude Due</i> SUPERVISOR FAC <i>Vanesa Cuesta R.</i> RL CONTRATISTA
08 JUNIO 2026	ANOTACIÓN Día no Laboral – (Lunes Festivo) Se solicita un apoyo por necesidad del Servicio Aires del casino no Estaban preñiendo operario de refrigeración reacciona y soluciona novedad  <i>Neude Due</i> SUPERVISOR FAC <i>Vanesa Cuesta R.</i> RL CONTRATISTA
09 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN - Mantenimiento 04 Aires Acondicionado 24.000 BTU Radar - Mantenimiento 02 Aires Acondicionado 18.000 BTU Radar - Mantenimiento 02 Aires Acondicionado 12.000 BTU Radar - Reparación 02 Aires Acondicionado 18.000 BTU Cambio Capacitor OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP - Mantenimiento General Aula Torre de Control Se culminan los trabajos






ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance Trabajos Oficina Instalaciones • Apoyo a Picado de Piso Cuarto Frio y lechada de piso SOPORTE EJECUCIÓN 09 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 09 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 09 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA 10 JUNIO 2026 ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: • Mantenimiento Aires Acondicionado 12.000 BTU BK 7 HAB 6 • Mantenimiento 03 Aires Acondicionado 18.000 BTU Casa MY Duque OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Se apoya Fundir Placa Shelter cuarto frio




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	- Preparación mezcla Cuarto Frio OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP - Avance trabajos oficina Instalaciones SOPORTE EJECUCIÓN 10 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 10 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 10 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FACRL CONTRATISTA 11 JUNIO 2026ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN - Mantenimiento 06 Aires Acondicionado 12.000 BTU Shelters OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP - Termino Oficina Instalaciones - Termino Canal Mantenimiento Frente Oficina instalaciones







ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Inicio Demolición Poyo para instalación cuarto Frio Prefabricado • Aplicación Lechada • Revista Fundida Placa Cuarto Frio SOPORTE EJECUCIÓN 11 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 11 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 11 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FACRL CONTRATISTA 12 JUNIO 2026ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA:OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento 05 Aires Acondicionado 18.000 BTU Oficinas ESTEC • Reparación 01 Aire acondicionado 18.000 BTU Soldadura en tarjeta OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP • Inicio Mantenimientos en Fachadas Subestación Eléctrica



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026			
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS			
	SOPORTE EJECUCIÓN 12 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN			
				
	SOPORTE EJECUCIÓN 12 JUNIO 2026 – 02 OP CONSTRUCCIÓN			
				
13 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC ANOTACIÓN		 RL CONTRATISTA	
	Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención			
14 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC ANOTACIÓN		 RL CONTRATISTA	
	Día no Laboral – (domingo)			
15 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC ANOTACIÓN		 RL CONTRATISTA	
	Día no Laboral – (Lunes Festivo)			
	 SUPERVISOR FAC		 RL CONTRATISTA	

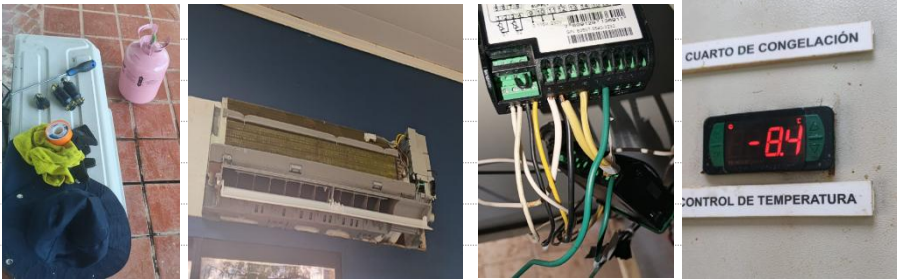



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
16 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire acondicionado 60.000 BTU SKYLINE • Mantenimiento 07 Aire Acondicionado 12.000 BTU Hotel OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Apoyo Aplicación pintura Trafico Shelter 03 Capas OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Limpieza Cubierta Subestación eléctrica (se retiran llenas 16 Bolsas de basura) • Culminación Trabajos Fachada subestación Eléctrica Estuco y pintura SOPORTE EJECUCIÓN 16 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 16 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 16 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA


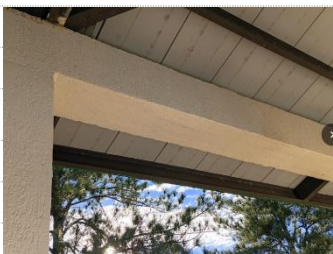




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
17 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Cambio Sensores Cuarto Frio ESDEB • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU Oficina jurídicos UMA • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Oficina DEPLA OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Inicio Trabajos mantenimiento Estado Mayor (Columnas ingreso) Estuco y pintura OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Inicio Trabajos fachada Planta de tratamiento ALFA SOPORTE EJECUCIÓN 17 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 17 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 17 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  <i>Neufeld Quiroga</i> SUPERVISOR FAC <i>Vanesa Cuesta R.</i> RL CONTRATISTA 18 JUNIO 2026 ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Comando


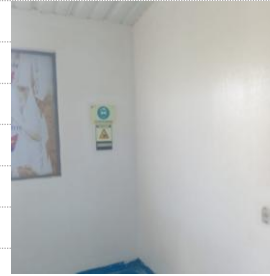






ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	• Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU Comando • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Oficina SECOM • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Sala reuniones SECOM • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU SEPLA Esalo • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Oficina Servicios ESALO OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance trabajos Estado Mayor Estuco y pintura OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance Trabajos Planta agua Potable Interno (Pintura y estuco) paredes SOPORTE EJECUCIÓN 18 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 18 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 18 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN   SUPERVISOR SAC  RL CONTRATISTA 19 JUNIO 2026 ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU Casa MY DUQUE • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 6 HAB 6




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	• Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 5 HAB 3 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 3 HAB 6 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 8 HAB 8 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance trabajos Estado Mayor (Laterales) y Columnas internas Estuco y pintura OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Finalizan trabajos Planta agua Potable Interno (Pintura y estuco) paredes. No Se pinta el piso teniendo en cuenta que se dan nuevas prioridades por el Comando SOPORTE EJECUCIÓN 19 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 19 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 19 JUNIO 2026 – OP CONSTRUCCIÓN 
20 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC ANOTACIÓN  RL CONTRATISTA Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026		
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS		
21 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC ANOTACIÓN Día no laboral – (domingo)	 RL CONTRATISTA	
22 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento 02 Blowers ingreso casino Oficiales • Mantenimiento 02 Aire Acondicionado 60.000 BTU Casino Oficiales • Mantenimiento 02 Aire Acondicionado 60.000 BTU Auditorio • Mantenimiento Aire Acondicionado 60.000 BTU Bar Tomo OPERARIO CONSTRUCCION 02 (DOS) OPERARIOS • Retiro Escombros demoliciones preparación placa cuarto Frio prefabricado • Avance Trabajos Mantenimientos Estado Mayor Estuco y pintura SOPORTE EJECUCIÓN 22 JUNIO 2026 – 02 OPERARIO CONSTRUCCION	 RL CONTRATISTA	
	     		
	SOPORTE EJECUCIÓN 22 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN		
	    		
	 SUPERVISOR FAC	 RL CONTRATISTA	

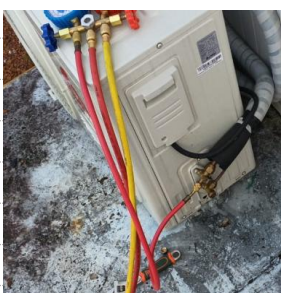


ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
23 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU GYM • Mantenimiento Blowers Casino Suboficiales • Mantenimiento 02 Aire Acondicionado 60.000 BTU Casino suboficiales • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Casino suboficiales OPERARIO CONSTRUCCION 02 (DOS) OPERARIOS • Mantenimiento Monumento Banderas Estuco y pintura • Avance Trabajos de Mantenimiento Estado Mayor Estuco y pintura SOPORTE EJECUCIÓN 23 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 23 JUNIO 2026 – 02 OPERARIO CONSTRUCCION 
24 JUNIO 2026	 SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU almacén Bodega pinturas • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU almacén Bodega Llantas • Mantenimiento 02 Aire Acondicionado 60.000 BTU Hangar ALMIS • Mantenimiento Aire Acondicionado 18.000 BTU Casita del Agua

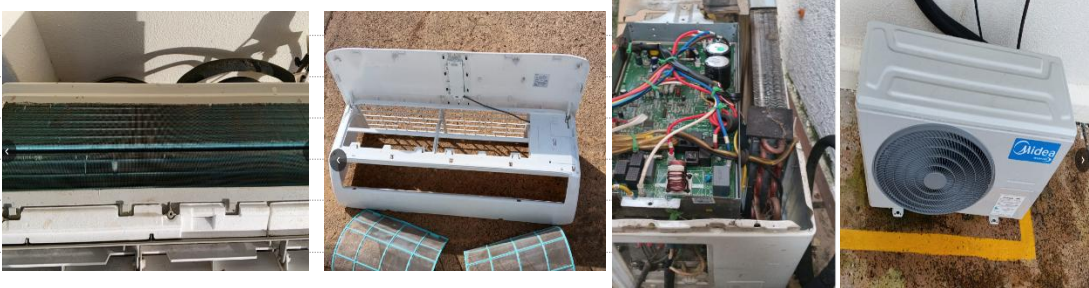



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	OPERARIO CONSTRUCCION 02 (DOS) OPERARIOS • Avance Trabajos de Mantenimiento Estado Mayor Estuco y pintura SOPORTE EJECUCIÓN 24 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 23 JUNIO 2026 – 02 OPERARIO CONSTRUCCION   SUPERVISOR FACRL CONTRATISTA 25 JUNIO 2026 ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 6 HAB 11 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU Admin Rancho Tropa • Mantenimiento y reparación Aire Acondicionado 24.000 BTU Aula Radar SOPORTE EJECUCIÓN 25 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN 





ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO CONSTRUCCIÓN 02 (DOS) OPERARIOS • Avance Trabajos de Mantenimiento Estado Mayor Resane de columnas Posteriores y aplicación de INVERCRIL SOPORTE EJECUCIÓN 25 JUNIO 2026 – 02 OPERARIO CONSTRUCCION 
26 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento 05 Aires Acondicionado 18.000 BTU RADAR • Mantenimiento Aire Acondicionado 24.000 BTU RADAR OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Avance trabajos Estado Mayor Estuco y pintura OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Alistamiento Material para Fundir placa cuarto Frio prefabricado • Apoyo Fundida Placa cuarto Frio SOPORTE EJECUCIÓN 26 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 26 JUNIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION   SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
	EJECUCIÓN 26 JUNIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION
	
27 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO CONSTRUCCION 02 OP (ANOTACIÓN) • Recoger Sobrantes de la fundida de la placa  OPERARIO REFRIGERACIÓN (ANOTACIÓN) Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención Anexo técnico deben hacerlo 02 horas no obstante, personal compenso Este Tiempo en la semana para no laborar el día en mención  SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA
28 JUNIO 2026	ANOTACIÓN Día no Laboral – (domingo)  SUPERVISOR FAC RL CONTRATISTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	054-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA	NOTAS, CROQUIS Y FOTOS
29 JUNIO 2026	ANOTACIÓN Día no Laboral – (Lunes Festivo)  SUPERVISOR FAC  RL CONTRATISTA
30 JUNIO 2026	ASIGNACION TRABAJOS DEL DIA: OPERARIO REFRIGERACIÓN • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 1 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 3 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 7 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 8 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 4 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 6 • Mantenimiento Aire Acondicionado 12.000 BTU BK 2 HAB 12 OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Iniciar con Todos los Resortes de pintura en el Estado Mayor OPERARIO CONSTRUCCION 01 OP • Iniciar Trabajos en fachada Casino Principal- Raspado de la fachada SOPORTE EJECUCIÓN 30 JUNIO 2026 – OP REFRIGERACIÓN  SOPORTE EJECUCIÓN 30 JUNIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION 



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:

054-00-B-COFAC-BACOF-2026

FECHA

NOTAS, CROQUIS Y FOTOS

SOPORTE EJECUCIÓN 30 JUNIO 2026 – 01 OPERARIO CONSTRUCCION



Neuqui Due
SUPERVISOR FAC

Vanesa Cuesta R.
RL CONTRATISTA



Revisado
