


CONOSRCIO URUMITA II REPROGRANACION DE OBRA FECHA DE TERMINACION 30 DE OCTUBRE DE 2026

EDT	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin													2025												2026	
						abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.			
1	1	CONTRATO DE OBRA URUMITA	589 días	mar 30/04/24	vie 31/07/26 1																										
2	1.1	ACTA DE INICIO	0 días	mar 30/04/24	mar 30/04/24																										
3	1.2	DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PLANTA Y TANQUE	5 días	mar 30/04/24	lun 6/05/24 19:00																										
4	1.3	DISEÑOS LINEA ADUCCION DESARENADOR PLANTA	210 días	mar 30/04/24	lun 17/02/25 19:00																										
5	1.4	DISEÑOS REDES DE DISTRIBUCION	370 días	mar 30/04/24	lun 29/09/25 19:00																										
6	1.5	SUSPENSION DE CONTRATO	45 días	lun 12/08/24 9:00	vie 11/10/24 19:00																										
7	1.6	OTRO SI ADICION DE RECURSOS No. 1	36 días	lun 5/01/26 9:00	lun 23/02/26 19:00																										
8	1.7	OTRO SI ADICION DE RECURSOS No. 2	0 días	lun 18/05/26 19:00	lun 18/05/26 19:00																										
9	1.8	ACTIVIDADES PRELIMINARES	415 días	mar 30/04/24	lun 1/12/25 19:00																										
10	1.8.1	Licencias y Permisos	415 días	mar 30/04/24	lun 1/12/25 19:00																										
22	1.9	CAPTACION	319 días	mar 18/02/25	vie 8/05/26 19:00																										
39	1.1 0	ADUCCION BOCATOMA - DESARENADOR	54 días	mar 24/02/26	vie 8/05/26 19:00																										
49	1.11	DESARENADOR	368 días	lun 16/12/24 9:00	mié 13/05/26 19:00																										
70	1.1 2	ADUCCION DESARENADOR - PTAP	367 días	mar 17/12/24	mié 13/05/26																										
106	1.13	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	425 días	lun 16/12/24 9:00	vie 31/07/26 19:00																										
134	1.14	PLANTA DE TRATAMIENTO	470 días	lun 14/10/24 9:00	vie 31/07/26 19:00																										
135	1.14.	Localización y Replanteo	21 días	lun 14/10/24 9:00	lun 11/11/24 19:00																										
136	1.1 4.2	Implementación PMT y/o Señalización Obra	21 días	mar 12/11/24	mar 10/12/24																										
137	1.14.	Aprovechamiento Forestal	21 días	mié 11/12/24 9:00	mié 8/01/25 19:00																										
138	1.14.	Cámara de Contacto de Cloro	211 días	jue 9/01/25 9:00	jue 30/10/25 19:00																										
139	1.1 4.4.	Excavaciones y Demoliciones	120 días	jue 9/01/25 9:00	mié 25/06/25 19:00																										
140	1.1 4.4.	Disposición de Material Sobrante	120 días	jue 9/01/25 9:00	mié 25/06/25 19:00																										
141	1.14.	Concretos de Limpieza	14 días	jue 26/06/25 9:00	mar 15/07/25 19:00																										
142	1.14.	Aceros de Refuerzo	45 días	mié 16/07/25 9:00	mar 16/09/25 19:00																										
143	1.14.	Pasamuros	14 días	mié 16/07/25 9:00	lun 4/08/25 19:00																										
144	1.14.	Concretos	77 días	mié 16/07/25 9:00	jue 30/10/25 19:00																										
145	1.1 4.5	Manejo de Lodos y Lecho de Secado	135 días	jue 28/08/25 9:00	mié 4/03/26 19:00																										
146	1.14.	Homogenizador	135 días	jue 28/08/25 9:00	mié 4/03/26 19:00																										
153	1.14.	Intercenexiones	54 días	mar 19/05/26	vie 31/07/26 19:00																										
154	1.1 4.6.	Suministro de Tuberías y Accesorios	30 días	mar 19/05/26	lun 29/06/26 19:00																										

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	[	Fecha límite		Progreso manual	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin	]	Tareas críticas			
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica			
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			

CONOSRCIO URUMITA II
REPROGRAMACION DE OBRA FECHA DE TERMINACION 30 DE OCTUBRE DE 2026

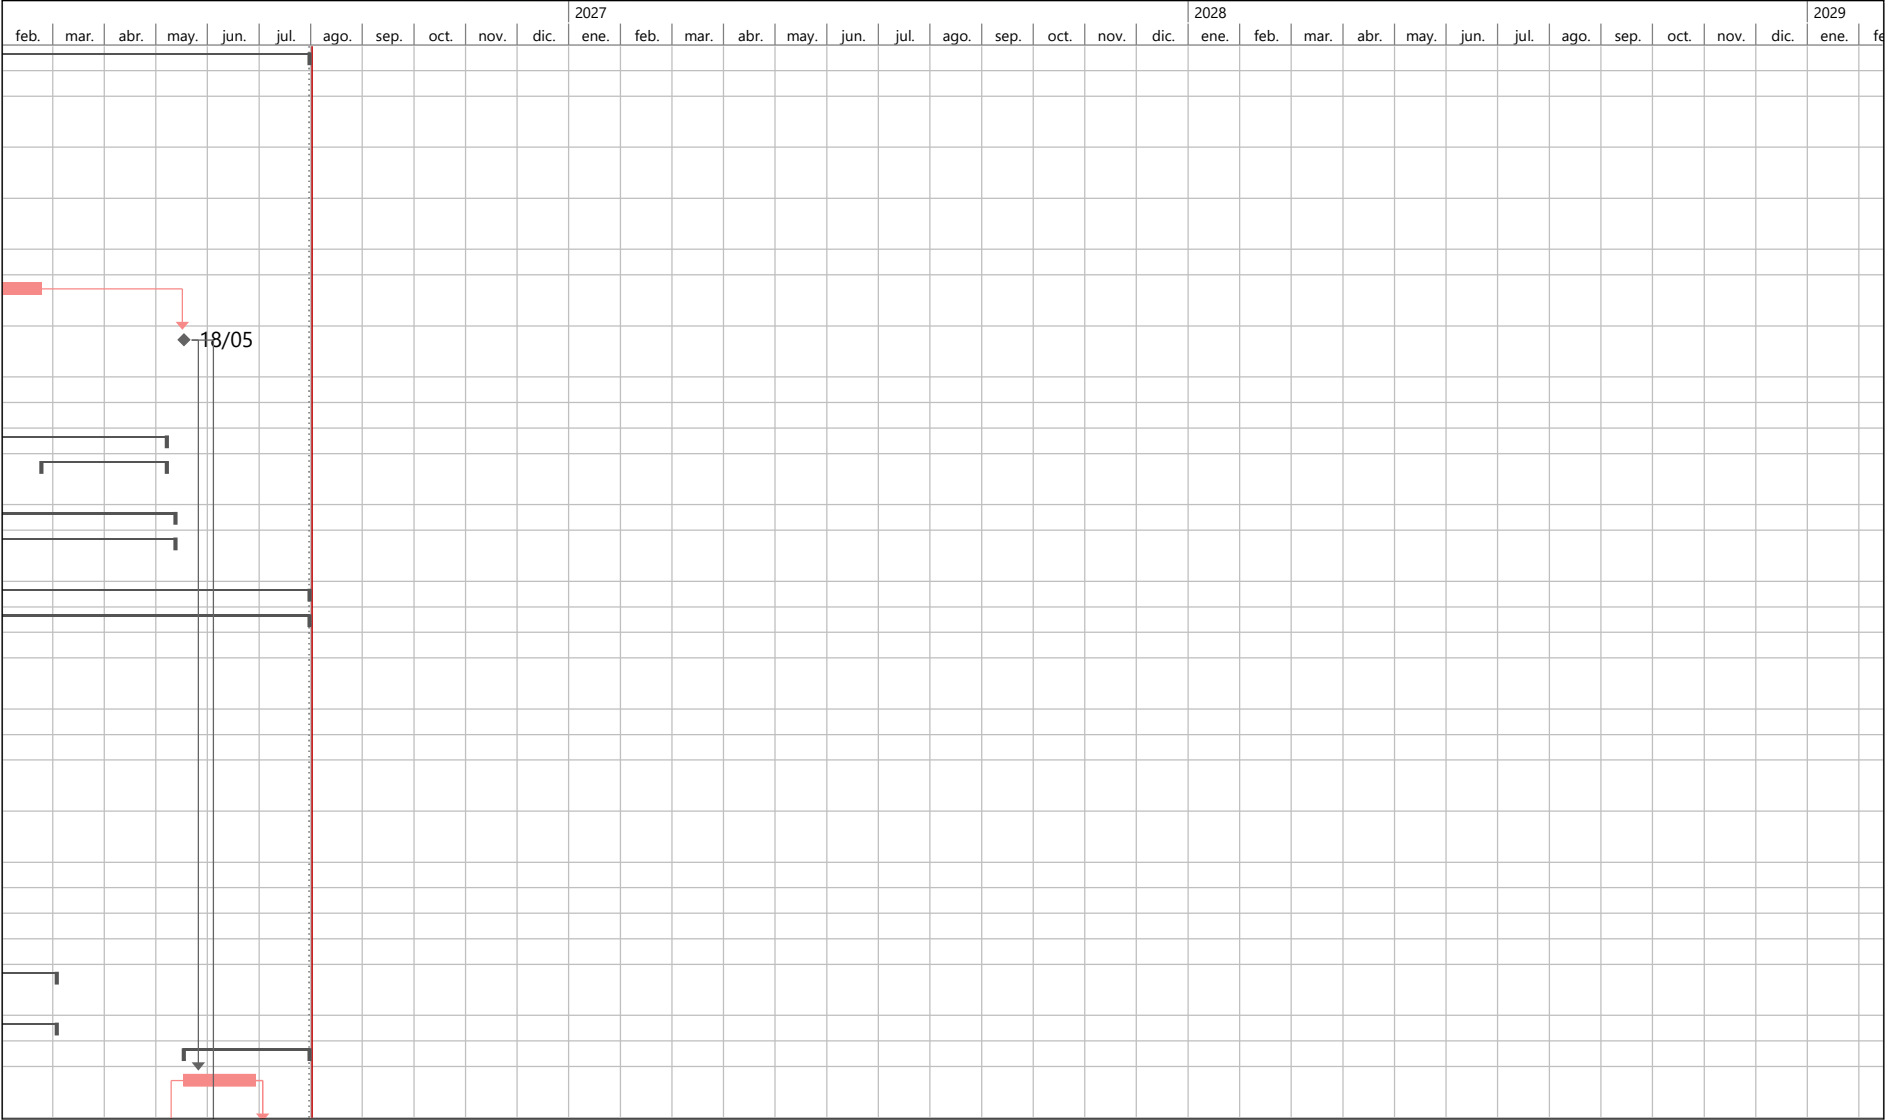

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas			
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica			
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			

CONOSRCIO URUMITA II
REPROGRANACION DE OBRA FECHA DE TERMINACION 30 DE OCTUBRE DE 2026

	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin													2025												2026	
						abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.			
155	1.1 4.6.	Interconexión Filtros - Contacto de Cloro	24 días	mar 30/06/26	vie 31/07/26 19:00																										
156	1.1 4.6.	Interconexión Contacto de Cloro - Tanque	24 días	mar 30/06/26	vie 31/07/26 19:00																										
157	1.1 4.6.	Interconexión Tanque - Conducción	40 días	lun 8/06/26 9:00	vie 31/07/26 19:00																										
158	1.1 4.6.	Red de Desague Lavado Tanque Almacenamiento	45 días	lun 1/06/26 9:00	vie 31/07/26 19:00																										
159	1.15	PLANES DE GESTION	588 días	mar 30/04/24	jue 30/07/26 1																										



Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas			
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica			
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			

CONOSRCIO URUMITA II
REPROGRANACION DE OBRA FECHA DE TERMINACION 30 DE OCTUBRE DE 2026

