



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S

Informe Final De Obra

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN

PERIODO DEL INFORME

24/04/2026 – 16/05/2026

CONTRATO DE OBRA

Nº. 320.11.027.2026

OBJETO:

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

CONTRATISTA

CEIBA M&F S.A.S

SUPERVISOR

OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA
GERENCIA

VILLANUEVA, CASANARE

03 DE JUNIO DE 2026

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

1. INTRODUCCION

La ESPAVI S.A E.S.P contrato con CEIBA M&F S.A.S las labores asociadas con las adecuaciones locativas de la sede administrativa de ESPAVI S.A E.S.P para desarrollar las actividades enmarcadas dentro del contrato No. 320.11.027-2026 que tiene como objeto "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P" con Acta de inicio firmado a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2026.

El presente corresponde al informe de liquidación, en donde se relacionan todas las actividades realizadas en el periodo de tiempo comprendido del 24 de abril de 2026 al 16 de mayo de 2026 por parte del contratista en cumplimiento del alcance contractual del contrato del Contrato No. 320.11.027-2026.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Presentar el informe de pago final de obra del contrato de No. 320.11.027-2026, que tiene como objeto "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P."

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

1. INFORMACION GENERAL

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	320.11.027-2026
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P
CONTRATISTA	CEIBA M&F S.A.S
NIT.	901497596-9
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
FECHA DE INICIO	17-03-2026
ADICIONAL	15-04-2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16-04-2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL 1	16-05-2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
PLAZO DE EJECIÓN FINAL	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL	\$ 73.192.947,00
VALOR ADICIONAL	\$ 16.145.998,00
VALOR FINAL	\$ 89.338.945,00
FORMA DE PAGO	La Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A. E.S.P., cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos parciales de acuerdo al avance de la obra: se efectuara tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra a la fecha



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S

a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la factura o cuenta de cobro, debidamente aprobada por la supervisión y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al cumplimiento de un 30% de avance de ejecución de obra, previa presentación del informe parcial en medio físico y magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos por ESPAVI para presentación de informes de obra y anexando soportes de pago de aportes a seguridad social y para fiscales, así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en el periodo a reportar y demás soportes que se consideren relevantes. La suma total de los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato.

b) Pago final a la liquidación del contrato: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la supervisión de obra, para lo cual se requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final en medio físico y magnéticos con los soportes de pago, pago de aportes a seguridad social y para fiscales así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en durante la ejecución del contrato, actualización de la garantía única, entrega de memorias de cantidades, planos, manual de operaciones, fichas técnicas de equipos, garantías de equipos, paz y salvo de proveedores, informe de imprevistos, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas y demás soportes que se consideren relevantes. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario.

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado el cual será contratado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

3. INFORME ADMINISTRATIVO

3.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan las pólizas expedidas para la ejecución del contrato de Obra No. 320.11.027-2026, la empresa CEIBA M&F S.A.S cuenta con todas las pólizas vigentes expedidas por SEGUROS DEL ESTADO SA, descritas a continuación. Póliza responsabilidad civil contractual **57-54-101001832** desde el 06 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026,

Póliza de Seguro de Cumplimiento Servicios Públicos 57-47-101002988

57-47-101002988								
Ítem	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
			D	M	A	D	M	A
1	Cumplimiento	\$ 7.319.294,70	06	03	2026	10	10	2026
2	Calidad de los elementos	\$ 10.978.942,05	06	03	2026	10	04	2027
3	Calidad del servicio	\$ 10.978.942,05	06	03	2026	10	04	2027
4	Salarios y prestaciones sociales	\$ 7.319.294,70	06	03	2026	10	04	2029

Ítem	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
			D	M	A	D	M	A
1	Cumplimiento	\$ 8.933.894,50	17	03	2026	21	10	2026
2	Calidad de los elementos	\$ 13.400.841,75	Si ampara 1 año, 1 mes y 5 días					
3	Calidad del servicio	\$ 13.400.841,75	17	03	2026	21	04	2027

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

4	Salarios y prestaciones sociales	\$ 8.933.894,50	17	03	2026	21	04	2029
---	----------------------------------	-----------------	----	----	------	----	----	------

3.2 SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

La empresa CEIBA M&F S.A.S identificada con Nit.: 901497596-9 reporta los Pagos al sistema integral de seguridad social y al sistema general de riesgos laborales, del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios y/o vinculados con la empresa, con los siguientes números de planilla

MES MARZO

Nombre	No. Cedula	Cargo	Planilla
Daniel Eduardo mora	1030644528	RL	9502136280
Laura Bejarano Martínez	1118203630	Residente	9502160534
Lizeth Fernanda robo acuña	1118196103	Técnico en seguridad y salud	6013111065
Jolman Stiven Hernandez	1006533514	Ayudante de obra	9502143338
Kevin Reyes Castro	1006823586	Ayudante de obra	9502143243
Jose Orlando Soler	74334104	Ayudante de obra	9502143569
Diego Fernando Mora	1006533761	Ayudante de obra	9502143777
Ortiz Luis	1095913224	Tec Aires	9502081059

MES ABRIL

Nombre	No. Cedula	Cargo	Planilla
Daniel Eduardo mora	1030644528	RL	9503401537
Laura Bejarano Martínez	1118203630	Residente	9503401466
Lizeth Fernanda robo acuña	1118196103	Técnico en seguridad y salud	6017001851

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Diego Fernando Mora	1006533761	Ayudante de obra	9503562239
Harrison Zúñiga Montenegro	1124191834	Ayudante de obra	9503562239

MES MAYO

Nombre	No. Cedula	Cargo	Planilla
Daniel Eduardo mora	1030644528	RL	9506008924
Laura Bejarano Martinez	1118203630	Residente	9505558888
Lizeth Fernanda riobo acuña	1118196103	Técnico en seguridad y salud	9506354094
Diego Fernando Mora	1006533761	Ayudante de obra	9506354094

3.3 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa CEIBA M&F ejecuto las actividades verificando que se cumpliera con las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, garantizando así, la seguridad de los trabajadores, peatones y vehículos. Para dar cumplimiento a lo anterior se verifico que el personal estuviera dotado con el adecuado equipo de protección personal, el cual se menciona a continuación.

- ✓ Casco de seguridad
- ✓ Gafas de protección ocular
- ✓ Guantes de seguridad
- ✓ Zapatos o botas de protección para obra civil
- ✓ Ropa de trabajo (camisa manga larga y pantalón de jean)

De igual manera se implementó el plan de manejo de tránsito y durante la ejecución de las actividades no se presentaron inconvenientes.

4. CORRESPONDENCIA (ENVIADA Y RECIBIDA)

Durante la ejecución de la obra no se remitió ni se recibió correspondencia entre el contratista y la supervisión.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	ENTIDAD Y/O PERSONA QUE RADICA EL OFICIO Y/O SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO (Correo Electrónico o medio físico)	DESCRIPCIÓN	No. DE OFICIO DE ENVIO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD Y/ PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDO EL OFICIO	SOLICITUD	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	SUGERENCIAS	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENVIO (Correo Electrónico o medio físico)

DESARROLLO DEL INFORME DE ACTIVIDADES

4.1 INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el desarrollo de actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de obra 320.11.027-2026, a la fecha se ejecutó la totalidad de las actividades las cuales fueron acompañadas de manera constante por parte de la supervisión de ESPAVI S.A E.S.P

ITEM	02.01
ACTIVIDAD	Desmonte e instalación de muros en lamina PVC
DESCRIPCION	Se realizó el desmonte controlado de los muros existentes en lámina PVC que presentaban deterioro y/o requerían reubicación, efectuando retiro de piezas, perfilería y accesorios asociados, con disposición del material resultante según condiciones de obra. Posteriormente, se ejecutó la instalación de nuevos muros en lámina PVC, incluyendo estructura de soporte, nivelación, fijación y acabados necesarios, garantizando estabilidad, alineación y adecuada presentación final, debido a la condiciones del material existente no fue posible restaurar la totalidad, y los

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

	tramos rescatados en algunas ocasiones por las dimensiones de nuevos muros no pudieron utilizarse, por lo que se utilizo en algunos tramos material existente y en otros material nuevo para dar cumplimiento.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	48.06
CANTIDAD EJECUTADA	48.06
% AVANCE	100%

ITEM	02.03
ACTIVIDAD	Instalación de módulos metálicos del archivo
DESCRIPCION	Se realizo la instalación de los módulos metálicos del archivo, se nivelo la placa y se instalo la totalidad del sistema, se hicieron pruebas y se entrega funcionando el modulo metálico del archivo funcionando.
UNIDAD	m2
CANTIDAD CONTRATADA	10.98
CANTIDAD EJECUTADA	10.98
% AVANCE	100%

ITEM	08.01
ACTIVIDAD	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos
DESCRIPCION	Se realizó el suministro y aplicación de pintura tipo vinilo para interiores sobre superficies pañetadas, aplicando tres (3) manos de pintura, previa preparación y limpieza de la superficie, garantizando uniformidad en el acabado, cubrimiento adecuado y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	303.14

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

CANTIDAD EJECUTADA	303.14
% AVANCE	100%

ITEM	08.02
ACTIVIDAD	Cerradura tipo manija cilíndrica reversible - entradas. Suministro e Instal.
DESCRIPCION	Se suministraron e instalaron cerraduras tipo manija cilíndrica reversible para puertas de entrada, ejecutando las actividades de adecuación, fijación, ajuste y calibración necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y operación, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.
UNIDAD	und
CANTIDAD CONTRATADA	3,00
CANTIDAD EJECUTADA	3,00
% AVANCE	100%

ITEM	08.03
ACTIVIDAD	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal
DESCRIPCION	Se suministró e instaló cerradura de sobreponer de triple seguridad para la puerta de entrada principal, realizando las actividades de ubicación, fijación, ajuste y puesta en funcionamiento del mecanismo, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
UNIDAD	und
CANTIDAD CONTRATADA	3,00
CANTIDAD EJECUTADA	3,00
% AVANCE	100%

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

ITEM	08.04
ACTIVIDAD	Construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandas de protección Incluye: replanteo, adecuación de superficie, construcción de rampa , instalación de barandas metálicas.
DESCRIPCION	Se ejecutó la construcción de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, incluyendo las actividades de replanteo, adecuación de la superficie, conformación y construcción de la rampa, así como el suministro e instalación de barandas metálicas de protección. Los trabajos se desarrollaron garantizando condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y normatividad aplicable al proyecto.
UNIDAD	und
CANTIDAD CONTRATADA	1,00
CANTIDAD EJECUTADA	1,00
% AVANCE	100%
ITEM	08.05
ACTIVIDAD	Instalación de rejas metálicas con material reutilizado (mano de obra) Incluye: adecuación, corte, ajuste, ensamble e instalación de rejas metálicas utilizando material suministrado por la entidad (reutilizado), anclajes y fijaciones necesarias.
DESCRIPCION	Se ejecutó la instalación de rejas metálicas utilizando material reutilizado suministrado por la entidad, realizando las actividades de adecuación, corte, ajuste, ensamble y montaje de los elementos metálicos, así como la instalación de los anclajes y fijaciones requeridas para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento. Los trabajos se desarrollaron conforme a las condiciones técnicas del proyecto y a los requerimientos de seguridad establecidos.
UNIDAD	M2
CANTIDAD CONTRATADA	16,00
CANTIDAD EJECUTADA	16,00

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

% AVANCE	100%
ITEM	08.06
ACTIVIDAD	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo tablero de distribución: comprende la ejecución de cinco (5) salidas en 220 V con conductor calibre No. 10, una (1) salida adicional en conductor No. 12, suministro e instalación de tablero de sobreponer de seis (6) circuitos con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A, instalación de tomacorrientes, incluyendo conexiones, canalizaciones y pruebas de funcionamiento.
DESCRIPCION	Se ejecutó el suministro e instalación del sistema eléctrico para la alimentación de aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo la construcción de cinco (5) salidas eléctricas en 220 V con conductor calibre No. 10 y una (1) salida adicional con conductor calibre No. 12. Así mismo, se suministró e instaló un tablero de distribución de sobreponer para seis (6) circuitos, equipado con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A. La actividad incluyó el suministro e instalación de tomacorrientes, canalizaciones, cableado, conexiones eléctricas, fijaciones, pruebas de funcionamiento y demás labores necesarias para garantizar la correcta operación y seguridad del sistema
UNIDAD	Und
CANTIDAD CONTRATADA	1,00
CANTIDAD EJECUTADA	1,00
% AVANCE	100%

La cantidad ejecutada y las áreas en donde se realizaron las respectivas actividades se presentan en el anexo memorias de cantidades, en donde se brinda el detalle de la información anteriormente presentada.

Para la ejecución de todas las actividades se verificaron las cantidades contractuales en las memorias de cantidades y se realizaron los procesos constructivos conforme las especificaciones técnicas del proyecto.

Para todas las actividades se contó con herramienta idónea y personal capacitado.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596- 9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	---

4.2 CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y OTRAS

Se adjunta certificados de calidad de los materiales utilizados para la ejecución del contrato.

4.3 CLIMA Y SITUACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

Durante la ejecución del contrato de obra se presentaron fuertes lluvias, las cuales ocasionaron que algunas actividades se realizaran de manera imprevista, soportadas en el informe de imprevistos, el cual se presenta al momento de la liquidación del contrato.

4.4 INCONVENIENES PRESENTADOS

Durante la ejecución de los trabajos no se han presentado inconvenientes que comprometieran la integridad de los trabajadores o de las actividades proyectadas.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
--	---	------------------------------------

5. INFORME DE ACTIVIDADES

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	PAGO LIQUIDACIÓN		
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO				
1,1	Desmonte de aires acondicionado. Incluye accesorios	Und			
1,2	Instalación de aire acondicionado de 12000/18000 BTU, 220V	Und			
1,3	Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 12.000/18.000 BTU a 220 V. Incluye recarga de refrigerante y juego de tuberías	Und			
2	DESMONTE Y MANTENIMIENTO GENERAL				
2,1	Desmonte e instalación de muros en lamina PVC	m2	13,00	\$ 38.455,00	\$ 499.915,00
2,2	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	m2			
2,3	Instalación de módulos metálicos del archivo	m2	10,98	\$ 164.500,00	\$ 1.806.210,00
3	CAMARAS DE VIDEO				
3,1	Cable UTP CAT6 100% cobre para exterior	m			
3,2	Cable Neopren 100% cobre	m			

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.		NIT 901497596-9
			CEIBA M&F S.A.S.

3,3	Desmante técnico, traslado, adecuación e instalación del sistema de videovigilancia y red asociada, incluyendo cámaras de video, DVR, gabinete de seguridad 35x35 cm, UPS 1000VA (R-UPR1008), fuentes de poder 12V-1A, video balun 5MP, extensores HDMI y USB, cajas de paso, cajas MT, tubería EMT (1" y 1½"), curvas, uniones, clavijas eléctricas (macho y hembra), anclajes, accesorios eléctricos y de fijación. Incluye desmante de puntos de red de datos, retiro de canalizaciones existentes, suministro e instalación de elementos nuevos que se requieran por ajuste de trazado, adecuación eléctrica regulada y puesta en funcionamiento con pruebas operativas del sistema.	global			
4	ALARMA DE SEGURIDAD				
4,1	Desmante técnico de central de alarma existente con discador, sensores de movimiento, cometa y accesorios asociados. Suministro e instalación de sistema de alarma inalámbrica GSM/WIFI, incluyendo central, sensores magnéticos para puertas/ventanas, sensores de movimiento, sirena/corneta, UPS 1000VA (R-UPR1008) para respaldo eléctrico, cableado y accesorios necesarios para su correcta operación. Incluye configuración, programación, sincronización de dispositivos, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio.	global			
5	RED DE DATOS				
5,1	Red de datos para instalar 25-35 puntos en las oficinas. Incluye (cable utp cat 5e interior 100% cobre, 21 m cable LAN, Conversor RJ 45 A Usb, rack metálico, tv box, switch linksys y mano de obra)	global			

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
--	---	---------------------------------------

6	BODEGA ARCHIVO			
6,1	Muro en ladrillo tolete común 0.06 m (6 x 24.5 x 12 pandereta)	m2		
6,2	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m2		
6,3	Malla electrosoldada Q-5 o M188	m2		
6,4	Excavación a mano en material común	m3		
6,5	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m		
6,6	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado	ml		
6,7	Cubierta arquitectónica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2		
6,8	muro teja arquitectónica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2		
6,9	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi	m3		
NP 6,10	Cubierta arquitectónica cal. 28 Pintada.	m2		

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.		NIT 901497596-9
			CEIBA M&F S.A.S

NP 6,11	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 0.80 m. Suministro e Instal.	m			
7	TRANSPORTE				
7,1	Cargue, transporte y descargue de muebles de oficina, archivo, y equipos distancia máxima 1.5 Km	Viaje			
8	NO PREVISTOS				
8,1	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	m2	303,14	\$ 15.831,61	\$ 4.799.194,26
8,2	Cerradura tipo manija cilíndrica reversible - entradas. Suministro e Instal.	und	3,00	\$ 125.901,04	\$ 377.703,12
8,3	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	und	3,00	\$ 176.333,00	\$ 528.999,00
8,4	Construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandas de protección Incluye: replanteo, adecuación de superficie, construcción de rampa , instalación de barandas metálicas.	und	1,00	\$ 800.889,64	\$ 800.889,64
8,5	Instalación de rejas metálicas con material reutilizado (mano de obra) Incluye: adecuación, corte, ajuste, ensamble e instalación de rejas metálicas utilizando material suministrado por la entidad (reutilizado), anclajes y fijaciones necesarias.	m2	16,00	\$ 144.760,00	\$ 2.316.160,00

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

8.6	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo tablero de distribución: comprende la ejecución de cinco (5) salidas en 220 V con conductor calibre No. 10, una (1) salida adicional en conductor No. 12, suministro e instalación de tablero de sobreponer de seis (6) circuitos con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A, instalación de tomacorrientes, incluyendo conexiones, canalizaciones y pruebas de funcionamiento.	und	1,00 \$ 2.468.079,76 \$ 2.468.079,76
VALOR TOTAL			\$13.597.150,77
ADMINISTRACIÓN 25.5%			\$3.467.273,45
IMPREVISTOS 2%			\$271.943,02
UTILIDAD 5%			\$679.857,54
COSTOS INDIRECTOS			\$4.419.074,00
COSTOS DIRECTOS			\$13.597.150,77
VALOR TOTAL			\$18.016.224,78


- Se ajusta 12 décimas, para la generación de la factura quedando el valor Total \$ 18.016.224,90

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

1. SUMAS IGUALES

Valor del contrato	\$ 73.192.947,00	
Valor adicional No. 1	\$ 16.145.998,00	
Valor pago parcial 1		\$ 34.362.225,38
Valor pago parcial 2		\$ 36.960.494,72
Valor pago liquidación		\$ 18.016.224,90
Total	\$ 89.338.945,00	\$ 89.338.945,00

PORCENTAJE DE AVANCE

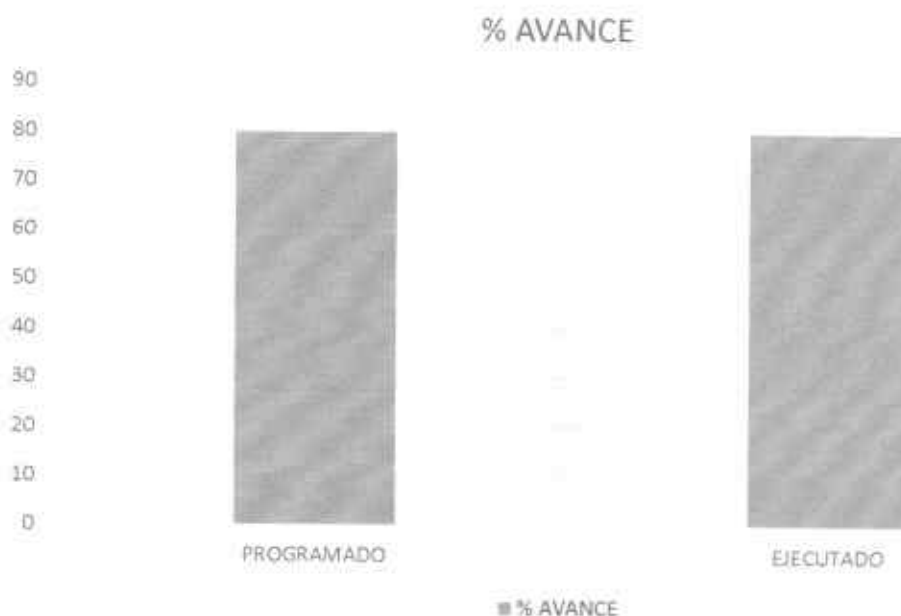


El avance de obra es del 100%, correspondiente a Ochenta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos (\$ 89.338.945,00) cumpliendo con el avance programado de las actividades enmarcadas dentro del contrato 320.11.027-2026 con objeto OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

INFORME AMBIENTAL

En atención a la política ambiental se recogieron los desechos generados durante la ejecución de los trabajos y se clasificaron en la fuente y se realizó disposición final de acuerdo con su clasificación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

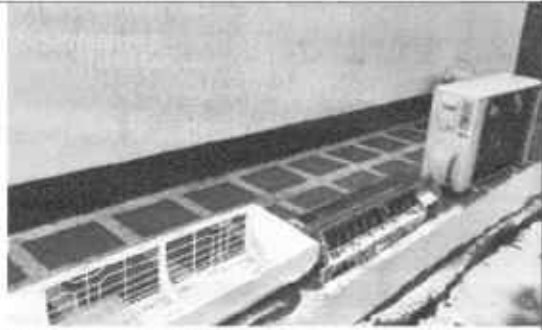CAPITULO 1 - DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO	
	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-9

CEIBA M&F
S.A.S

FOTOGRAFÍA 5



FOTOGRAFÍA 6



FOTOGRAFÍA 7



FOTOGRAFÍA 8





**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 9



FOTOGRAFÍA 10



FOTOGRAFÍA 11



FOTOGRAFÍA 12

CAPITULO 2 DESMONTE Y MANTENIMIENTO GENERAL



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 13



FOTOGRAFÍA 14



FOTOGRAFÍA 15



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 16



FOTOGRAFÍA 17



FOTOGRAFÍA 18



FOTOGRAFÍA 19

CAPITULO 3 CAMARAS DE VIDEO



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 20




FOTOGRAFÍA 21



FOTOGRAFÍA 22



FOTOGRAFÍA 23

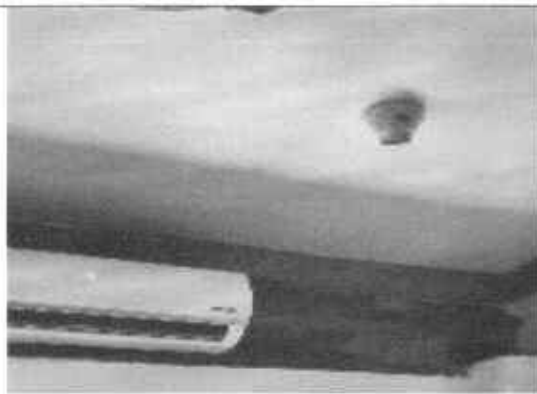

FOTOGRAFÍA 24




FOTOGRAFÍA 25



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**


**NIT 901497596-
9**

**CEIBA M&F
S.A.S**

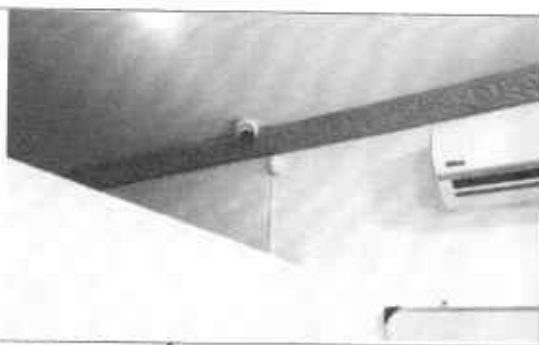


FOTOGRAFÍA 26


CAPITULO 4 ALARMA DE SEGURIDAD

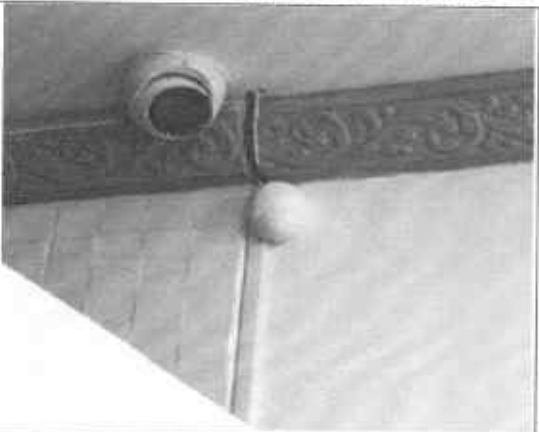


FOTOGRAFÍA 27

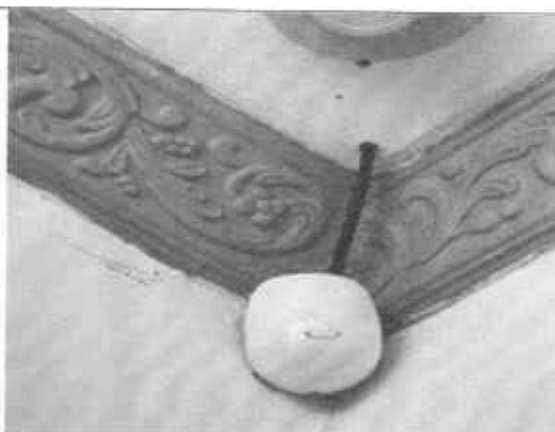

FOTOGRAFÍA 28

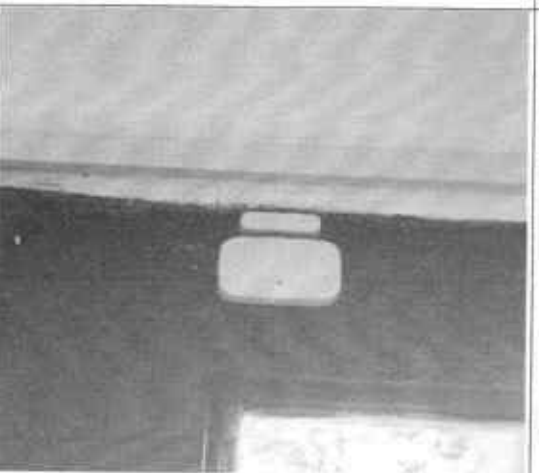

FOTOGRAFÍA 29

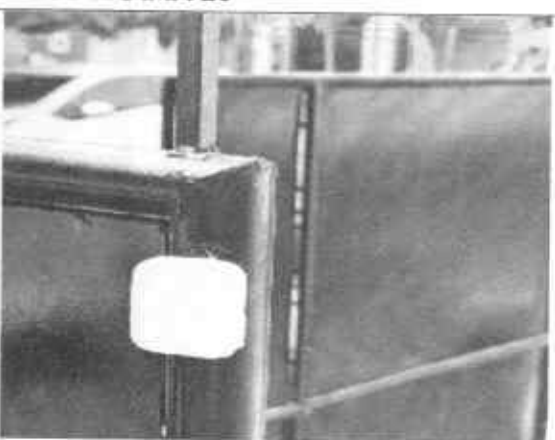

FOTOGRAFÍA 30



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S




FOTOGRAFÍA 31




FOTOGRAFÍA 32

CAPITULO 5 RED DE DATOS

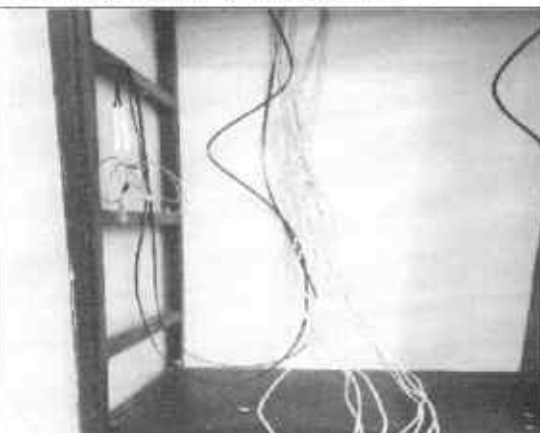

FOTOGRAFÍA 33

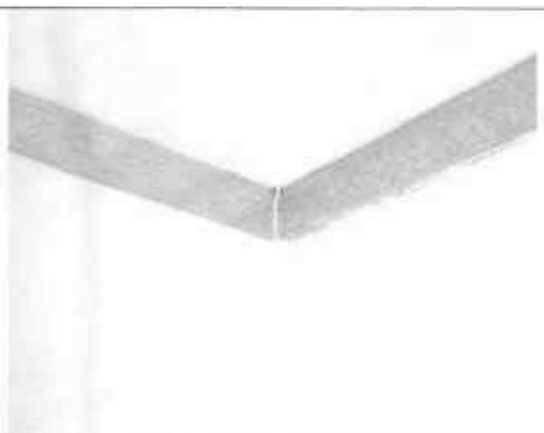


FOTOGRAFÍA 34




**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S

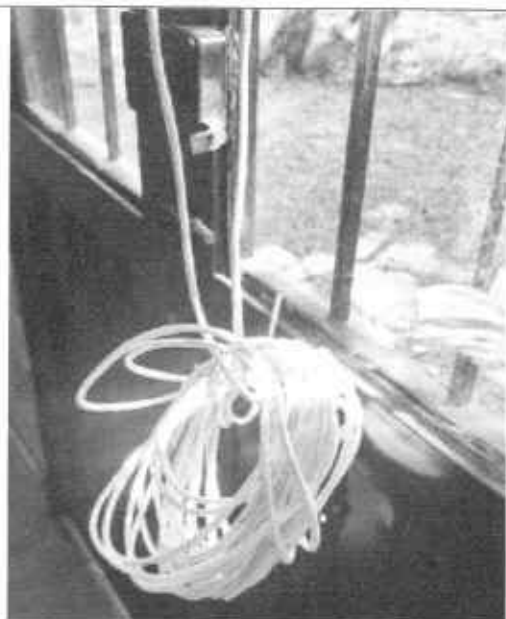

FOTOGRAFÍA 35

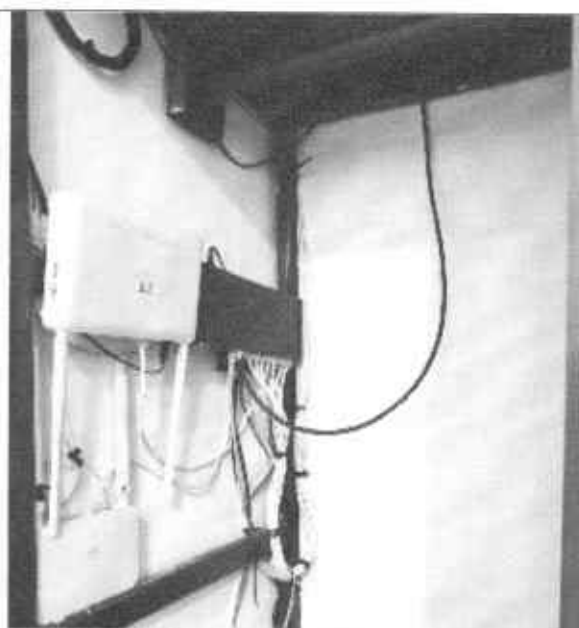

FOTOGRAFÍA 36



FOTOGRAFÍA 37

CAPÍTULO 6 RED DE DATOS



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 38



FOTOGRAFÍA 39



FOTOGRAFÍA 40



FOTOGRAFÍA 41



FOTOGRAFÍA 42



FOTOGRAFÍA 43



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 44



FOTOGRAFÍA 45



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 46



FOTOGRAFÍA 47



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A, E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 48



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 49



FOTOGRAFÍA 50



FOTOGRAFÍA 51



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 52



FOTOGRAFÍA 53



FOTOGRAFÍA 54



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S.



FOTOGRAFÍA 55



FOTOGRAFÍA 56



FOTOGRAFÍA 57



FOTOGRAFÍA 58



FOTOGRAFÍA 59



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S



FOTOGRAFÍA 60



FOTOGRAFÍA 61



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT 901497596-
9

CEIBA M&F
S.A.S.



FOTOGRAFÍA 62



FOTOGRAFÍA 63

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	------------------------------------

CONCLUSION

Se presenta el informe de pago de liquidación por un total de DIECIOCHO MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$18.016.224,78) acumulando a la fecha una ejecución del 100% del contrato de obra No. 320.11.27-2026 cuyo objeto enunciaba "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.."

En la factura se ajustan 12 pesos como ajuste para cerrar con el valor del contrato.

todas las actividades se realizaron cumpliendo los protocolos de seguridad y de bioseguridad, con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores.

Se emplearon materiales que cumplieran con los estándares de calidad que exige el contrato y los procesos se han realizado en acompañamiento con la supervisión garantizando que se ejecuten las actividades de la mejor manera.



R/L DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
CEIBA M&F S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Informe SST

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO DEL INFORME

17/03/2026 – 16/05/2026

CONTRATO DE OBRA

Nº. 320.11.027.2026

OBJETO:

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

CONTRATISTA

CEIBA M&F S.A.S

SUPERVISOR

OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA
GERENCIA

VILLANUEVA, CASANARE

03 DE JUNIO DE 2026

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

1. INTRODUCCIÓN

La ESPAVI S.A. E.S.P. contrato con CEIBA M&F S.A.S las labores asociadas con las adecuaciones locativas de la sede administrativa de ESPAVI S.A. E.S.P. para desarrollar las actividades enmarcadas dentro del contrato No. 320.11.027-2026 que tiene como objeto "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P." con Acta de inicio firmado a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2026.

El presente corresponde al informe de SST, en donde se relacionan todas las actividades realizadas en el periodo de tiempo comprendido del 17 de marzo de 2026 al 16 de mayo de 2026 por parte del contratista en cumplimiento del alcance contractual del contrato del Contrato No. 320.11.027-2026.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

2. GENERALIDADES

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	320.11.027-2026
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P
CONTRATISTA	CEIBA M&F S.A.S
NIT.	901497596-9
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
FECHA DE INICIO	17-03-2026
ADICIONAL	15-04-2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16-04-2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL 1	16-05-2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL	\$ 73.192.947,00
VALOR ADICIONAL	\$ 16.145.998,00
VALOR FINAL	\$ 89.338.945,00
FORMA DE PAGO	La Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A. E.S.P., cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos parciales de acuerdo al avance de la obra: se efectuara tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la factura o cuenta de cobro, debidamente aprobada por la supervisión y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al cumplimiento de un 30% de avance de ejecución de obra, previa presentación del informe parcial en medio físico y magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos por ESPAVI para presentación de informes de obra y anexando soportes de pago de aportes a seguridad social y para fiscales, así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en el periodo a reportar y demás soportes que se consideren relevantes. La suma total de los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
--	---	--

	b) Pago final a la liquidación del contrato: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la supervisión de obra, para lo cual se requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final en medio físico y magnéticos con los soportes de pago, pago de aportes a seguridad social y para fiscales así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en durante la ejecución del contrato, actualización de la garantía única, entrega de memorias de cantidades, planos, manual de operaciones, fichas técnicas de equipos, garantías de equipos, paz y salvo de proveedores, informe de imprevistos, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas y demás soportes que se consideren relevantes. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado el cual será contratado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.
--	--

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO GENERAL

El presente informe tiene como objetivo documentar las medidas de seguridad y salud implementadas en el contrato de obra 320.11.027-2026 con objeto OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P. con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores involucrados.

DESARROLLO DE PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES QUE SON OBJETO DE CONTRATO QUE COMPONEN LA OBRA.

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD
1	DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO		
1,1	Desmonte de aires acondicionado. Incluye accesorios	Und	11,00
1,2	Instalacion de aire acondicionado de 12000/18000 BTU, 220V	Und	9,00
1,3	Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 12.000/18.000 BTU a 220 V. Incluye recarga de refrigerante y juego de tuberías	Und	11,00
2	DESMONTE Y MANTENIMIENTO GENERAL		
2,1	Desmonte e instalación de muros en lamina PVC	m2	48,06



INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

NIT
901497596-9
CEIBA M&F
S.A.S

2,2	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	9,78
2,3	Instalacion de modulos metalicos del archivo	m2	10,98
3	CAMARAS DE VIDEO		
3,1	Cable UTP CAT6 100% cobre para exterior	m	150,00
3,2	Cable Neopren 100% cobre	m	150,00
3,3	Desmonte técnico, traslado, adecuación e instalación del sistema de videovigilancia y red asociada, incluyendo cámaras de video, DVR, gabinete de seguridad 35x35 cm, UPS 1000VA (R-UPR1008), fuentes de poder 12V-1A, video balun 5MP, extensores HDMI y USB, cajas de paso, cajas MT, tubería EMT (1" y 1½"), curvas, uniones, clavijas eléctricas (macho y hembra), anclajes, accesorios eléctricos y de fijación. Incluye desmonte de puntos de red de datos, retiro de canalizaciones existentes, suministro e instalación de elementos nuevos que se requieran por ajuste de trazado, adecuación eléctrica regulada y puesta en funcionamiento con pruebas operativas del sistema.	global	1,00
4	ALARMA DE SEGURIDAD		
4,1	Desmonte técnico de central de alarma existente con discador, sensores de movimiento, corneta y accesorios asociados. Suministro e instalación de sistema de alarma inalámbrica GSM/WIFI, incluyendo central, sensores magnéticos para puertas/ventanas, sensores de movimiento, sirena/corneta, UPS 1000VA (R-UPR1008) para respaldo eléctrico, cableado y accesorios necesarios para su correcta operación. Incluye configuración, programación, sincronización de dispositivos, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio.	global	1,00
5	RED DE DATOS		



INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

NIT
901497596-9
CEIBA M&F
S.A.S

5,1	Red de datos para instalar 25-35 puntos en las oficinas. Incluye (cable utp cat 5e interior 100% cobre, 21 m cable LAN, Conversor Rj 45 A Usb, rack metálico, tv box, switch linksys y mano de obra)	global	1,00
6	BODEGA ARCHIVO		
6,1	Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24.5 x 12 pandereta)	m2	8,51
6,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	44,00
6,3	Malla electrosoldada Q-5 o M188	m2	46,20
6,4	Excavacion a mano en material comun	m3	4,62
6,5	Correa metalica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	61,46
6,6	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado	ml	20,79
6,7	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2	0,00
6,8	muro teja arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2	0,00
6,9	Placa o losa concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi	m3	4,84
NP 6,10	Cubierta arquitectonica cal. 28 Pintada.	m2	81,43
NP 6,11	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 0.80 m. Suministro e Instal.	m	9,00
7	TRANSPORTE		
7,1	Cargue, transporte y descargue de muebles de oficina, archivo, y equipos distancia maxima 1.5 Km	Viaje	15,00
8	NO PREVISTOS		
8,1	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	m2	303,14

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

8,2	Cerradura tipo manija cilindrica reversible - entradas. Suministro e Instal.	und	3,00
8,3	Cerradura de sobreponer triple seguridad para entrada principal. Suministro e Instal	und	3,00
8,4	Construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandas de protección Incluye: replanteo, adecuación de superficie, construcción de rampa , instalación de barandas metálicas.	und	1,00
8,5	Instalación de rejas metálicas con material reutilizado (mano de obra) Incluye: adecuación, corte, ajuste, ensamble e instalación de rejas metálicas utilizando material suministrado por la entidad (reutilizado), anclajes y fijaciones necesarias.	m2	16,00
8,6	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aires acondicionados y tomacorrientes, incluyendo tablero de distribución: comprende la ejecución de cinco (5) salidas en 220 V con conductor calibre No. 10, una (1) salida adicional en conductor No. 12, suministro e instalación de tablero de sobreponer de seis (6) circuitos con breaker principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A, instalación de tomacorrientes, incluyendo conexiones, canalizaciones y pruebas de funcionamiento.	und	1,00

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se ha realizado una evaluación de riesgos para identificar y abordar posibles peligros en la obra. Las medidas de control incluyen:

- ✓ Identificación de zonas de riesgo.
- ✓ Implementación de barreras de seguridad.
- ✓ Señalización clara de áreas peligrosas.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Todos los trabajadores han recibido capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que incluye:

- ✓ Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP).
- ✓ Procedimientos de emergencia.
- ✓ Normas de seguridad específicas para la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Se proporciona y exige el uso de EPP adecuado para cada tarea, incluyendo:

- ✓ Cascos de seguridad.
- ✓ Guantes.
- ✓ Calzado de seguridad.
- ✓ Protección visual y auditiva, según sea necesario.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. Las correcciones necesarias se implementarán de inmediato.

PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS MÉDICOS

Se ha establecido un plan de primeros auxilios que incluye la ubicación de kits de primeros auxilios y la capacitación del personal en su uso. Además, se cuenta con acceso a servicios médicos de emergencia.



**INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA
ESPAVI S.A. E.S.P.**

NIT
901497596-9
CEIBA M&F
S.A.S

3. CONTROL OPERACIONAL

Se ha establecido un mecanismo de control para las actividades que presenten una significancia y magnitud de riesgo categorizados en significativo en las operaciones incluidas dentro del Alcance del Sistema de Gestión, que permitan el cumplimiento con la Política, así como con los objetivos y metas establecidos.

Para cada actividad crítica se identifica uno o más parámetros de control que permitan controlar dicha actividad crítica desde el punto de vista de Seguridad y Salud ocupacional, también se registra la característica clave, los Puestos Claves relacionados a cada actividad crítica, se ha definido que a los responsables de ejecutar una actividad crítica, se les conoce como Puesto Clave ya que su participación es muy importante para asegurar que no se producirán riesgos en Seguridad y Salud ocupacional.

PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

La empresa, deberá hacer la identificación de situaciones potenciales de emergencia y la respuesta a estas situaciones, así como prevenir y mitigar las probables enfermedades y lesiones que pueden estar relacionados con estas, tener un Plan de Respuesta a Emergencias el cual está estructurado para responder al Nivel I de emergencia, para los Niveles de emergencia II y Nivel de emergencia III.

Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir durante el desarrollo de las obras. Implementar la organización y los procedimientos que permitan brindar una respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando los recursos internos del proyecto, así como coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran, del modo más eficiente.

• Cobertura

Este plan debe cubrir las emergencias con potencial de lesiones en las personas y daños en el medio ambiente o bienes que pudieran generarse en las operaciones, encuadrado en las exigencias legales del sector. Poner en marcha un plan de respuesta a emergencias. Este plan debe cubrir las emergencias con potencial de lesiones a las personas, los daños al medio ambiente o bienes que pudieran generarse en las operaciones.

Proporcionar y mantener operativos los recursos y equipamiento necesario, para hacer frente a una posible emergencia.

Se han identificado situaciones de emergencia que pueden afectar el normal desarrollo del proyecto, y para las que se establecieron las medidas correctivas dentro del Plan De Contingencia Y Emergencia que son:

- ✓ Acciones en caso de Sismo.
- ✓ Acciones en caso de Derrumbes.
- ✓ Acciones en caso de Urgencia Médica.
- ✓ Acciones en caso de Accidente Laborales.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

- ✓ Procedimiento de Evacuación.

- **Clasificación y evaluación de una Emergencia**

Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, son los siguientes:

- ✓ El número de víctimas y la extensión de sus lesiones y/o daños.
- ✓ El potencial de agravamiento de la situación.
- ✓ La habilidad de manejar la situación usando recursos propios de la empresa.
- ✓ El tiempo necesario para el reinicio de actividades.

- **Actividades a realizar**

A través del Área de Seguridad y salud en el trabajo de la obra, se analizará la situación y condiciones especiales. Se considerará los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las condiciones geográficas del proyecto, áreas de influencia del lugar de la obra y la información recopilada de las diferentes fuentes de información

Realizada esta actividad se procede a elaborar:

- ✓ Plan de Contingencia y Emergencia: La confección de éste Plan se realizará considerando los requisitos establecidos en las normas vigentes.
- ✓ Simulacros de Emergencia: La obra definirá un simulacro de Emergencia para mantener el sistema operativo, y asimismo, se comprobará el correcto estado de los equipos de respuesta frente a emergencias en la obra.
- ✓ Liderazgo en la concreción del Plan de Contingencia y Emergencia: El área de SST de la obra, es el máximo responsable de la realización de todas las actividades que se detallan en el PLCE.
- ✓ Brigadas de Emergencias: Se considera la constitución, formación y operación de brigadas de emergencias para diferentes escenarios.

4. TIPO DE CONTINGENCIA

Previo a la ejecución de las obras, en cumplimiento de las normas legales vigentes, se debe realizar una evaluación de riesgos, determinando aquellas actividades que por su nivel de peligro pueden impactar directa o indirectamente sobre el desarrollo del Proyecto. Este análisis permitirá conocer el grado de vulnerabilidad y peligro de la actividad y la capacidad de respuesta para afrontar con éxito una contingencia. El enfoque general considera la prevención como medida principal.

- **Contingencias Naturales:** Está asociada a la ocurrencia de sismos, el cual dependiendo de su intensidad puede ocasionar pérdidas de vidas humanas, lesiones, efectos negativos en las estructuras de construcción, etc.
- **Contingencias por Accidentes:** Se refiere a las contingencias de seguridad y salud en el trabajo de tipo industrial durante el funcionamiento de la Central o por labores de mantenimiento de las instalaciones.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.

Nivel 1 "Bajo". Una emergencia de "Nivel Bajo" es una emergencia en el emplazamiento o fuera de éste, que puede ser controlada localmente por personal del área afectada.

Nivel 2 "Medio". Una emergencia de "Nivel Medio" es aquella que no puede ser manejada por el personal del área afectada, solicitando la intervención el Equipo de Respuestas a Emergencias (no excede los recursos disponibles de la empresa).

Nivel 3 "Nivel Alto". Un incidente de "Nivel Alto" es aquel que excede los recursos disponibles en el lugar de la emergencia y requiere ayuda externa, tal como la brindada por el gobierno, la industria y/o empresas ajenas a la nuestra.

5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.

El Comité de Emergencia es el órgano normativo en casos de Contingencias, lo conformarán trabajadores representativos de nivel directivo, ejecutivo u operativo, con el fin de que tenga poder de decisión administrativa para viabilizar las condiciones de seguridad en equipamiento y demás que se recomiende personal de trabajadores calificados en acciones frente a una Contingencia.

Las Funciones y Obligaciones del Comité de Emergencia son:

- Reunirse periódicamente para acordar, planificar, orientar y desarrollar debidamente las acciones de seguridad para las fases de prevención, Emergencia y rehabilitación (antes, durante y después) de una Contingencia.
- Disponer la elaboración del Plan de Contingencia de manera técnica y adecuada a la realidad de la empresa (estudio de riesgos), debiendo revisar y aprobar el mismo.
- Organizar y disponer la adecuada capacitación y entrenamiento de los brigadistas, preparándolos en acciones del antes, durante y después del desastre o Emergencia.
- Coordinar las acciones de prevención, protección y seguridad con entidades como Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Hospitales, Clínicas, entre otros.
- Dictar normas complementarias correspondientes a la seguridad de las instalaciones del Proyecto, trabajadores y público en general.
- Reunir a sus integrantes, periódicamente, a fin de evaluar y definir políticas de seguridad para garantizar la seguridad de la empresa y la correcta aplicación del Plan de Contingencia.

6. EQUIPOS Y MATERIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.

Los Equipos formados en respuesta a las Emergencias que puedan presentarse se denominarán Brigadas Operativas de Emergencia, al grupo de personas constituido bajo directivas y un comando que se encuentran preparados para actuar en las acciones de respuesta ante una Emergencia o Desastre que pudiese ocurrir en las instalaciones del Proyecto.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	--

Estas brigadas son el Órgano Operativo de Seguridad y Emergencias del contratista y es integrada por sus trabajadores, siendo el responsable directo el coordinador de Seguridad, el mismo que es responsable de su organización y capacitación permanente y a su vez, este designará un Delegado.

INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Nos brinda las pautas necesarias para el registro, investigación y análisis de incidentes. Los procedimientos para el reporte de incidentes son:

- Reporte del trabajador involucrado o testigo del incidente.
- Reporte del supervisor presente en el lugar del incidente.
- Reporte de las partes interesadas.
- Reporte de auditores internos o externos.



LIZETH FERNANDA RIOBO ACUÑA
TÉCNICO SST

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Soporte pago seguridad social

independent, it does not



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que LIZETH FERNANDA con documento Cedula de Ciudadania 1118196103, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LIZETH FERNANDA RIOBO ACUÑA con documento CC 1118196103, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6025531345	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2026	Periodo Cotización Salud	MAYO/2026
Fecha Pago	2026/06/26	Número de Autorización	424025458

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION
Días:	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días:	30 Tarifa		12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días:	30 Tarifa		2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DE LA EMPRESA			
NOMBRE	EMPRESA	CI	CE	NOMBRE	EMPRESA	CI	CE	NOMBRE	EMPRESA	CI	CE
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA

TOTAL APORTES A RENDIR				TOTAL APORTES A RENDIR			
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE

TOTAL APORTES A RENDIR				TOTAL APORTES A RENDIR			
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE

TOTAL APORTES A RENDIR				TOTAL APORTES A RENDIR			
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE

TOTAL APORTES A RENDIR				TOTAL APORTES A RENDIR			
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE
APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE

TOTAL PAGADO: \$ 541.800



Platilla Resumen

DATOS GENERALES DEL AEROPORTE									
Identificación	5	Razon Social	Clase Aportante		Socios al Privetut	Direccion	Cuota de Depreciacion	Telefono	Exonerado SCHA o IUBF
IMP 4075A	5	CIBA IND S.A.S	6 - 49105 00 700 COTZAVITE		Fecha de	607 0 0	RELAJADA C/200707	47-0000	50
DATOS GENERALES DE LA INQUINCION									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Planta		Planta		Liquid		Pago	
100% 04	100-45	270-2104		19970-2728		19970-00538		2024-04-27	
								Pago de	
RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCION		CODIGO	NIT	DV	MILLONES	VALOR LIQUIDADO	INTERES MONA	SALDOS E INCOMPAJOS	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 7)									
PORVENIR		270201	600.224.800	8		\$750.700	50	50	\$750.700
PROTECCION		270201	600.225.779	0		\$64.100	50	50	\$64.100
AFIL ADMINISTRADORAS: 1)									
ABLS S/PA		14-11	892.801.192	5		\$74.200	50	50	\$74.200
CCT ADMINISTRADORAS: 1)									
COMI ACASABRE		02749	644.002.392	8		\$41.400	50	50	\$41.400
DPS ADMINISTRADORAS: 1)									
PAJVA L P S.		LP5037	902.131.204	2		\$76.600	50	50	\$76.600
TOTAL						\$245.400	50	50	\$245.400

PARTES GEMELAS DEL ACORDEANTE

Identificación		Clase		Clase Asignatura		Solución Propuesta		Ejecución		Código Departamento		Teléfono		E-mail y Sitio Web	
Forma	Fecha	Forma	Fecha	Forma	Fecha	Forma	Fecha	Forma	Fecha	Forma	Fecha	Forma	Fecha	Forma	Fecha
1	2008-09	2	2008-09	3	2008-09	4	2008-09	5	2008-09	6	2008-09	7	2008-09	8	2008-09

DADOS GERAIS DE LA EQUIPACION

Fornecedor		Classe		Tipo		Fatura		Pagto	
Fornecedor	Social	Page	Fuente	Platilla	Latex	Page	Banco	Orçamento	Valor
ATA 09	3035-00	27007148	09070777	7	2004-07-16	001 28 27 148-00 Credito		0	5.445,000

CONSEJO DE LA CIUDAD DE ATLANTA

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

NOMBRE	CODIGO	MT	DV	APLICADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP LABORATORIOS (1)				1	\$224,200	50	50	\$224,200
PONPHE	13045	800,024,000	8	1	\$224,200	50	50	\$224,200
ATL LABORATORIOS (1)				1	\$34,200	50	50	\$34,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,200	50	50	\$34,200
EPS ADMINISTRATIVAS (1)				1	\$175,100	50	50	\$175,100
MOENA E.P.S.	EP002	960,195,264	2	1	\$175,100	50	50	\$175,100
TOTAL				1	\$433,500	150	150	\$433,500

STATUTS GÉNÉRAUX ET LA LIQUIDATION

Periodo		Clase		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Segu	Planilla	Luzes	Pago	Dijal Hora	Valor
2023-04	25/01/2023	990.64137	1	901.07199	1226.7427	04/04/2023	1441.500

[illegible]Page 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RECIBO	CÓDIGO	NIT	OW	APLZASO	VALOR LIQUIDADO	INTERSES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS: 1)									
PLANVITAL	230001	900.024.808	0	0	524.200	50	50	524.200	524.200
AFP ADMINISTRADORAS: 1)									
PORTIVA COMPANIA DE SEGUROS	14.23	900.011.151	6	0	544.200	50	50	544.200	544.200
EPS ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	095005	900.051.000	6	0	5175.000	50	50	5175.000	5175.000
TOTAL				1	5.413.500	50	50	5.413.500	5.413.500

NATIONAL CATHARTIC FOUNDATION

[illegible]

Ends 8 & 9 only

Page 1 de 2

aportes
en línea

DADOS GERAIS DO APORTANTE

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Id	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exemplar de SENA e ICBF
CC-114203631		BEJARDO MATTHEW LAURA GUSTHA	MOTOPEDINANTE	PRINCIPAL	DG 24 - 13 - 56	VILLAMARÍA, CAQUETÁ	327242271	54

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Unidad	Unidad	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-05	343238847	9505552886	1	2024-05-28	2024-05-28	BANCA COMISA		1,187,100

RESUMEN DE PAGO

CÓDIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFPP ADMINISTRADORAS: 1)				\$149,500	\$0	\$0	\$149,500
POSIVIEHR	800.224.878	8		\$149,500	\$0	\$0	\$149,500
APRL (ADMINISTRADORAS: 1)				\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860.011.153	8		\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				\$116,800	\$0	\$0	\$116,800
SANTAS	800.231.440	6		\$116,800	\$0	\$0	\$116,800
TOTAL				\$289,100	\$0	\$0	\$289,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESPágina 1 de 2

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$149,500	\$1,300	\$0	\$0	\$150,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$149,500	\$1,300	\$0	\$0	\$150,800
APL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$22,800	\$200	\$0	\$0	\$23,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$22,800	\$200	\$0	\$0	\$23,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$116,800	\$1,000	\$0	\$0	\$117,800
HUEVA E.P.S.	EP9277	900.136.264	2	1	\$116,800	\$1,000	\$0	\$0	\$117,800
TOTAL				1	\$289,100	\$2,500	\$0	\$0	\$291,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA * ICBF
487 901 467356	9	CEBA MAR S.A.S.	B - MENOS DE 200 COLTAMILES	PRINCIPAL	CR 7 & 35	VILLAHUYA - CASHUARE	6610000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-05	412209578	Planilla	2024-06-24	2024-06-22 BARCOS OMERIA	\$333,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días			
Confinamiento de Tránsito PRINCIPAL (2 Afiliados)																							
Ciudad: VILLAHUYA Depto: CASHUARE (2 Afiliados)																							
1	CC	108432753	MORA LUISGO	22001	11	\$1,167,270	EP025	11	\$501,635	\$51,405	CC040	11	\$501,635	\$51,405	CC040	11	\$501,635	\$51,405	CC040	11			
2	CC	111878403	RODRIGUEZ LUTHER	22001	11	\$1,167,270	EP025	11	\$501,635	\$51,405	CC040	11	\$501,635	\$51,405	CC040	11	\$501,635	\$51,405	CC040	11			
Total Afiliados(2)						\$2,334,540			\$1,003,270	\$102,810			\$1,003,270	\$102,810			\$1,003,270	\$102,810					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SINAE a RBF
NIT 901407596	9	CEIBA HUIF S.A.S	8 : MENOS DE 300 COLIANTES	PRINCIPAL	CR 7 k 35	VILLAMARVA-CAQUAME	4610000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Prestación	Salida	Pago	Platilla	Platilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	411299579	9506354004	8	2024/06/24	2026/06/22	BAHCOLO DUBLIA	0	\$333,200

RESUMEN DE PAGO

CÓDIGO		NIT	DV	AFLIGIDOS	VALOR LIQUIDADO	INTERIESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2):								
PORVENIR		2303071	800.224.808	8	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800
PROTECCION		2302011	800.229.739	0	\$93,400	\$0	\$0	\$93,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1):								
ARL SURIA		14-11	890.903.790	5	\$50,800	\$0	\$0	\$50,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1):								
CONFACASAMAR		CCF69	844.003.392	8	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2):								
PREVIA E.P.S.		EP0037	900.156.264	2	\$46,800	\$0	\$0	\$46,800
SANTAS		EP5005	800.251.440	6	\$23,400	\$0	\$0	\$23,400
TOTAL				2	\$333,200	\$0	\$0	\$333,200

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Certificado pago de seguridad expedido por contador

	CERTIFICADO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

CEIBA M&F SAS
NIT: 901497596-9
Dirección: CR 7 7 68
Teléfono: 3213103923

Fecha: 17 de MAYO de 2026

Asunto: Certificación de paz y salvo en aportes al Sistema de Seguridad Social – Contrato No. 320.11.027-2026

Yo, ESTEFANY FLOREZ TAO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1.118.196.641, en calidad de Contador(a) Público(a) de CEIBA M&F SAS, con Tarjeta Profesional No 298454-T, me permito certificar que, una vez verificada la documentación correspondiente, los profesionales contratados bajo la modalidad de prestación de servicios vinculados a la ejecución del Contrato No. 320.11.027-2026, cuyo objeto es:

"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P."

se encuentran a paz y salvo a la fecha del presente documento por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a:

Salud
Pensión
Riesgos Laborales (ARL)

Lo anterior, conforme a los soportes de pago y planillas aportadas por cada contratista, los cuales se anexan al presente documento para los fines pertinentes.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,



ESTEFANY FLOREZ TAO
Contador Público
T.P. No. 298454-T
C.C. No. 1118196641

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Yo, **ESTEFANY FLOREZ TAO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.118.196.641**, de Villanueva Casanare y con Tarjeta Profesional No. **298454-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de la empresa **CEIBA M&F S.A.S** identificada con **NIT 901.497.596-9**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y **se encuentra al día y a paz y salvo** por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Villanueva Casanare, a los 17 días del mes de mayo de 2026.

Atentamente:



ESTEFANY FLOREZ TAO

C.C. 1.118.196.641

CONTADOR PUBLICO T.P. 298454-T

ANEXO: Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido ante la junta central de contadores, no mayor a 90 días.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 B D C 3 1 F C 7 7 0 A 2 3 A A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ESTEFANY FLOREZ TAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118196641 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 298454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado.



DE CONTADORES 17

298454-T

ESTEFANY
FLOREZ TAO
C.C. 1118196541
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITZGTON



321845

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

345290

UNION DE CONTADORES


UNION DE CONTADORES

UNION DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1988. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (50X1) 844 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Camé, 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.



FIRMA

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Paz y salvo trabajadores

	CERTIFICADO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

CEIBA M&F SAS

NIT 901497596-9

CERTIFICA:

Que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la señor DIEGO FERNANDO MORA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1006533761 quien laboro para esta empresa como ayudante de obra para la ejecución del contrato No 320.11.027-2026, con la empresa de servicios públicos de Villanueva ESPAVI S.A E.

La presente se expide a los 17 días del mes de mayo de 2026 en Villanueva Casanare


CONTRATANTE



DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

EMPLEADO



DIEGO FERNANDO MORA MARTINEZ

AYUDANTE DE OBRA

	CERTIFICADO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596- 9 CEIBA M&F S.A.S
--	---	---

CEIBA M&F SAS

NIT 901497596-9

CERTIFICA:

Que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la señora LAURA BEJARANO MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía No 1118203630 quien laboro para esta empresa como ingeniera residente de obra para la ejecución del contrato No 320.11.027-2026, con la empresa de servicios públicos de Villanueva ESPAVI S.A E.


La presente se expide a los 17 días del mes de mayo de 2026 en Villanueva Casanare

CONTRATANTE



DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EMPLEADO



LAURA BEJARANO MARTINEZ
INGENIERA RESIDENTE

	CERTIFICADO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
--	---	------------------------------------

CEIBA M&F SAS

NIT 901497596-9

CERTIFICA:

Que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la señora LIZETH FERNANDA RIOBO ACUÑA identificada con cedula de ciudadanía No 1118196103 quien laboro para esta empresa como técnico en seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato No 320.11.027-2026, con la empresa de servicios públicos de Villanueva ESPAVI S.A E.

La presente se expide a los 17 días del mes de mayo de 2026 en Villanueva Casanare

CONTRATANTE



DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EMPLEADO



LIZETH FERNANDA RIOBO ACUÑA
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9 CEIBA M&F S.A.S
---	---	---------------------------------------

Paz y salvo proveedores



**SELTEC INGENIERIA Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S**
Nit: 901.273.242-5
3508600600

Instalación de
Alarmas Instalación Circuito
Cerrado de TV
Mantenimiento de alarmas
Mantenimientos de CCTV
Asesoría en seguridad

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente, la empresa **SELTEC INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.**, identificada con NIT **901.273.242-5**, certifica que la empresa **CEIBA M&F S.A.S.**, identificada con NIT **901.497.596-9**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con nuestra compañía por todo concepto. Se deja constancia de que la empresa anteriormente mencionada no presenta saldos pendientes, obligaciones económicas ni valores adeudados a favor de **SELTEC INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Se firma en Villanueva Casanare, a los 06 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

1118196457
Frenay Aguirre Castillo

FRENEY AGUIRRE CASTILLO
Representante legal

Dirección: Calle 9 # 7-49 Villanueva Casanare
Email: gerencia@seltec.com.co -
proyectos@seltec.com.co
Teléfonos: 350 8600 600
www.seltec.com.co

REFRISERVICIOS ORTIZ



PAZ Y SALVO

Yo Luis Felipe Ortiz Serrano identificado con cedula de ciudadanía No. 1'095.913.224 de Giron Santander actúa como independiente y representante legal de REFRISERVICIOS ORTIZ, se permite certificar que la empresa CEIBA M&F S.A.S identificada con el NIT 901.497.596-9 se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con nosotros en lo que se refiere en temas de:

Servicios prestados en desinstalación de aires acondicionados, mantenimiento, instalaciones de los mismos y materiales utilizados en las obras que se han ejecutado.

El presente certificado se expide por solicitud de los interesados el día 20 de Mayo del 2026.

Cordialmente:

Luis Felipe Ortiz Serrano.

C.C: 1.095.913.224 de Girón, Santander.

Celular: 3171758874.

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Oficio personería

	ESPAVI S.A. E.S.P PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIO	CÓDIGO: F-GA-006
		FECHA: 01/06/2022
		VERSIÓN: 01
		PÁGINAS: ____ DE ____

100.12.02-572

Villanueva, Casanare, 25 de mayo de 2026

Doctor

JHON JAIRO ECHEVARRIA PEREZ

Personero Municipal

Villanueva Casanare

Email: personeria@villanueva-casanare.gov.co

Referencia: Contrato de Obra N° 320.11.027-2026. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P

Asunto: Solicitud de Información.

Cordial saludo,

En atención de las obligaciones como Supervisor del contrato de la referencia, y dado que actualmente se adelantan los trámites correspondientes para el recibo y liquidación del contrato, de manera atenta solicito de su valiosa colaboración con la siguiente información:

- Informar a esta dependencia si han sido radicadas a su despacho peticiones, quejas o reclamaciones respecto de incumplimientos en el pago y/o pasivos con trabajadores o proveedores de bienes y servicios por parte de CEIBA M&F representada Legalmente por DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ en desarrollo del contrato de la referencia.

Agradezco su valiosa colaboración, sin otro particular,




OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA
Gerente ESPAVI S.A. E.S.P

Elaboró:



Proyecto: Hugo Ricardo Pedraza Caro
CPS 320.11.004-2025
Apoyo a la supervisión



 Personería Municipal Villanueva - Casanare Tus Derechos, Nuestra Razón de Ser	CÓDIGO: PMRTC-18
GESTION DOCUMENTAL - MECI CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	VERSION: 01 FECHA: 07/12/2012

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

INFORMA QUE:

Mediante oficio 100.12.02.572 del 25 de mayo del 2026, radicado internamente bajo el número 346 del 28 de mayo del 2026, por medio del cual se solicita información referente a quejas, peticiones y/o reclamos de pasivos laborales o pasivos de proveedores relacionados con el contrato de obra No 320.11.027-2026, cuyo objeto es **"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P"**

En atención a lo anterior, este Despacho procede a realizar la respectiva verificación.

Una vez revisada nuestra base de datos, **NO** se encuentra ninguna queja petición o reclamos de pasivos laborales o pasivos de proveedores que guarden relación con el contrato de la referencia.

Es importante señalar que este documento no se considera como un "paz y salvo" por parte del Municipio y/o la Personería de Villanueva, ya que se expide únicamente en función de la información disponible en la Personería Municipal. Por lo tanto, se desconoce si existen quejas o reclamaciones al respecto ante otros entes de control, entidades administrativas y/o judiciales de orden local, departamental o nacional.

El presente documento se expide a solicitud del ingeniero Oscar Hernando Franco Mejía, para los trámites de liquidación del contrato mencionado.

Dada en Villanueva Casanare, a los once (11) días de mes de junio de dos mil veintiséis (2026).



JHON JAIRO ECHEVERRÍA PÉREZ
Personero Municipal

Proyectó: Edith Leguizamo salamanca

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Factura



CEIBA MF SAS
NIT 901.497.596-8
Cra 7 N 6 - 35
Tel: (608) 3213103923
Villanueva - Colombia
ceibamfssas@gmail.com

No. FE 62

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A.E.S.P			Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	900.262.261-4	Teléfono	(608) 0000000		
Dirección	CR 1 D 4 14	Ciudad	Villanueva - Colombia	2026-06-18	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	CONTRATO DE OBRA No. 320.11.027-2026 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	1.00	13,597,150.77	13,597,150.77	0 %
2	Administración 25.5%	1.00	3,467,273.45	3,467,273.45	0 %
3	Imprevisto 2%	1.00	271,943.02	271,943.02	0 %
4	utilidad 5%	1.00	571,306.86	673,857.54	19 %
5	ajuste decimas	1.00	0.12	0.12	0 %

Total items: 5

Total Bruto 17,907,676.22

Valor en Letras:

Dieciocho millones dieciséis mil doscientos veinticuatro pesos noventa cent.

IVA 19% 108,548.68

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 18,016,224.90

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 18,016,224.90

Observaciones:

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S.

Rut y cuenta bancaria

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141242860403



(415170) 21248998416020 0000141242860403

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

E. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 9 7 5 9 6 9

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CEIBA M&F S.A.S

36. Nombre comercial

CEIBA M&F S.A.S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Casanare

40. Ciudad/Municipio

Villanueva

4 4 0

41. Dirección principal

CR 7 6 35

42. Correo electrónico

ceibamfsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 3 1 0 3 9 2 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 4 0 3 2 0

4 2 2 0

2 0 2 5 0 5 2 0

7 7 3 0

4 3 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogenea

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2026-03-25 / 03:08:49PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1525 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre MORA MARTINEZ DANIEL EDUARDO

965. Cargo Representante legal Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141242860403



41517707212485984(6020) 0000141242860403

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Trópic

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 9 7 5 9 6 9

4 4

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 2 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 6 4 4 5 2 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	MARTINEZ	DANIEL	EDUARDO
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

	INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	NIT 901497596-9
		CEIBA M&F S.A.S

Memorias de cantidades ejecutadas

CULTO Opere de enseñanza y ediciones bellas de la Empresa de Impresos Publicos de Venezuela (EIPAV) S.A. E.S.P.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL COMITÉ

500 N. 1st St. St. Paul, MN 55101	Wash. Ave. at Third St. St. Paul, MN 55101
--------------------------------------	---

Value of χ^2 statistic:	
------------------------------	--

876-222-2222

SUPPLEMENT

CHICAGO, ILL. (UPI) — A woman who was

PLATO THE EDUCATION MANAGER

Author's address:

RECIBO DE TRANSFERENCIA SOCIAL

2015 APRIL 2015

100	100
-----	-----

FECHA DE INICIO:

© 1997 Blackwell Science Ltd

meditation in

10

FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO

0000-0000-0000-0000

REACHING THE REMEDIATION GOAL

0.010

TABLE 1. RATIO OF EXECUTION ACTUAL TO ESTIMATED IN 1997

Overall, the results of this study suggest that the use of a structured, evidence-based approach to patient assessment and management can lead to improved patient outcomes and reduced costs. The implementation of such a program requires a commitment to ongoing education and training for all staff involved in patient care, as well as a willingness to embrace change and innovation in the way we deliver care. By working together, we can ensure that every patient receives the highest quality of care possible.

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALORES CONTRACTUALES			PAGO PARCIAL No. 1			PAGO PARCIAL No. 2			PAGO LIQUIDACION			VALOR TOTAL EJECUTADO	
		CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	RECAUDANTE E INSTRUCCION DE ASESOR ACONSEJAMIENTO	Unid	1.00	\$ 207 081.00	\$ 207 081.00	11.00	\$ 627 503.00	\$ 1 239 122.00				11.00	\$ 627 503.00	\$ 1 239 122.00		
1.1	Desarrollar un plan de mejoramiento técnico académico	Unid	9.99	\$ 516 461.20	\$ 5 146 204.00	9.00	\$ 579 462.50	\$ 5 199 200.00				9.00	\$ 579 462.50	\$ 5 199 200.00		
1.2	Indicador de los conocimientos de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	17.00	\$ 2 751 796.00	\$ 46 980 452.00											
2	Manejo de personal en un establecimiento de 12000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	40.00	\$ 38 454.00	\$ 1 538 156.00											
2.1	Elaborar el plan de mejoramiento de personal en un establecimiento	Unid	40.00	\$ 38 454.00	\$ 1 538 156.00	9.79	\$ 67 467.00	\$ 667 472.00								
2.2	Elaborar el plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 12000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	11.00	\$ 1 966 190.00	\$ 21 625 110.00											
3	MANEJO DE NEGOCIO	Unid	1.00	\$ 207 081.00	\$ 207 081.00	11.00	\$ 627 503.00	\$ 1 239 122.00				11.00	\$ 627 503.00	\$ 1 239 122.00		
3.1	Calcular el costo de los servicios	Unid	11.00	\$ 6 700.98	\$ 73 710.87	10.00	\$ 8 709.36	\$ 87 093.56								
3.2	Calcular el costo de los servicios	Unid	10.00	\$ 8 700.00	\$ 87 000.00	10.00	\$ 8 700.00	\$ 87 000.00								
3.3	Calcular el costo de los servicios	Unid	1.00	\$ 5 200 000.00	\$ 5 200 000.00	1.00	\$ 5 200 000.00	\$ 5 200 000.00								
4	MANEJO DE SEGURIDAD															
4.1	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.2	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.3	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.4	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.5	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.6	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.7	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.8	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.9	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.10	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.11	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.12	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.13	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.14	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.15	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.16	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.17	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.18	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.19	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.20	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.21	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.22	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.23	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.24	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.25	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.26	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.27	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.28	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.29	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.30	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.31	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.32	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.33	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.34	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.35	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.36	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.37	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.38	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.39	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.40	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.41	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.42	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.43	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.44	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.45	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.46	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.47	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.48	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.49	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.50	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.51	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.52	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.53	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.54	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.55	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.56	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.57	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.58	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.59	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRESO BRUTO LÍQUIDO	Unid	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00	1.00	\$ 6 500 000.00	\$ 6 500 000.00								
4.60	Desarrollar un plan de mejoramiento de personal en un establecimiento de 15000 INGRES															

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALORES CONTRACTUALES			PAGO PARCIAL No. 1			PAGO PARCIAL No. 2			PAGO LIQUIDACION			VALOR TOTAL EJECUTADO		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6.6	Piso por cubeta liviana 2' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	20.79	\$ 72,331.62	\$ 1,503,714.38				20.79	\$ 72,331.62	\$ 1,503,714.38				20.79	\$ 72,331.62	\$ 1,503,714.38
6.7	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 87,447.57	\$ 0.00										0.00	\$ 87,447.57	\$ 0.00
6.8	Piso por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 87,447.57	\$ 0.00										0.00	\$ 87,447.57	\$ 0.00
6.9	Placa de acero para piso de 1/2" x 12" x 20'	m2	4.84	\$ 1,045,070.10	\$ 5,058,139.17				4.84	\$ 1,045,070.10	\$ 5,058,139.17				4.84	\$ 1,045,070.10	\$ 5,058,139.17
6.10	Placa de acero para piso de 1/2" x 12" x 20'	m2	81.43	\$ 3,400,007.37	\$ 278,180,762.21				81.43	\$ 3,400,007.37	\$ 278,180,762.21				81.43	\$ 3,400,007.37	\$ 278,180,762.21
6.11	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 201,238.74	\$ 0.00				0.00	\$ 201,238.74	\$ 0.00				0.00	\$ 201,238.74	\$ 0.00
7	TRANSPORTE																
7.1	Carga, transporte y descarga de materiales de obra, mano de obra y equipo de obra	Vaga	18.00	\$ 87,880.30	\$ 1,581,845.40				18	\$ 87,880.30	\$ 1,581,845.40				18.00	\$ 87,880.30	\$ 1,581,845.40
8	NO PRESTADOS		0.00		\$ 0.00						\$ 0.00						\$ 0.00
8.1	Placa de acero para piso de 1/2" x 12" x 20'	m2	303.34	\$ 15,811.81	\$ 4,800,184.26				303.34	\$ 15,811.81	\$ 4,800,184.26				303.34	\$ 15,811.81	\$ 4,800,184.26
8.2	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 125,901.04	\$ 0.00				0.00	\$ 125,901.04	\$ 0.00				0.00	\$ 125,901.04	\$ 0.00
8.3	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 178,333.00	\$ 0.00				0.00	\$ 178,333.00	\$ 0.00				0.00	\$ 178,333.00	\$ 0.00
8.4	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 810,188.54	\$ 0.00				0.00	\$ 810,188.54	\$ 0.00				0.00	\$ 810,188.54	\$ 0.00
8.5	Placa de acero para piso de 1/2" x 12" x 20'	m2	16.00	\$ 144,182.00	\$ 2,306,912.00				16.00	\$ 144,182.00	\$ 2,306,912.00				16.00	\$ 144,182.00	\$ 2,306,912.00
8.6	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.7	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.8	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.9	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.10	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.11	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.12	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.13	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.14	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.15	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.16	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.17	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.18	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.19	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.20	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.21	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.22	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.23	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.24	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.25	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.26	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.27	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.28	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.29	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.30	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.31	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.32	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.33	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.34	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.35	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.36	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.37	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.38	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.39	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.40	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.41	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.42	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.43	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.44	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.45	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.46	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.47	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.48	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.49	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.50	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.51	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.52	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.53	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.54	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.55	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.56	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.57	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.58	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.59	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.60	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.61	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.62	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.63	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00
8.64	Cubierta por cubeta liviana 20' x12" x 1/2" para distribución de carga, material y mano de obra	m2	0.00	\$ 2,400,070.10	\$ 0.00										0.00	\$ 2,	


 JUAN CARLOS CRUZ CARD
 ASISTENTE A LA SUPERVISIÓN
 PROYECTO DE ARQUEO



 RENATO A. S. P.
 CENTRO TECNOLÓGICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO


 SR. GABRIEL ESLAVIANO MORA MARTINEZ
 CERRA VAF S.A.S.
 CONTABILISTA DE OBLA

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA		VERSION : 01
---	--	--	--	--------------

OBJETO		OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA REDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPANA S.A. E.E.P.	
CAPITULO	Y	DESMONTE E INSTALACION DE AERES ACONDICIONADO	
ITEM	1.1	Desmonte de aires acondicionado. Incluye accesorios	

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES
	Cant.	unid.				
1 piso - Correspondencia	1.00	unid.	1.00		1.00	
1 piso - Alacena	1.00	unid.	1.00		1.00	
1 piso - Comedor	1.00	unid.	1.00		1.00	
1 piso - Prg	1.00	unid.	1.00		1.00	
1 piso - SGT	1.00	unid.	1.00		1.00	
2 piso - Control de	1.00	unid.	1.00		1.00	
2 piso - BH	1.00	unid.	1.00		1.00	
2 piso - Centralización	1.00	unid.	1.00		1.00	
2 piso - Operativa	1.00	unid.	1.00		1.00	
2 piso - Administrativa	1.00	unid.	1.00		1.00	
2 piso - General	1.00	unid.	1.00		1.00	
TOTAL					11.00	

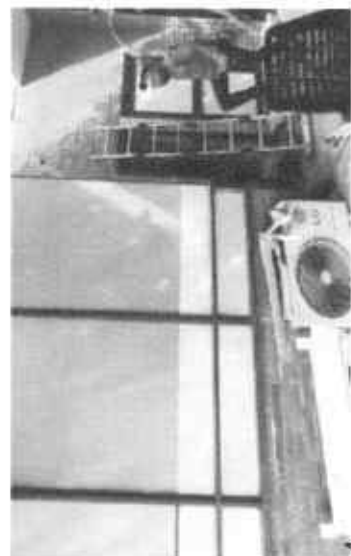Elaboró

Revisó



R/A DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
CERBA MBS S.A.S




ING. HUGO RICARDO PEDRAZA CAIRO
Apoyo a la supervisión

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN :01
---	--	--	--	-------------

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPÍRITU S.A. E.S.P.				
CAPÍTULO	1	DESMONTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		
ITEM	1.2	Instalación de aire acondicionado de 12000/18000 BTU, 230V		


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES
	Cent	und				
Desmonte	1.00	und	1.00		1.00	
Compartir	2.00	und	2.00		2.00	
Conectar	2.00	und	2.00		2.00	
Alimentación	1.00	und	1.00		1.00	
Aplicación	1.00	und	1.00		1.00	
Controlación	1.00	und	1.00		1.00	
SubT	1.00	und	1.00		1.00	
TOTAL						8.00

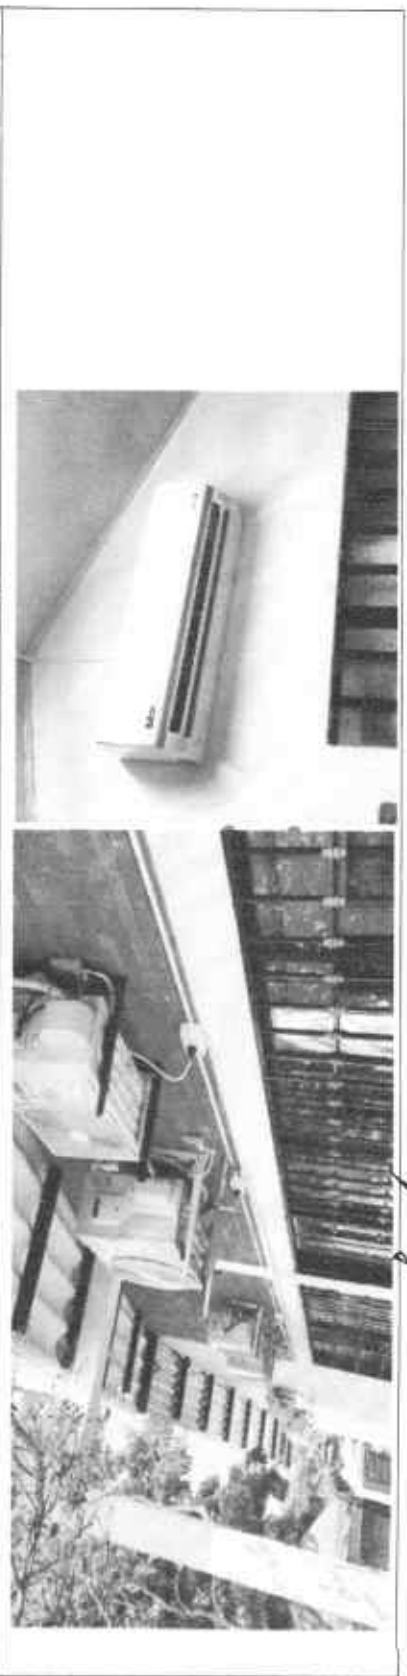

Elaboró:  **RAFAEL EDUARDO MORA MARTÍNEZ**
 CEIBA M&F S.A.S.

Revisó:  **HUGO RICARDO PEDRAZA CARO**
 Apoyo a la supervisión

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN :01
OBJETO		OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCALITIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPRAN S.A. E.S.P.		
CAPÍTULO		DEBIMONTE E INSTALACION DE ASES ACONDICIONADO		
ITEM		Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 12.000/18.000 BTU a 220 V incluye recarga de refrigerante y limpieza de tuberías		
1	1.3	UNIDAD	Unid.	
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		OBSERVACIONES
Cant	Unid	CANTIDAD	UNIDAD	
1.00	und	1.00		TOTAL ACUMULADO
2.00	und	2.00		
2.00	und	2.00		TOTAL
1.00	und	1.00		
1.00	und	1.00		TOTAL
1.00	und	1.00		
1.00	und	1.00		TOTAL
1.00	und	1.00		
2.00	und	2.00		TOTAL
TOTAL		TOTAL		11.00

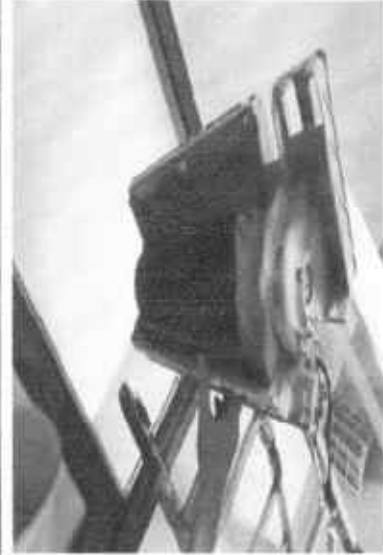

Revisó

Elaboró

ING. HUGO RICARDO PEDRAZA CARO
Ayudo a la supervisión

M/L DANIEL EDUARDO MONA MARTINEZ
CEIBA M&E S.A.S

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN -01
OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAZO S.A. E.S.P.				
CAPÍTULO 1		DESGASTE Y MANTENIMIENTO GENERAL		
ITEM 2.1		Desgaste e instalación de muros en lamina PVC		
		m ²		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
	Longitud	Ancho	Area	
Lamina por correspondencia con puerta	3.36	4.20	14.31	
Lamina por ventana an.	4.15	2.59	10.75	
Lamina por abridor con p. anillo	2.50	4.00	10.00	
Lamina abridor manual, anillo y abridor	8.57	1.50	12.86	
TOTAL			48.06	




Elaboró

 R/V DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
 CEIBA M&F S.A.S.

Revisó

 Ingeniero RICARDO PEDRAZA LARGO
 Apoyo a la supervisión

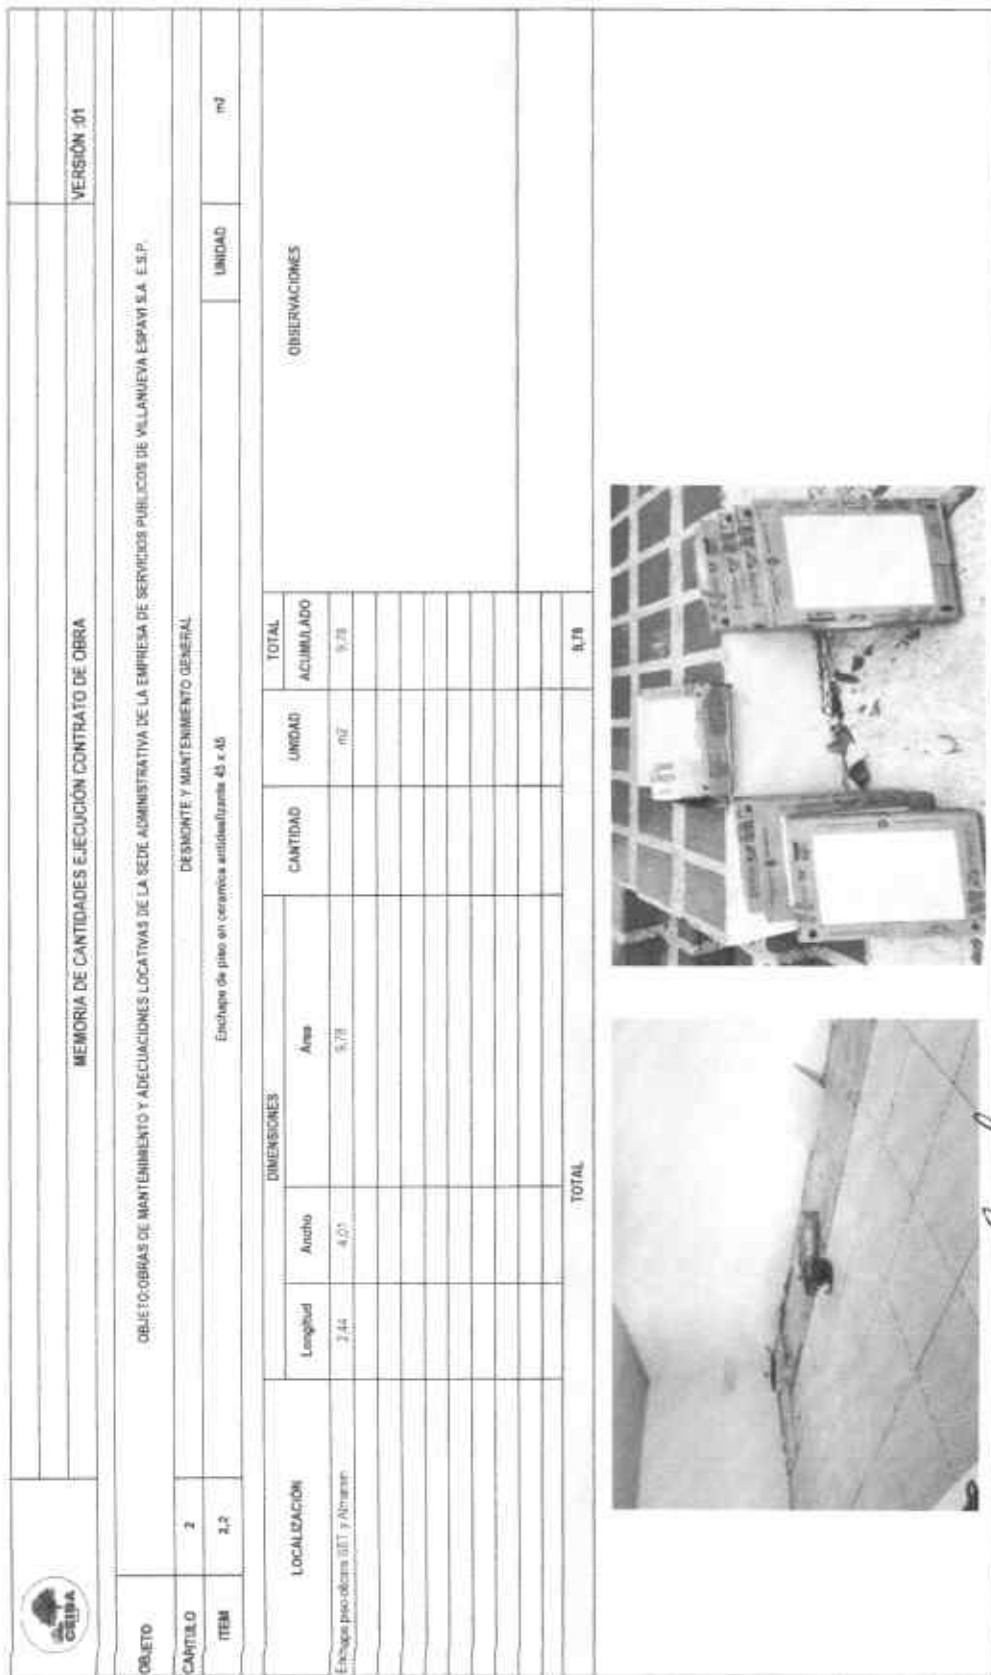

liberá

R/ DANIEL EDUARDO MOREA MARTINEZ

Revisó



		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA										VERSIÓN :01
		OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPANA S.A. E.S.F.										
OBJETO	DESMONTE Y MANTENIMIENTO GENERAL											
CAPITULO	2	Instalación de módulos metálicos del archivo										
ITEM	2.1	UNIDAD										
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES				
		Longitud	Ancho	Area								
Enchufe por oficina SS y Almacén		2.00	5.40	10.80		m2	10.80					
TOTAL							10.80					




Elaboró 

R/L DANIEL EDUARDO MORA MARTÍNEZ
CEIBA M&E S.A.S.

Revisó 

R/L HUGO RICARDO PEDRAZA CANO
Apoyo a la supervisión

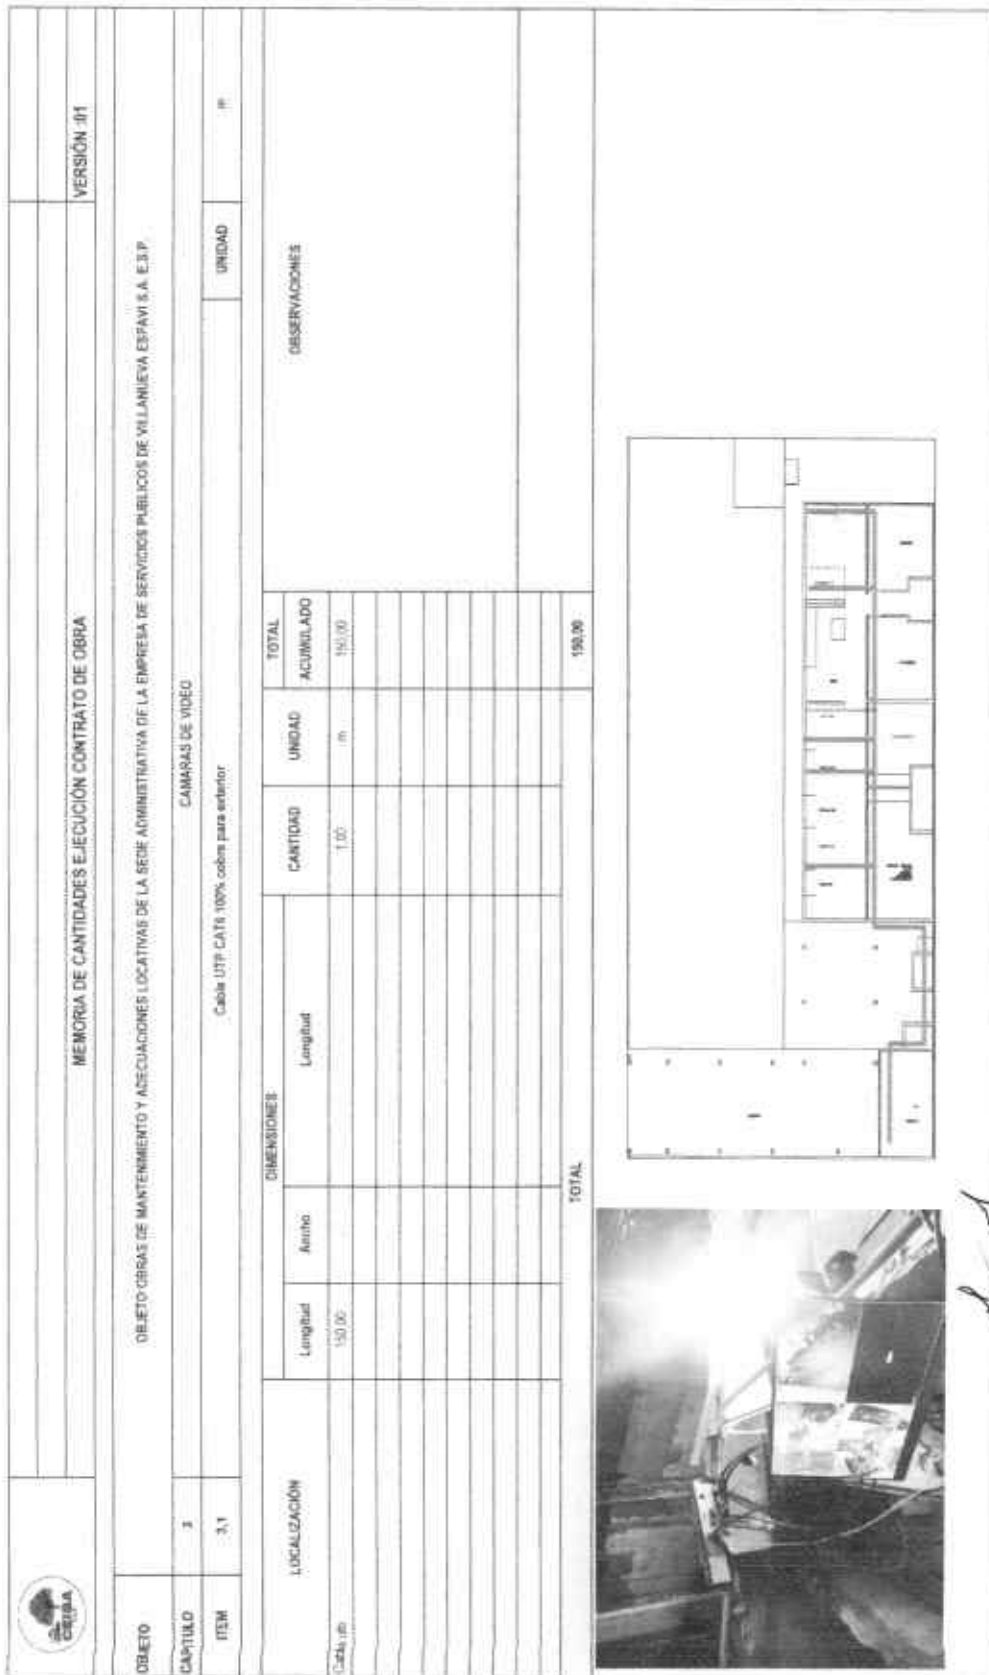

Newish

~~EL CARNÍEL~~ EDUARDO MORA MARTÍNEZ
CEIBA MIF S.A.S.

ING HUGO RICARDO PEDRAZA CAMO
Aprobó a la supervisión



OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAÑA S.A. E.S.P.

CAMPAÑAS DE VIDEO

Cable Neopren 100% cobre

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

3

[illegible]

Reviewers

9/1 DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ

CHINA NARF S.A.S.

Reviewers

UGO RICARDO PEDRAZA CARI

Aporro e la superstitia



MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSION : 01

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCALITIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAÑA S.A. E.S.P.

CAMPAGNA DE VIDEO

[illegible]

servicio técnico, traslado, educación e instalación del sistema de intercomunicación y sus asociadas, incluyendo cámara de video, DVR, grabador de seguridad 3500 cm. (PES 00004, R01-PR12010)

Botas de policía 17V-14, talla 40mm 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163

LOCALIZACION	DIMENSIONES						OBSERVACIONES
	Longitud	Ancho	longitud	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	
Actividad anterior de cultivo de maricultura en el predio	1.00			1.00	gr	1.00	
TOTAL						1.00	



References

R/E. DANIEL EDUARDO ACOSTA MARTINEZ
CEIBA MAR-5.A.5

APPROVALE E SUPERVISATO



MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION CONTRATO DE OBRA


VERSION: 01

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADICIONES LOCALITIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLAMENA ESPANA S.A. E.S.P.

ALÍNEA DE SEGURIDAD

Desarrollo de obra de mantenimiento y adiciones de seguridad, en la sede administrativa de la empresa de servicios públicos de Villamena España S.A. E.S.P. Incluye: mano de obra, materiales, herramientas, equipo, transporte, etc. para el desarrollo de la obra. Incluye: mano de obra, materiales, herramientas, equipo, transporte, etc. para el desarrollo de la obra. Incluye: mano de obra, materiales, herramientas, equipo, transporte, etc. para el desarrollo de la obra.

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
		Longitud	Ancho	Longitud	CANTIDAD	UNIDAD	
1	Localización	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
TOTAL:							1.00



Elaboró

M. DANIEL ECUADOR MONA MARTINEZ
CEIBA M&E S.A.S

Revisó

M. HUGO MONTEO FERNANDEZ
Aprobó a la supervisión



OBJETO	OBJETO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCALES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPANA S.A. E.S.P.
--------	---

FIELD OF LOCATION

ITEM		UNIDAD	precio
2.4	Red de cable paracable 2x20 pares en las oficinas. Incluye trabajo con cable de nichel, 100% cobre, 21 en cable LAN. Conector RJ 45 A tipo, red switch, 16 los, switch trabajo y mano de obra		

LOCALIZATION	OBSERVATIONS					TOTAL	OBSERVATIONS
	Length	Area	Length	CATCHED	LIMITED	AQUACULTURE	
Actualized by data observation & intuition	1.00			1.00	9%	1.00	



References

ASSO RICARDO PEDRAZA CARO
Apoyo a la superación

Approved for publication



OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAÑA S.A. E.S.P.

BOEFGA ARCHIVO

Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno

UNIVERSITY

101

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES
	Longitud	Ancho	Area	CANTIDAD	UNIDAD		
Area zona 8 boques	15.50	0.21	44.00	1.00	m ²	44.00	
TOTAL						44.00	



References

ING. RUGERO RICCARDO PEDRAZA CARD
Aprobó a la supervisión



MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN :01

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES LOCALITIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLARUEYA ESPAN S.A. E.S.P.

BOCUEBA ARCHIVO

Matte electrolitico 0-4 a 10182

UNIDAD m2

CANTIDAD 5.3

LOCALIZACION

DIMENSIONES

Longitud

Ancho

Area

CANTIDAD

UNIDAD

ACUMULADO

OBSERVACIONES

Matte

6.50

8.50

44.00

1.00

m2

44.00

0.060

2.20

TOTAL

44.20



Elaboró

RA DANIEL ESTEBAN MOYA MARTINEZ
CEBRA M&F S.A.S

Revisó

RICARDO RICARDO FERRAZA CARO
Apoyo a la supervisión



MEMORIA DE CANTIDADES E EJECUCION CONTRATO DE OBRA

VERSION: 01

OBJETO

OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ANEXOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLE, E.S.P.

BOSQUE ARCHIVO

CANTIDAD
ITEM

1
1.1

Piso y base concreto resistencia 210 kg/cm² 1000 m²

UNIDAD

m²

LOCALIZACION

Longitud
Ancho
prof

CANTIDAD

UNIDAD

ACUMULADO

OBSERVACIONES

VALOR

1.20

5.00

0.10

1.00

m³

4.24

TOTAL

4.24



Elaboró


DANIEL EDUARDO NOYA MARTÍNEZ
CEBA M&F S.A.S

Revisó


HUGO RICARDO PIZARRA CANO
Apoyo a la empresa sede



OBJETO CORRESPONDE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SECC. ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPANA S.A. S.P.

BODEGA ARCHIVO

Cubierta arquitectónica col. 28 Pintada.

UNICAD	m ²
--------	----------------

[illegible]

Microarray

Aspirante a la supervisión



OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPANOL S.A. E.S.P.

BIOETHICA ARCHIVO

Canalito an interno galvanizada cal. 18 Au = 0.80 m. Suministro e instal

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES
	Longitud	Ancho	Area				ACUMULADO		
Gravada gravatada	8.00	0.00		0.00	1.00	m		8.00	
TOTAL								8.00	



Elmhurst

Reviews

R/L DANIEL EDUARDO MONA MARTINEZ
CEIBA M&F S.A.S

THE HUGO RICARDO PEDRAZA CARI
Apoyo a la superación

25

10

要約



MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN 01

OBJETO OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLAMUÑA ESPANA S.A. E.S.P.

BOSQUE ARCHIVO

Caliente arquitectónica c/ 28 Parada

UNIDAD m²

OBJETO

6

ITEM

MP 6.19

LOCALIZACION

Longitud

Altura

ANCHO

Area

CANTIDAD

UNIDAD

TOTAL

OBSERVACIONES

Item

7.00

5.00

35.00

1.00

m²

35.00

35.00

Item

6.40

2.55

16.50

1.00

m²

16.50

16.50

Item

4.33

2.55

11.04

2.00

m²

22.08

22.08

Item

7.40

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Elaboró

RICARDO EDUARDO MORA MARTINEZ
CERBA V&A S.A.S

Revisó

HUGO RICARDO FERRAZA CANO
Acepto el supervisor





OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCALITIVAS DE LA REDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAÑA S.A. E.S.P.


BOLESA ARJUNO

Cavalito em lâmbas girificadas cal. 18 Au = 0,05 m. Survelado e injetado

UNITARY

3

LOCALIZACIÓN	UNIDADES				TOTAL		OBSERVACIONES
	Longitud	Alto	Area	CANTIDAD	UNIDAD	ACUMULADO	
Observación	21.02	0.70	0.28	1.00	m	11.50	
TOTAL						3.00	

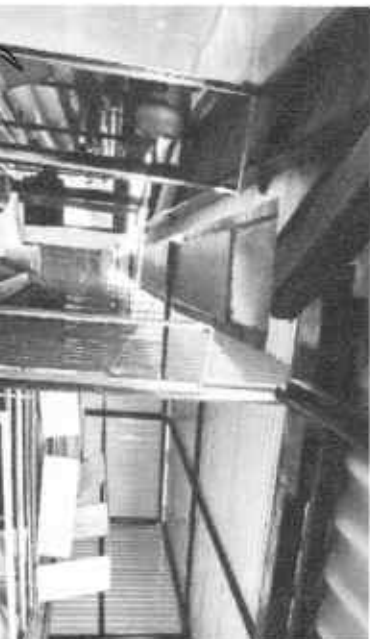

Received

R/1 DANIEL EDUARDO NODIA MARTINEZ

CEIRBA N° 16 F 3 A 33

ING HUGO RICARDO ESPINOZA CARDI

Abstract is the superordinate



MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSION :01

OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCALITARIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLAMEREA EIRPA S.A. E.S.P.


TRANSPORTE

Cargue, transporte y descargue de muebles de oficina, archivo y equipos de oficina maxima 1.5 Km

UNIDAD Y/año

OBJETO	7	
CAPITAL	7	
ITEM	2.1	

LOCALIZACION	Longitud	Ancho	prof	DIMENSIONES		OBSERVACIONES
				CANTIDAD	UNIDAD	
obra de archivo				4.00	und	4.00
obra de archivo				3.00	und	3.00
obra de archivo				3.00	und	3.00
obra de archivo				4.00	und	4.00
obra de archivo				1.00	und	1.00
TOTAL				11.00		

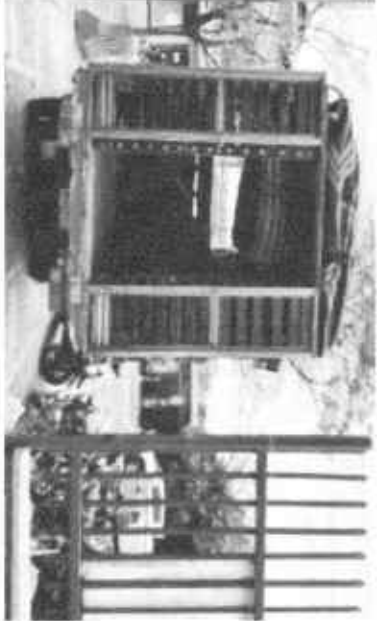

Elaboró

R/A DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ
CEBA M&F S.A.S

Revisó

R/A RICARDO PEDRAZA CABO
Aspinto a la supervisión



MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN :01

OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCALITIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAN S.A. E.S.P.


NO PRECISTOS

Pintura vitilo interior sobre pintura a mano

UNIDAD

m2

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIONES
	Longitud	Anch	Area				
1 piso - Almacén	41.50	2.50	103.75	1.00	m2	103.75	
1 piso - Cuartales	27.00	2.00	54.00	1.00	m2	54.00	
1 piso - SST	11.00	2.50	27.50	1.00	m2	27.50	
2 piso - Cuartales	7.00	2.50	17.50	1.00	m2	17.50	
2 piso - RH	6.17	2.50	15.43	1.00	m2	15.43	
2 piso - Corredor	10.00	2.00	20.00	1.00	m2	20.00	
2 piso - Almacén	11.48	2.50	28.70	1.00	m2	28.70	
2 piso - Almacén	19.27	2.00	38.54	1.00	m2	38.54	
2 piso - Cuartales	15.00	2.50	37.50	1.00	m2	37.50	
2 piso - Cuartales	19.00	2.50	47.50	1.00	m2	47.50	
TOTAL						201.14	

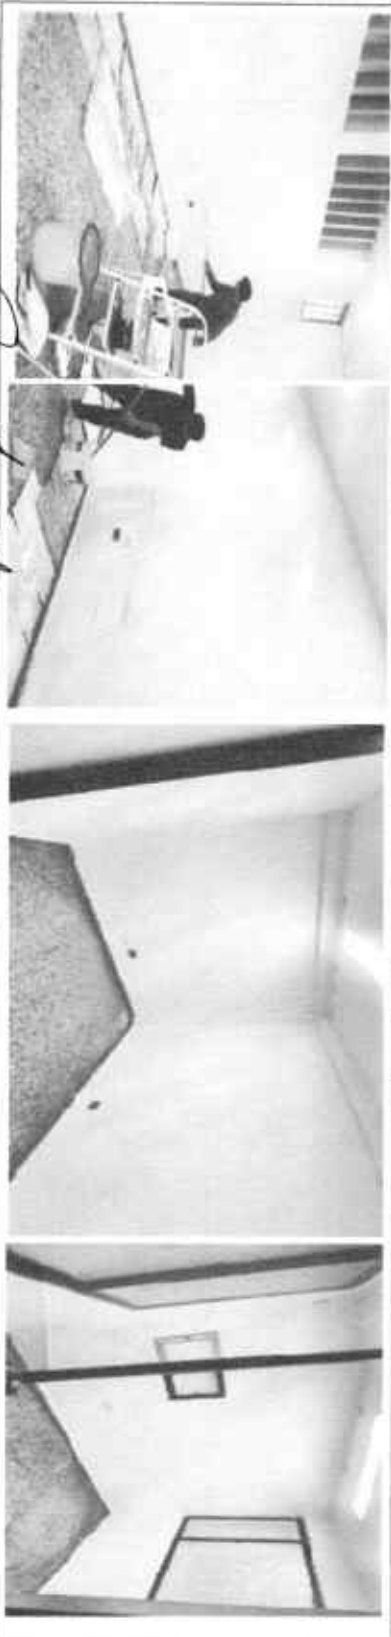

Elaboro

Revisó

WIL DANIEL EDUARDO MORA MARTINEZ

HUGO RICARDO PEDRAZA CAMO

CEBASAS S.A.S

Apoyo a la supervisión




OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLALBA ESPANIA S.A. E.S.P.

NO PREVENTION

Cratichneumon tipu munda elliptica reversibilis - unicolor. Barmenholle a barmen

and	UNEP
-----	------

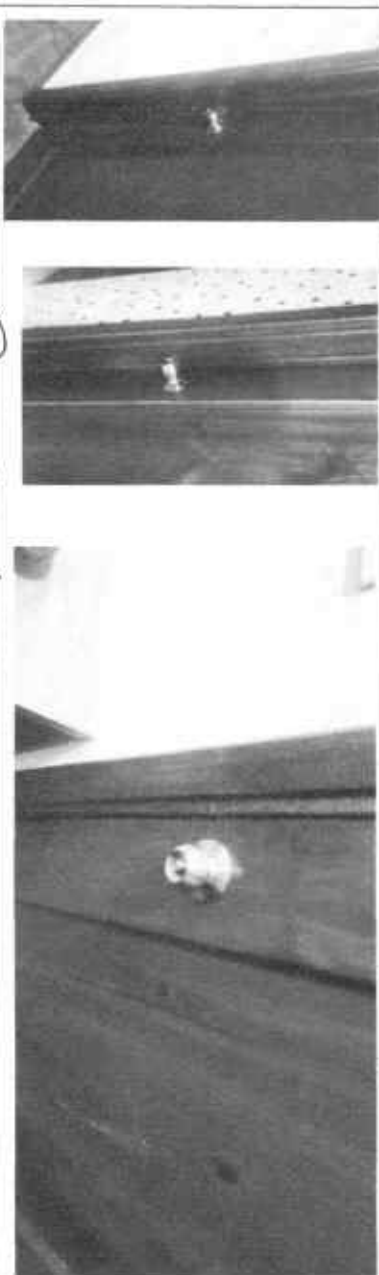[illegible]

References

Apoyo a la superación




OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA ESPAÑA S.A. E.S.P.

NO PRELIMIS

Caracteres de subespecie: *Tringa sagittalis* para entrada principal; *Sturnisto* e *Tringa*

Unit	Unit
------	------

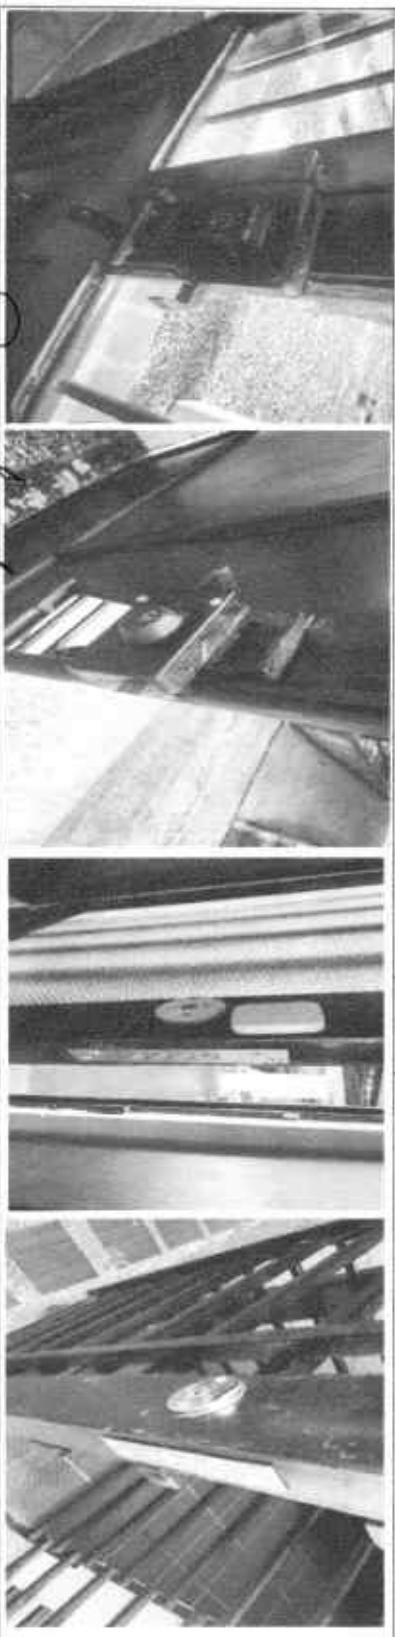[illegible]

Materials

ALVARO A. LA SAPIENZA



MEMORIA DE CANTIDADES E EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSION :01

OBJETO

OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE WILLAMETIA EXIMAV S.A. E.S.P.

CAPITULO

I

NO PRESUPOSTO

ITEM

8.4

Construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con barandas de parrillas (chilipi) pintadas, colocación de superficies, construcción de rampa, instalación de barandas metálicas.

UNIDAD

ml

LOCALIZACIÓN

DIMENSIONES

Longitud

Alto

Area

CANTIDAD

UNIDAD

TOTAL
ACUMULADO

OBSERVACIONES

QUEDAR DE ACERVO

1.00

UNID

1.00

TOTAL

1.00



Elaboró

R/A DANIEL EDUARDO MORA MARTÍNEZ

CEIBA M&F S.A.S

Revisó

ING. HUGO RICARDO PEDRAZA CHAO

Aprobó a la supervisión



NO PREVENTION

instalación de agua mediante con material utilizado (marco de obra)
bolsa de cemento, con la que, ensamblo e instalación de vigas metálicas utilizando material suministrado por la entidad (utilizando) aceites y lubricantes necesarios

Review


THE HUGO RICARDO MEDRANZA CARO
Apoteosis e superación



OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLAMUEVA ESPANIA S.A. E.S.P.

NO PREVIOUS

NO PREPUESTOS									
CANTIDAD	1	Servicio e instalación de sistema eléctrico para una acedificación y peticionarios, incluyendo trabajo de distribución, comprando la ejecución de cable (5) cables en 220 V con conductor calibre No. 10, una (1) salida exterior en conductor No. 12 suministrado e instalado de salida de subpropietario de este (5) circuitos con trabajo principal de 70 A y breakers derivados de 50 A y 40 A.						UNIDAD	and
ITEM	0.6								
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					TOTAL		OBSERVACIONES
		Longitud	alta	Area	CANTIDAD	UNIDAD	ACUMULADO		
Cost electrica					1.20	m	1.20		

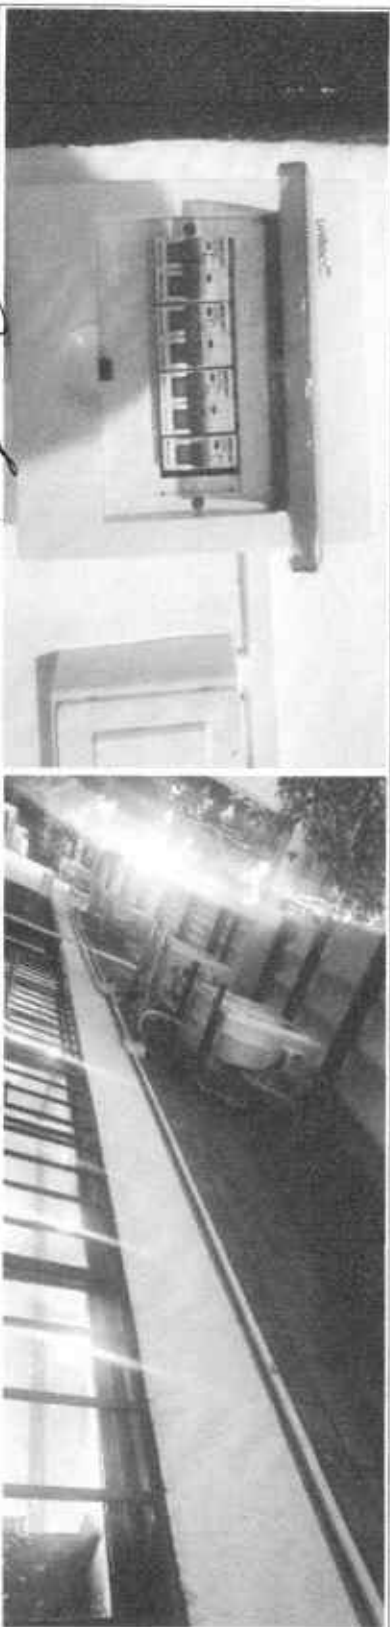

References

THE MUSEO NICARAGUO PEDRERAZA CARD

Appoggio a la supervisione

Pago de FIC

		INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	
NIT 901497596-9		CEIBA M&F S.A.S	

Recado exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7887514

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido

caso contrario debe volver a realizarse liquidación y

generar un nuevo cupón

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

REFERENCIA
No. 164772347

FECHA DE EXPIRACIÓN

25 06 2026

FECHA VENCIMIENTO

30 06 2026

NIT o C.C. 901497596

Teléfono +57,3213103923

Nombre Pagador CEIBA M&F

Dirección CARRERA 7 # 7-

Casanare

3-2-07-1-02-1-04-43

Pago Ordinario - FIC

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.



SUBTOTAL

\$ 223,350.00

IVA

\$ 223,350.00

TOTAL
FACTURA

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENa escribanos al correo certapades@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7887514(3900)00000223350(96)20260630

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 164772347

Código

NIT

901497596

Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente

CEIBA M&F

Cheque No.

Cuenta No.

Concepto

Valor

TOTAL

CHEQUE

EFECTIVO

CANTIDAD
DE CHEQUES

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior
Por el total indicado en la misma. El Banco solo ampara el efectivo indicado en el
original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes
necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación
hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean correctos.

Recauda exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7887514

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado en caso contrario debe volver a realizarse la liquidación y generar un nuevo cupón

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

REFERENCIA
No. 164772347

FECHA DE EXPEDICIÓN
25 06 2026
FECHA VENCIMIENTO
30 06 2026

NIT o C.C. 901497596

Teléfono +57,3213103923

Nombre Pagador CEIBA M&F

Dirección CARRERA 7 # 7-

DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC			
3-2-07-1-02-1-04-43			
Casanare			
SENA			
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.			
		SUBTOTAL	\$ 223,350.00
		IVA	
		TOTAL	\$ 223,350.00
		FACTURA	

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Garantía.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de garantía).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escríbanos al correo certifiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7887514(3900)00000223350(96)20260630

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 164772347

Código NIT 901497596 Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente CEIBA M&F

Bo	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
----	------------	------------	----------	-------

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
---------------------	-----------	--------	-------

Las cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior
Por el total indicado en la misma. El Banco solo empareja el efectivo indicado en el
original de la consignación. Si hubiera errores o faltantes, el Banco hará los ajustes
necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación
hecho en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes

MIL SESENTA Y TRES

El personal bancario no debe
ocuparse por realizar esta transacción.

Póliza actualizada

		INFORME OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.	CEIBA M&F S.A.S
NIT 901497596- 9			



NIT 960.009.878-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION		SUCURSAL		COD. SOC.		NO. POLIZA		ANEXO	
YOPAL		AGENCIA YOPAL		57		57-47-101002903		ANEXO	
FECHA EXPEDICION		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		HORAS		TPO MOVIMIENTO	
24	06	2026	17	03	2026	00:00	21:59	ANEXO NO CAUSA PRIMARIA	

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CEIBA MAR S.A.S		IDENTIFICACION		NIT: 901.497.996-5	
DIRECCION: CARRETERA 7 NO. 6-35		CIUDAD: VILLANUEVA CASANARE		TELEFONO: 521310021			

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P.		IDENTIFICACION NIT: 900.962.261-4	
DIRECCION: CARRETERA 13 N DE 24		CIUDAD: VILLA NUEVA CASANARE		TELEFONO: 6241310	

ADICIONAL:					
------------	--	--	--	--	--

TEXTO ALFABETICO					
------------------	--	--	--	--	--

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL MISMO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRETERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 310210100 - YOPAL



57-47-101002903

57-47-101002903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Osorio - Representante de Empresa

FIRMA: TOMADOR

DAYANAMARTIN



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

IDENTIFICACION INT: 901.087.596-9	CEIBA MAF S.A.S.	MONTEBARRIO D. PABON
-----------------------------------	------------------	----------------------

DIRECCION CARRETA 7 NO. 6-35	Ciudad	VILLA NUEVA, CASAPARE	TELÉFONO 5713103923
------------------------------	--------	-----------------------	---------------------

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. S.P.	IDENTIFICACION NIT: 900.262.261-4
--	-----------------------------------

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

MOLE FRACTION OF WATER	MOLE FRACTION OF ETHYLENE GLYCOL	WATER VAPOR PRESSURE	ETHYLENE GLYCOL VAPOR PRESSURE
0.0	1.0	17.54	0.00
0.1	0.9	15.50	0.00
0.2	0.8	13.72	0.00
0.3	0.7	12.21	0.00
0.4	0.6	10.90	0.00
0.5	0.5	9.81	0.00
0.6	0.4	8.94	0.00
0.7	0.3	8.28	0.00
0.8	0.2	7.80	0.00
0.9	0.1	7.47	0.00
1.0	0.0	7.19	0.00

DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
17/03/2020	21:05:20Z	STX 600 041.75	STX 600 041.75
17/03/2020	21:05:20Z	STX 600 041.75	STX 600 041.75
17/03/2020	21:05:20Z	STX 600 041.75	STX 600 041.75

[illegible]

ACTIVACIONES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PLANO DE SAUDE	VALOR RESCATE TOTAL	VALOR RESCATE	VALOR RESCATE	VALOR RESCATE	VALOR RESCATE
----------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH
---------------	---------------


07-001	07-002	07-003	07-004	07-005	07-006	07-007	07-008	07-009	07-010	07-011	07-012	07-013	07-014	07-015	07-016	07-017	07-018	07-019	07-020	07-021	07-022	07-023	07-024	07-025	07-026	07-027	07-028	07-029	07-030	07-031	07-032	07-033	07-034	07-035	07-036	07-037	07-038	07-039	07-040	07-041	07-042	07-043	07-044	07-045	07-046	07-047	07-048	07-049	07-050	07-051	07-052	07-053	07-054	07-055	07-056	07-057	07-058	07-059	07-060	07-061	07-062	07-063	07-064	07-065	07-066	07-067	07-068	07-069	07-070	07-071	07-072	07-073	07-074	07-075	07-076	07-077	07-078	07-079	07-080	07-081	07-082	07-083	07-084	07-085	07-086	07-087	07-088	07-089	07-090	07-091	07-092	07-093	07-094	07-095	07-096	07-097	07-098	07-099	07-100	07-101	07-102	07-103	07-104	07-105	07-106	07-107	07-108	07-109	07-110	07-111	07-112	07-113	07-114	07-115	07-116	07-117	07-118	07-119	07-120	07-121	07-122	07-123	07-124	07-125	07-126	07-127	07-128	07-129	07-130	07-131	07-132	07-133	07-134	07-135	07-136	07-137	07-138	07-139	07-140	07-141	07-142	07-143	07-144	07-145	07-146	07-147	07-148	07-149	07-150	07-151	07-152	07-153	07-154	07-155	07-156	07-157	07-158	07-159	07-160	07-161	07-162	07-163	07-164	07-165	07-166	07-167	07-168	07-169	07-170	07-171	07-172	07-173	07-174	07-175	07-176	07-177	07-178	07-179	07-180	07-181	07-182	07-183	07-184	07-185	07-186	07-187	07-188	07-189	07-190	07-191	07-192	07-193	07-194	07-195	07-196	07-197	07-198	07-199	07-200	07-201	07-202	07-203	07-204	07-205	07-206	07-207	07-208	07-209	07-210	07-211	07-212	07-213	07-214	07-215	07-216	07-217	07-218	07-219	07-220	07-221	07-222	07-223	07-224	07-225	07-226	07-227	07-228	07-229	07-230	07-231	07-232	07-233	07-234	07-235	07-236	07-237	07-238	07-239	07-240	07-241	07-242	07-243	07-244	07-245	07-246	07-247	07-248	07-249	07-250	07-251	07-252	07-253	07-254	07-255	07-256	07-257	07-258	07-259	07-260	07-261	07-262	07-263	07-264	07-265	07-266	07-267	07-268	07-269	07-270	07-271	07-272	07-273	07-274	07-275	07-276	07-277	07-278	07-279	07-280	07-281	07-282	07-283	07-284	07-285	07-286	07-287	07-288	07-289	07-290	07-291	07-292	07-293	07-294	07-295	07-296	07-297	07-298	07-299	07-300	07-301	07-302	07-303	07-304	07-305	07-306	07-307	07-308	07-309	07-310	07-311	07-312	07-313	07-314	07-315	07-316	07-317	07-318	07-319	07-320	07-321	07-322	07-323	07-324	07-325	07-326	07-327	07-328	07-329	07-330	07-331	07-332	07-333	07-334	07-335	07-336	07-337	07-338	07-339	07-340	07-34
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.R. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DEL AÑO

1074-REGIÕES DE ESTUDO E DE PESQUISA

OLTA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

[Handwritten signature]



Usp. 2

100-443887-100

© 2000 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher is prohibited. This publication may be reproduced for classroom use only. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.
