

Bitácora de Obra

Contratista: V & M Ingeniería SAS
Contrato: IECU N. 1596 de 2023

Objeto: "Mantenimiento rutinario para corredores viales no concesionados con caseta de recuado en el departamento de Cundinamarca".

Tranquil: Guavio
Plazo: 11 meses

Interventoría: QS Vías y estructuras. SAS.
Contrato: 1608 del 2023

9 de febrero de 2026

Inicio de Jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

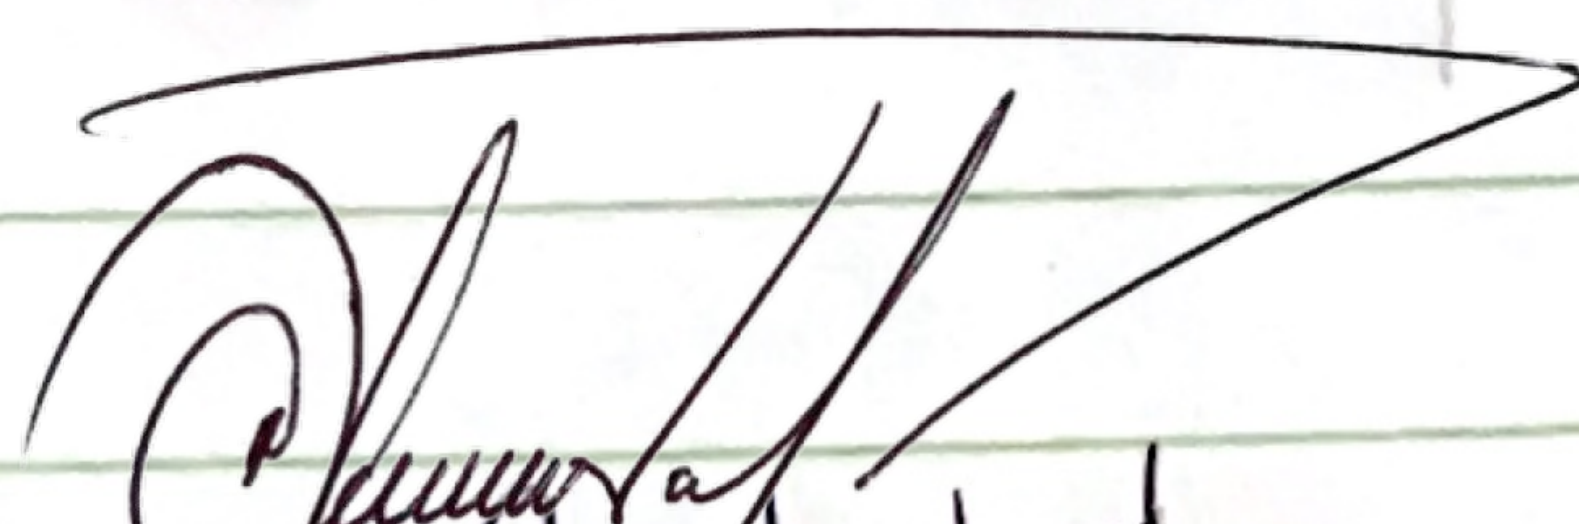
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 Barreras y herramienta menor.

Personal de Interventoria : Inspector,

Personal del contratista : 12 trabajadores

Actividades : Mantenimiento del corredor quavio continuando en el PR00+000 al PR03+200

Fin de la jornada : 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

10 de Febrero de 2026

Inicio de Jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

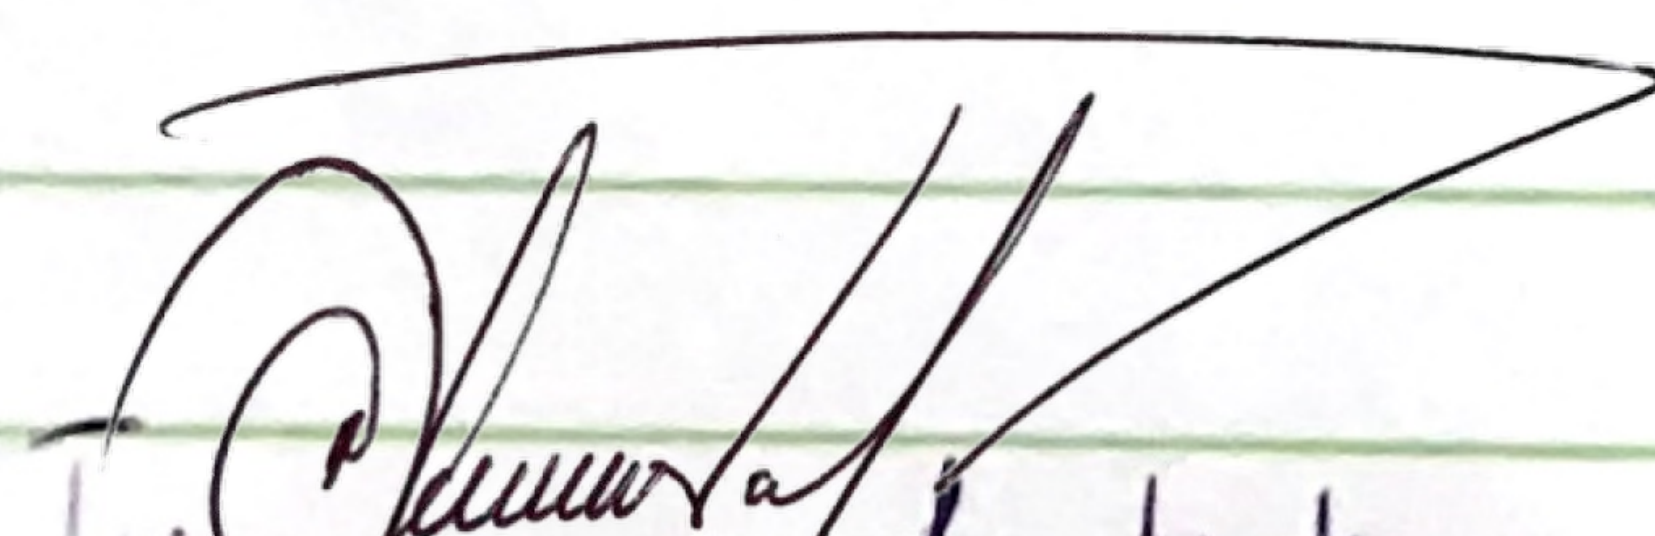
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 Barreras y herramienta menor.

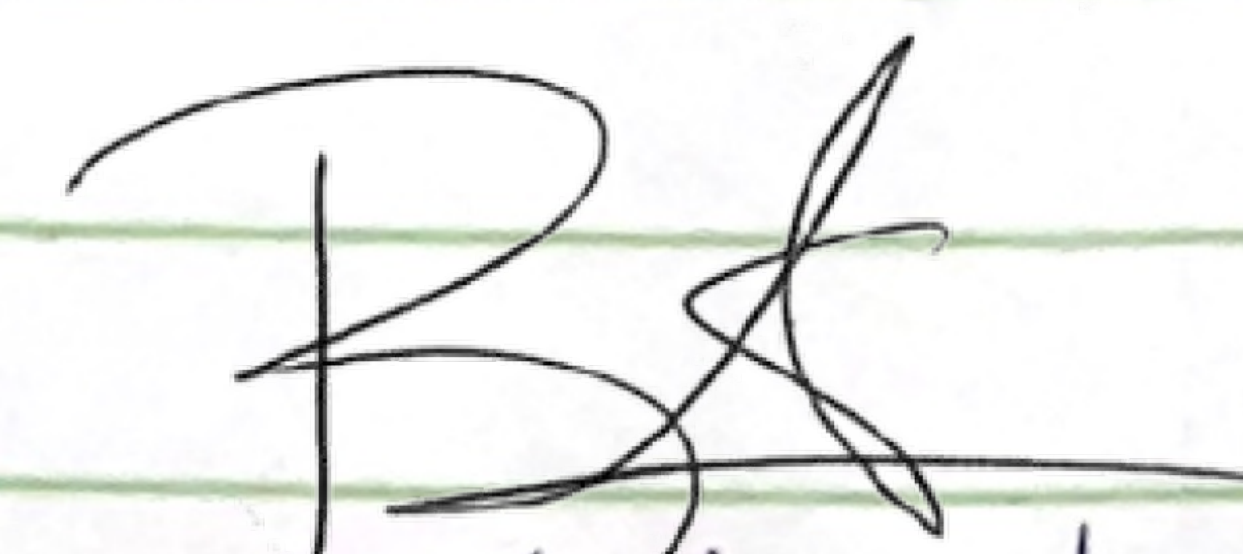
Personal de Interventoria : Inspector, ingeniero auxiliar y residente de obra.

Personal del contratista : 12 trabajadores

Actividades : Mantenimiento del corredor Quavio continuando en el PR03+200 al PR06+400

Fin de la jornada : 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

11 de Febrero de 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Llovizna 2 horas

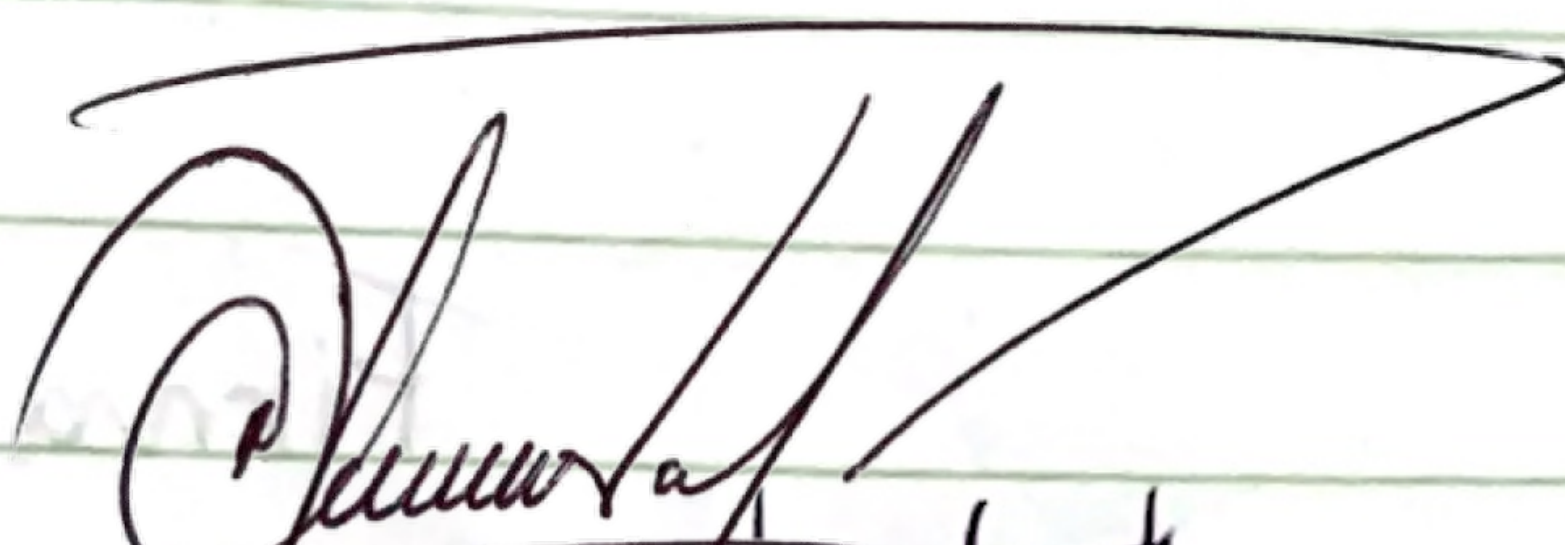
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

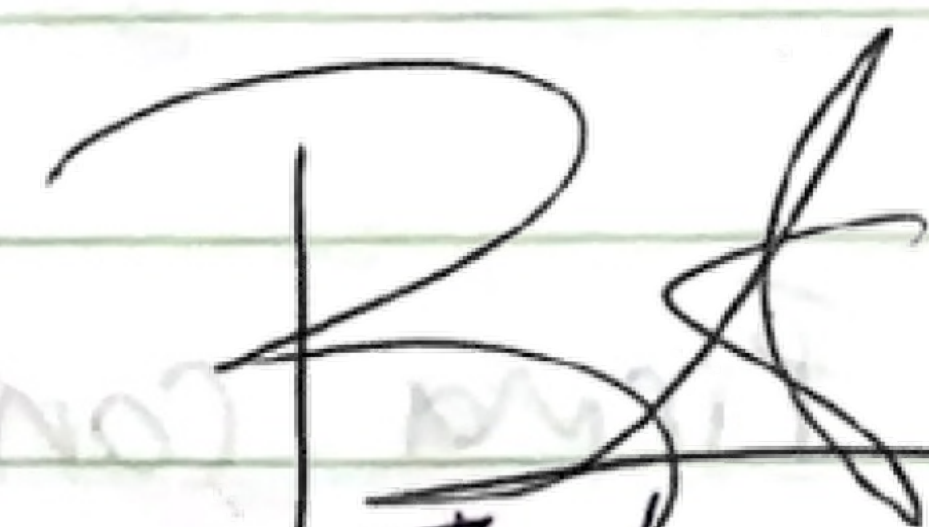
Personal de interventoria: Inspector

Personal del contratista: 12 trabajadores

Actividades: Mantenimiento del corredor Quavio continuando en el PR 08+400 al PR 08+600

Fin de la jornada: 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor.

12 de Febrero de 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

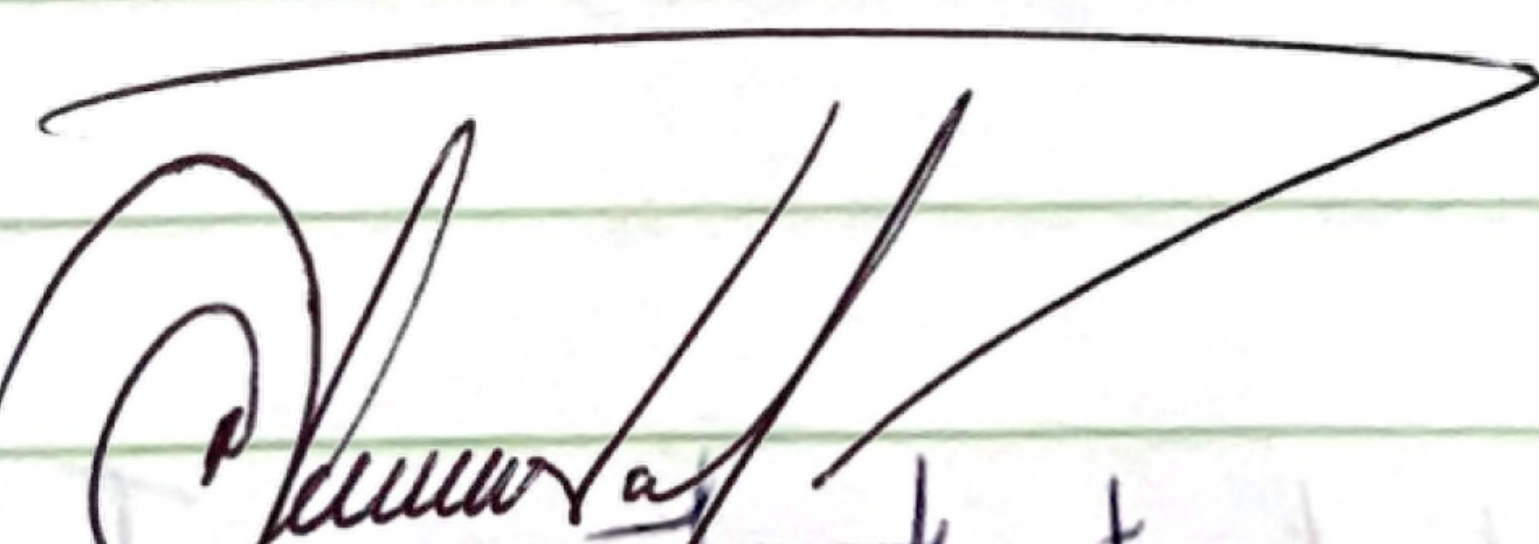
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

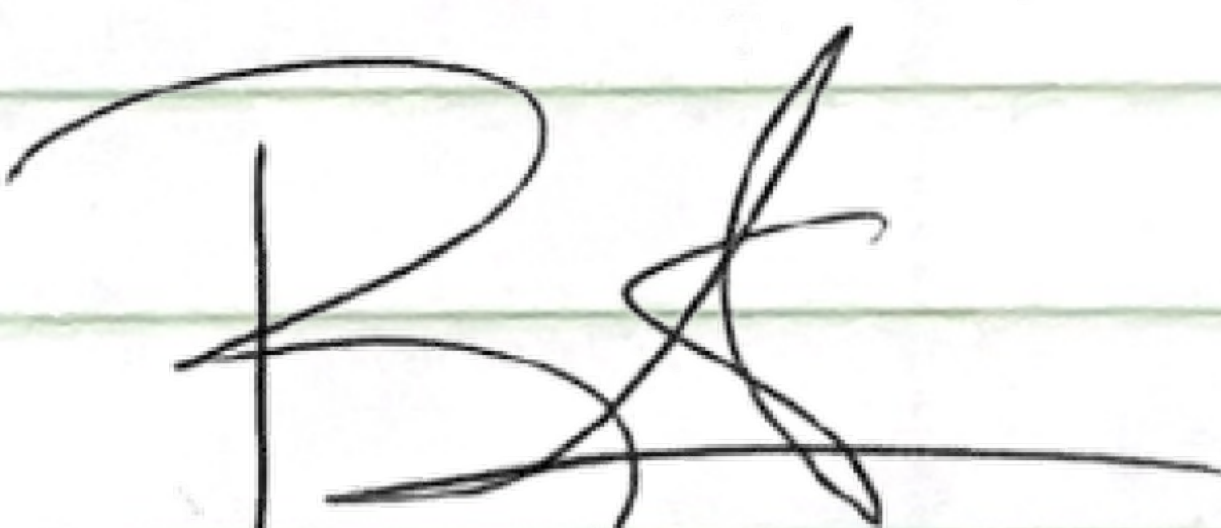
Personal de interventoria: Inspector.

Personal del contratista: 12 Trabajadores.

Actividades: Mantenimiento del corredor Quavio continuando en el PR 08+600 al PR 10+800

Fin de la jornada:


Firma Contratista


Firma Interventor

13 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Llovizna 2 horas

Equipos: 6 guadañas, 1 Soplador, 2 Barreras y herramienta menor.

Personal de Interventoria: Inspector

Personal del contratista: 12 trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del Corredor Guavio continuando en el PR 10+800 al PR 14+900.

Fin de la jornada 5:00 pm

Firma Contratista

Firma Interventor

14 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 Barreras y herramienta menor.

Personal de Interventoria: Inspector.

Personal del Contratista: 12 trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del Corredor Guavio continuando en el PR: 14+900 al PR: 17+980.

Fin de la jornada: 12:00 pm.

Firma Contratista

Firma Interventor.

16 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

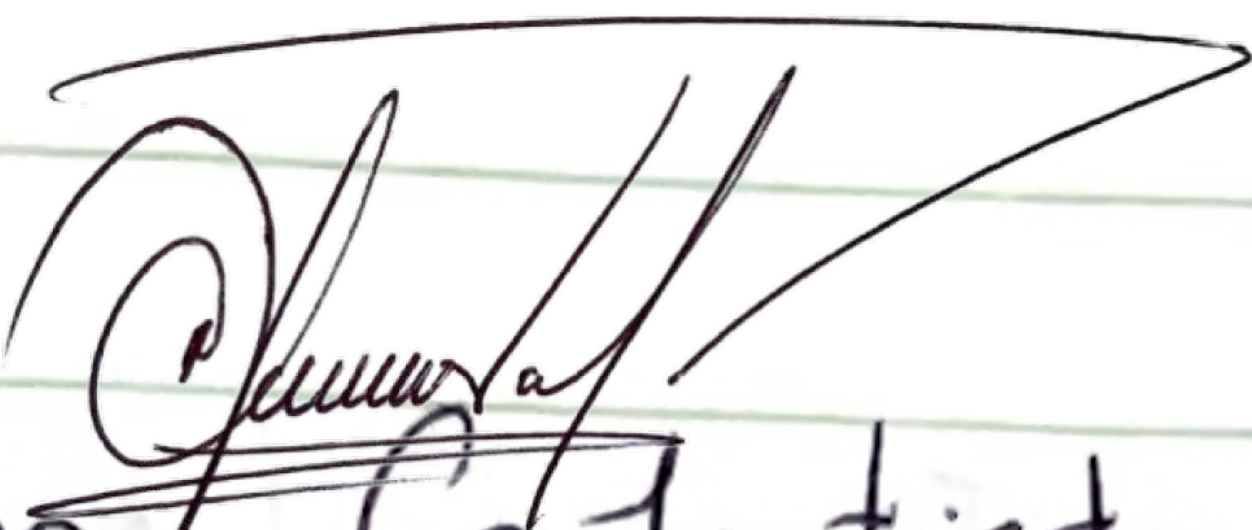
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

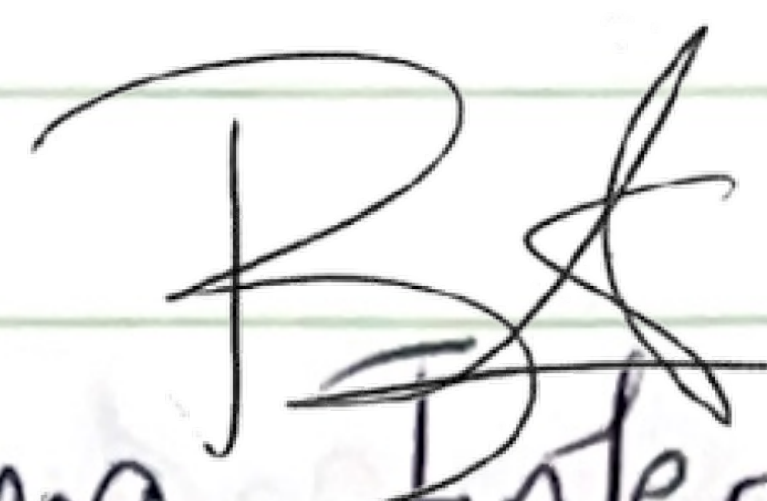
Personal de Interventoria: Inspector

Personal del contratista: 12 trabajadores

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PR 17+980 al PR 21+180.

Fin de la jornada: 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

17 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

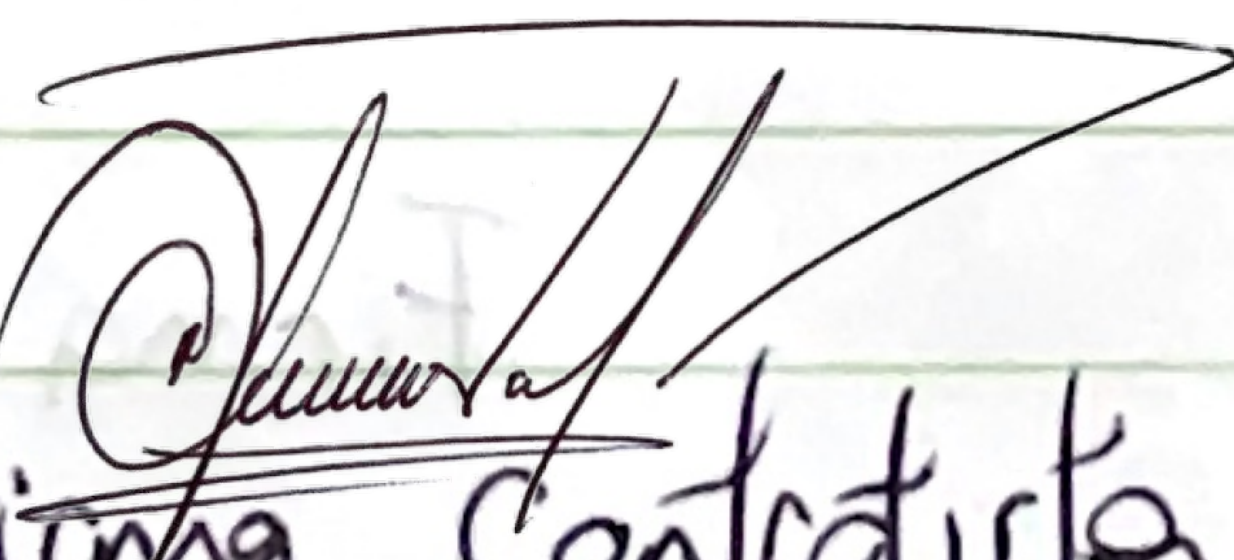
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

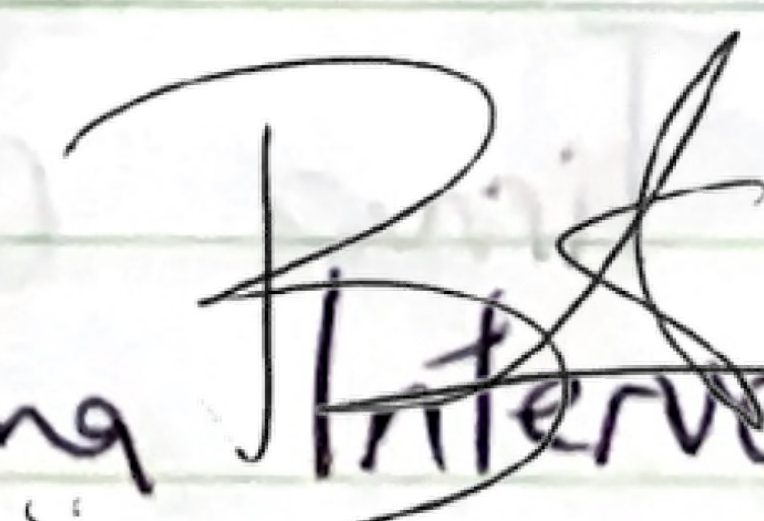
Personal de Interventoria: Inspector, Ingeniero Auxiliar y residente de obra.

Personal del contratista: 12 trabajadores

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PR 21+180 al PR 24+380

Fin de la jornada: 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

18 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada : 7:00 am

Clima: Soleado

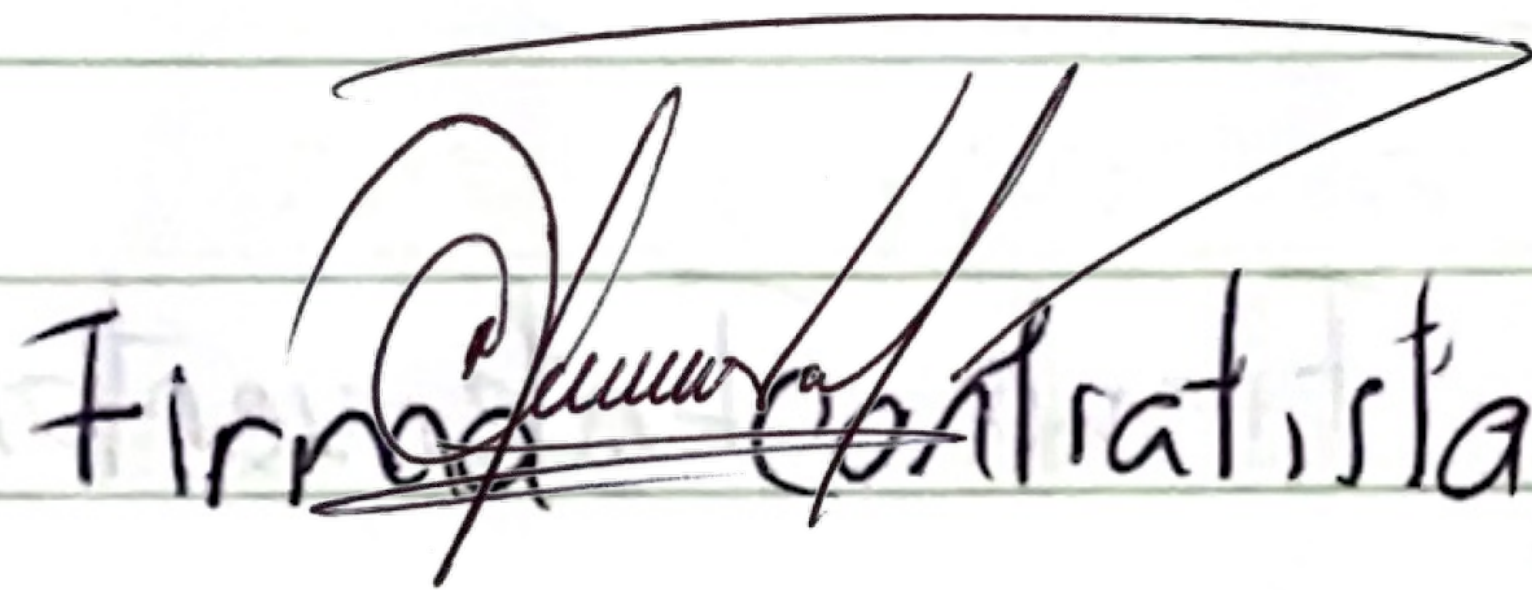
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

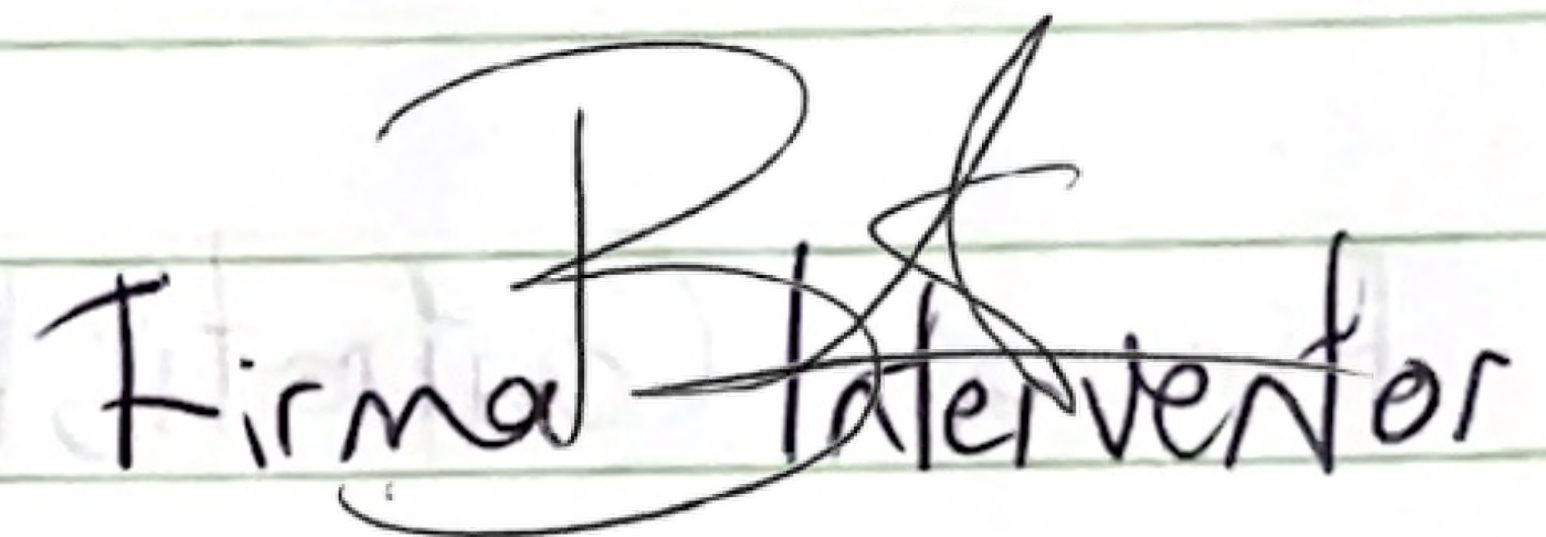
Personal de interventoria: Inspector

Personal del contratista: 12 trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PR 24+380 al PR 27+580.

Fin de la jornada 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

19 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada : 7:00 am

Clima: Soleado

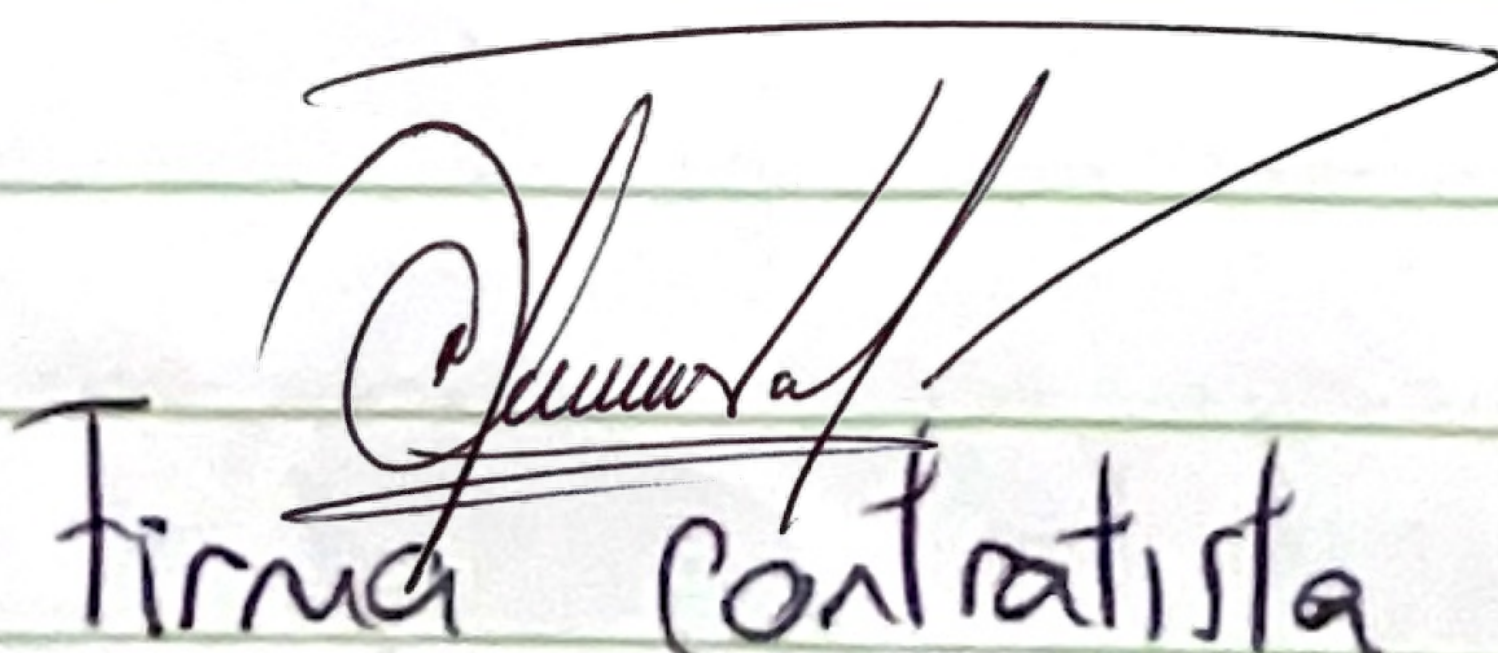
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

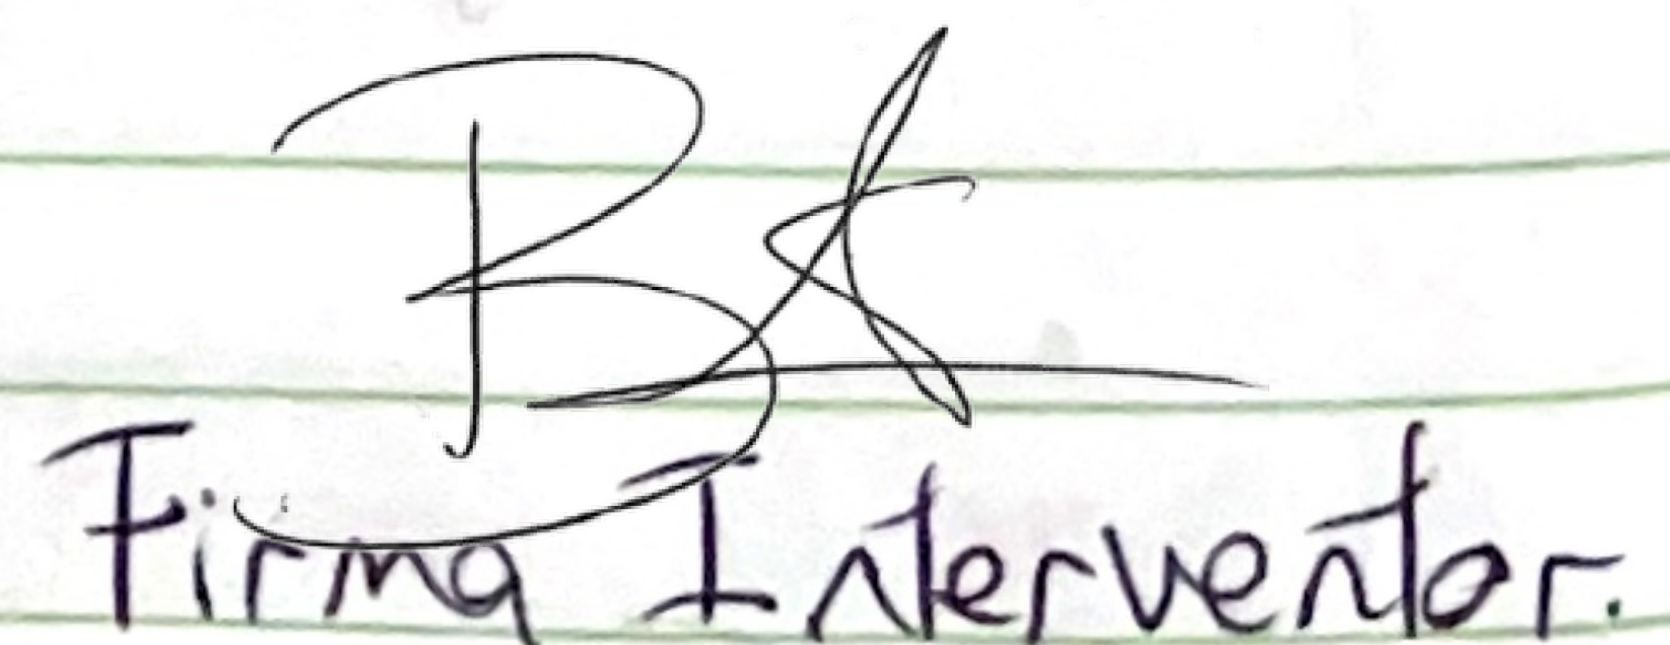
Personal de interventoria: Inspector.

Personal del contratista: 12 trabajadores

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PR 27+580 al PR 30+780.

Fin de la jornada : 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor.

20 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

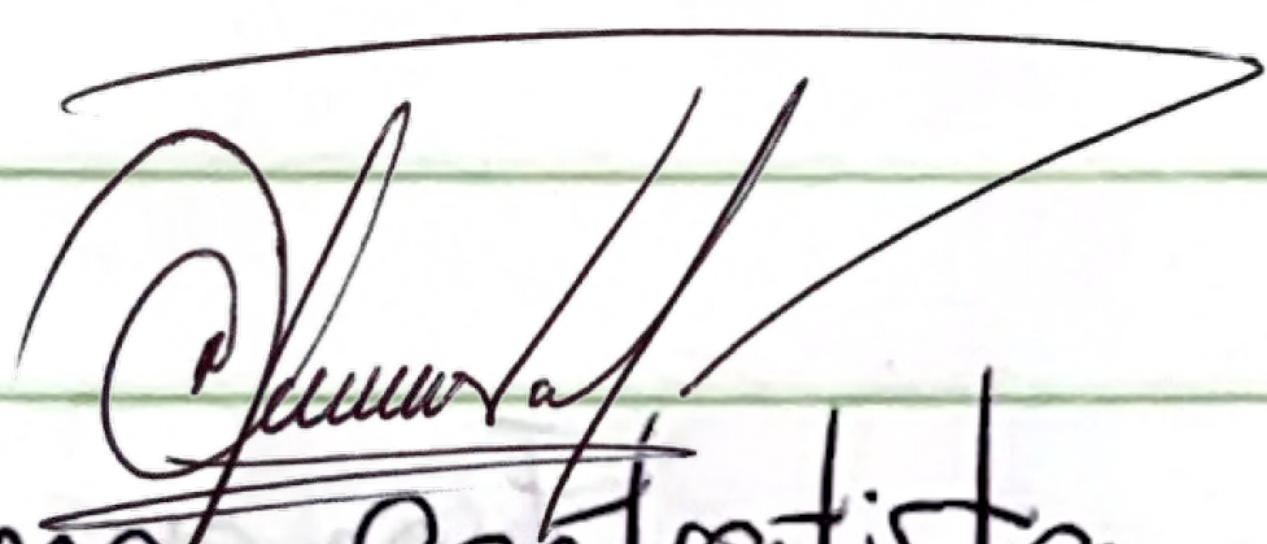
Equipos : 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

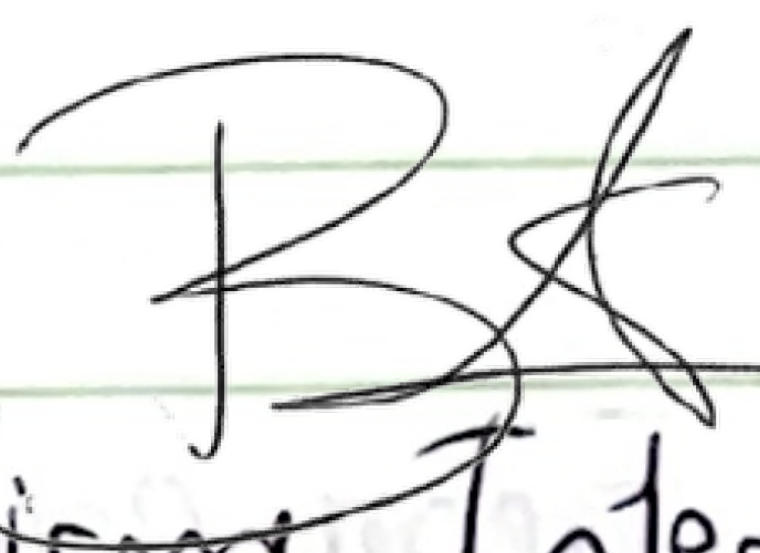
Personal de interventoria : Inspector.

Personal del contratista : 12 trabajadores.

Actividades : Mantenimiento rutinario del corredor Quavio Continuo en el PR 30+780 al PR 33+980.

Fin de la jornada 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

21 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

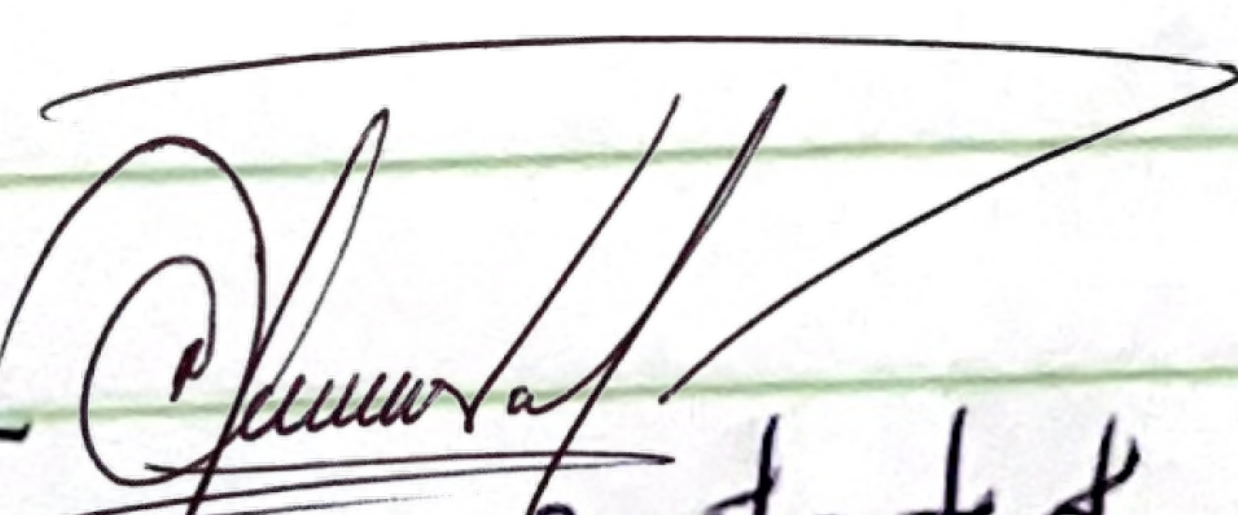
Equipos : 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

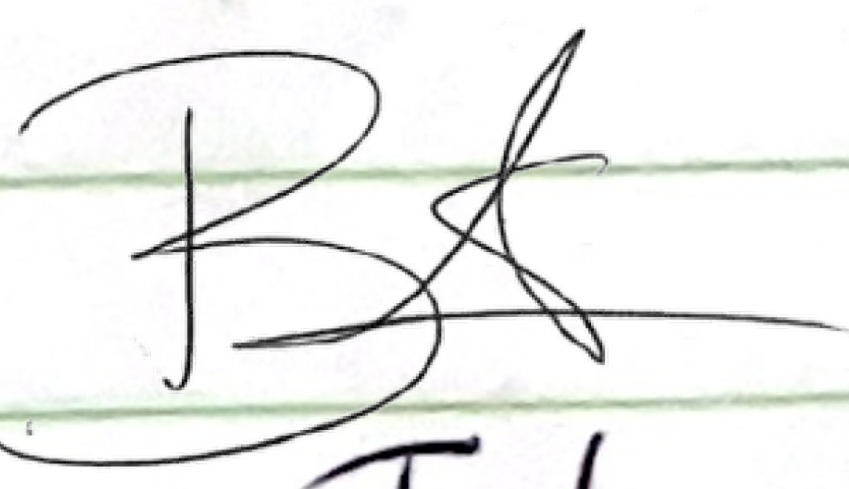
Personal de Interventoria : Inspector.

Personal del Contratista : 12 trabajadores.

Actividades : Mantenimiento rutinario del corredor Quavio Continuo en el PR 30+780 al PR 35+960.

Fin de la jornada : 12:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor.

23 de Febrero del 2026

Inicio de la Jornada: 7:00 am

Clima: Dloviznas 2 horas

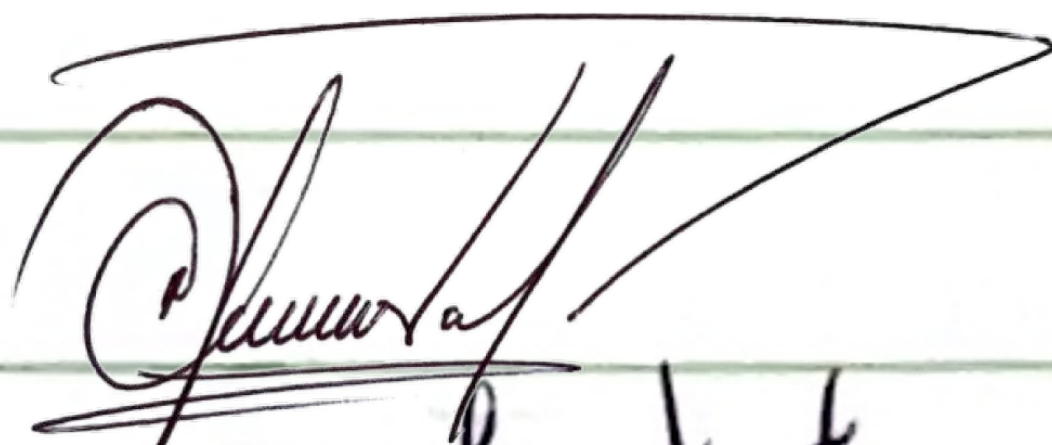
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

Personal de interventoría: Inspector

Personal del contratista: 12 trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio Continuando en el PR 35+960 al PR 38+960.

Fin de la jornada 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor.

24 de Febrero del 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

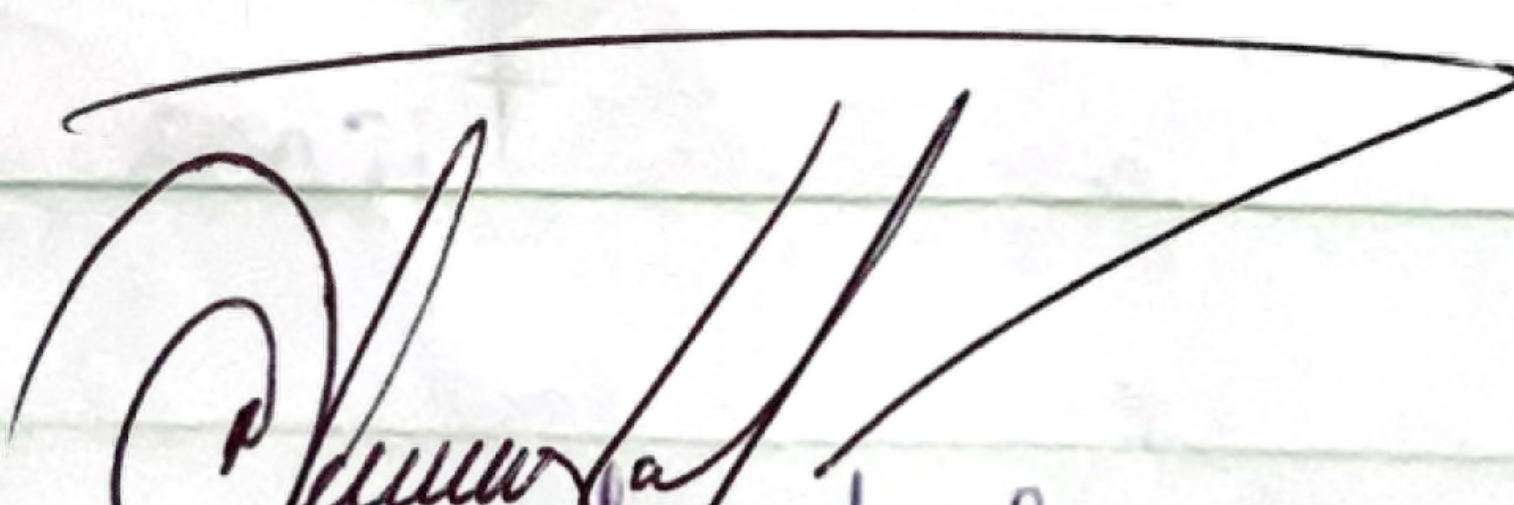
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

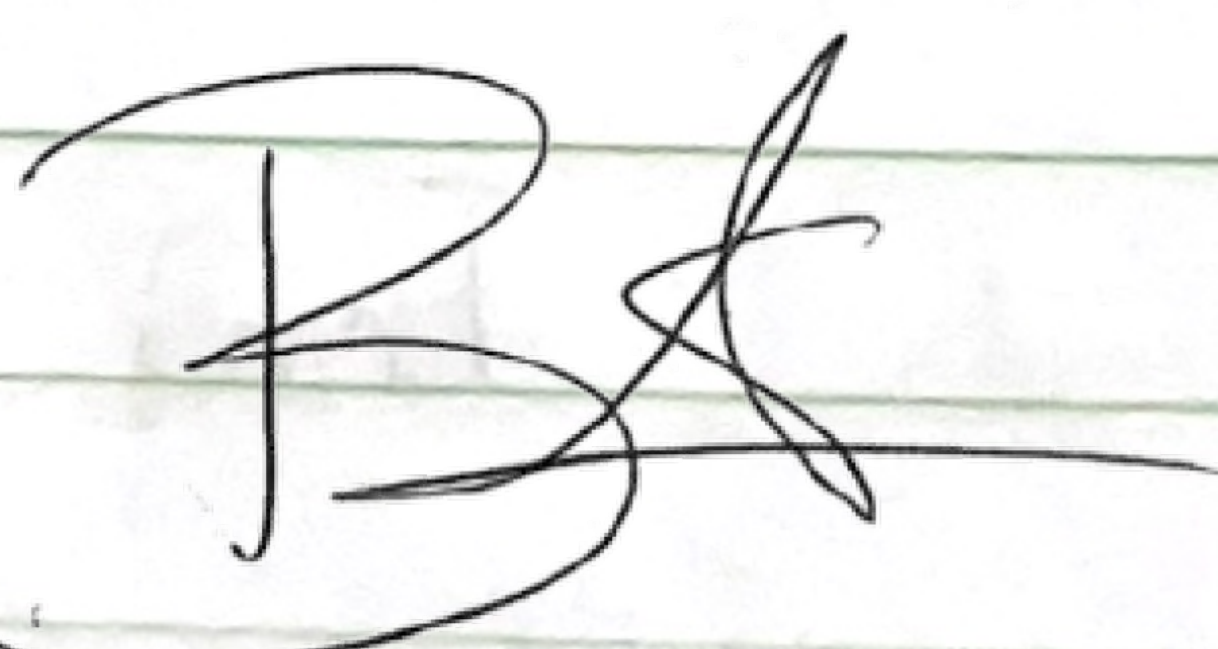
Personal de interventoría: Inspector, ingeniero auxiliar, y residente de obra.

Personal del contratista: 12 trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio Continuando en el PR 38+960 al PR 40+960.

Fin de la jornada: 5:00 pm.


Firma Contratista


Firma Interventor

25 de Febrero del 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

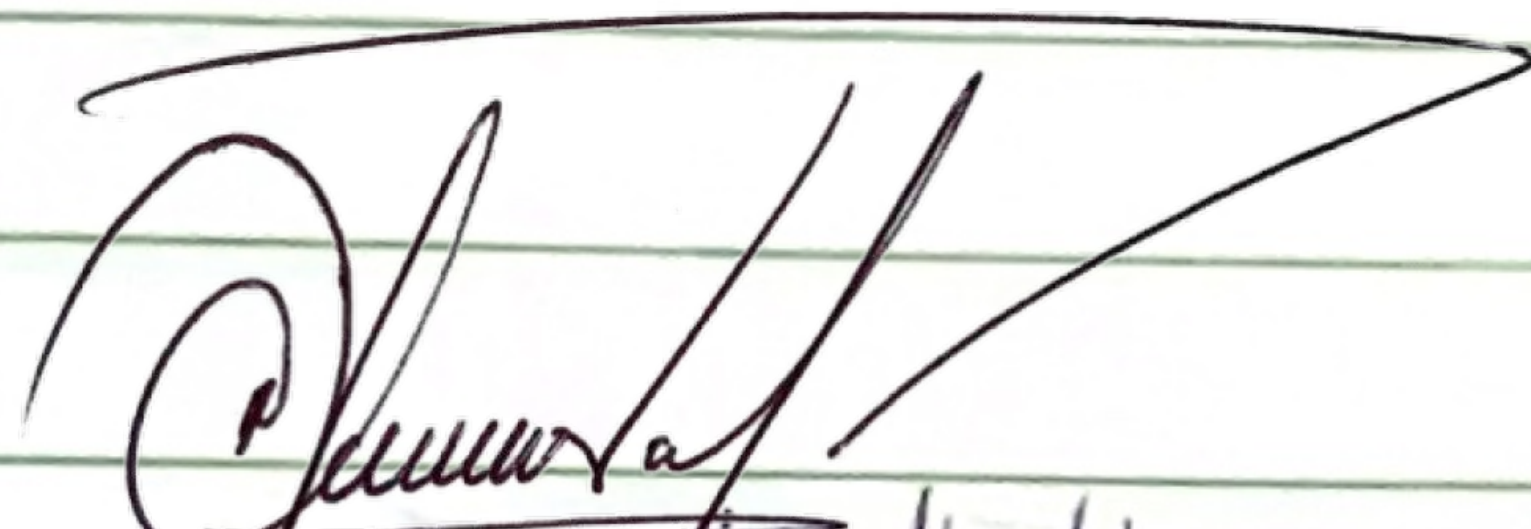
Equipos: 6 guadañas, 1 Soplador, 2 Barreras y herramienta menor.

Personal de interventoría: Inspector.

Personal del contratista: 12 Trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PR 40+960 al PR 44+960.

Fin de la jornada: 5:00 pm

Firma  Contratista

Firma  Interventor

26 de Febrero de 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor

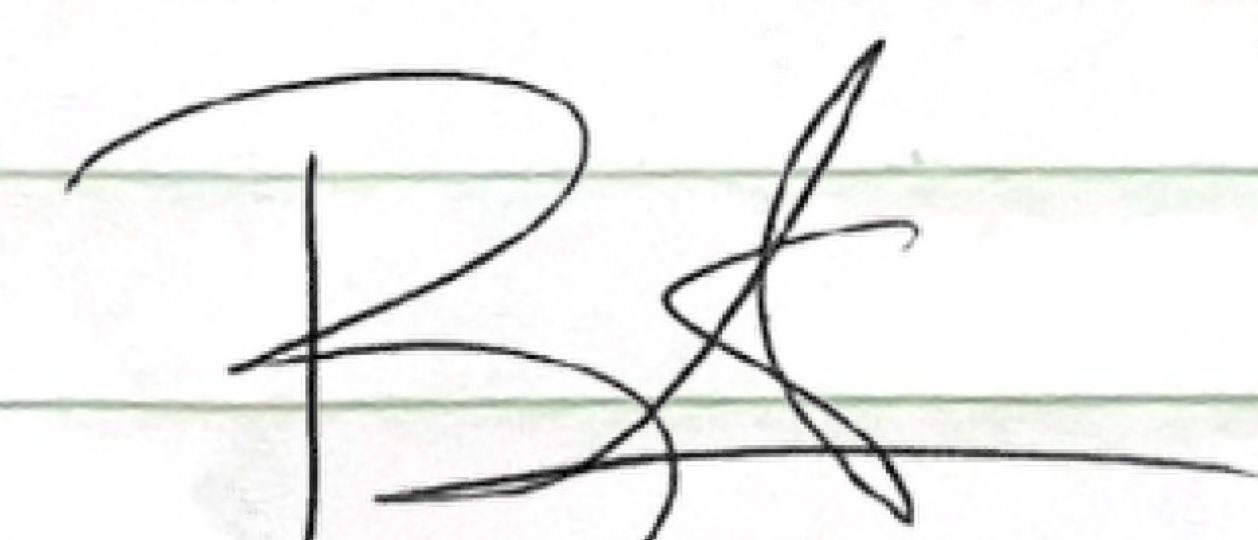
Personal de interventoría: Inspector

Personal del contratista: 12 trabajadores

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PR 44+960 al PR 47+960.

Fin de la jornada: 5:00 pm

Firma  Contratista

Firma  Interventor.

27 de febrero 2026

Inicio de la jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

Personal de interventoria: Inspector

Personal del Contratista: 12 trabajadores

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PK 47+960 al PK 50+960.

Fin de la jornada: 5:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor

28 de Febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

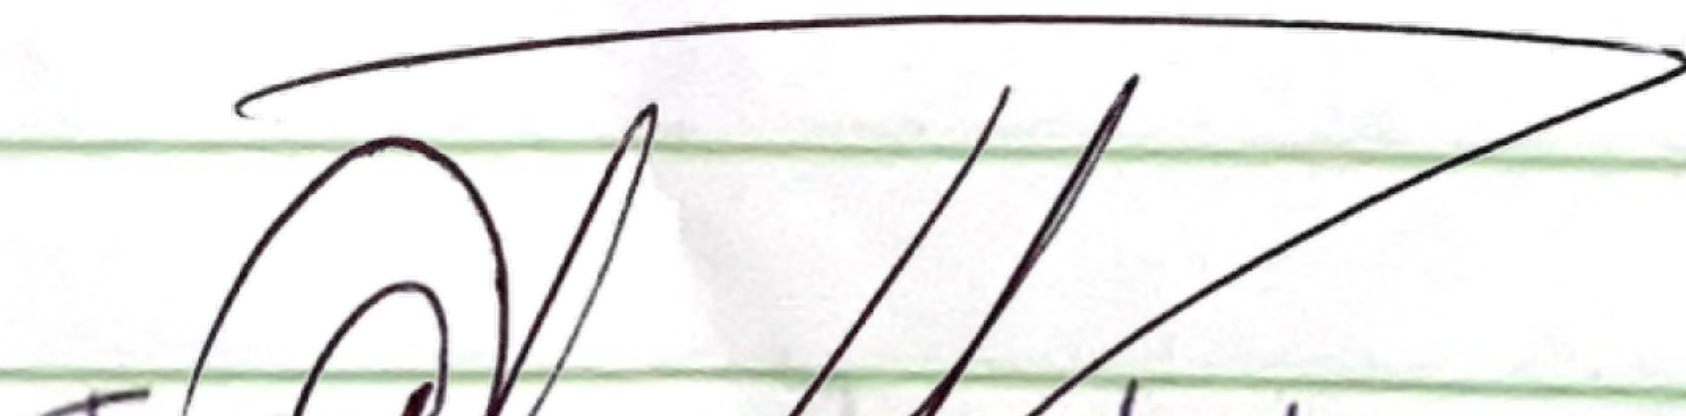
Equipos: 6 guadañas, 1 soplador, 2 barreras y herramienta menor.

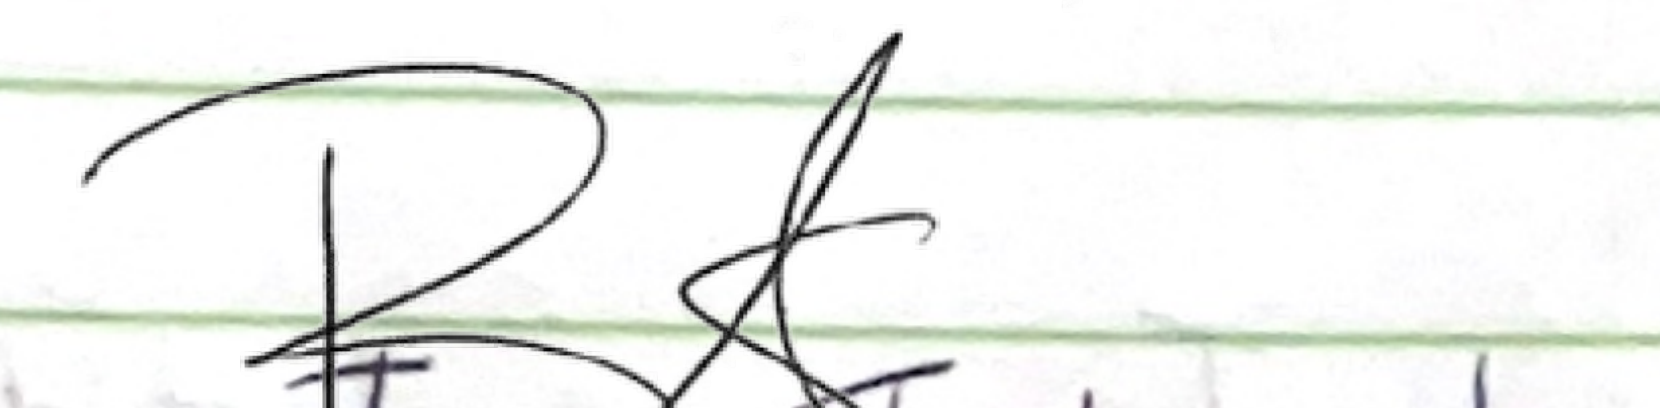
Personal de interventoria: Inspector.

Personal del contratista: 12 trabajadores.

Actividades: Mantenimiento rutinario del corredor Quavio continuando en el PK 50+960 al PK 53+950.

Fin de la jornada: 12:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventor
