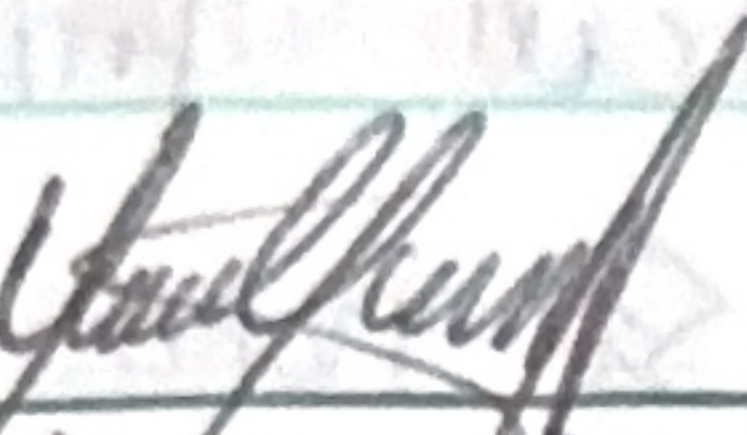


operativo: 1 Oficial, 1 Auxiliar, 1 Soldador

Se realiza la fabricacion de los anclajes de las columnas y el replanteo de los mismos para la losa de cimentacion del shut de basura.


Residente de obra

RP.

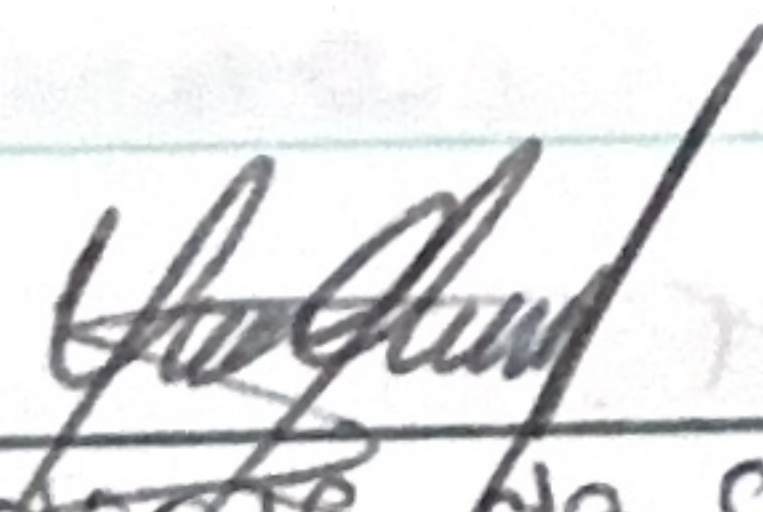
31 de Marzo de 2026

Clima: Nublado

Administrativo: 1 Residente, 1 SST

operativo: 1 Soldador, 1 Oficial, 1 Auxiliar

Se continua con la colocacion y replanteo de los anclajes para la losa de cimentacion del shut de basura y apoyos del perguonadero de METOS.


Residente de obra

RP.

1 de Abril de 2026. (Herrero)

Clima: Nublado.

Administrativo: (1) Residente, (1) SST

OPERATIVOS: (1) MAESTRO, (1) OFICIAL, (3) AYUDANTES, 3 ELECTRICISTAS.
 SE REALIZA FUNDIDA DE PLACA CONCRETO DE 3000 PSI PRETENSADO. INICIANDO ACTIVIDADES A LAS 11:48 AM. Y FINALIZANDO A LAS 12:52 PM. DEL MISMO MATERIAL SE OBTIENE MUECUN PARA FUNDIR DADOS EN ZONA PARQUEADERO. SE TOMAN MUESTRAS EN HORAS DE LA TARDE Y DESARROLLO DE HORARIO NOCHE SE INICIA ACTIVIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS PERIMETRA, CON LA INSTALACION DE TUBERIA FUT, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS.
 SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PARQUEADERO DE VEHICULOS, INSTALACION DE CORREAS.

02 DE ABRIL DE 2026. (JUEVES).

CLIMA: NUBADO. PARCIALMENTE

ADMINISTRATIVOS: (1) PRESIDENTE, (3) SST

OPERATIVOS: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.

SE REALIZA HIDRATACION DE CONCRETO. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ESTRUCTURA EN PARQUEADERO VEHICULAR.

03 DE ABRIL DE 2026. VIERNES.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES. (FESTIVO) S.S.

04 DE ABRIL DE 2026. (SABADO)

CLIMA: NUBADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) PRESIDENTE Y (1) SST

OPERATIVOS: (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES.

3 ELECTRICISTAS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES ELECTRICAS EN ZONA PERIMETRA AL FRONTE DE CANAL 18. SE REALIZAN DESMONTES E INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS (CAMBIO DE LUMINARIAS).

EXTERIORES.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE ESTRUCTURA (CORREAS) SOBRE PARQUEADERO VEHICULAR.

05 DE ABRIL DE 2026. (DOMINGO).

CLIMA: SOLARADO.

ADMINISTRATIVOS: 0. OPERATIVOS: (1) OFICIAL.

HIDRATACION DE CONCRETO. PLACA SHUT.

SOLDADURAS DE ESTRUCTURA PARQUEADERO.

06 DE ABRIL DE 2026. (LUNES)

Clima: Llovizna.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES, (1) SOLIDARIO
(3) ELECTRICOS.

SE FINALIZAN CON TODAS LAS ACTIVIDADES DE
ILUMINACIÓN PERIMETRAL, SE INSTALAN TABLERO
NUEVO, Cajas, tubería SCH 40. 1 1/2, CARBONO.
TUBERÍA FHT. y EQUIPOS COMO REFLECTORES.

QUEDAN FUNCIONANDO.

SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURA
METÁLICA EN PARQUEADERO VEHICULAR CORREAS, ESTA
ACTIVIDAD SE HA VISTO ADELANTADA POR LLUVIA.
INTERMITENTE. SOBRE TODO CON LA FUNDACIÓN
DE LAS PORTA CORREAS.

SE RECIBE ESTRUCTURA DE SHOT BARUDAS, COLUMNAS
CON SUS RESPECTIVAS PLATINAS.

SE HABLA CON ADMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR
LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES INTERNAS, SE DEPA
CLARO POR PARTE DE FLOI QUE EN LAS OFICINAS.
DESPUÉS DE 5:00 PM. Y LOS FOTOS DE REUNIÓN
NO SE TIENE ACCESO POR SEGURIDAD DE LOS

Norma

ARCHIVOS, PISO 3. ARCHIVO L, SE SOLICITA
REUBICAR TODOS LOS ELEMENTOS ACOPIAOS.
EN FLOI PARA PODER INICIAR ACTIVIDADES.

07 DE ABRIL DE 2026. (MARTES).

Clima: SOLARDO.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES.

SE DA INICIO CON EL LEVANTAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE PARQUEADERO DE MOTOS, SE
VERIFICAN NIVELES Y ALINEACIONES.

SE DA TRÁNSITO DE MATERIALES (PINTURA Y
ESTUCO). A FRENTE DE OBRA.

08 DE ABRIL DE 2026. (MIÉRCOLES).

Clima: NUBLADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVO: (1) OFICIAL CIVIL, (1) OFICIAL ESTRUCTURAS,
(2) AYUDANTES ESTRUCTURAS.

SOLO SACAN Cajas DE OFICINA Y ARCHIVO.
DE 3ER PISO, SE DA INICIO ACTIVIDAD
DE APLICADO DE ESTUCO, ARREGLO DE

Norma

Filo, y dilataciones, en muro. Se levantan estructura de shot de paseras, se toman niveles y alineación de columnas. Se pegan a patinas.

De acuerdo con interventoría solicita la ventilación en laboratorio

9 de abril de 2026 (jueves).

CUMA: NOROCCO:

Administrativos: (1) Residente, (1) SST

Operativos: (1) Oficial Civil. pintura, (1) Oficial Técnico. (2) Ayudantes.

Se continua con actividades de aplicación de pintura blanca sobre muros de Archivo 1 piso. 2. Sin novedades.

Se continua con instalación de estructura en parqueadero autos, instalación de cercas.

Observaciones: A la prestare aun el Archivo.

1 de 2 piso. Se encuentra con los frentes

No se ha podido ingresar material puesto de trabajo. Demoras en el inicio

de acuerdo a la visita de ayer de residente de interventoría, nos solicita que enviemos

Norma

correo. con oficio donde se solicita definición de actividades en el frente Calle 18. En el cual se solicita definición de la actividad de ventilación. En laboratorio 2do piso, cuya actividad es de suma importancia que se defina según el residente de interventoría, otro tema, sería sobre el destino de las redes en uso en Atención Primer. piso., dando que el lugar se encuentra ocupado y la actividad no se ha desarrollado. Otro tema conexión sistema sanitario - del shot. Definir si utilizar trampa de grasa o. Crear Cajón Muevas. y por ultimo se toma la propuesta del residente de solo suministrar el tutor a la puerta de acceso vehicular. Quedando en espera de respuesta del oficio CC-BTA-RTHAJUD-167-2015-211.

10 de abril de 2026. (viernes)

CUMA: SOLDADO.

Norma

NN

O

PQ

R

S

T

UV

WX

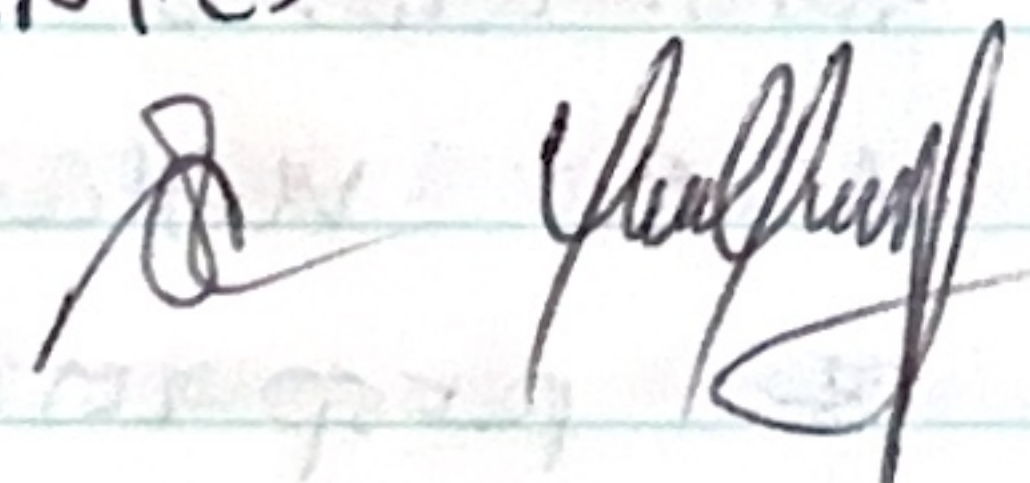
YZ

ADMINISTRATIVO: (1) RESIDENTE, (1) SST.
OPERATIVOS: (1) OFICIAL CIVIL PINTURA, (1) OFICIAL ESTR.
(2) AYUDANTES).

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ESTRUCTURAS
EN SILT DE BASURAS. INSTALACION DE VIGAS
EN LA PORTINERIA SEGUN PLANOS.

SE CONTINUA CON APLICADO DE PINTURA.
VINILO. TIPO 1, INTERIOR EN ARCHIVO 1 DE
PISO 2. | EN ESTE LUGAR SE ENCUENTRAN
ACOPANDO MATERIAL DE LA ENTIDAD, LO CUAL
HA GONTRADO ATRASO. EN EL UNICO DE
DETERMINADES ATRASO PUESTO DE TRABAJO.

SE HABLA CON ENCARGADO DE PISO, EL CUAL
INDICA QUE NO CUENTA CON EL PERSONAL
PARA REMEDIAR LOS FISTANTES.




11 DE ABRIL DE 2016. (SABADO)

Clima: NUBLADO

ADMINISTRATIVO: (1) RESIDENTE, (1) SST
OPERATIVOS: (1) OFICIAL PINTURA, (1) OFICIAL
ESTRUCTURAS, (1) SOLDADOR


Norma

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE SOLDADURAS
EN ESTRUCTURA DE PARQUEADERO VEHICULAR
SE CONTINUA CON INSTALACION DE CORREAS
EN PARQUEADERO DE MOTOS, E INSTALACION
DE PLATINAS DE UNION.
SE CONTINUA CON APLICADO DE PINTURA.
VINILO TIPO 1. EN ARCHIVO 1 DE PISO 3.



12 DE ABRIL DE 2016.

DOMINGO. - NO SE LABORA



13 DE ABRIL DE 2016. (LUNES)

Clima: NUBLADO.

ADMINISTRATIVO: (1) RESIDENTE, (1) SST
OPERATIVO: (1) OFICIAL PINTURA, (2) OFICIAL
MOBILIARIO, (1) OFICIAL ESTR., (2) AYUDANTES.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE
ESTRUCTURAS DE SILT DE BASURAS.

SE FINALIZA LA ACTIVIDAD DE APLICADO
DE PINTURA TIPO 1 EN ARCHIVO 1 DE
PISO 2. RESPECTO DE TODOS LOS LANTEROS
DE PINTURA

Norma

O

PQ

R

S

T

UV

WX

YZ

Se reciben puntos de trabajo, partes de planchas, estructura aluminio para divisiones de piso a techo, divisiones de pared altura y puntos de trabajo.

El cual no se pudo iniciar hoy, como tener todos los espacios ocupados.

[Signature]

14 DE ABRIL DE 2026. (MARTES)

Ciudad: NUBUADO.

Administrativos: (1) Residente, (1) SST

Operativos: (1) Oficial ETR, (2) Ayudante

(2) Oficiales Mobilizadores, (2) Oficiales Civiles

Siendo las 9:19 AM los dan ingreso

a Laboratorio piso 2, para iniciar

labores / instalación de división de

piso a techo. / Previo al inicio los

todos cerrar los huecos del espacio.

Para optimizar la actividad.

Se continua con la estruct. de

parqueadero de todos y shot basuras.

Financiamiento de turnos y nutricional.

Norma

de vigas y bordes.

Se da inicio a la actividad de limpieza de canales, el cual se observa colapsos por acumulación de material vegetal y sedimentos.

[Signature]

A

15 DE ABRIL DE 2026. (MIÉRCOLES)

Ciudad: NUBUADO. / Lluvias intermitentes.

Administrativos: (1) Residente, (1) SST.

Operativos: (2) Oficiales Civiles, (2) Oficiales ETR.

(2) Oficiales Mobilizadores.

Se continua con actividad de instalación de divisiones de piso a techo. En Laboratorio piso 2.

Se continua con la limpieza de canales

en cubierta, retiro de todo el

material vegetal y sedimentos que afectan.

El correcto funcionamiento de la canalización.

El reinicio de la actividad se

va afectado por las lluvias intermitentes.

Se continua con actividades de estructuras

Norma

076

EN SITIO DE OBRAS, TAMBIEN SE
AFECTA RENDIMIENTO POR LLUVIAS
INTERMITENTES.

[Signature]

[Signature]

16 DE ABRIL DE 2026. (JUEVES)

CLIMA: NUBLADO / LLUVIAS INTERMITENTES

ADMINISTRATIVO: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVO: (2) OFICIALES CIVILES, (2) OFICIALES
HOBILIARIOS, (1) AYUDANTE ESTRUCTURAL

SE DA INICIO APLICADO DE ANTICORROSION
EN ESTRUCTURA DE PARQUEADO VEHICULAR

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
DE CANALES (REMO DE MATERIAL VEGETAL
Y SEDIMENTOS). SE ACOPIAN EN LONAS.

SE CONTINUA CON ARMADO DE DIVISION
DE PISO A TECHO. EN OFICINA ARCHIVOS.

PISO 2. SE CONTINUA CON ACTIVIDADES
ESTRUCTURAS ALT BARRAS.

[Signature]

[Signature]

17 DE ABRIL DE 2026 (VIERNES)

Norma

077

CLIMA: NUBLADO / LLUVIAS INTERMITENTES.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) HOBILIARIOS OFICIALES, (2) OFICIALES CIVILES
CUBIERTAS, (2) OFICIALES ESTRUCTURAS.

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
LIMPIEZA DE CANALES, RETIRO DE MATERIAL VEGETAL

Y SEDIMENTOS, ACOPiado EN LONAS, SE TOMA
MEDIDA PARA INSTALACION DE FLANCHES, CON EL FIN

DE EXTENDER EL INSTALADO Y PUEDA CERRAR LA
SEPARACION DE LOS ELEMENTOS / EVITANDO INGRESO

DE AGUA A LAS OFICINAS / ACTIVIDAD AFECTADA POR LLUVIAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE DIVISIONES

EN LABORATORIO Y EN OFICINA DE ARCHIVOS.

EN PISO 2, SE LOGRA APERTURAR LOS
FRENTE.

SE CONTINUA CON APLICADO DE ANTICORROSION A

ESTRUCTURA PARQUEADERO. (ACTIVIDAD AFECTADA

POR LLUVIAS INTERMITENTES.

[Signature]

[Signature]

18 ABRIL DE 2026. (SABADO)

CLIMA: SOLEADO.

Norma

R

S

T

UV

WX

YZ

ADMINISTRATIVOS: (RESIDENTE, SST.

OPERATIVOS: (2) OFICIALES CUBIERTA, (2) OFICIALES ESTRUCT.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CANALES. ; PASADO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y SEDIMENTOS... SE INGRESA MATERIAL PARA INICIAR CON MANTENIMIENTO DE LAS CANALES, FLANCHES Y CABALLETES.

SOBRE CUBIERTA.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA PARQUEADERO, APLICADO DE ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR NEGRO, Y SE CONTINUA CON SOLDADURAS DE PORTA CERRAS. EN SOLAR BATURAS.

Yaul

1A DE ABRIL DE 2026 (DOMINGO)

DIA NO LABORAL

20 DE ABRIL DE 2026 (LUNES). 7:00 AM - 6:00 PM

CLIMA: NUBLADO / Lluvias intermitentes.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) OFICIALES CUBIERTA, (2) OFIC. CARPINTERIA

(2) OFICIALES ESTRUCTURA

Norma

ACTIVIDADES: SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CANALES, FLANCHES Y CABALLETE CON APLICADO DE BRONCOSIL, APLICADO HILLO DE SILLONA, TELA O MANTO METALICO, ETC. CON EL FIN DE EVITAR FUERTES FILTRACIONES LA ACTIVIDAD SE VIO AFECTADA POR LUVIAS INTERMITENTES.

SE CONTINUA CON ARMAZO DE DIVISIONES DE PISO A TEGLO. EN PISO 2. LA ACTIVIDAD SE DETIENE SIN MOVIMIENTO.

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CERRAJES EN SOLAR DE BATURAS, ACTIVIDAD AFECTADA POR LUVIAS.

Yaul

21 ABRIL DE 2026. (MARTES). 7:00 AM - 5:00 PM.

CLIMA: SOLEADO.


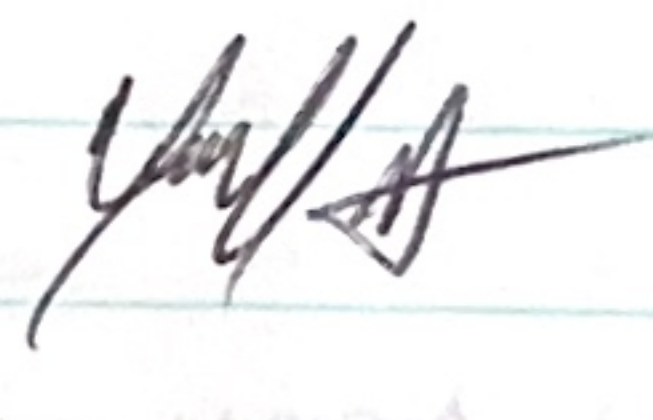
ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) OFICIALES CUBIERTA, (2) OFICIALES MOBILIARIO Y (2) ESTRUCTURA.

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CANALES, FLANCHES Y CABALLETE

Norma

Aplicado de BROCOSIL, Aplicado de SILICOMA.
TAMBIEN SE DA INICIO CON LA INSTALACION DE
FLANCHES LOGRANDO ESTENDER EL EXISTENTE
Y LOGRANDO SELLAR EL ESPACIO DE LA
VENTANA (ALFARJA) HASTA LA LUBIERTA
INTERIOR A LA VENTANA.
DIVISIONES DE PISO A TECHO SE LOGRA INSTALAR
TODA LA PERIFERIA METALICA Y SE INICIA
CON LA INSTALACION DE PANELES.
EN TABLERA.
SE DA CONTINUIDAD AL APLICADO DE PINTURA
A ESTRUCTURA PARQUEADERO VEHICULAR Y
SE DA INICIO DE LA MISMA ACTIVIDAD A
PARQUEADERO DE TROTOS.

22 DE ABRIL DE 2026. (MIÉRCOLES). 07:00 AM - 6:00 PM.

LUGAR: NOBLANO.

ADMINISTRATIVO: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) OFICIALES CUBIERTOS, (2) OFICIALES TUBOS

(2) ESTRUCTURAS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

Norma

DE COBERTA. (CABLES Y FLANCHES.) (CABLETES).
SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA EXTENSION
DE FLANCHES.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LOS PANELES.
DIVISION DE PISO A TECHO. EN PISO 2.

SE DA INICIO AL ARBOLADO DE PUESTOS DE TRABAJO.

Y A LAS DIVISIONES A MEDIO ALTURA EN PISO

3. ALTERNATIVO. 1. DE ACOTADO AL PLANO.



SE CONTINUA CON ESTRUCTURA SE INSTALA LA

ULTIMA CORREA DE PARQUEADERO VEHICULO, REMATE

CONDICIONADO POR POSTE DE CONCRETO UBICADO AL

EXTREMO. PERMITE PASAR SOBRE CALLE 19.

SE CONTINUA CON APLICADO DE PINTURA.

23 DE ABRIL DE 2026. (JUEVES). 07:00 AM - 5:00 PM.

LUGAR: SOLANO.

ADMINISTRATIVO: (1) RESIDENTE, (1) SST.

OPERATIVOS: (2) OFIC. CUB. , (2) OFIC. TUBILIAEROS, 1 Ayudante

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE

CABLETES, FLANCHES Y CABLETES.

SE CONTINUA CON ARBOLADO DE PUESTOS DE TRABAJO

Y DIVISIONES DE MEDIO ALTURA EN PISO 3.

Norma

PQ

R

S

T

UV

WX

YZ

SE CONTINUA CON APLICADO DE PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS.

OBSERVACIONES: SE CONTINUA A LA ESPERA DE APROBACION DE LOS FOLIOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL HUMIDIFICADOR POR PARTE DE INTERVENTORIA. SE TOMAN MEDIDAS PARA FABRICACION DE PUERTAS TIPO PERMANAS EN SHUT BASURAS.

[Signature]

24 DE ABRIL DE 2026 (VIERNES). 07:00 AM - 5:00 PM.

CLIMA: NUBLADO | Lluvias.

ADMINISTRATIVOS: (1) REINTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) OFICIALES CURTIERTAS, (2) OFICIAL TUBERIAS.

ACTIVIDADES EN EXTERIORES SE VEN AFECTADAS

POR LLUVIAS EN LA ZONA, POR SEGURIDAD

NO SE PERMITE EL INGRESO A CUBIERTA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE DIVISIONES

A MEDIA ALTURA EN PISO 3. ARCHIVO 1.

SE RECIBEN VIDEOJ PARA DIVISIONES DE PISO

A TIELO, SE INICIA CON LA INSTALACION

DE LOS ELEMENTOS EN OFICINA 1 Y

LABORATORIO EN PISO 2.

Norma

EN EL PISO 3, NOS PERMITEN LABOAR HASTA LA 6:30 PM., ACORTANDO EL PROCESO DE INSTALACION PUERTOS DE TRABAJO.

[Signature]

25 DE ABRIL DE 2026 (SABADO). 07:00 - 1:00 PM.

CLIMA: NUBLADO | Lluvias.

ADMINISTRATIVOS: (1) REINTE, (1) SST

OPERATIVOS: (1) ESTRUCTURA, (2) HERRAMIENTAS, (2) CURTIERTAS

EN LOS ESPACIOS DE NO LLOVIA SE LOGRA

Bajar todas LAS LONAS CON MATERIAL.

RECOLECTADO DE LAS CANALES Y BAJANTES.

SE LOGRA INSTALAR LAS ULTIMAS DOS CORREAS EN CUBIERTA DE SHUT BASURAS.

SE RECIBE PERMISO POR PARTE DE SEGURIDAD

PARA LABOAR MEDIO DIA DEL SABADO EN

OFICINA ARCHIVO 1 | PISO 3. INSTALANDO

los PUERTOS DE TRABAJO.

OBSERVACIONES: SE RECIBEN 3 MESAS ALUMINIO, 12

3. SILLAS OPERATIVAS, 16 SILLAS DE OFICINAS

SE ADQUIEREN EN EL PISO 3.

[Signature]

R

S

T

UV

WX

YZ

26 DE ABRIL DE 2026. DOMINGO

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

27 DE ABRIL DE 2026. (LUNES)

Clima: Nublado.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) CUBIERTAS OFIC., (2) MOBILIARIOS,
(2) ESTRUCTURAS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE APLICADO
DE PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
DE CANALES, PLANETES Y CABALLETES

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE ARMADO DE
PUSTOS DE TRABAJO. EN PISO 3.

28 DE ABRIL DE 2026. (MARTES)

Clima: Nublado.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) CUBIERTAS OFICIALES, (2) MOBILIARIOS
OFICIALES, (1) ESTRUCTURA.

SE CONTINUA Y SE FINALIZA CON LA

Norma

ACTIVIDAD DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE
CANALES, PLANETES Y CABALLETES, IMPERMEABILIZANDO
TODOS LOS ELEMENTOS TENSIONADOS.

SE CONTINUA CON ARMADO DE PUESTOS DE
TRABAJO Y DIVISIONES, FINALIZADO CON

ESTA ACTIVIDAD; QUEDARIA PENDIENTE LA
INSTALACION DE PIA VIDRIOS Y SANDBLASTING.

SE CONTINUA CON APLICADO DE PINTURA SOBRE
ESTRUCTURA DE SHT. LOGRANDO CASI UN 100%
DE LA ACTIVIDAD. DE ACUERDO A LO DISEÑADO
EN PLANO.

OBSERVACIONES: SE ENVIO CORREO DE LISTADO DE
MATERIA ELÉCTRICA PARA INGRESO MAÑANA

29 DE ABRIL DE 2026 (MIÉRCOLES)

Clima: Lluvias.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: 3 ELÉCTRICOS, (2) MOBILIARIOS

SE RECIBIÓ MATERIAL ELÉCTRICO PARA INICIAR

ACTIVIDADES EN PARQUEROS Y SHT

DE BASURAS, DURANTE LA MAÑANA E

Norma

PERSONAL NO PUDO TRABAJAR POR LLOVIAS.
 INICIANDO LA ACTIVIDAD EN HORAS DE LA
 TARDE TIPO: 3:00 PM. Y FINALIZANDO
 ACTIVIDADES A MEDIA NOCHE.
 SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE
 PUESTOS DE TRABAJO EN PISO 2.
 LABORATORIOS (2 PUESTOS). Y SE CONTINUA CON
 LA INSTALACIÓN DE PISA VIDRIOS.

20 DE ABRIL DE 2026. (JUEVES). 7:00 AM - 6:30 PM.

CLIMA: NUBLADO.

OPERARIOS: (2) MOBILIARIOS OFICIALES, (3) ELECTRICOS.
 (2) OFICIALES CIVILES.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN
 PARQUEADEROS Y SALT PASURAS. CON LA
 INSTALACIÓN DE TERMINAL RED ELÉCTRICA
 DESDE TABLERO HASTA CADA UNO DE LA ESPACIOS
 INSTALACIÓN DE TORERA EXT, INSTALACIÓN DE
 PUNTO SALIDAS LUMINARIAS, E INSTALACIÓN
 DE SOLO LUMINARIAS DE LOS PARQUEADEROS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE

Norma

INSTALACIÓN DE PISA VIDRIOS, INSTALACIÓN DE
 PISO CEMENTO PUEBLO, ACTIVIDADES DE
 LIMPIEZA. POR MEDIO DE CHAT WA. EL ABO.
 JABREHAN. LE CONFIRMA AL ABO. HORTAN QUE EL
 REMATE DE LAS DIVISIONES DE PISO A TECTO
 VAN HASTA LA VENTANA, QUEDAR TOTALMENTE
 CERRADO LOS ESPACIOS.
 SE TOMAN MEDIDAS PARA INICIAR CON LA
 FABRICACIÓN DE CANALES PARA PARQUEADEROS
 Y SALT PASURAS.

1 MAYO DE 2026. (VIERNES).

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES POR SER FESTIVO.

2 MAYO DE 2026. (SABADO).

CLIMA: NUBLADO DURANTE TODO EL DIA.

PQ

ADMINISTRATIVOS: 1 RESIDENTE, 1 SST

OPERARIOS: (2) OFICIALES MOBILIARIOS, 2 OFICIALES.

MOBILIARIOS TERMINAN DE REVISAR ACTIVIDADES
 EN PASO 3. ACTIVO 1.

SE REALIZA JORNADA DE ASES EN

Norma

R

S

T

UV

WX

YZ
