

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 22/Jul/2026

FECHA PRESENTE	22/07/2026		
ACTA:			
CONTRATO / CONVENIO	CONVENIO	INTERADMINISTRATIVO	No.
Nº	CO1.PCCNTR.8524401/3779 DE 2025		
OBJETO	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y TIERRASUA S.A.S. para el mantenimiento de la vía con código 62BY03 Arcabuco – Naranjos – Villa de Leyva en el Departamento de Boyacá.		
LECTURA ACTA ANTERIOR			
N/A			
VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS			
COMPROMISO		OBSERVACIÓN	
BALANCE DE CANTIDADES		EN EJECUCION	
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES		SE CUMPLIO CON EL COMPROMISO	
DESARROLLO DEL COMITÉ			
Se realizó comité de obra en el corredor vial objeto de intervención con el fin de efectuar el seguimiento técnico, administrativo y contractual al avance del proyecto, verificando el cumplimiento de las actividades programadas, el estado de ejecución de la obra y las condiciones identificadas en campo que inciden en el desarrollo del contrato. Como resultado de las actividades de excavación y retiro de la estructura existente, se evidenciaron condiciones geotécnicas que afectan mediante la saturación de capas granulares. Los eventos de alta pluviosidad registrados en el área de intervención han generado la saturación de las capas granulares, impidiendo alcanzar las condiciones de humedad y estabilidad requeridas para la aplicación de la imprimación asfáltica, por consiguiente, la continuidad en la ejecución de la carpeta de rodadura. Adicionalmente, las escorrentías superficiales han ocasionado el arrastre y pérdida parcial de materiales granulares, afectando los rendimientos de obra y haciendo necesaria la reconformación de los sectores intervenidos antes de continuar con las actividades constructivas. Las condiciones encontradas hacen técnicamente necesaria la ejecución de actividades complementarias de estabilización y mejoramiento estructural, con intervenciones de			

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 22/Jul/2026

mayor profundidad a las inicialmente contempladas, garantizando la capacidad estructural, estabilidad y vida útil del corredor vial.

Adicionalmente, durante el segundo trimestre de la vigencia se registraron precipitaciones de alta intensidad en la zona de influencia del proyecto, afectando los rendimientos de obra y limitando la ejecución de actividades que requieren condiciones climáticas favorables.

Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades correspondientes a la apertura mecánica de caja, reposición, extendida y compactación de base granular para parcheo, imprimación con emulsión asfáltica, sello arena asfalto con emulsión, suministro e instalación de mezcla asfáltica para parcheo, transporte de materiales granulares y transporte de mezcla asfáltica.

Una vez verificada la conformación de la estructura de soporte, se efectuó la aplicación de imprimación con emulsión asfáltica, garantizando la adecuada adherencia entre la base granular y la carpeta de rodadura. Finalmente, se ejecutó el suministro, extendido, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC 19 para parcheo, en los tramos intervenidos, obteniendo una superficie de rodadura con las condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad requeridas para la operación del corredor vial.

En consideración a lo anterior, se concluye que resulta técnica y contractualmente procedente la evaluación de una prórroga de tres (3) meses al plazo contractual, con el propósito de ejecutar las actividades complementarias requeridas, garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y asegurar la calidad, estabilidad y funcionalidad de la infraestructura intervenida.

Vale la pena resaltar, que con las actividades ejecutadas y las áreas intervenidas en el corredor vial objeto de intervención, el convenio cuenta con un avance de ejecución del **55%** a la fecha.

Como soporte del avance físico del proyecto, se anexa el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo informado.



Gobernación de
Boyacá

FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: M-PD-ID-F-012

ACTA DE COMITÉ

FECHA: 22/Jul/2026





Gobernación de
Boyacá

FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: M-PD-ID-F-012

ACTA DE COMITÉ

FECHA: 22/Jul/2026





Gobernación de
Boyacá

FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: M-PD-ID-F-012

ACTA DE COMITÉ

FECHA: 22/Jul/2026





Gobernación de
Boyacá

FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: M-PD-ID-F-012

ACTA DE COMITÉ

FECHA: 22/Jul/2026





Gobernación de
Boyacá

FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: M-PD-ID-F-012

ACTA DE COMITÉ

FECHA: 22/Jul/2026




 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 22/Jul/2026

A la fecha de realización del presente comité, el proyecto registra un avance físico del cincuenta y cinco (55%) respecto de las actividades contempladas en el alcance contractual.

A la vez, vale la pena tener presente que por la primera temporada de lluvias del año se ha retrasado el inicio de la ejecución física del convenio, razón por la cual se justifica la necesidad de adicionar el tiempo solicitado para la ejecución del convenio.


Con el fin de sustentar las condiciones climáticas que han incidido en el desarrollo de las actividades del convenio, se adjunta el histograma de precipitación correspondiente a la zona de intervención. Este análisis evidencia el comportamiento de las lluvias y permite identificar la incidencia de la primera temporada de lluvias del año, la cual ha generado retrasos en el inicio de la ejecución física de las actividades programadas.

HISTOGRAMA COMPORTAMIENTO DE LLUVIAS MES DE ABRIL

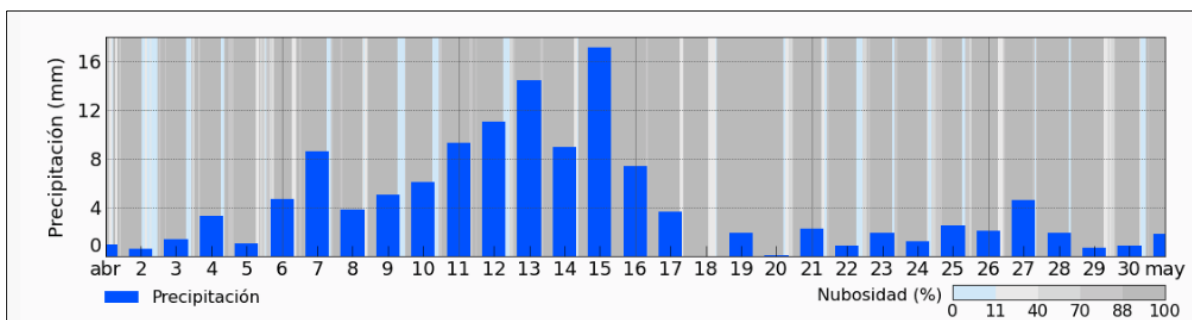

Fuente: meteoblue

HISTOGRAMA COMPORTAMIENTO DE LLUVIAS MES DE MAYO

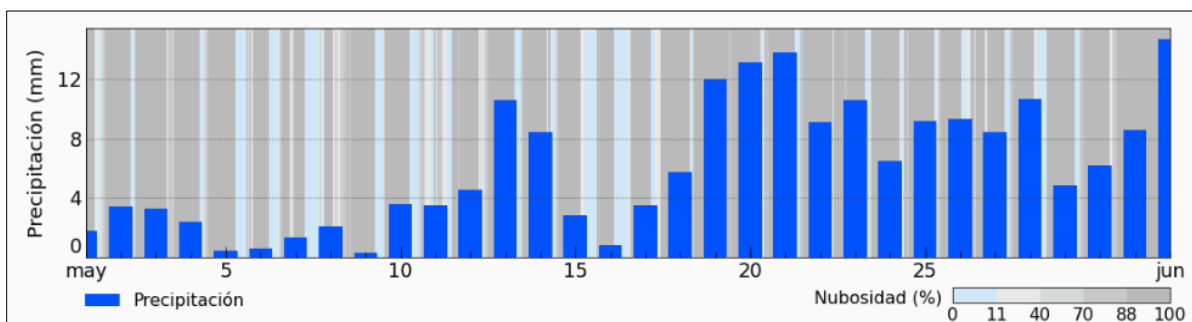

Fuente: meteoblue



Gobernación de
Boyacá

FORMATO


VERSION: 1

CODIGO: M-PD-ID-F-012

ACTA DE COMITÉ

FECHA: 22/Jul/2026

HISTOGRAMA COMPORTAMIENTO DE LLUVIAS MES DE JUNIO

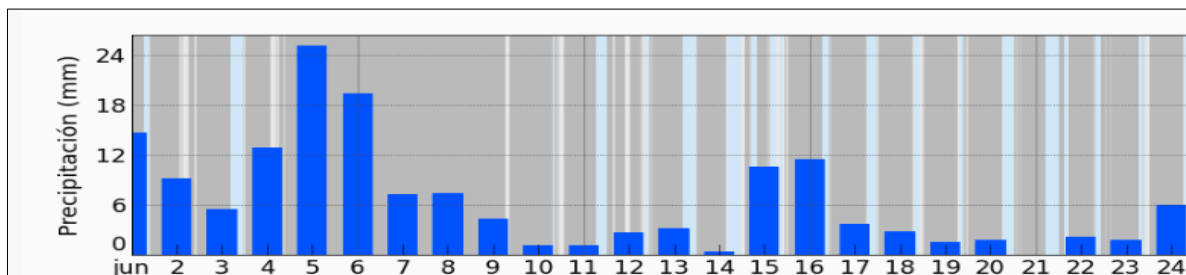

Fuente: meteoblue


Teniendo en cuenta la información expuesta en los histogramas de lluvia en la zona por lo que se ha generado significativos retrasos del proyecto se solicita comedidamente prorrogar el tiempo del proyecto en un pedido de (3) tres meses, con esta solicitud se busca, garantizar la correcta ejecución del proyecto bajo los principios de responsabilidad técnica eficiencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

FECHA PRÓXIMA
REUNIÓN:

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Realizar comités semanales y analizar las problemáticas reportadas en la presenta acta	29/07/2026	cooperantes
Tramitar la prórroga No. 2 al convenio 3779 de 2025	24/07/2026	Supervisión
Entrega del balance de cantidades a ejecutar	29/07/26	cooperantes

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 22/Jul/2026

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL	Gerente Tierrasua	3163334288	
JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON	Director Técnico Tierrasua	3118962136	
MILTON MORANTES	Apoyo a la supervisión Gobernación de Boyacá	3166985654	Milton A. Morantes P.
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	Apoyo dirección técnica Tierrasua	3143990829	
JAVIER CAMILO LÓPEZ	Apoyo dirección técnica Tierrasua	3143053691	
ANDERSON YECID PARRALES	Director Infraestructura vial Gobernación de Boyacá	3103314360	
