



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA
RESOLUCIÓN 2784 DE 22 DE JULIO 2014

NIT 900112222 - 4
DANE 26808100690
EL CENTRO - BARRANCABERMEJA

ACTA FINAL 21 de julio de 2026

CONTRATO:	008-26
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
NIT:	900.112.222-4
CONTRATISTA:	P&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	N° 901879880-6
REP. LEGAL	LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ
IDENTIFICACION:	80.492.942
TELÉFONO:	3133961472
DIRECCIÓN:	CLL 63 N° 35 A – 13 BARRIO SAN PEDRO
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN CAMPO 38 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$25.924.311)
DURACIÓN:	TREINTA (30) DÍAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Disponibilidad presupuestal No. 26-00023 de fecha 09/06/2026
FECHA DE INICIO:	19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	RECTORA – ANA ISABEL GUTIERREZ

En Barrancabermeja, el día 21 de julio de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa Los Laureles, se reunieron, ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO – en calidad de rectora y supervisora del contrato y P&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT N° 901879880-6, y representada legalmente por LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ identificado con cedula de ciudadanía N° 80.492.942, -Contratista, con el fin de suscribir el Acta Final del contrato N° 008-2026. Además de la revisión satisfactoria del pago de la seguridad social, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR DEL CONTRATO	\$25.924.311	
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		\$25.924.311
VALOR SIN EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$25.924.311	\$25.924.311

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$25.924.311)


CONSTANCIA: Se deja constancia que a la fecha el contratista presto la totalidad de los servicios requeridos objeto del presente contrato y el Supervisor ha recibido a entera satisfacción del colegio los mismos, por consiguiente, se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.

Se firma por los que en ella intervinieron, a los 21 días del mes de julio de 2026.

El contratante,


ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO
Rectora

El contratista,


LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ
Rep. Legal del Contratista



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA
RESOLUCIÓN 2784 DE 22 DE JULIO 2014

NIT 900112222 - 4
DANE 26808100690
EL CENTRO - BARRANCABERMEJA

ACTA LIQUIDACION

22 de julio de 2026

CONTRATO:	008-26
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
NIT:	900.112.222-4
CONTRATISTA:	P&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	N° 901879880-6
REP. LEGAL	LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ
IDENTIFICACION:	80.492.942
TELÉFONO:	3133961472
DIRECCIÓN:	CLL 63 N° 35 A – 13 BARRIO SAN PEDRO
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN CAMPO 38 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$25.924.311)
DURACIÓN:	TREINTA (30) DÍAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Disponibilidad presupuestal No. 26-00023 de fecha 09/06/2026
FECHA DE INICIO:	19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	RECTORA – ANA ISABEL GUTIERREZ

En Barrancabermeja, el día 22 de julio de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa Los Laureles, se reunieron, ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO – en calidad de rectora y supervisora del contrato y P&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT N° 901879880-6, y representada legalmente por LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ identificado con cedula de ciudadanía N° 80.492.942, -Contratista, con el fin de suscribir el Acta LIQUIDACION del contrato No 008-2026, Determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA INICIO	19/06/2026
ACTA FINAL	21/07/2026
ACTA LIQUIDACION	22/07/2026

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato fue suscrito el día 19 de junio de 2026, por las partes y su acta de iniciación del 19 de junio de 2026. Su ejecución en el tiempo, se desarrolló entre el día 19 de junio y 18 de julio de 2026.

El acta fue suscrita teniendo en cuenta la realización de las actividades encomendadas en un 100% y teniendo en cuenta la fecha de la firma del contrato y la fecha realización de las actividades; el Acta Final, correspondiente al cumplimiento total de los bienes requeridos y finalización del contrato entre las partes anteriormente enunciadas la cual está con fecha del 21 de julio de 2026, dejándose en el acta final constancia del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato No. 008-2026, por parte del contratista.

2. CONTRATOS ADICIONALES O AMPLIACIONES DE PLAZO

En el presente Contrato no se realizó adición en valor.

3. ACTAS ADEUDADAS POR LA INSTITUCION



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA
RESOLUCIÓN 2784 DE 22 DE JULIO 2014

NIT 900112222 - 4
DANE 26808100690
EL CENTRO - BARRANCABERMEJA

Descripción	FECHA	VALOR ACTA	VALOR A PAGAR
Acta final	21 julio 2026	\$25.924.311	\$25.924.311
TOTAL A PAGAR			\$25.924.311

4. RESUMEN FINACIERO DEL CONTRATO:

4.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$25.924.311
Valor Ejecutado	\$25.924.311	
Valor por pagar acta final		\$25.924.311
Valor a favor de la entidad	\$0	\$0
Sumas Iguales	\$25.924.311	\$25.924.311

NOTA: La entidad educativa adeuda al Contratista el pago del acta final. El contratista cumplió con todas sus obligaciones, una vez se realice el pago por parte de la institución, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato.

5. CONSTANCIAS:

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:


1. Que el contratista desarrolló bajo la supervisión de la señora rectora **ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO**, entregando todos los servicios requeridos en el contrato y recibido a satisfacción, tal como consta en el Acta Final.
2. Que en la presente Acta de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores de los bienes entregados.
3. Que el Contratista manifiesta que la Institución Educativa Los Laureles cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los 22 días del mes de julio de 2026.

El contratante,


ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO
Rectora

El contratista,


LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ
Rep. Legal del Contratista

Factura Electrónica de Venta FE 8
P&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
901879880 - 6


No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764084132458 de 26/11/2024

Vigente hasta 26/11/2026 - Prefijo: FE de la factura 1 a la 1000



CUFE 2ee92db4e1589a2fbf3229f38cafa4412b2f99d83e9f974b9c08d6ee5f50af111356e3a85b7db044d2a261f68d30c899

INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES

NIT 900112222 - 4

Dirección: KM 11 VIA AL CORREGIMIENTO EL CENTRO

Ciudad: Barrancabermeja, Santander, Colombia

Teléfono:

Vendedor: Luis Felipe Liebano Cruz

Fecha Factura: 17/07/2026 09:29:14

Fecha Expedición: 17/07/2026 09:29:18

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 17/07/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA	UNID	1.00	25,924,311.00	0.00	0.00		25,924,311.00

Observaciones:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2026. MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN CAMPO 38 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES.

Subtotal 25,924,311.00

Descuentos 0.00

IVA 0.00

ICO 0.00

Total COP 25,924,311.00

Saldo Pendiente 25,924,311.00

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO P&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

CL 63 35 A 13 Tel (57607) 3008930269

Barrancabermeja, Santander, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-21, 08:20:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 80492942
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	86731357
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	497856127
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 218.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.200	\$ 0
			SubTotales:	\$ 508.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 508.300



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ		
Documento	CC80492942	Dirección	CL 25 #14 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6214563
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	SVN	IGE	LMA	VAC	VAC	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80492942	LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(MIN002) ADRES MIN002	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 0	\$ 508.300





INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRATO 008-2026

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN CAMPO 38 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

- **Fecha de Inicio:** 19 junio de 2026

Fecha de Finalización: 18 Julio de 2026

Objetivo: Mejorar las condiciones del sistema eléctrico de la sede Campo 38 de la Institución Educativa Los Laureles, garantizando la seguridad, la operatividad y el cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

El presente informe detalla las actividades técnicas de mantenimiento y adecuación eléctrica desarrolladas en la sede Campo 38 de la Institución Educativa Los Laureles, dando cumplimiento al alcance establecido en el Contrato 008-2026 durante el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 18 de julio de 2026.

- **2. Descripción de las Áreas de Intervención**

Las labores se ejecutaron de manera integral en las siguientes zonas de la sede:

- **Exteriores:** Iluminación de accesos entradas y salidas, iluminación perimetral de pasillos exteriores y puntos de toma de corriente en fachadas.
- **Interiores:** Aulas de clase, batería de baños, áreas de almacenamiento y espacios compartidos como zonas de distribución y áreas de servicio.

3. Diagnóstico Inicial



INFORME FINAL DE EJECUCION

Previo a las intervenciones, la infraestructura eléctrica de la sede presentaba un estado de deterioro avanzado y crítico, producto de la obsolescencia de los componentes y la ausencia prolongada de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que generaba un riesgo eléctrico inminente para la comunidad escolar.

Evaluación General y Problemáticas Identificadas:

- Ausencia de sistemas de protección y tomas de corriente sin dispositivos de seguridad.
- Cableado expuesto, desprendimiento de cajas de paso y conexiones en mal estado.
- Iluminación deficiente y puntos de luz inoperativos en pasillos, accesos y aulas.
- Inexistencia de un sistema de puesta a tierra adecuado y distribución desordenada de los circuitos en baja tensión

Evaluación General

- **Tomas de Corriente sin Protección**
- **Cableado Expuesto**
- **Conexiones Deterioradas**
- **Iluminación Deficiente**
- **Inexistencia de polo a tierra**

Problemas Identificados:

- Fallos en puntos de luz
- Ausencia de luz en las entradas de las aulas y pasillos.
- Problemas de cableado y conexiones.
- Exposición y falta de protección

4. informe de actividades y registro fotográfico:

A continuación, se relacionan los ítems ejecutados correspondientes al alcance contractual, respaldados por su respectivo registro fotográfico del proceso y resultado final:


1. **Suministro e instalación de acometida subterránea:** Construcción y canalización de la nueva alimentación principal para optimizar la seguridad y distribución de la energía general.



2. **Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra:** Incluye cable de cobre verde calibre #8 AWG, varilla Copperweld de 5/8" x 2.4 m, conectores, terminal tipo campana y su respectiva caja de inspección perimetral.




3. **Adecuación y redistribución de circuitos y carga en el tablero de distribución de baja tensión:** Reestructuración total del centro de carga, balanceo de fases, cableado interno y rotulación de breakers con su respectiva tabla de distribución de circuitos.

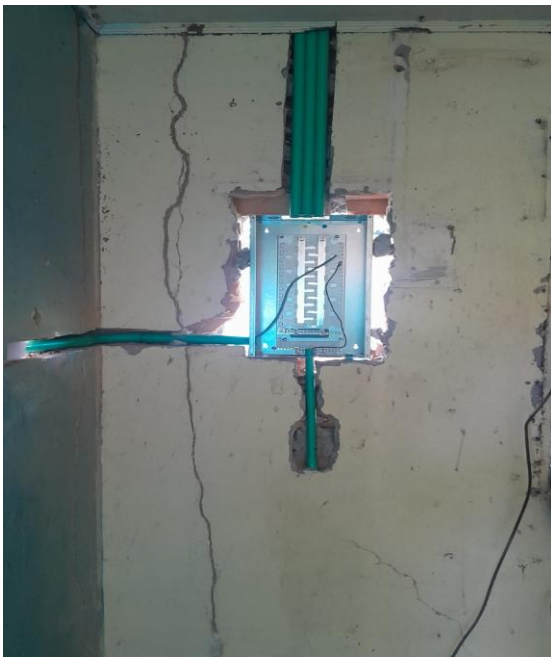




INFORME FINAL DE EJECUCION

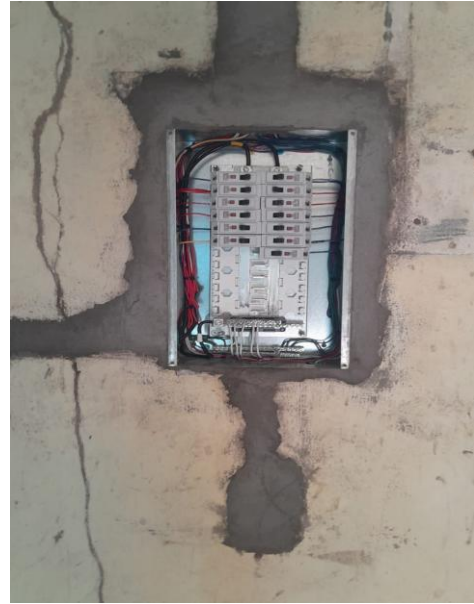



INFORME FINAL DE EJECUCION

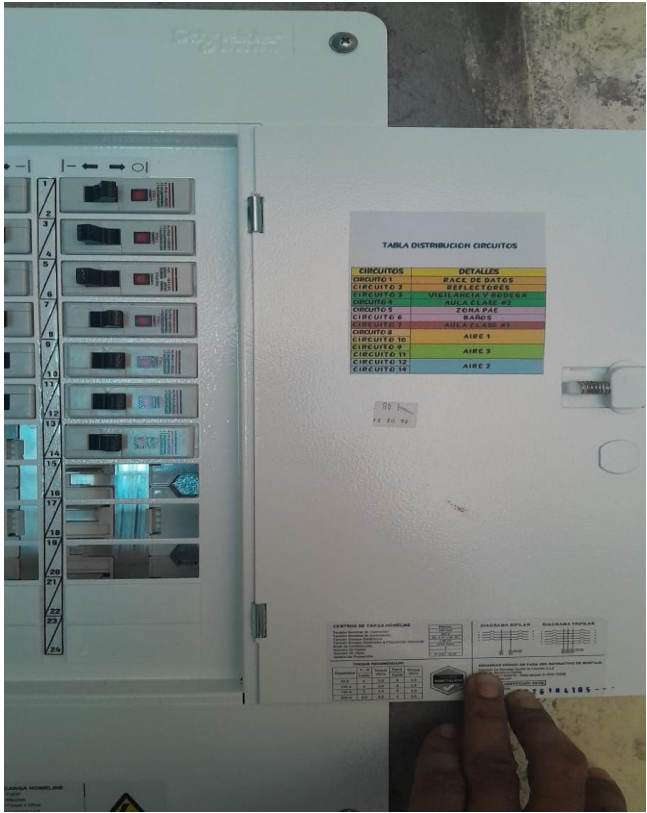

4. Suministro e instalación de 26 puntos para iluminación de aulas de clase:

Montaje de paneles LED de 18 W, canalización superficial/empotrada, cableado en calibre #12 AWG, accesorios y terminales.





INFORME FINAL DE EJECUCION







INFORME FINAL DE EJECUCION







INFORME FINAL DE EJECUCION

5. **Suministro e instalación de 32 puntos para tomacorrientes en aulas de clase:**
Renovación y ampliación de puntos de fuerza con canalización y cableado en calibre #12 AWG.





INFORME FINAL DE EJECUCION


























INFORME FINAL DE EJECUCION

6. **Suministro e instalación de 6 puntos para iluminación exterior:** Montaje de reflectores de 50 W, cableado y canalización para asegurar la visibilidad perimetral de los salones

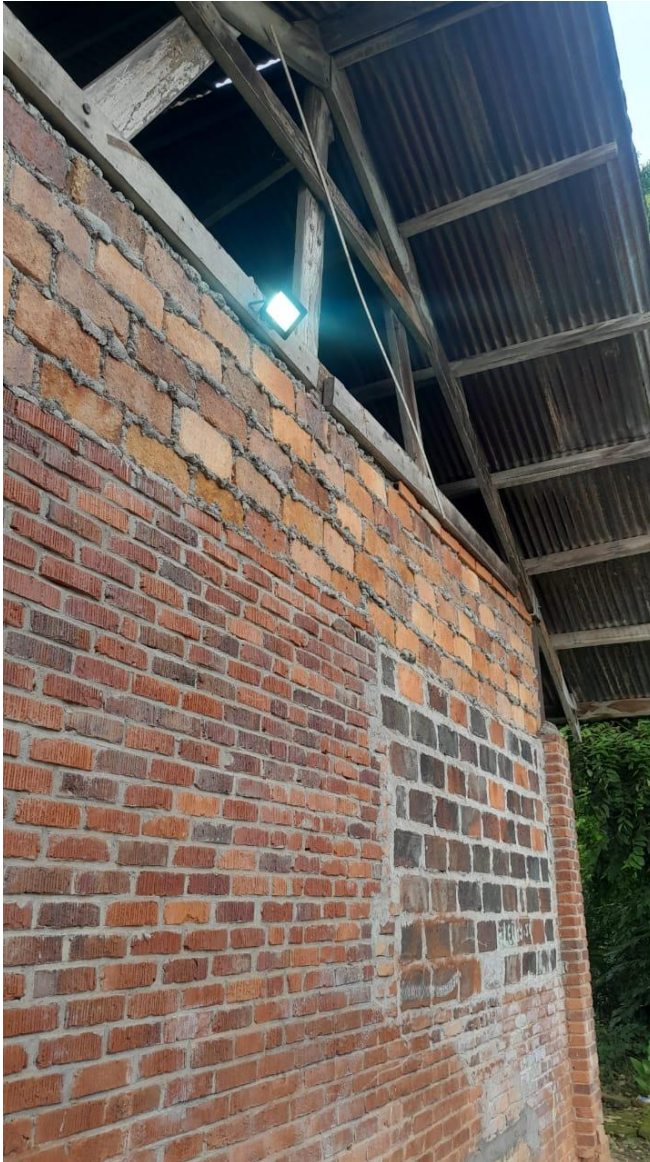



INFORME FINAL DE EJECUCION





INFORME FINAL DE EJECUCION


7. **Suministro e instalación de 7 ventiladores de techo:** Unidades de 110V con 3 aspas de metal, incluyendo soportes, canalización y cableado de alimentación en calibre #14 AWG.





INFORME FINAL DE EJECUCION



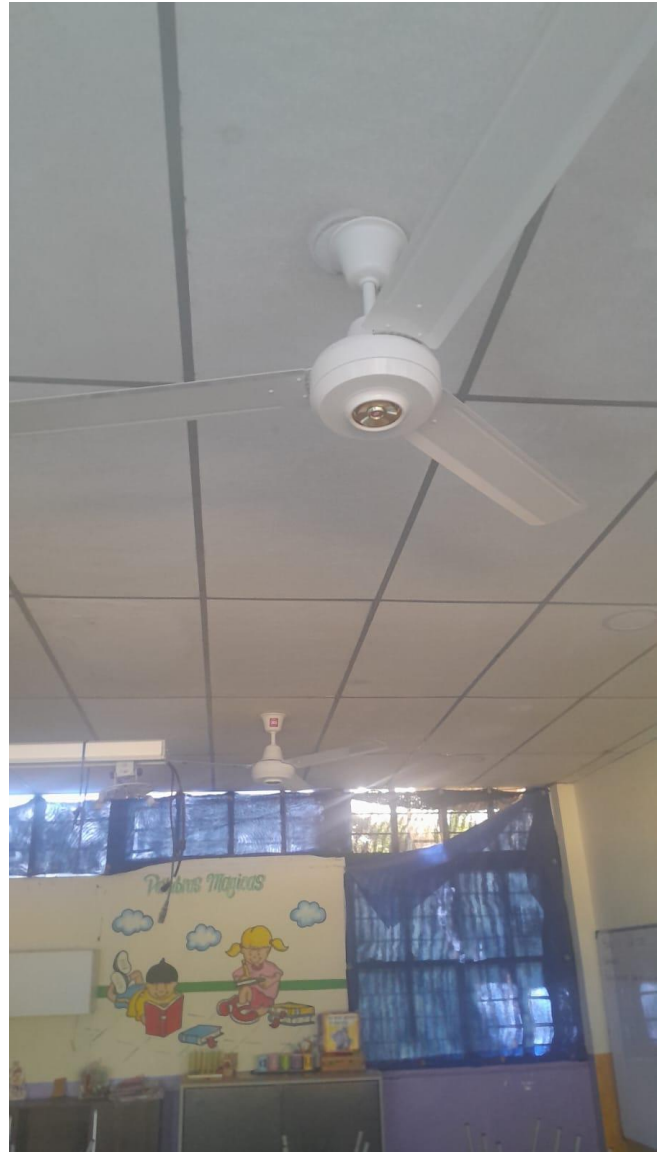

8. **Suministro e instalación de timbre escolar:** Sistema de alertamiento a 110V con su respectiva red de alimentación y dispositivos de control.





INFORME FINAL DE EJECUCION



LUIS FELIPE LIEBANO CRUZ

Representante Legal
