



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 25-10/06/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consorcio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consorcio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Nombre	Cargo	Empresa/Entidad	Firma
Eric Leonardo Elias Acosta	Apoyo a la supervisión del Contrato	SDSCJ	
Pablo David Ariza Martinez	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Angie Alieth Daza Sandoval	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Wilver Franciny Russey Ladino	Director de Obra	Consorcio WR Alianza	
Gabriel Felipe Arismendi Caicedo	Residente de Obra	Consorcio WR Alianza	
Karen Liseth Salamanca Roja	Residente Ambiental y Sst-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Juan Esteban Forero Becerra	Auxiliar Administrativo-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Claudia Alexandra Daza	Inspectora SST -OBRA	Consorcio WR Alianza	Alexandra Daza
Olga Lucia Torres Camargo	Directora de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Alejandro Hermida Meneses	Residente de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Pedro Enrique Galeano Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Edward Santiago Vargas Llorca	Apoyo a coordinador	Consorcio WR Alianza	Santiago V.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 25-10/06/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consortio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consortio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Temas de la reunión

Inicio de Reunión: 9:26 am Finalización:

Tema	Descripción
<i>PIN Ambiental:</i>	<i>Ya realizaron el cargo de la información a la plataforma</i>
<i>Scanner - Reyes</i>	<i>A la fecha</i>
<i>Informe Red</i>	<i>Quedo la información cargada en la cuenta numero 8 y en el informe mensual</i>
<i>Membrana tangues</i>	<i>El apoyo de supervisión solicita el apoyo dado que el lavado y mantenimiento de tangues se debe elaborar el día de hoy mismo</i>
<i>Lavadoras y secadoras</i>	<i>A la fecha NO se a terminado el mantenimiento y NO se a quitado, presenta</i>
<i>NP's</i>	<i>A la fecha el contratista de Obra NO a remitido a lo solicitado de lo NP como vidrios Blindados,</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 25-10/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	→ Pasadorn: Se encuentra en fabricación del pabellon de Barica. → Puerta 1M: Falta una puerta de ingreso de la 1M al Baño y falta pintura de la puerta del costado de ingreso de /parqueadero, en cual hace falta acabados, el apoyo de la supervisión solicita adicionales de acabados → Lineas antidulizante: Se programara la actividad; en cual el apoyo de la supervisión solicita el item NO previsto → Cambio de baños: En el cual el contratista de obra ya hizo el ensayo de los baños de celdas → Pintura 3 Piso ✓ Capilla: se quitó el cielo raso, reinstalar red eléctrica ✓ Se encuentran quitando consolas ✓ Aula 3 → falta ✓ Biblioteca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



CONSORCIO
PRISMA DC

ACTA DE COMITÉ No. 25-10/06/2026

Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ		
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ		

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	→ Puesta caninos: La ingeniera Angre de la entidad y la interventoría y obra realizaron visita, en cual se ve la necesidad de realizar la actividad → Piso de Rancho: A la fecha el NP se encuentra en el contratista → Garitos: Ya se encuentra en ejecución en 1 de sus 4 garitos, de la sociedad SST de la entidad → Alcega - Piso 4 administrativo El contratista de obra de la semana del 16 JUNIO → Cultivación de anclajes: A la fecha NO se a ejecutado, ni lo tienen programado por el contratista de obra. → Levantamiento, Hidráulico Al momento la interventoría ya tuvo la información, el grupo de la supervisión solicita, verificar la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 25-10/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	✓ <i>Protectos de Picos Botoneras: El apoyo a la supervisión bolicata) enurara la información a l contra lista de obra la referencia para realizar Apu y ppto</i> <i>Recomidos</i> <i>14) → Superventa el dia del comite, en wa l guda aprobado.</i> <i>1a l 12) 100% 13 → al 25%</i> <i>Programado \$1372.738.795 31,06%</i> <i>Ejecutada \$ 1.292.506.861 29,25%</i> <i>Diferencia -\$ 80.231.934 -1,81%</i>

RECORRIDO 14 - 10/06/2026

AREA	LUGAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ITEM	VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL
HIDRAULICA							
PASILLOS DE SERVICIOS	LIBERTAD CELDA 315	TAPON SANITARIO	UND	1		\$	-
PASILLOS DE SERVICIOS	LIBERTAD CELDA 304	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
PASILLOS DE SERVICIOS	AUTONOMIA DUCHA PISO 2 ORIENTAL	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
PASILLOS DE SERVICIOS	TRANSICIÓN CELDA 306	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
PASILLOS DE SERVICIOS	OPCIÓN CELDA 319	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
PASILLOS DE SERVICIOS	BASICO CELDA 301	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
PASILLOS DE SERVICIOS	OPCIÓN DUCHA PISO 2 ORIENTAL	TAPON SANITARIO	UND	1		\$	-
PASILLOS DE SERVICIOS	OPCIÓN CELDA 215	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
PASILLOS DE SERVICIOS	OPCIÓN CELDA 215	REGISTRO 2"	UND	1	6.4.26	\$ 384.056	\$ 384.056
PASILLOS DE SERVICIOS	BASICO PISO 1 ORINAL	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
ADMINISTRATIVO	PISO 4 BAÑO MUJERES	SONDEO	UND	1	22.14	\$ 62.785	\$ 62.785
ADMINISTRATIVO	PISO 4 BAÑO HOMBRES	CODO HIDRAULICO				\$	-
ADMINISTRATIVO	PISO 4 BAÑO HOMBRES	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMBOLO POMA PARA DUCHA (INCLUYE DESMONTE DE EMBOLO DAÑADO , INSTALACION DE POMA NUEVA)	UND	1	6.6.13	\$ 32.879	\$ 32.879
ADMINISTRATIVO	PISO 3 BAÑO HOMBRES - MITAD	SONDEO	UND	1	22.14	\$ 62.785	\$ 62.785
ADMINISTRATIVO	PISO 3 BAÑO HOMBRES - MITAD	RESANE				\$	-
ADMINISTRATIVO	PISO 3 BAÑO HOMBRES - MITAD	Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario.	UND	1	15.4.15	\$ 334.412	\$ 334.412
ADMINISTRATIVO	PISO 3 BAÑO MUJERES	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
LIBERTAD	CELDA 305	CAMBIO PUSH	UND	1	NP02	\$ 582.151,00	\$ 582.151
LIBERTAD	CELDA 305	DESMONTE PUSH	UND	1	NP03	\$ 53.625,00	\$ 53.625
LIBERTAD	CELDA 311	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
LIBERTAD	1 PISO	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
OPCION	REJILLAS PRIMER PISO	SONDEO	UND	4	22.14	\$ 62.785	\$ 251.138
OPCION	LAVADERO PRIMER PISO	SONDEO	UND	2	22.14	\$ 62.785	\$ 125.569
OPCION	CELDA 305	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CELDA 309	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	BAÑO 2 PISO 1	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	ORINAL	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	REJILLAS PRIMER PISO	SONDEO	UND	4	22.14	\$ 62.785	\$ 251.138
BASICO UNO	CELDA 306	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 317	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 215	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 204	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 202	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 312	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
ADMINISTRATIVO	PISO 2 BAÑO HOMBRES - MITAD	REP. HIDRAULICA	UND	2	6.6.5	\$ 74.720	\$ 149.440
ELÉCTRICO							
ADMINISTRATIVO	PISO 4 ACCESO	PANEL 18 WHATS	UND	0,5	8.1.6	\$ 12.755	\$ 6.378
ADMINISTRATIVO	PISO 2 BAÑO HOMBRES - NORTE	PANEL 18 WHATS	UND	0,5	8.1.6	\$ 12.755	\$ 6.378
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)						\$ 3.873.974,52
B	ADMINISTRACION					25%	\$ 968.493,63
C	IMPREVISTOS					1%	\$ 38.739,75
D	UTILIDAD					4%	\$ 154.958,98
E	SUBTOTALTOTALES (A+B+C)						\$ 5.036.167,00



COMITÉ TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRA No 25

BOGOTÁ D.C. JUNIO 10 DE 2026



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.



CONTRATO DE OBRA : SCJ-2063-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO WR ALIANZA
VALOR CONTRATO: \$ 4.417.892.192,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 28 MESES

CTO DE INTERVENTORIA : SCJ-2114-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO PRISMA DC
VALOR CONTRATO: \$ 739.092.526,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 29 MESES



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ORDEN DEL DIA

- 1.Lectura de Compromisos.
- 2.Información programación y ejecución semanal.
- 3.Actividades Ejecutadas.
- 4.Actividades Programadas
- 5.Seguimiento recorridos (01 al 12)
- 6.Cronograma de mantenimiento
- 7.Temas varios
- 8.No previstos



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. LECTURA COMPROMISOS

Armerillo:

- Vidrio templado

Baño para porteros:

- Obra civil – (Terminado)
- Movimiento punto eléctrico (botón de pánico)

Tanques de almacenamiento:

- Lavado
- Impermeabilización (apu)

Consultoría redes hidráulicas:

- Presupuesto.

Área Caninos:

- Construcción de poceta
- Instalación de acrílicos en ventanas caninos

Cancha múltiple

- Mantenimiento fisura.

Pasadores celdas pabellón:

- Instalación total

Cerramiento carrera 9:

- Presupuesto – diseño de detalle
- Inicio de actividad

Presupuesto y cuantificación:

- Suministro e instalación concertina área perimetral caninos.

Mantenimientos pendientes:

- Lavadoras – secadoras – Urgente



CONSORCIO
PRISMA DC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



BOGOTÁ



CONSORCIO
WR ALIANZA

2. INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMANAL

Semana No. 33 Correspondiente a: 01-06-2026 al 07-06-2026



TOTAL

% PROGRAMADO: 31,06%

% EJECUTADO: 29,25%

DIFERENCIA: -1,81%

TOTAL


VALOR PROGRAMADO: \$ 1.372.738.795,00

VALOR EJECUTADO: \$ 1.292.506.861,00

DIFERENCIA: \$ -80.231.934,00

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS


- Presurización del sistema
- Reparaciones hidráulicas – zona administrativa y penitenciaria.
- Reparaciones eléctricas
- Atención emergencias cerraduras pabellones.
- Instalación de push pabellones.
- Atención de recorridos.
- Pintura multicapa duchas pabellones.
- Instalación de luminarias de panel led.
- Desmonte de Drywall Capilla.
- Cambio de circuito eléctrico área de visitas.

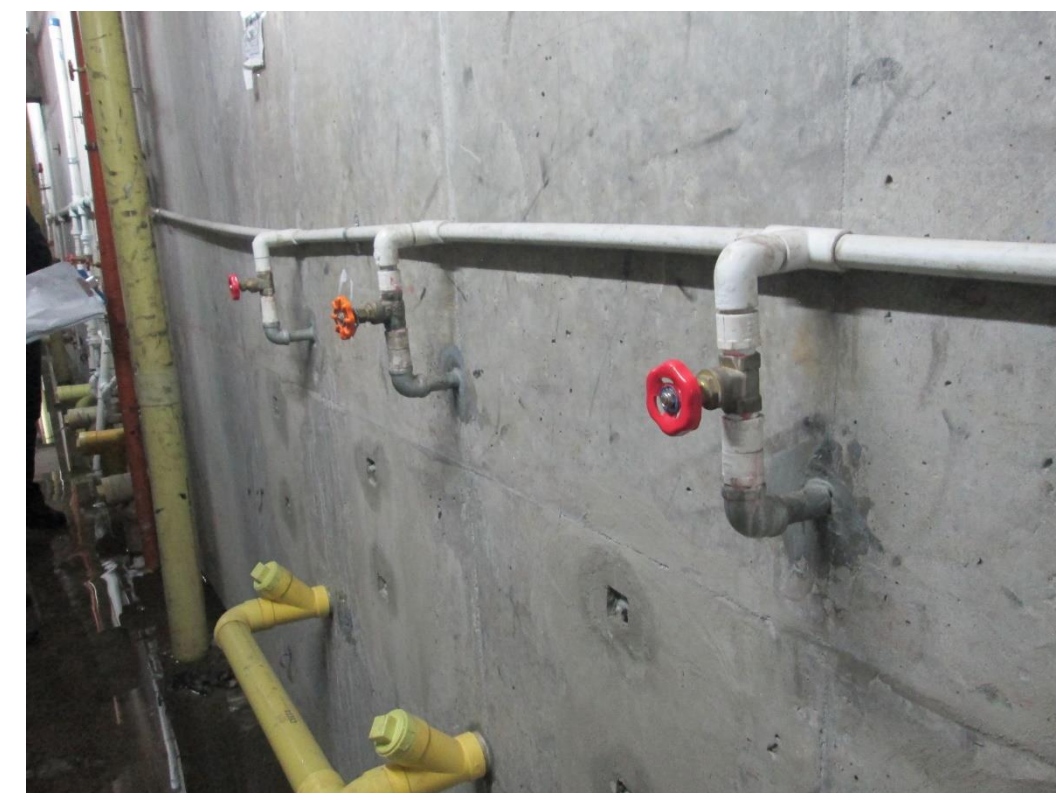

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

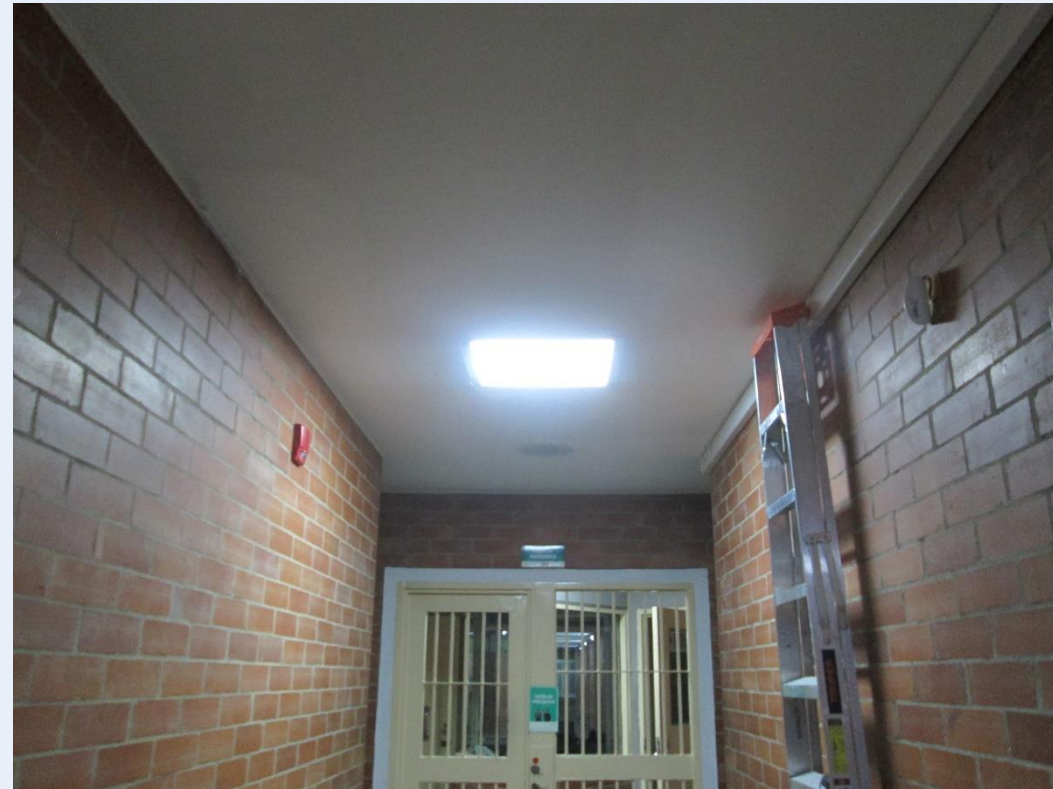

- Reparaciones hidráulicas.
- Presurización del sistema.
- Cambio grifería y push en pabellones.
- Reparaciones eléctricas.
- Resanes generales.
- Instalación de luminarias – panel Led.
- Cambio de circuito eléctrico área de visitas.
- Pintura punto vive digital.
- Desmonte e instalación de Drywall Capilla.
- Pintura celdas 201 – 308 pabellón libertad



CONSORCIO
PRISMA DC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



CONSORCIO
WR ALIANZA

5. SEGUIMIENTO RECORRIDOS

✓ **Recorridos No. 1 AL 12:**
Ejecutados 100%

✓ **Recorrido No. 13:** Ejecutado 25%

Presentado en comité del 27 de mayo de 2026

✓ **Recorrido No. 14:** Ejecutado 0%

Se presentado en comité del 10 de junio de 2026



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



6. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO / INFRAESTRUCTURA	PERIODIC. MESES	2025	2026											
			DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO														
1	LAVADO TANQUE ELEVADO	6	PR						PR						PR
2	LAVADO TANQUE SUBTERRANEO	6	PR						PR						PR
3	LAVADO TANQUE ADMINISTRATIVO	6	PR						PR						PR
4	LAVADO TANQUE RCI	6	PR						PR						PR
	SISTEMA DE BOMBEO SUM. AP														
5	SISTEMA BOMBEO RECLUSORIO	4					PR				PR				PR
6	SISTEMA BOMBEO ADMINISTRATIVO	4					PR				PR				PR
	RED CONTRA INCENDIO														
7	SISTEMA BOMBAS RCI	4					PR				PR				PR
8	SISTEMA RCI RED EXTINCION TABLEROS	4					PR				PR				PR
9	SISTEMA RCI DETECCION	4					PR				PR				PR
10	PITOMETRIA	12							PR						
11	PRUEBAS, MANGUER, GABIN. (Cada 2 AÑOS)	24													
	RANCHO														
12	HORNO PANADERIA	5		PR					PR					PR	
13	AMASADORA	5		PR					PR					PR	
14	MEZCLADORA	5		PR					PR					PR	
15	BATIDORA	5		PR					PR					PR	
	CALDERA														
16	CALDERA (incluye sistema de bombeo agua caliente)	6			PR						PR				
	LAVANDERIA														
17	LAVADORAS	4	PR				PR				PR				PR
18	SECADORAS	4	PR				PR				PR				PR
19	PLANCHAS	4	PR				PR				PR				PR
	SISTEMA DETECCION METALES (SCANERS)														
20	SISTEMA DE ARCO Y SCANER	6				PR						PR			
	CORTINAS Y PUERTAS														
21	MOTORES PARQUADEROS	6				PR						PR			
22	MOTORES PUERTAS GRANDES, CRA 8° Y 9°	4				PR						PR			
	CERRADURAS														
23	CERRADURAS	4													
	PUNTOS DE ANCLAJE														
24	RECERTIFIC. PUNTOS EXISTENTES	12							PR						
25	INST. Y CERTIF. PUNTOS NUEVOS	12													
	OTROS														
26	PLANTA ELECTRICA (TERCEROS)														
27	REDES DE GAS	6				PR						PR			



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS PENDIENTES

Informes especiales de actividades ejecutadas mantenimiento:

- ✓ Cubierta – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Tablero red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema de bombas red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema cortinas y puertas – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Caldera – Pendiente informe mantenimiento correctivo.
- ✓ Red de gas – Pendiente atención comentarios de interventoría



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

VALOR DE CONTRATO					\$ 4.417.892.192
MES	ACTA No.	VALOR MENSUAL FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	% EJECUCION
oct-25	1	\$ 98.949.162,00	\$ 4.318.943.030,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de OCTUBRE DE 2025	2,24%
nov-25	2	\$ 449.722.355,00	\$ 3.869.220.675,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de NOVIEMBRE DE 2025	10,18%
dic-25	3	\$ 47.179.372,00	\$ 3.822.041.303,00	Esta es la acta actual esta en proceso corresponde al mes de DICIEMBRE DE 2025	1,07%
ene-26	4	\$ 127.522.277,00	\$ 3.694.519.026,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ENERO DE 2026	2,89%
feb-26	5	\$ 66.585.977	\$ 3.627.933.049,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de FEBRERO DE 2026	1,51%
mar-26	6	\$ 152.501.785	\$ 3.475.431.264,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de MARZO DE 2026	3,45%
abr-26	7	\$ 178.049.392	\$ 3.297.381.872,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ABRIL DE 2026	4,03%
may-26	8	\$ 137.810.206	\$ 3.159.571.666,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de JUNIO DE 2026	3,12%
TOTAL		\$ 1.258.320.526,00	\$ 3.297.381.872,00		28,49%

ACTA No. 8– \$ 137.810.206 – Porcentaje Presente Acta: 3.12%
Radicado Entidad: 1-2026-31699
Total Ejecutado: \$ 1.258.320.256 – Porcentaje Ejecutado: 28.49%
Saldo Actual: \$ 3.297.381.872 – Porcentaje por Ejecutar: 71.51%



8. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

VALOR CONTRATO				\$ 739.092.526,00
MES	ACTA No.	% DE EJECUCIÒN	FACTURADO INTERVENTORIÀ	SALDO DEL CONTRATO
oct-25	1	2,24%	\$ 16.555.672,58	\$ 722.536.853,42
nov-25	2	10,18%	\$ 75.239.619,15	\$ 647.297.234,27
dic-25	3	1,07%	\$ 7.908.290,03	\$ 639.388.944,24
ene-26	4	2,89%	\$ 21.359.774,00	\$ 618.029.170,24
feb-26	5	1,51%	\$ 11.160.297,14	\$ 606.868.873,10
mar-26	6	3,45%	\$ 25.498.692,15	\$ 581.370.180,95
abr-26	7	4,03%	\$ 29.785.428,80	\$ 551.584.752,15
may-26	8	3,12%	\$ 23.059.686,81	\$ 528.525.065,34
TOTAL		28,49%	\$ 210.567.460,66	\$ 528.525.065,34

ACTA No. 8 – \$ 23.059.686- Porcentaje Presente Acta: 3.12%
Radicado Entidad: 1-2026-31707
Total Ejecutado: \$ 210.567.460 - Porcentaje Ejecutado: 28.49%
Saldo Actual: \$558.525.065- Porcentaje por Ejecutar: 71.51%



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE OBRA

- Informe mensual No. 1 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-87361.
- Informe mensual No. 2 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-92837.
- Informe mensual No. 3 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-1566.
- Informe mensual No. 4 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-5371.
- Informe mensual No. 5 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-11930.
- Informe mensual No. 6 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-18790.
- Informe mensual No. 7 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-25186.
- Informe mensual No. 8 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-31673.



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

- Informe mensual No. 1 – Radicado a la entidad 1-2025-90308.
- Informe mensual No. 2 – Radicado a la entidad 1-2025-93088.
- Informe mensual No. 3 – Radicado a la entidad 1-2026-1570.
- Informe mensual No. 4 – Radicado a la entidad 1-2026-5443.
- Informe mensual No. 5 – Radicado a la entidad 1-2026-11969.
- Informe mensual No. 6 – Radicado a la entidad 1-2026-18823.
- Informe mensual No. 7 – Radicado a la entidad 1-2026-25274.
- Informe mensual No. 8 – Radicado a la entidad 1-2026-31675.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



8. NO PREVISTOS

ÍTEM NP	DESCRIPCIÓN	UND	OBSERVACIÓN PRINCIPAL
NP-19	Suministro e instalación de tablón en gress 25x25	M2	Falta soporte técnico, fichas técnicas, rendimientos y especificaciones completas del sistema constructivo.
NP-20	Suministro e instalación de portón de 7m x 2.70m en tubo rectangular	UND	No presenta desagregación estructural, planos, memorias de cálculo ni especificaciones metálicas completas.
NP-21	Construcción, detalle y acabado de media caña en resina epóxica	ML	No se especifican espesores, resistencia química, preparación de superficie ni procedimiento constructivo.
NP-22	Suministro e instalación de puerta corredera con riel y rodachinas	UND	El APU se presenta globalmente sin discriminar componentes metálicos, accesorios y sistema de deslizamiento.
NP-23	Sistema de piso Epoxi-Ucrete	M2	Solo presenta una cotización válida y la justificación técnica no corresponde al alcance del ítem.
NP-24	Construcción, detalle y acabado de media caña Epoxi-Ucrete	ML	No define geometría, espesores, compatibilidad técnica ni especificaciones del sistema Ucrete.
NP-25	Desmonte, trasiego y marco de ventanería blindada para cristal de 10mm	M2	No presenta certificados de blindaje, especificaciones del vidrio ni detalles de instalación.
NP-26	Suministro e instalación de concertina galvanizada Ø45 cm	ML	Cotizaciones no homogéneas y sin definición técnica de fijaciones, soportes y rendimiento lineal.
NP-27	Desmonte, suministro e instalación de batería sellada 12V-9AH REF. FL1290GS	UND	Inconsistencia entre unidad de medida y forma de pago; falta soporte técnico y compatibilidad UPS.
NP-28	Suministro e instalación de multicapa en resina epóxica	M2	Las cotizaciones anexas corresponden erróneamente a baterías UPS y no al sistema epóxico.
NP-29	Suministro e impermeabilización de tanques con membrana PVC	M2	Solo presenta una cotización válida y no adjunta certificados sanitarios ni garantías del sistema.
NP-30	Suministro e impermeabilización de tanques con Sikaguard	M2	Información técnica insuficiente, falta definición de capas, rendimientos y compatibilidad sanitaria.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



GRACIAS



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

