





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 26-17/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Nombre	Cargo	Empresa/Entidad	Firma
Eric Leonardo Elias Acosta	Apoyo a la supervisión del Contrato	SDSCJ	
Pablo David Ariza Martinez	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Angie Alieth Daza Sandoval	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Wilver Franciny Russey Ladino	Director de Obra	Consorcio WR Alianza	
Gabriel Felipe Arismendi Caicedo	Residente de Obra	Consorcio WR Alianza	
Karen Lisbeth Salamanca Roja	Residente Ambiental y Sst-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Juan Esteban Forero Becerra	Auxiliar Administrativo-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Claudia Alexandra Daza	Inspectora SST -OBRA	Consorcio WR Alianza	
Olga Lucia Torres Camargo	Directora de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Alejandro Hermida Meneses	Residente de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Pedro Enrique Galeano Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Prisma DC	



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 26-17/06/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consorcio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consorcio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Temas de la reunión

Inicio Comité: 9:20am Finalización:

Tema	Descripción
Administrativo	→ Las cuentas ya se radicaron por contrato de obra y interventoría → Pm Ambiental: El apoyo de la supervisión en via la comunicación de seguimiento
Técnico:	→ Escaner Pagos X: A la fecha NO se a realizado la instalación de cambio → Lavadoras y secadoras: A la fecha NO a terminado el mantenimiento total - Secadoras: Programación, Limpieza ducto - Lavadoras: Correas, verificación mecánica - Planchas: Están a la espera de las piezas y el diagnóstico total → Fianza canche administrativo: El contratista de obra dice que se debe romper, y aplicar una cinta, dado que es una junta → Vidrio Blindados: A la fecha esta en un NO Previstos, en cual esta de mano contratista de obra

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 26-17/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	→ <i>Certificación Andagó:</i> A la fecha el contrato de Obra NO a ejecutado
	→ <i>Protección termica - DPS</i> El apoyo a la supervisión envia la descripción del producto, en cual son 12, el contratista de Obra va a realizar el analisis del PISO
	→ <i>Push Magnético</i> A la fecha hace falta por ejecutar de autonomía y Opción.
	→ <i>Cerraduras</i> 311 y Esperanza 213 → El apoyo de la entidad, solicita la ejecución de apertura.
	→ <i>Panaderia</i> Se debe realizar la tampa de graso dado, a los nuevos elementos, y cambio de tuberia de lavamanos. En cual la interventoria y obra solicitan realizar la pintura de multicapa en la zona humida panaderia en cual apoyo de la supervisión da el aprobado

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 26-17/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	El contratista de obra solicita realizar actividades de Noche, en cual la entidad, da el visto bueno → Póster caninos Ya se cuenta con obración, el contratista de obra programara la actividad → Multicapa Rancho A la fecha el NO presta esta atención del contratista de obra → Actividades SST garantas A la fecha ya se encuentra ejecutada 1 de 4 garantas En cual la obra, solicita la incorporación de la pintura total de la escalera, en cual el apoyo de supervisión solicita el presupuesto → Administrativo Piso 4 A la fecha la obra NO a realizado la ejecución, en cual se programara la proxima semana

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 26-17/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	→ Impermeabilización: Se encuentra ejecutado a un 40% → Pavadores Se encuentra en fabricación los 46 → Puerta 1M. Ya se encuentra entregada las llaves a la entidad → Area de Reparto - Cinta antiderrapante: A la fecha del contrato de obra NO a entregado NP → Baños de reemplazo total 308 → Prisión } El contrato de obra ya va a 317 → Libertad } realizar la instalación → Pintura 3 Piso Falta de ejecución Aula -3, Parte posillo central, capilla En la capilla, hace falta el tendido eléctrico, debido que el personal electricista sufrió un accidente laboral

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 26-17/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	y las actividades se ejecutaron en la noche, previo se debían ejecutar demoliciones → Membrana Tanque PUC: Se realizara la mesa de trabajo despues del comite interventoria y obra → PPTO Levantamiento hidraulico El PPTO a la fecha NO a entregado el con lista de obra.



COMITÉ TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRA No 26

BOGOTÁ D.C. JUNIO 17 DE 2026



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.



CONTRATO DE OBRA : SCJ-2063-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO WR ALIANZA
VALOR CONTRATO: \$ 4.417.892.192,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 28 MESES

CTO DE INTERVENTORIA : SCJ-2114-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO PRISMA DC
VALOR CONTRATO: \$ 739.092.526,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 29 MESES



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ORDEN DEL DIA

- 1.Lectura de Compromisos.
- 2.Información programación y ejecución semanal.
- 3.Actividades Ejecutadas.
- 4.Actividades Programadas
- 5.Seguimiento recorridos (01 al 14)
- 6.Cronograma de mantenimiento
- 7.Temas varios
- 8.No previstos



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. LECTURA COMPROMISOS

APU's

- Pendiente entrega final para revisión y legalización

Armerillo:

- Vidrio templado

Baño para porteros:

- Obra civil – (Terminado)
- Movimiento punto eléctrico (botón de pánico)

Tanques de almacenamiento:

- Lavado
- Impermeabilización (apu)

Consultoría redes hidráulicas:

- Presupuesto.

Área Caninos:

- Construcción de poceta

Cancha múltiple

- Mantenimiento fisura.

Pasadores celdas pabellón:

- Fabricación e instalación

Cerramiento carrera 9:

- Presupuesto – diseño de detalle
- Inicio de actividad

Presupuesto y cuantificación:

- Suministro e instalación concertina área perimetral caninos.

Mantenimientos pendientes:

- Lavadoras – secadoras – Urgente



CONSORCIO
PRISMA DC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



BOGOTÁ



CONSORCIO
WR ALIANZA

2. INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMANAL

Semana No. 34 Correspondiente a: 08-06-2026 al 14-06-2026



TOTAL

% PROGRAMADO: 32,08%

% EJECUTADO: 30,01%

DIFERENCIA: -2,07%

TOTAL


VALOR PROGRAMADO: \$ 1.417.652.128,00

VALOR EJECUTADO: \$ 1.326.046.861,00

DIFERENCIA: \$ -91.605.267,00

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Presurización del sistema
- Reparaciones hidráulicas – zona administrativa y penitenciaria.
- Atención emergencias pasillos de servicios pabellones.
- Instalación de push pabellones.
- Atención de recorridos.
- Pintura vinilo y epoxica en cuarto de herramientas.
- Pintura vinilo y epoxica en punto vive digital.
- Desmonte de Drywall Capilla.
- Instalación de manto asfaltico penitenciaria zona sur - occidente
- Pintura carpintería metálica escaleras y baranda en garitas

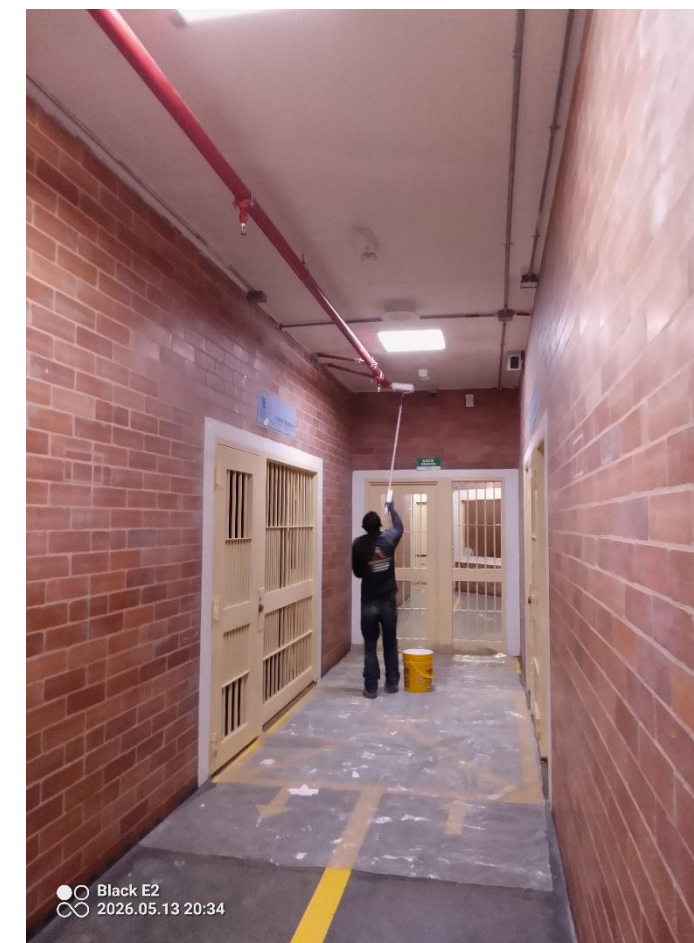

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS



- Reparaciones hidráulicas.
- Presurización del sistema.
- Cambio push en pabellones.
- Reparaciones eléctricas.
- Resanes generales.
- Instalación de luminarias – panel Led.
- Pintura punto vive digital.
- Desmonte e instalación de Drywall Capilla.
- Pintura celdas 201 – 308 pabellón libertad.
- Instalación de manto asfáltico penitenciaria zona sur - occidente
- Pintura carpintería metálica escaleras y baranda en garitas.
- Pintura vinilo y epoxica en punto vive digital.



CONSORCIO
PRISMA DC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



CONSORCIO
WR ALIANZA

5. SEGUIMIENTO RECORRIDOS

✓ **Recorridos No. 1 AL 12:**
Ejecutados 100%

✓ **Recorrido No. 13:** **Ejecutado 62%**

Presentado en comité del 27 de mayo de 2026

✓ **Recorrido No. 14:** **Ejecutado 18%**

Se presentado en comité del 10 de junio de 2026



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



6. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO / INFRAESTRUCTURA	PERIODIC. MESES	2025	2026											
			DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO														
1	LAVADO TANQUE ELEVADO	6	PR						PR						PR
2	LAVADO TANQUE SUBTERRANEO	6	PR						PR						PR
3	LAVADO TANQUE ADMINISTRATIVO	6	PR						PR						PR
4	LAVADO TANQUE RCI	6	PR						PR						PR
	SISTEMA DE BOMBEO SUM. AP														
5	SISTEMA BOMBEO RECLUSORIO	4					PR				PR				PR
6	SISTEMA BOMBEO ADMINISTRATIVO	4					PR				PR				PR
	RED CONTRA INCENDIO														
7	SISTEMA BOMBAS RCI	4					PR				PR				PR
8	SISTEMA RCI RED EXTINCION TABLEROS	4					PR				PR				PR
9	SISTEMA RCI DETECCION	4					PR				PR				PR
10	PITOMETRIA	12							PR						
11	PRUEBAS, MANGUER, GABIN. (Cada 2 AÑOS)	24													
	RANCHO														
12	HORNO PANADERIA	5		PR					PR					PR	
13	AMASADORA	5		PR					PR					PR	
14	MEZCLADORA	5		PR					PR					PR	
15	BATIDORA	5		PR					PR					PR	
	CALDERA														
16	CALDERA (incluye sistema de bombeo agua caliente)	6			PR						PR				
	LAVANDERIA														
17	LAVADORAS	4	PR				PR				PR				PR
18	SECADORAS	4	PR				PR				PR				PR
19	PLANCHAS	4	PR				PR				PR				PR
	SISTEMA DETECCION METALES (SCANERS)														
20	SISTEMA DE ARCO Y SCANER	6				PR						PR			
	CORTINAS Y PUERTAS														
21	MOTORES PARQUADEROS	6				PR						PR			
22	MOTORES PUERTAS GRANDES, CRA 8° Y 9°	4				PR						PR			
	CERRADURAS														
23	CERRADURAS	4													
	PUNTOS DE ANCLAJE														
24	RECERTIFIC. PUNTOS EXISTENTES	12							PR						
25	INST. Y CERTIF. PUNTOS NUEVOS	12													
	OTROS														
26	PLANTA ELECTRICA (TERCEROS)														
27	REDES DE GAS	6				PR						PR			



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS PENDIENTES

Informes especiales de actividades ejecutadas mantenimiento:

- ✓ Cubierta – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Tablero red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema de bombas red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema cortinas y puertas – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Caldera – Pendiente informe mantenimiento correctivo.
- ✓ Red de gas – Pendiente atención comentarios de interventoría



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

VALOR DE CONTRATO					\$ 4.417.892.192
MES	ACTA No.	VALOR MENSUAL FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	% EJECUCION
oct-25	1	\$ 98.949.162,00	\$ 4.318.943.030,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de OCTUBRE DE 2025	2,24%
nov-25	2	\$ 449.722.355,00	\$ 3.869.220.675,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de NOVIEMBRE DE 2025	10,18%
dic-25	3	\$ 47.179.372,00	\$ 3.822.041.303,00	Esta es la acta actual esta en proceso corresponde al mes de DICIEMBRE DE 2025	1,07%
ene-26	4	\$ 127.522.277,00	\$ 3.694.519.026,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ENERO DE 2026	2,89%
feb-26	5	\$ 66.585.977	\$ 3.627.933.049,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de FEBRERO DE 2026	1,51%
mar-26	6	\$ 152.501.785	\$ 3.475.431.264,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de MARZO DE 2026	3,45%
abr-26	7	\$ 178.049.392	\$ 3.297.381.872,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ABRIL DE 2026	4,03%
may-26	8	\$ 137.810.206	\$ 3.159.571.666,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de JUNIO DE 2026	3,12%
TOTAL		\$ 1.258.320.526,00	\$ 3.297.381.872,00		28,49%

ACTA No. 8– \$ 137.810.206 – Porcentaje Presente Acta: 3.12%
Radicado Entidad: 1-2026-31699
Total Ejecutado: \$ 1.258.320.256 – Porcentaje Ejecutado: 28.49%
Saldo Actual: \$ 3.297.381.872 – Porcentaje por Ejecutar: 71.51%



8. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

VALOR CONTRATO				\$ 739.092.526,00
MES	ACTA No.	% DE EJECUCIÒN	FACTURADO INTERVENTORÌA	SALDO DEL CONTRATO
oct-25	1	2,24%	\$ 16.555.672,58	\$ 722.536.853,42
nov-25	2	10,18%	\$ 75.239.619,15	\$ 647.297.234,27
dic-25	3	1,07%	\$ 7.908.290,03	\$ 639.388.944,24
ene-26	4	2,89%	\$ 21.359.774,00	\$ 618.029.170,24
feb-26	5	1,51%	\$ 11.160.297,14	\$ 606.868.873,10
mar-26	6	3,45%	\$ 25.498.692,15	\$ 581.370.180,95
abr-26	7	4,03%	\$ 29.785.428,80	\$ 551.584.752,15
may-26	8	3,12%	\$ 23.059.686,81	\$ 528.525.065,34
TOTAL		28,49%	\$ 210.567.460,66	\$ 528.525.065,34

ACTA No. 8 – \$ 23.059.686- Porcentaje Presente Acta: 3.12%
Radicado Entidad: 1-2026-31707
Total Ejecutado: \$ 210.567.460 - Porcentaje Ejecutado: 28.49%
Saldo Actual: \$558.525.065- Porcentaje por Ejecutar: 71.51%



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE OBRA

- Informe mensual No. 1 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-87361.
- Informe mensual No. 2 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-92837.
- Informe mensual No. 3 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-1566.
- Informe mensual No. 4 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-5371.
- Informe mensual No. 5 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-11930.
- Informe mensual No. 6 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-18790.
- Informe mensual No. 7 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-25186.
- Informe mensual No. 8 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-31673.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

- Informe mensual No. 1 – Radicado a la entidad 1-2025-90308.
- Informe mensual No. 2 – Radicado a la entidad 1-2025-93088.
- Informe mensual No. 3 – Radicado a la entidad 1-2026-1570.
- Informe mensual No. 4 – Radicado a la entidad 1-2026-5443.
- Informe mensual No. 5 – Radicado a la entidad 1-2026-11969.
- Informe mensual No. 6 – Radicado a la entidad 1-2026-18823.
- Informe mensual No. 7 – Radicado a la entidad 1-2026-25274.
- Informe mensual No. 8 – Radicado a la entidad 1-2026-31675.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



8. NO PREVISTOS

ÍTEM NP	DESCRIPCIÓN	UND	OBSERVACIÓN PRINCIPAL
NP-19	Suministro e instalación de tablón en gress 25x25	M2	Falta soporte técnico, fichas técnicas, rendimientos y especificaciones completas del sistema constructivo.
NP-20	Suministro e instalación de portón de 7m x 2.70m en tubo rectangular	UND	No presenta desagregación estructural, planos, memorias de cálculo ni especificaciones metálicas completas.
NP-21	Construcción, detalle y acabado de media caña en resina epóxica	ML	No se especifican espesores, resistencia química, preparación de superficie ni procedimiento constructivo.
NP-22	Suministro e instalación de puerta corredera con riel y rodachinas	UND	El APU se presenta globalmente sin discriminar componentes metálicos, accesorios y sistema de deslizamiento.
NP-23	Sistema de piso Epoxi-Ucrete	M2	Solo presenta una cotización válida y la justificación técnica no corresponde al alcance del ítem.
NP-24	Construcción, detalle y acabado de media caña Epoxi-Ucrete	ML	No define geometría, espesores, compatibilidad técnica ni especificaciones del sistema Ucrete.
NP-25	Desmonte, trasiego y marco de ventanería blindada para cristal de 10mm	M2	No presenta certificados de blindaje, especificaciones del vidrio ni detalles de instalación.
NP-26	Suministro e instalación de concertina galvanizada Ø45 cm	ML	Cotizaciones no homogéneas y sin definición técnica de fijaciones, soportes y rendimiento lineal.
NP-27	Desmonte, suministro e instalación de batería sellada 12V-9AH REF. FL1290GS	UND	Inconsistencia entre unidad de medida y forma de pago; falta soporte técnico y compatibilidad UPS.
NP-28	Suministro e instalación de multicapa en resina epóxica	M2	Las cotizaciones anexas corresponden erróneamente a baterías UPS y no al sistema epóxico.
NP-29	Suministro e impermeabilización de tanques con membrana PVC	M2	Solo presenta una cotización válida y no adjunta certificados sanitarios ni garantías del sistema.
NP-30	Suministro e impermeabilización de tanques con Sikaguard	M2	Información técnica insuficiente, falta definición de capas, rendimientos y compatibilidad sanitaria.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



GRACIAS



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

