

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

UNIDAD EJECUTORA:
Subdirección de Vías Regionales

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Informe Mensual No. 5

Periodo: Marzo - 2026

CONTRATO NÚMERO 1703 DE 2025

Objeto:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES MASTER SAS

FECHA DE INICIO CONTRATO:
10/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO CONTRATO:
30/06/2026

SUPERVISOR

ING. JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Área Técnica Dirección Territorial Boyacá

Fecha:
6/04/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.1703-2025

Contratista: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

Contrato de Interventoría No.N/A

Interventoría: N/A

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME MENSUAL No.5

MES O PERIODO:Marzo - 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A	N/A
5.1	Información general del contrato	N/A	N/A
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	N/A	N/A
5.3	Informes especialistas y profesionales	N/A	N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC	N/A	N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.	N/A	N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según plegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría	N/A	N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	N/A	N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		N/A
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	N/A
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

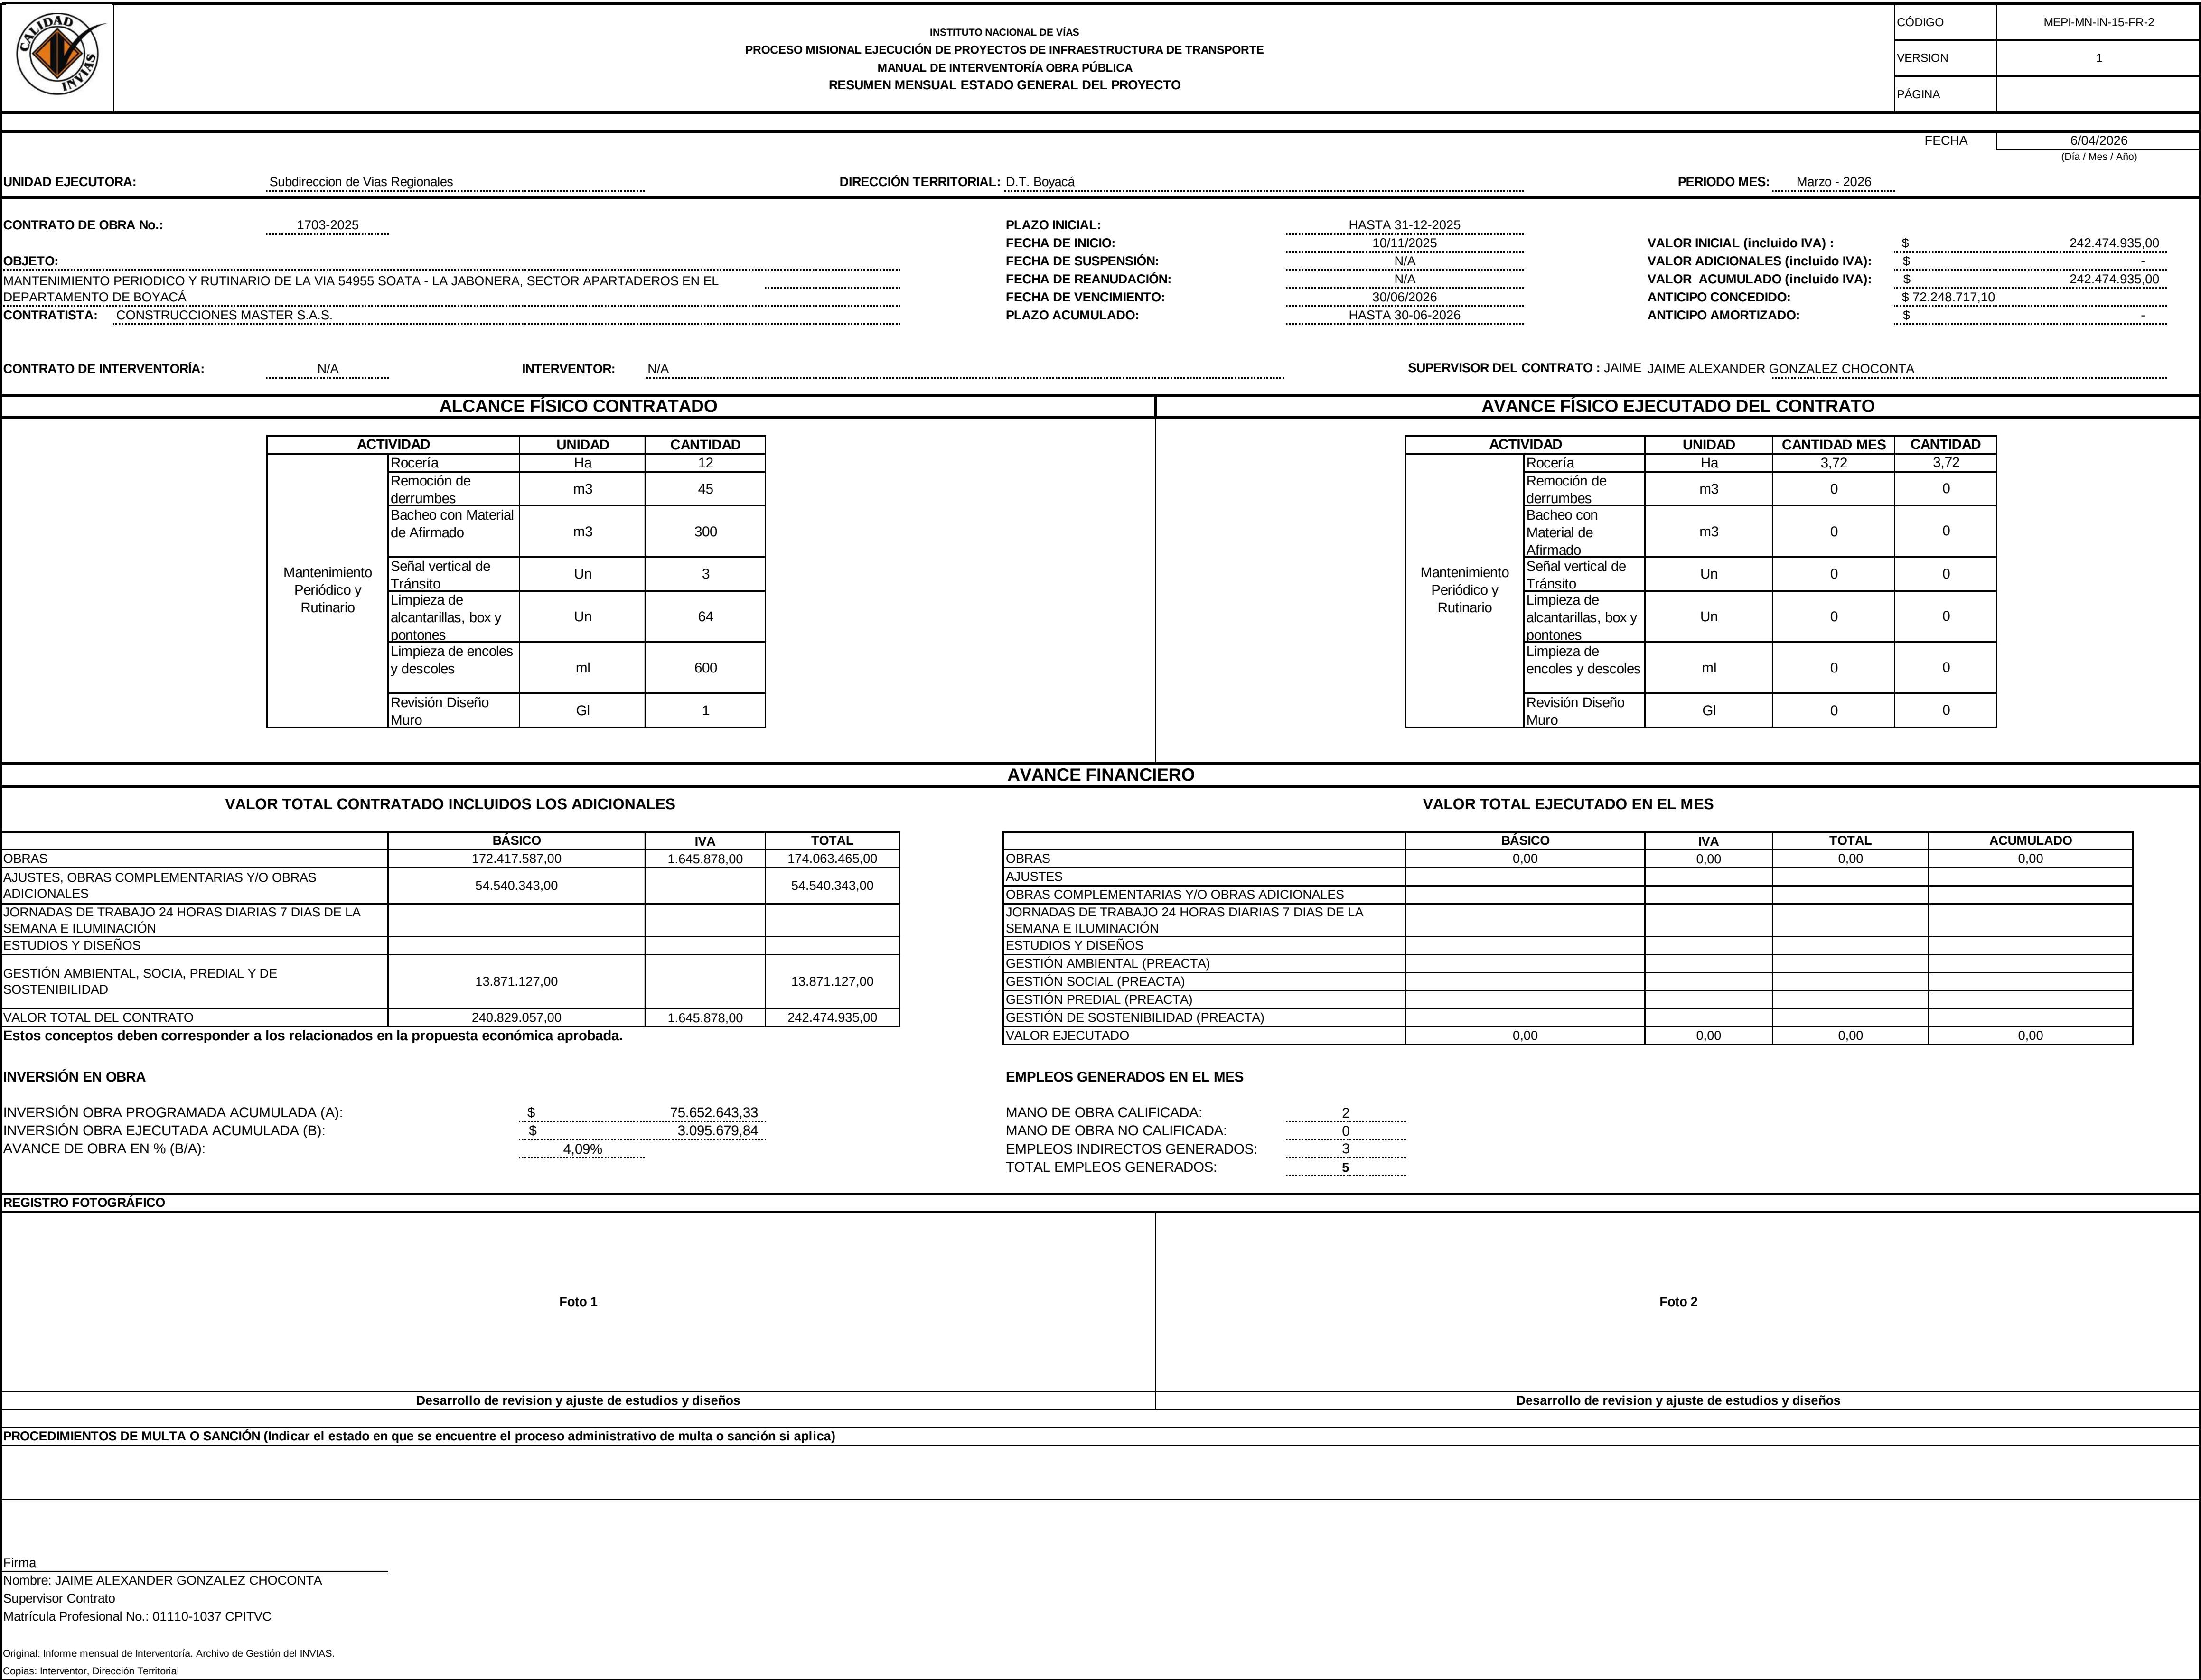
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Resolución de designación No. 5094 de fecha 25/11/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al **Contrato de Obra No. 1703-2025**, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y la empresa **Construcciones Master S.A.S.**, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA LA JABONERA SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

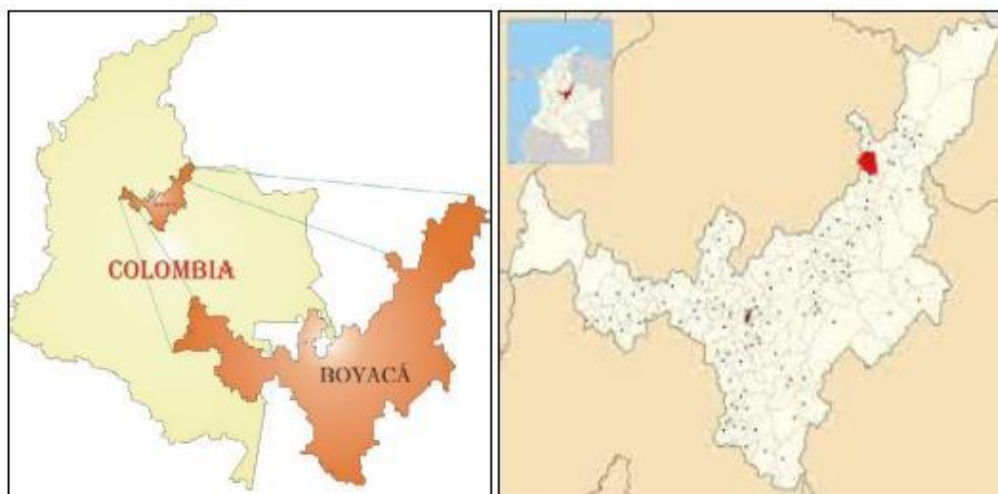
Este contrato fue adjudicado mediante el proceso de selección abreviada **SA-MC-DEO-SVR-009-2025**, cuyo registro en el SECOP II se encuentra bajo el ID **CO1.PCCNTR.8317236**. En el marco del presente proyecto, el contratista es responsable de adelantar las actividades orientadas a conservar las condiciones de transitabilidad, seguridad y funcionalidad del corredor vial.

La supervisión del contrato se realiza por parte del Instituto Nacional de Vías, a cargo del supervisor designado Ing. Jaime Alexander González Choconta, quien verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales, sociales y administrativas establecidas. De igual manera, se cuenta con el equipo técnico del contratista, responsable de la planeación, ejecución y control de las labores programadas durante el plazo contractual.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION

El proyecto se sitúa al norte del departamento de Boyacá, y conecta el casco urbano, situado a unos 1.950 metros sobre el nivel del mar, con la vereda La Jabonera, descendiendo por las laderas de la Cordillera Oriental y bordeando zonas del cañón del río Chicamocha. Este trayecto atraviesa paisajes de bosque seco premontano y áreas agrícolas donde predominan cultivos como cítricos, aguacate y cacao, además de sistemas silvopastoriles con cría de caprinos. La vía es rural y forma parte de la red vial secundaria que comunica varias veredas del sector, siendo clave para la movilidad y el desarrollo



El proyecto objeto de este informe se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Soatá, cuyas coordenadas son 6°19'58"N 72°41'02"O en el departamento de Boyacá, específicamente sobre la vía 54955 en el tramo Soatá – La Jabonera – Sector Apartaderos.

El corredor vial hace parte de una ruta TERCIARIA que conecta diferentes veredas del SECTOR APARTADEROS - LA JABONERA y constituye una vía fundamental para la movilidad local, el acceso a centros poblados y el transporte de productos agrícolas de la región.

Como punto de referencia inicial se toma el **PR0+000**, localizado aproximadamente en las coordenadas:

Latitud: 6°17'58.47"N

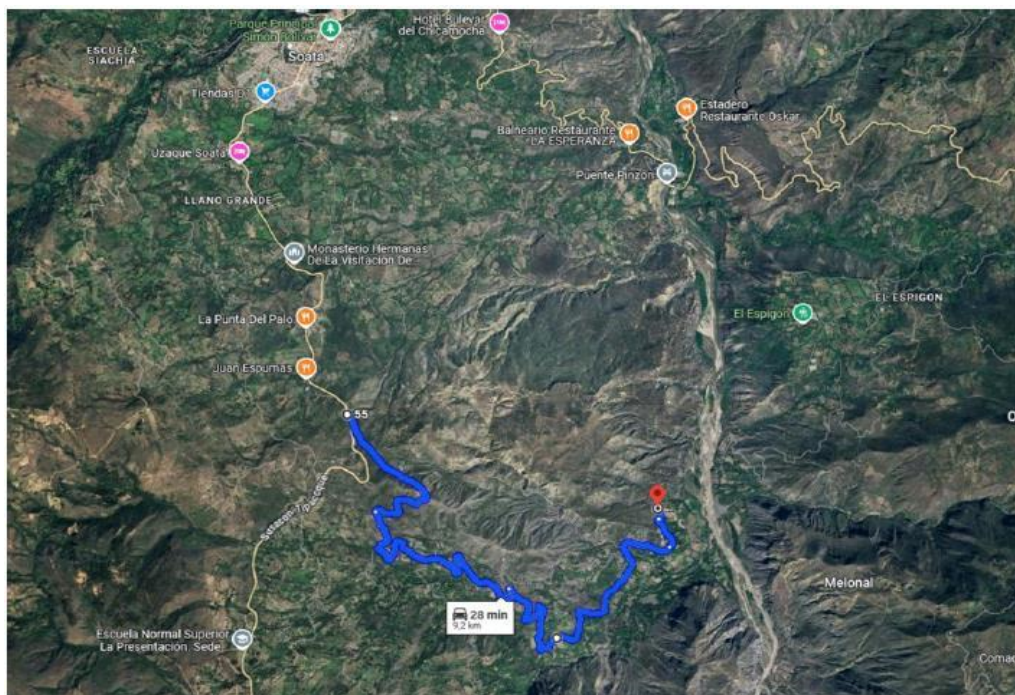
Longitud: 72°40'44.63"W

El punto de referencia final del tramo intervenido corresponde al **PR9+300**, ubicado hacia el sector de La Jabonera, con coordenadas aproximadas:

Latitud: 6°17'22.65"N

Longitud: 72°38'59.99"W

Estas coordenadas se establecen a partir de la verificación en campo y el seguimiento cartográfico preliminar realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Boyacá del INVÍAS, definiendo así el alcance lineal del mantenimiento rutinario programado para esta sección de la vía **54955**.



2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de **mantenimiento periódico y rutinario de la vía 54955, tramo Soatá – La Jabonera – Sector Apartaderos**, tiene como zona de influencia directa al **municipio de Soatá**, en el departamento de Boyacá. Esta vía constituye un corredor estratégico que conecta áreas rurales productivas con el casco urbano del municipio, facilitando la movilidad de habitantes, transporte de mercancías y acceso a servicios esenciales.

En su zona de influencia indirecta se encuentran comunidades pertenecientes a las veredas **La Jabonera, Apartaderos, Resguardo** y sectores aledaños que dependen de este corredor para actividades productivas, desplazamiento hacia instituciones educativas, centros de salud y comercialización agrícola.

Beneficios esperados de la ejecución del proyecto

La intervención del corredor vial genera una serie de beneficios sociales, económicos y operativos, entre los cuales se destacan:

Mejoramiento de la transitabilidad: El mantenimiento rutinario garantiza una superficie de rodadura en mejores condiciones, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos de operación vehicular.

Mayor seguridad vial: Al corregir deterioros, limpiar drenajes y mejorar visibilidad, se disminuye el riesgo de accidentes, especialmente en tramos rurales donde circulan motociclistas, vehículos de carga y transporte escolar.

Facilitación del transporte de productos agrícolas: La región cuenta con producción de caña, frutales, café y productos pecuarios. El mejoramiento del corredor facilita la salida a mercados locales y regionales.

Fortalecimiento del acceso a servicios básicos: La vía es empleada para el traslado hacia Soatá, donde se concentran los servicios de salud, educación, comercio y administración municipal.

Impacto positivo en la economía local: Al mejorar la conectividad, se favorecen pequeños comerciantes, transportadores y productores locales, dinamizando la economía rural.

Continuidad en la prestación del servicio público de transporte: Un tramo en buen Limpieza manual de cunetas no revestidas estado evita interrupciones y facilita la operación de rutas veredales y transporte intermunicipal.

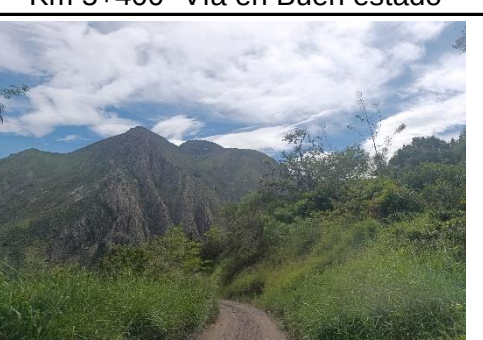
En conjunto, estos beneficios contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población rural del municipio de Soatá y a garantizar la funcionalidad del corredor vial dentro de la red secundaria del departamento de Boyacá.

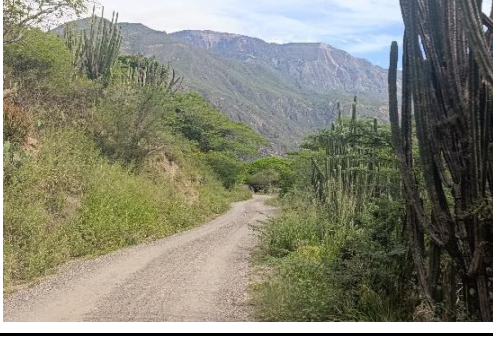
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El Supervisor realizó el inventario físico del corredor vial, documentando el estado inicial de la superficie de rodadura, obras de drenaje, señalización, coronaciones, taludes y elementos de la estructura existente.

Se identificaron afectaciones como alta maleza a lado y lado de la vía, derrumbes, falta de material de afirmado en algunos sectores, conformación de la calzada existente, falta limpieza cunetas, alcantarillas bacheos, se identificó un punto crítico en el km 4.4 en el cual se derrumbó parte de la alcantarilla y es necesario para que la banca no se pierda, las cuales fueron registradas mediante recorrido técnico.

		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 0+000- Vía en Buen estado	Km 0+200- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 0+900- Vía en Buen estado	Km 1+500- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 2+100- Vía en Buen estado	Km 2+400- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 2+600- Vía en Buen estado	Km 2+800- Vía en Buen estado	

		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 3+600- Vía en Buen estado	Km 4+100- Vía en Buen estado	
		Sitio Critico, amenaza posible perdida parcial de banca, se requiere obra de contención de talud inferior y recuperación de descole de alcantarilla
Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	
		Sitio Critico, amenaza posible perdida parcial de banca, se requiere obra de contención de talud inferior y recuperación de descole de alcantarilla
Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	Km 4+400- Sitio Critico Falla talud	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 4+700- Vía en Buen estado	Km 5+400- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 5+700- Vía en Buen estado	Km 6+100- Vía en Buen estado	

		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 6+800- Vía en Buen estado	Km 7+000- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 8+300- Vía en Buen estado	Km 8+400- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 8+500- Vía en Buen estado	Km 8+900- Vía en Buen estado	
		Vía en buen estado en material de afirmado, es necesario realizar rocería y limpieza de cunetas
Km 9+200- Vía en Buen estado	Km 9+300- Vía en Buen estado	

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla la intervención del corredor vial mediante actividades orientadas al mantenimiento periódico y rutinario. Entre las características técnicas se incluyen:

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Remoción de derrumbes
- Conformación Calzada Existente
- Bacheo con Material de Afirmado
- Señal vertical de Tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimensión 75 x 75 cm, en lámina galvanizada retroreflectiva, con película retroreflectiva tipo IV.
- Limpieza manual de cunetas no revestidas
- Limpieza de alcantarillas con diámetro 36"
- Limpieza de pontones y box coulvert
- Limpieza de encoles y descoles

- PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
- GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA e IVA) (G)

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información general del contrato

CONTRATO DE OBRA	1703-2025
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.
SUPERVISOR:	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	\$ 242.474.935,00
PLAZO DE EJECUCIÓN :	HASTA 31-12-2025
ANTICIPO	\$ 72.248.717,10
ADICIONAL	\$ 0,00
FECHA DE INICIACIÓN:	10/11/2025
FECHA DE TERMINACION	30/06/2026

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Toma de información para desarrollo de estudios y diseños del Km 4+400- Sitio Critico Falla talud

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Se incluye en el presente periodo el Item No previsto de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL, con el fin de adelantar la revisión de la cartilla de obras menores y proyectar un diseño a fin de solucionar la problemática del punto critico del Km 4+400- Sitio Critico Falla talud

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL	GL	1	9.956.000,00	9.956.000,00

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Supervisión.

Se esta coordinando con el contratista para definir acciones a seguir

4. Reportes ejecución mensual contrato de obra:

4.1. Informe semanal.

Se anexa informes semanales del periodo de: Marzo - 2026

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
.....
UBICACIÓN:
.....

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X
VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SIN PRESENTAR.....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
.....

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Toma de informacion de Campo para desarrollo de estudios y diseños para punto crítico Km 4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Indicar localización y actividadIndicar localización y actividadIndicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Requerimientos al contratista a fin de inicar actividades acordadas y programada junto con la supervision del contrato

FIRMA
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: SIN PRESENTAR		OBSERVACIONES:	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1		
	5		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			
VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		OBSERVACIONES:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:			
AVALUOS APROBADOS:			
PREDIOS ADQUIRIDOS:			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Requerimientos al contratista a fin de iniciar actividades acordadas y programada junto con la supervisión del contrato		FIRMA NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
.....
UBICACIÓN:
.....

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X
VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: SIN PRESENTAR.....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
.....

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PEDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Trabajo de oficina desarrollo de estudios y diseños para punto critico Km 4+200

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Indicar localización y actividad

Indicar localización y actividad

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Requerimientos al contratista a fin de iniciar actividades acordadas y programada junto con la supervisión del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

No se ha iniciado actividades de obra que requieran Maquinaria y equipo, las actividades desarrolladas en el periodo se utilizó solo personal - El equipo y maquinaria se relaciona el Siguiendo Formato:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4						
																											VERSIÓN	1						
																											PÁGINA							
FECHA6/04/2026(Día / Mes / Año)																																		
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales																DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá																		
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																		
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Marzo - 2026																PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																		
CONTRATO No. 1703-2025																CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.																		
CONTRATO INTERVENTORÍA No. N/A																INTERVENTORÍA: N/A																		
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora balde 1.5 m³		1.5			I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
Motoniveladora					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
Compactador vibratorio					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
Carrotanque de agua 1000 litros					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			
TOTAL ACTIVO					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
TOTAL EN REPARACIÓN					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
TOTAL INACTIVO					4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4			
RESUMEN PERIODO / MES			No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																													
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			4	100																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			0	0																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			0	0																														
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			4	100																														
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contrato no ha iniciado actividades de obra en Campo que requieran la maquinaria contemplada																																		
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																		
NOTAS:																																		
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																		
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.																																		
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.																																		
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																		
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																		
																Firma Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD																		
																Firma Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA Supervisor Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC																		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																		
Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																		

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El personal se relaciona el Siguiendo Formato:

4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Se presenta formato de acuerdo a lo ejecutado en el periodo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA			

FECHA

6/04/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	Subdireccion de Vias Regionales												DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá				
-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

CONTRATO DE OBRA No:	1703-2025												CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.				
MES INFORME MENSUAL:	Marzo - 2026												PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	N/A												INTERVENTOR: N/A				

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	742525	C-2402-0600-13-51102A-2402112-02	10	Nación	1703-2025	\$ 242.474.935	\$ 242.474.935
TOTAL						\$ 242.474.935	\$ 242.474.935

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 242.474.935,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	Diciembre - 2025	\$ 3.095.679,84	\$ 22.450,00	\$ 3.118.130	\$ -	\$ 3.118.129,84	\$ -	742525 del 16/10/2025	\$ 242.474.935,00	\$ 242.474.935,00				
									742525 del 16/10/2025	\$ 239.356.805,16	\$ 239.356.805,16				
TOTALES			\$ 3.095.679,84	\$ 22.450,00	\$ 3.118.129,84	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 239.356.805,16	\$ 239.356.805,16				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	\$ 3.095.679,84	\$ 22.450,00	\$ 3.118.129,84
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ -	\$ -	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -
ÍTEM NO PREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -
*			
VALOR TOTAL	\$ 3.095.679,84	\$ 22.450,00	\$ 3.118.129,84

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. Estado general del tiempo.

Se presenta formato de acuerdo a lo ejecutado en el periodo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN		1									
																					PÁGINA											
																				FECHA		6/04/2026 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá												
CONTRATO DE OBRA No: 1703-2025																				CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo - 2026																				PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A																				INTERVENTOR: N/A												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24				
Lluvias moderadas		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Lluvias intensas		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Total horas		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24				
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div><div>Firma</div><div>Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD</div></div><div><div>Firma</div><div>Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA</div><div>Supervisor</div><div>Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC</div></div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

4.6. Resumen ensayos de Laboratorio.

En el presente periodo no se adelantaron obras que requieran la realización de ensayos de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, por tanto no se realizan ensayos de control de calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	6/04/2026 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá									
CONTRATO DE OBRA No.: 1703-2025 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSU Marzo - 2026 PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N N/A INTERVENTOR: N/A									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
No se han iniciado actividades de obra en campo									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en									
Firma					Firma				
Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA					Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA				
Director de Obra					Supervisor				
Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD					Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se anexa formato de seguimiento a Garantías y el respectivo anexo actualizado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
		VERSIÓN	1																																																														
		PÁGINA																																																															
		FECHA	6/04/2026 (Día) (Mes) (Año)																																																														
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales		DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá																																																															
CONTRATO DE OBRA No. 1703-2025		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.																																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																																																																	
FECHA DE INICIO: 10/11/2025 PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 46203 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 242.474.935,00 VALOR ACUMULADO: \$ 242.474.935,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A INTERVENTOR: N/A																																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10</td><td>\$ 24.247.493,50</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100</td><td>\$ 72.742.480,50</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20</td><td>\$ 48.494.987,00</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30</td><td>\$ 72.742.480,50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10	\$ 24.247.493,50	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$ 72.742.480,50	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 48.494.987,00	Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 72.742.480,50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>10</td><td>2025</td><td colspan="3">LIQUIDACION</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>2025</td><td colspan="3">LIQUIDACION</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>2025</td><td>31</td><td>10</td><td>2028</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">ACTA DE ENTREGA</td><td colspan="3">5 AÑOS</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			3	10	2025	LIQUIDACION			3	10	2025	LIQUIDACION			3	10	2025	31	10	2028							ACTA DE ENTREGA			5 AÑOS		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																															
Cumplimiento	10	\$ 24.247.493,50																																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$ 72.742.480,50																																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 48.494.987,00																																																															
Calidad de Estudios y Diseños																																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 72.742.480,50																																																															
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
3	10	2025	LIQUIDACION																																																														
3	10	2025	LIQUIDACION																																																														
3	10	2025	31	10	2028																																																												
ACTA DE ENTREGA			5 AÑOS																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 600 - 47 - 994000077535																																																																	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																	
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA																																																																	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/10/2025																																																																	
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																	
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 284.700.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>10</td><td>2025</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			3	10	2025	31	12	2025																																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																															
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00																																																															
Otros																																																																	
VIGENCIA																																																																	
Desde			Hasta																																																														
3	10	2025	31	12	2025																																																												

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 600-74 - OTRAS PÓLIZAS No. 994000012326

Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
- 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Supervisor

Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra

No se ha iniciado actividades en campo, Plan de calidad aun en desarrollo del contratista de obra y por presentar a la supervisión

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo. No se ha desembolsado a la fecha
- Seguimiento Programa de Obra.
- Seguimiento Programa de Inversiones.
- Actas de Comité de Obra
- Actas de Reunión.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	33 de 52
		PÁGINA	

FECHA

16/02/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

Subdireccion de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

D.T. Boyacá

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

1

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No.		1703-2025		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.			
		(Indicar número y año)					
OBJETO DEL CONTRATO:							
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		N/A		INTERVENTOR: N/A			
		(Indicar número y año)					
JUSTIFICACIÓN:							
Plan de Inversion inicial							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Material de afirmado		\$ 15.000.000,00			\$ 15.000.000,00	20,62%
2	Equipos y herramienta menor		\$ 5.000.000,00			\$ 5.000.000,00	6,87%
3	Transporte de materiales		\$ 22.000.000,00			\$ 22.000.000,00	30,24%
4	Costos de Personal (Mano de Obra)		\$ 30.742.480,50			\$ 30.742.480,50	42,26%
TOTAL			\$ 72.742.480,50			\$ 72.742.480,50	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA

Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma:

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Supervisor

Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

06/04/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

Subdireccion de Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

D.T. Boyacá

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

1

MES:

Marzo - 2026

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No.

1703-2025

(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No.

N/A

DE

N/A

ENTIDAD FINANCIERA:

N/A

(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No.

267882959

BANCO

Banco de Occidente

SUCURSAL:

Tunja

(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO:

30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:

\$ 72.248.717,10

(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

N/A

(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

N/A

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Material de afirmado	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00
2	Equipos y herramienta menor	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00
3	Transporte de materiales	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000,00
4	Costos de Personal (Mano de Obra)	\$ 30.742.480,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.742.480,50
	TOTALES	\$ 72.742.480,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.742.480,50

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (__ N/A __) :

(Indicar el mes)

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Anticipo sin desembolso a la fecha

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.**

Firma:

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA

Representante Legal o Delegado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 68202-45343 STD

Firma:

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Supervisor

Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vías RegionalesDIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No. 1703-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	
		(Día / Mes / Año)	
<div>DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá

CONTRATO DE OBRA No. 1703-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	
		(Día / Mes / Año)	
<div>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</div> <div></div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2																																				
		VERSIÓN	1																																				
		PÁGINA																																					
		FECHA																																					
		(Día / Mes / Año)																																					
<table><thead><tr><th>COMPROMISOS PACTADOS</th><th>FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)</th><th colspan="2">RESPONSABLES</th></tr></thead><tbody><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td colspan="2">.....</td></tr></tbody></table>				COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES																																	
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES																																					
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN																																							
(Día / Mes / Año)																																							
NOTAS:																																							
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.																																							
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.																																							
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:																																							
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																																				
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																							

7. Conclusiones y recomendaciones

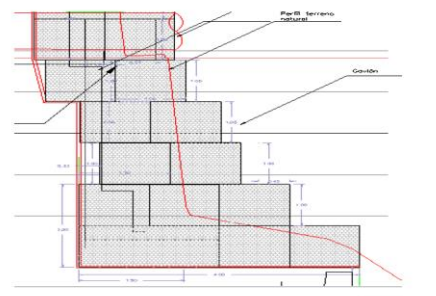
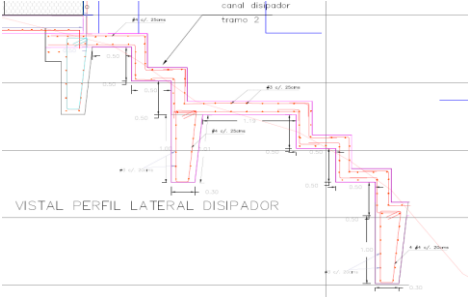
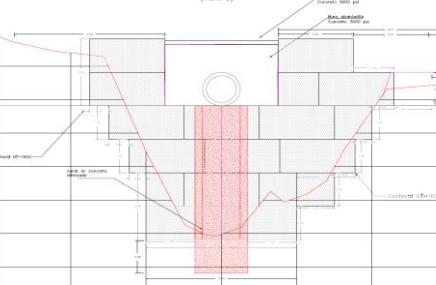
-El contratista en el presente periodo esta realizando la revisión y estudios y diseños para la construcción de una obra de contención del talud (muro en gaviones y/o similar en un punto critico) y recuperación del descole de la alcantarilla existente

8. Anexos

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Fecha	No radicado	Asunto	Remite	Destino

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras

	
<p>Toma de información estudios y diseños del Km 4+400- Sitio Critico</p>	
	
<p>Toma de información estudios y diseños del Km 4+400- Sitio Critico</p>	

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

N/A

8.4 Copia bitácora

Se anexa copia de bitácora de las actividades desarrolladas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA		
					FECHA	06/04/2026 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales				DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá		PERIODO MES: Marzo - 2026
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ -
		Día/Mes/Año		FIRMA		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOHAN ALEXIS TORRES REYES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DENICE BIBIANA ACERO VARGAS		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.						
ORDEN DE PAGO						
CONTRATO DE OBRA No.: 1703-2025 DE 2025						
OBJETO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA						
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.			NIT. 830004448-5			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA,			DENICE BIBIANA ACERO VARGAS		AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 0,00			VALOR EN LETRAS: CERO PESOS			
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)						
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5			DEL PERIODO Marzo - 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.			
(Indicar el periodo del Acta)						
Firma JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA Supervisor del Contrato Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC Territorial Boyaca INVIAS		Firma FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Director Territorial Boyaca Matricula profesional No.: 12202093568 BYC Fecha firma:		Firma JOHAN ALEXIS TORRES REYES Matricula profesional No.: 25202-375135 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma:		Firma DENICE BIBIANA ACERO VARGAS SUBDIRECTOR VIAS REGIONALES ORDENADOR DEL GASTO Matricula profesional No.: 15202-093568 BYC
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
FECHA 06/04/2026 (Día 7 Mes 0 Año)															
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá ACTA No. 5 VALOR BÁSICO ACTA: \$ - MES Marzo - 2026															
ACTA FINAL ☐ 45 de 52															
CONTRATO No : 1703-2025 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: HASTA 30-06-2026 (En meses según las prórrogas sin sujeción)	
OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 242.474.935,00				VALOR ADICIONES (ir \$)	
										(Según contrato principal)					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 242.474.935,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 8-01-2026		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
1		200.2.1		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	12,00	\$ 832.172,00	\$ 9.986.064,00	12	\$ 9.986.064,00	\$ -		3,720	\$ 3.720,00	
2		211.1		Remoción de derrumbes	m3	45,00	\$ 20.452,00	\$ 920.340,00	45	\$ 920.340,00	\$ -			\$ 0,00	
Subtotal								\$ 10.906.404,00		\$ 10.906.404,00	\$ -			\$ 0,00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
3		310.1		Conformacion Calzada Existente	m3	46500,00	\$ 1.350,00	\$ 62.775.000,00	46500,00	\$ 62.775.000,00	\$ -			\$ 0,00	
4		311.1		Bacheo con Material de Afirmado	m3	300,00	\$ 160.545,00	\$ 48.163.500,00	300,00	\$ 48.163.500,00	\$ -			\$ 0,00	
Subtotal								\$ 110.938.500,00		\$ 110.938.500,00	\$ -			\$ 0,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL															
5		710.1.1		Señal vertical de Tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimensión 75 x 75 cm, en lámina galvanizada retroreflectiva, con película retroreflectiva tipo IV.	u	3,00	\$ 780.500,00	\$ 2.341.500,00	3,00	\$ 2.341.500,00	\$ -			\$ 0,00	
Subtotal								\$ 2.341.500,00		\$ 2.341.500,00	\$ -			\$ 0,00	
OBRAS DE LIMPIEZA															
6		1412		Limpieza manual de cunetas no revestidas	ml	18601,00	\$ 2.135,00	\$ 39.713.135,00	18601,00	\$ 39.713.135,00	\$ -			\$ 0,00	
7		1421		Limpieza de alcantarillas con diametro 36"	u	60,00	\$ 106.430,00	\$ 6.385.800,00	60,00	\$ 6.385.800,00	\$ -			\$ 0,00	
8		1421.1		Limpieza de pontones y box coulvert	u	4,00	\$ 213.262,00	\$ 853.048,00	4,00	\$ 853.048,00	\$ -			\$ 0,00	
9		1421.2		Limpieza de encoles y descoles	ml	600,00	\$ 2.132,00	\$ 1.279.200,00	600,00	\$ 1.279.200,00	\$ -			\$ 0,00	
Subtotal								\$ 48.231.183,00		\$ 48.231.183,00	\$ -			\$ 0,00	
ÍTEM NO PREVISTOS															
1				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL	GL		\$ 9.956.000		1	\$ 9.956.000,00					
Subtotal								\$ -		\$ 9.956.000,00				\$ 0,00	
* SUBTOTAL BASICO OBRAS (A) \$ 172.417.587,00															
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) \$ 54.540.343,00															
* TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B \$ 226.957.930,00															
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (D) \$ 1.645.878,00															
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA e IVA) (G) \$ 13.871.127,00															
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL (I) \$ 9.956.000,00															
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL 19% \$ 1.891.640,00															
* TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J \$ 11.847.640															
* VALOR TOTAL = C + D + G \$ 242.474.935,00															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.															
AIU 30% Utilidad 5%															
		Valor		%											
Valor Anticipo Otorgado		\$ 72.248.717,10		30%											
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ -													
Valor Amortizado Acumulado		\$ -													
Valor Saldo por Amortizar		\$ 72.248.717,10		30%											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-I
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	

FECHA

06/04/2016

(Día / Mes)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$ -	\$ -	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -
ÍTEM NO PREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DAN

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
TOTAL		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ -

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivamente (Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-45343 STD

Firma:

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Supervisor

Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

N-4-FR-1
2026
/ Año)
a)
UE.
IMULADO

Activas (Obra,
Especificaciones

provisiones

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.1703-2025

ContratistaCONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.

Objeto del ContratoMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA -LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.

Acta No.5

Valor básico\$-

PeríodoMarzo - 2026

Valor incluido el Iva\$-

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	54955	SOATA - LA JABONERA,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2			\$ -	\$ -		\$ -
3			\$ -	\$ -		\$ -
			\$ -	\$ -		\$ -
		TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.016-1	MUNICIPIO 1	SOATA	\$ -	\$ -
			\$ -	
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	\$ -	\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	\$ -	\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 4	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	\$ -	\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 4	\$ -

	VALOR TOTAL	\$ -	\$ -
--	-------------	------	------

Firma

Nombre: JOSE VICENTE MARIÑO BECERRA

Representante Legal

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-45343 STD

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Representante Legal

Supervisor

Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 1703-2025

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA ☒

ACTA DE INTERVENTORIA ☐

ACTA DE AJUSTE ☐

PRESTACION DE SERVICIOS ☐

OTRO ☐

CUAL ?:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

ACTA No 5

PERIODO

Marzo - 2026

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 742525 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402112-02 RECURSO No. 10

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.

VALOR AFECTADO \$ -

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA \$ -

Firma

JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Supervisor del Contrato

Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC

Territorial Boyaca INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA													CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1									
														VERSIÓN	1									
														PÁGINA										
														FECHA	08/01/2026 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA:		Subdireccion de Vías Regionales						DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá				ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒				POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)						
CONTRATO No : 1703-2025 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025 (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: HASTA 30-06-2026 51 de 52 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 45 N/A										INTERVENTOR: N/A					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 242.474.935,00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -				
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DE fecha Diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS									
		GR.2022	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																								
1		200.2.1		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	12	\$ 832.172,00	\$ 9.986.064,00					\$ -	3,72	\$ 3.095.679,84	12	\$ 9.986.064,00							
2		211.1		Remoción de derrumbes	m3	45	\$ 20.452,00	\$ 920.340,00					\$ -	-	\$ -	45	\$ 920.340,00							
Subtotal								\$ 10.906.404,00					\$ -		\$ 3.095.679,84		\$ 10.906.404,00							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																								
3		310.1		Conformacion Calzada Existente	m3	46500	\$ 1.350,00	\$ 62.775.000,00					\$ -	-	\$ -	46500	\$ 62.775.000,00							
4		311.1		Bacheo con Material de Afirmado	m3	300,00	\$ 160.545,00	\$ 48.163.500,00					\$ -	-	\$ -	300	\$ 48.163.500,00							
Subtotal								\$ 110.938.500,00					\$ -	Subtotal	\$ -		\$ 110.938.500,00							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																								
5		710.1.1		Señal vertical de Tránsito tipo SR, SP y/o SI, dimensión 75 x 75 cm, en lámina galvanizada retrorreflectiva, con película retroreflectiva tipo IV.	u	3	\$ 780.500,00	\$ 2.341.500,00					\$ -	-	\$ -	3	\$ 2.341.500,00							
Subtotal								\$ 2.341.500,00					\$ -		\$ -		\$ 2.341.500,00							
OBRAS DE LIMPIEZA																								
6		1412		Limpieza manual de cunetas no revestidas	ml	18601	\$ 2.135,00	\$ 39.713.135,00					\$ -	-		18601	\$ 39.713.135,00							
7		1421		Limpieza de alcantarillas con diametro 36"	u	60	\$ 106.430,00	\$ 6.385.800,00					\$ -	-		60	\$ 6.385.800,00							
8		1421.1		Limpieza de pontones y box coulvert	u	4	\$ 213.262,00	\$ 853.048,00					\$ -	-		4	\$ 853.048,00							
9		1421.2		Limpieza de encoles y descoles	ml	600	\$ 2.132,00	\$ 1.279.200,00					\$ -	-		600	\$ 1.279.200,00							
Subtotal								\$ 48.231.183,00					\$ -		\$ -		\$ 48.231.183,00							
ÍTEM NO PREVISTOS																								
1				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL	GL		\$ 9.956.000,00				+	1,00	\$ 9.956.000,00			1,00	\$ 9.956.000,00							
Subtotal								\$ -					\$ -		\$ -		\$ 9.956.000,00							
Ajuste al peso																\$ -								
* SUBTOTAL BASICO OBRAS (A)								\$ 172.417.587,00					\$ -		\$ 3.095.679,84		\$ 172.417.587,00							
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								NO MODIFICAR	\$ 54.540.343,00					\$ (11.762.341,00)		\$ 42.778.002,00								
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B								\$ 226.957.930,00					\$ -	\$ 11.762.341,00	\$ 3.095.679,84	\$ 215.195.589,00								
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (D)								\$ 1.645.878,00					\$ -	\$ (85.299,00)	\$ 22.450,00	\$ 1.560.579,00								
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA e IVA) (G)								NO MODIFICAR	\$ 13.871.127,00							\$ 13.871.127,00								
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL (I)													\$ 9.956.000,00		\$ 9.956.000,00									
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)								19%					\$ 1.891.640,00											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales			FECHA 08/01/2026 (Día / Mes / Año)	
DIRECCIÓN TERRITORIAL: D.T. Boyacá			ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)	
			POR CANTIDADES DE OBRA ☒	
			POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)	
CONTRATO No : 1703-2025 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2025 (En meses según contrato principal)		
OBJETO:		PLAZO ACUMULADO: HASTA 30-06-2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA VIA 54955 SOATA - LA JABONERA, SECTOR APARTADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Indique día/mes/año)		
		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 45 N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)		
INTERVENTOR: N/A		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 242.474.935,00 (Según contrato principal)		
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+ \$ 242.474.935,00		
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -				
Revisión: Director Territorial Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Matricula profesional No.: 12202093568 BYC (Suscribe según su competencia funcional)				
Firma DENICE BIBIANA ACERO VARGAS Matricula profesional No.: 15202-093568 BYC SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES				
Original: Archivo Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				
