


PERSONAL NO PUDO TRABAJAR POR LLOVIAS.
 INICIANDO LA ACTIVIDAD EN HORAS DE LA
 TARDE TIPO: 3:00 PM. Y FINALIZANDO
 ACTIVIDADES A MEDIA NOCHE.
 SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE
 PUNTO DE TRABAJO EN PISO 2.
 (LABORATORIOS (2 PUNTO). Y SE CONTINUA CON
 LA INSTALACIÓN DE PISA VIDRIOS.

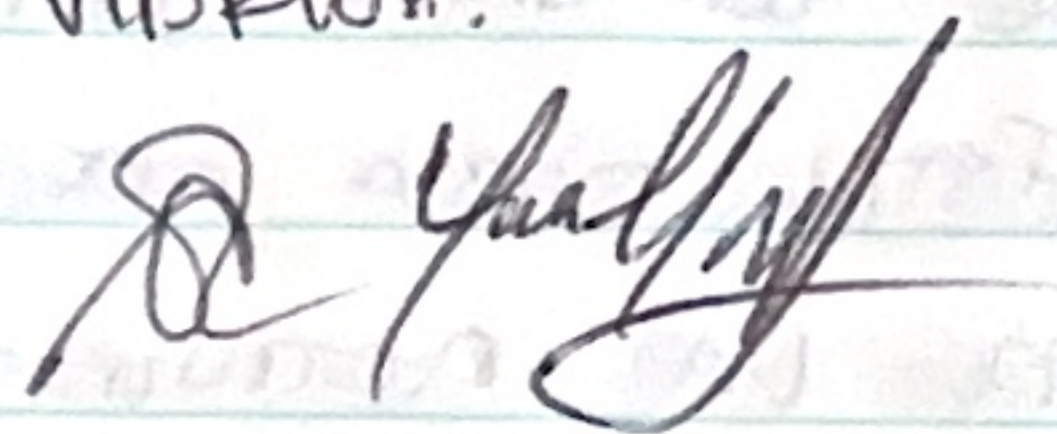

20 DE ABRIL DE 2026. (JUEVES). 7:00 AM - 6:30 PM.

Clima: Nublado.


Operarios: (2) MOBILIARIOS OFICIALES, (3) ELECTRICOS.
 (2) OFICIALES CIVILES.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EN
 PARQUEADEROS Y SALIT BASURAS. CON LA
 INSTALACIÓN DE TERMINAL RED ELÉCTRICA
 DESDE TABLERO HASTA CADA UNO DE LA ESPACIOS
 INSTALACIÓN DE TORERA FMT, INSTALACIÓN DE
 PUNTO SALIDAS LUMINARIAS, E INSTALACIÓN
 DE SOLO LUMINARIAS DE LOS PARQUEADEROS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE

Norma

INSTALACIÓN DE PISA VIDRIOS, INSTALACIÓN DE
 POCO CERRADURA PUERTAS, ACTIVIDAD DE
 LIMPIEZA. POR MEDIO DE CHAT WA. EL ADO.
 JABRETTAN. LE CONFIRMA AL ADO. HORTAN QUE EL
 REMATE DE LAS DIVISIONES DE PISO A TECHO
 VAN HASTA LA VENTANA, PARA TOTALMENTE
 CERRAR LOS ESPACIOS.
 SE TOMAN MEDIDAS PARA INICIAR CON LA
 FABRICACIÓN DE CANALES PARA PARQUEADEROS
 Y SALIT BASURAS.

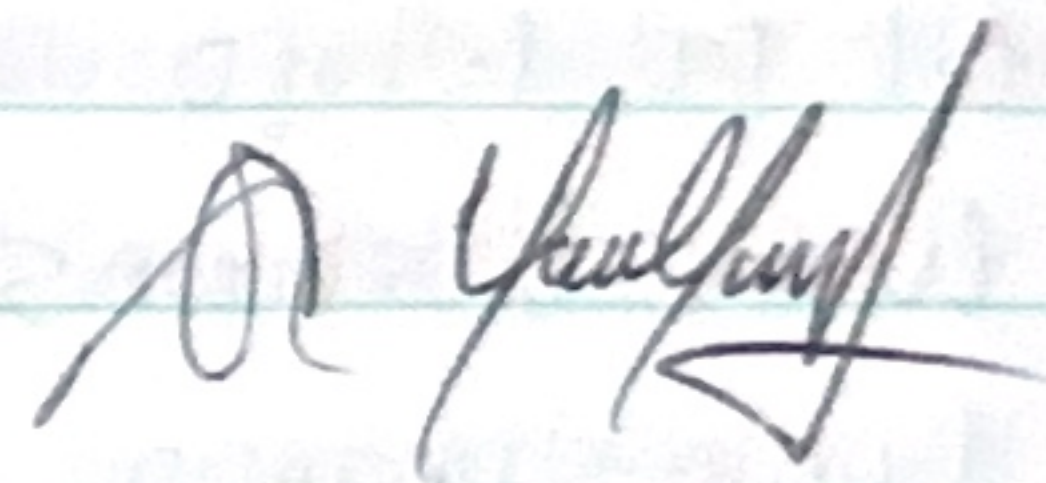

1 MAYO DE 2026. (VIERNES).

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES POR SER FESTIVO.

2 MAYO DE 2026. (SABADO).

Clima: Nublado DURANTE TODO EL DIA.

Administrativos: 1 RESIDENTE, 1 SST

Operarios: (2) OFICIALES MOBILIARIOS, 2 OFICIALES.
 MOBILIARIOS TERMINAN DE RETOCAR ACTIVIDADES
 EN PISO 3. AREA 1.

SE REALIZA JORNADA DE ASEO EN

Norma

R

S

T

UV

WX

YZ

DADO RECOLECCION DE ESCOMBROS
ADYACENTE A SALTO DE BARRERAS.

SE PERMANECE PERSONADO DE ALGUNOS ELEMENTOS
SOLICITADO EN COPIERTA SALTO BARRERAS

3 DE MAYO DE 2026. (DOMINGO).

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES.

04 DE MAYO DE 2026. (LUNES). 7:00 - 6:00 PM
Clima: Lluvias. Intermitentes

Administrativos: 11 Residente, 11 SST

Operativos: 11 Hombres (1) Electrico; (2) Civiles

SE DA INICIO A LA INSTALACION DE
SARDOBLASTING EN VORPO DE DIVISIONES.

Y LOGRA FINALIZAR A LAS 6:00 PM.

SE FINALIZA UN CORTAON DE RED

ELECTRICA A TRAVES. FTERNO, SE HACEN

PROBES DE ELEMENTO LAMPARAS (FINCIONANDO)

OBSERVACIONES: (1) VORPO DE LA DIVISION

DE LA OFICINA ARCHIVO 1, PUNTO 2 SE

ENCUENTRA EL VIA DE HOG POTO, SE

Norma

TOMAR MEDIDAS PARA FABRICACION. NUEVAMENTE
DEL FLEUENTO.

05 DE MAYO DE 2026. (MARTES)

Clima: Nublado.

Administrativos: 1 Residente, 1 SST

Operativos: (2) Oficiales Civiles.

TRATANDO EL PERSONAL CIVIL EN SUO NO SE LOGRO

INICIAR CON ACTIVIDADES CIVILES POR PAROQUEAS

Y SALTO. POR FALLAS EN LA LOGISTICA

DE ENTREGA DE MATERIAL POR PARTE DE

PROVEEDOR.

SE ENVIA CORREO. SOLICITUD INGRESO DE MATERIAL

ELECTRICO PARA INSTALACION DE LOS.

2 PUNTO ELECTRICOS Y 4 PUNTO DE DATOS EN

PISO 4. ARCHIVO 1 Y ARCHIVO 2.

06 DE MAYO DE 2026. (MIÉRCOLES)

Clima: Lluvias durante medio dia.

Administrativos: 1 Residente, 11 SST

Operativos: 11 Electrico, 11 Estructuras, 2 Civiles.

Norma

SE INGRESA MATERIAL ELÉCTRICO PARA ACTIVIDADES DE PISO 4, SE HABLA CON ENCARGADO INDICANDO QUE SE PUEDE INICIAR ACTIVIDADES PLAZANA, Y REPROGRAMAR A FUNCIONARIA DE LA ZONA.

SE TOMAN NIVELES DE ALISTADO, SE REVISAN ÁREAS PARA APLICADO DE GROUTING. PARA EL ÁREA DE SLOUT, POR SER EXTERNO SE VIERO AFECTADOS POR LAS LLUVIAS.

EN HORAS DE LA TARDE SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DEL PERFIL DINTEL, POR TAL MOTIVO NO SE INICIA CON PLANTILLAS.

[Signature]

07 MAYO DE 2026 (JUEVES)

CUBA: HONDURAS

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVO: (2) ELÉCTRICOS, (1) ESTRUCTURAL, (1) OFICIAL CIVIL

(1) AYUDANTE CIVIL

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PERFIL (DINTEL) EN SLOUT DE BASURAS. SOBRE EL EJE DE PUERTAS.

Norma

POR LA PARTE ELÉCTRICA SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE TUBERÍA. EMT EN PISO 4, RED PARA LOS PUNTOS ELÉCTRICOS RECORRIDOS Y DE DATOS. TAMBIÉN SE RECIBE LA ORIENTACIÓN POR PARTE DEL. ARQ. HORTAN PARA LA INSTALACIÓN DE 2 INTERRUPTORES LUMINARIAS EN PARQUEADORES DE VEHÍCULOS Y MOTOS.

MOBILIARIOS INDICAN RETORAS EN LA FABRICACIÓN DEL PERFIL REMATE EN LAS DIVISIONES DE PISO A TECHO, SE REPROGRAM ACTIVIDADES PARA EL DIA DE MAÑANA AL IGUAL QUE LA REPOSICIÓN DE VIDEOS QUE HALLAMOS POTO. EN OFICINA ARCHIVO. / PISO 2.

[Signature]

8 DE MAYO DE 2026 (VIERNES) 07:00 - 5:00 PM.

CUBA: SOLARDO.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) ELÉCTRICOS, (2) ESTRUCTURAS, (3) CIVILES.

SE INSTALAN. ACEROS DE RETORNO PARA LA FUNDICIÓN DE PÓLOS EN ZONA PERÍMETRO LATERAL Y POSTERIOR EN SLOUT DE BASURAS.

SE REALIZA DESPASTE Y LIMPIEZA EN ÁREA ADYACENTE A TRAMPA DE GRASAS.

Norma

R

S

T


UV

WX

YZ

SE RECIBE TORNILLERIA PARA REALIZAR CAMBIOS EN ALGUNAS ZONAS, Y SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PUENTE (DINTER).

SE INSTALAN INTERRUPTORES SOLICITADOS EN COMITE EN AMBOS PASADIZOS.



9 DE MAYO 2026 (SABADO) 07:00 - 12:00 PM.

CLIMA: SOLEADO.


ADMINISTRATIVOS: (1) SST, (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: (3) CIVILES Y (2) ESTRUCTURAS.

SE REALIZA DEMANDA DE FUNDIDA DE POZO EN PERIFERIA LATERAL Y POSTERIOR EN PLAZA DE SALTO DE BARRAS.

SE CONTINUA CON EL CAMBIO DE TORNILLERIA EN DONDE SE REQUIERE PARA MAYOR FIJACION DE LA ESTRUCTURA.

NO SE LABORA EN OFICINAS POR SER FIN DE SEMANA Y NO TENEMOS MATERIAL A ELLAS.

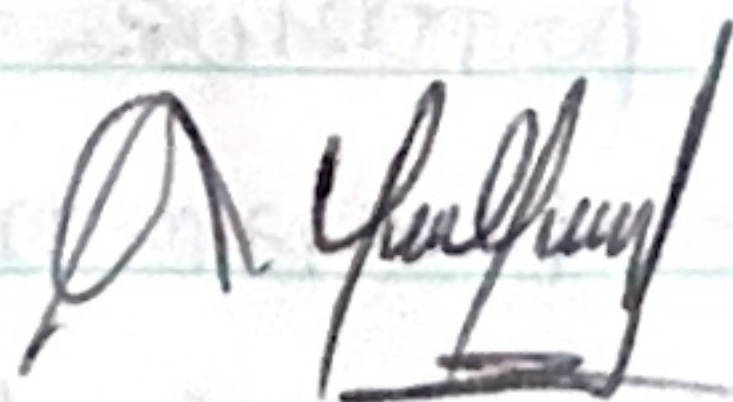


10 DE MAYO DE 2026 (DOMINGO) 08:00 - 2:00 PM.

CLIMA: SOLEADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: ESTRUCTURAS (2).

SE CONTINUA CON EL CAMBIO DE TORNILLERIA EN CUBIERTAS, PARA MEJORAR FIJACION DE ESTRUCTURA



11 DE MAYO DE 2026 (LUNES) 7:00 - 5:00 PM.

CLIMA: NUBOSADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) SST. Y (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: (3) CIVILES, (2) ESTRUCTURAS, (1) MOBILIARIOS.

SE TERMINAN DE INSTALAR TODA LA SANDBLASTING EN VENTANOS (DIVISIONES DE PUO A TECTO Y EN

DIVISIONES A MEDIA ALTURA), QUEDANDO PENDIENTE

SANDBLASTING DE VENTANOS ROTO, TAMBIEN QUEDA

PENDIENTE LA INSTALACION DE LOS REMATES.


SE RETIRAN TIPOLOGIAS DE ENCOFRADO DE

POZOS EN SITIO DE BARRAS, SIN OBSERVACIONES

SE TRABAJAN NIVELES Y SE FIJAN


LA INSTALACION DE SOBRE PUO CON INCLINACION

A PUNTO SANITARIO PUO.



Se continúan con Actividad de Cambios de Tornillería. (Haciendo fijación en la estructura).

OBSERVACIONES: SE REALIZA RETIRO DE PROMIDROS ADOPTADOS EN PATIO. (NO SE REPORTA NOVEDAD).



12 DE MAYO DE 2026. (Martes).

CLIMA: NOBLADO. - Lluvias. intermitentes.

ADMINISTRATIVOS: (1) CIT, (1) RESIDENTE OPERATIVOS: (2) Ayudantes Estructuras, (1) Electrico. (2) Ayudantes Civiles.

SE REALIZA TIRADILLO DE PUNTOS ELECTRICOS, PANTOS Y TABLERO.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS fijación y cambio de tornillería y REAPLIQUE DE PINTURA SOBRE ESTRUCTURA.

SE DA INICIO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES.

LIMPIEZA DE CAJAS.

LA ACTIVIDADES EXTERNAS AFECTADA POR LLUVIA

Norma

13 DE MAYO DE 2026. (Miércoles).

CLIMA: NOBLADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE C., (1) SST C.

(1) RESIDENTE INTERV.

OPERATIVOS: (2) MOBILIARIOS, (2) AYUDANTES CIVILES, (1) ESTRUCTURA.

SE REALIZA DESMUNTE DE BLACKOUT EN LABORATORIO. ADOPTADO PARA ENTREGAR CON ACTA DE DESMUNTES.

SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE PERFIL DE RETUATE EN DIVISIONES DE PURO A TECTO.; SIENDO LAS 10:00 AM SE SUSPENDEN ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL EDIFICIO, DADO QUE, HACIENDO A TONOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDE POR MANIFESTACIONES EN EL EDIFICIO DE ACUEDUCTO BOGOTÁ.

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA CON APLICACIÓN DE PINTURAS.

SE DA INICIO CON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CAJAS INSPECCION Y TRAMPA DE GRASAS.

NOTA: SIENDO LAS 3:30. NO AVISAN QUE

Norma

R

S

T

UV

WX

YZ

DEBEMOS EVACUAR TRAFICO POR TEMAS DE SEGURIDAD. POR MANIFESTACIONES.

[Signature]

14 DE MAYO DE 2026. (JUEVES)

CLIMA: NUBLADO.

ADMINISTRATIVO: (1) SST, (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: (1) ESTRUCTURA, (2) CIVILES. AYUDANTES

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA

DE CAMPO INSPECCION Y TRAMPAS DE GRASAS

LAS CUALES SE ENCONTRABAN COLGANDAS DE

SORIMENTOS Y DEMAS FLOTANTES. TODO EL MATERIAL

ES ACOPANDO EN LOMAS PARA DISPOSICION FINAL

CON COMPRESOR INCENTRO CON PROCESO DE SONDEO.

EN TUBERIAS EN REDES DE AGUAS LLUVIAS.

[Signature]

15 DE MAYO DE 2026 (VIERNES).

CLIMA: SOLOADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) SST, (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: (1) ESTRUCTURA, (2) CIVILES. AYUDANTES.

SE DA INICIO CON TEMAS DE DEMOLICION

Norma

DE PLACA O PISO EN PARQUEaderos y se
DA INICIO CON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES.
PARA RED DE AGUAS LLUVIAS.

EN ESTACIONES SE REALIZA CAMBIO DE 3.

PORTA CORPORA, QUE NO OBSTRUYAN LA CANAL

EN LA CUBIERTA DE PARQUEadero MOTOS.

[Signature]

16 DE MAYO DE 2026. (SABADO).

CLIMA: NUBLADO.

ADMINISTRATIVOS: (1) RESIDENTE, (1) SST

OPERATIVOS: (2) AYUDANTES CIVILES.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DEMOLICION.

DE PISO Y PLACA EN PARQUEadero.

DE VEHICULOS. PARA CONSTRUCCION DE

RED. AGUAS LLUVIAS.

[Signature]

17 DE MAYO DE 2026. (DOMINGO).

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES

18 DE MAYO DE 2026. (LUNES)

FESTIVO. NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES

Norma

S

T

UV

WX

YZ

19 DE MAYO DE 2026. (MARTES).

CLIMA: NUBLADO.


ADMINISTRATIVO: (1) SST, (1) RESIDENTE, (1) COORDINADOR

OPERATIVOS: (2) AYUDANTES CIVILES, 1 ESTRUCTURA
POR PARTE DE CONCRETO. SE REVISAN SOLDADURAS
Y ELEMENTOS INSTALADOS DE LAS ESTRUCTURAS
DE STUT; Y PARQUEADEROS. DEJANDO YA

FINALIZANDO LA ACTIVIDAD SIN OBSERVACIONES
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVA-
CIONES PARA INSTALACIONES DE REDES DE
AGUAS LLUVIAS.

SE DA INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
MATERIALES DE CONCRETO, CEMENTOS Y
LATUNAS.

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION
ENCUADRE PARA PISO DE SEDE CALLE 18 Y
CALLE 19A. POR ELLO NO SE HA INICIADO
CON LA INSTALACION DE ENCUADRES.

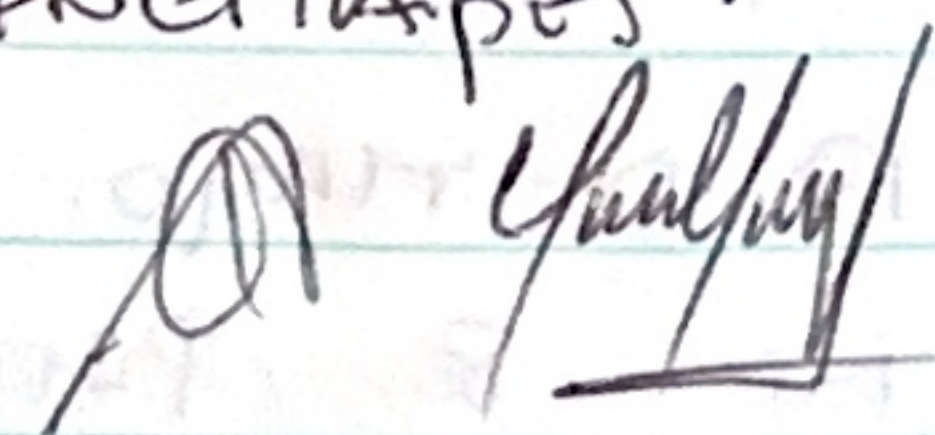

20 DE MAYO DE 2026. (MIÉRCOLES).

CLIMA: SOLEGADO.

Norma

ADMINISTRATIVO: (1) SST, (1) RESIDENTE.


OPERATIVOS: (1) CIVIL, (1) ESTRUCTURAL.

SE DA ULTIMA MANO DE REPLICADO
DE PINTURA. SE INSTALAN GOTAS.

EN ORIFICIOS SOBRE ESTRUCTURA PARA
PROTECCION.

SE REMATA DIVISIONES DE PISO A TECTO.
QUEDA PENDIENTE APLICACION DE SILICONA DE
SELLADO.

SE ENVIA INFORME SOLICITADO POR INTERVENIENTE
PARA AIRES; DEHUMIDIFICADOR Y EXTRACCION
EN AREA DE LABORATORIOS.

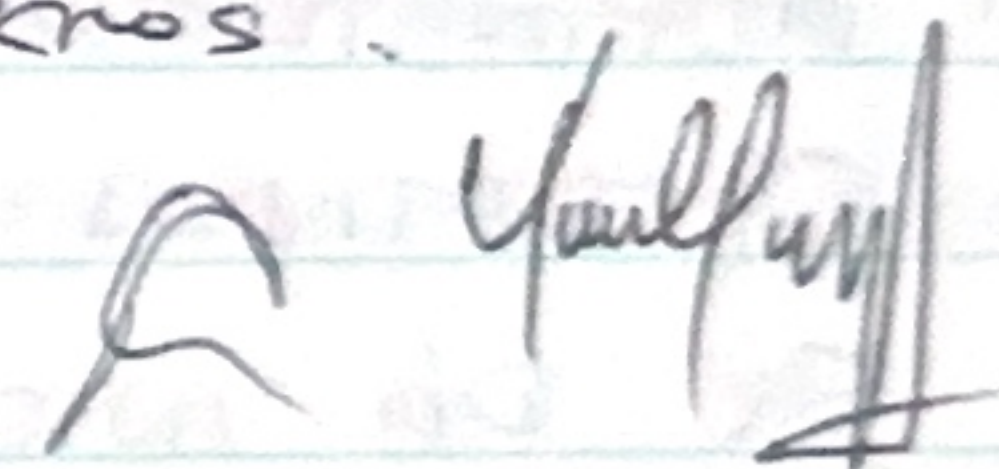

21 DE MAYO DE 2026. (JUEVES).

CLIMA: LLUVIAS. EN HORAS DE LA TARDE.

ADMINISTRATIVOS: (1) SST, (1) RESIDENTE.

OPERATIVOS: (3) CIVILES; (1) ELECTRICO.

SE RECIBE MATERIAL PARA COMERTAS DE
STUT Y PARQUEADERO, INCLUIDO CANAL
Y TEJAS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE

S

T

UV

WX

YZ

EXCAVACION PARA REDES AGUAS LLUVIAS.
SE INICIA CON INSTALACION DE TUBOS
FMT PARA ELECTRICIDAD DE SHUT
DE BASURAS.

NOTA: A LA PRESENTE NO SE HA APROBADO EL
TIPO DE ENCLAVE A UTILIZAR, POR PARTE
DE LA ENTIDAD.

A. [Signature]

22 DE MAYO DE 2026 (VIERNES).

CLIMA: SOLEADO.

ADMINISTRATIVOS: (2) SST, (2) RESIDENTES.

OPERATIVOS: (4) OFICIALES CIVILES.

SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE
CUBIERTAS EXTERIORES, INSTALANDO CANALES.
SE REALIZAN REBATAJAS PARA INSTALACION
DE BAJANTES Y CONECTARLAS A REDES
AGUAS LLUVIAS EXISTENTES. ES NECESARIO

PERMANECER CORPO DE SOPORTES DE CANAL.

SE REGISTRA VISTA DE PERIMETRO DE INTERVENCIÓN
REJILLA DIVISIONES, CUBIERTAS, REDES ELECTRICAS
Y PANTOS, ESTRUCTURAS. SIN OBSERVACIONES.

Norma

SEGUIREMOS A LA ESPERA DE LA APROBACION
DE LOS EQUIPOS ADICIONALES,
DESTUMIFICADOR Y VENTILACION.

A. [Signature]

23 DE MAYO DE 2026 (SABADO).

CLIMA: NUBLADO (CON LLUVIAS).

ADMINISTRATIVOS: (1) SST, (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: (3) OFICIALES CIVILES.

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE POCOS
AL INTERIOR DEL SHUT BASURAS.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE
CANALES EN PARQUEaderos DE CARROS
Y MOTOS.

A. [Signature]

24 DE MAYO DE 2026 (DOMINGO).

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES.

A. [Signature]

25 DE MAYO DE 2026 (LUNES).

CLIMA: NUBLADO.

Norma

S

T

UV


WX

YZ

ADMINISTRATIVO: (1) SST, (1) RESIDENTE
OPERATIVOS: (2) DEHWALLEROS, (1) OFICIAL, (1) AYUDANTE
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES EN SHUT DE
BASURAS., SE DA INICIO CON LA INSTALACION
DE ESTRUCTURA EN AUTUNIO PARA MUROS
EN SUPER BOARD.; INICIANDO POR LOS
MUROS PERIMETRICOS.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE FABRICACION
DE PULOS, INTERAJOS, SE RETIRA ENGRANAJE
SE INICIA CON ACTIVIDADES CIVILES EN
AREA DE POZETA (DEMOLICION Y EXCAVACION)
SE CONTINUA CON LA INSTALACION
DE CANALES METALICAS.
SE REALIZA REPLANTEO DE APARATOS
ELECTRICOS.

NOTA: HASTA LA PRESENTE NO SE HAN APROBADO
LOS DISEÑOS DE VENTILACION Y CLIMATIZACION
PARA EL AREA DE LABORATORIO PISO 2
POR OTRO LADO ENCHUFAS NO SE HAN APROBADO
PARA EL AREA DEL SHUT. BASURAS.

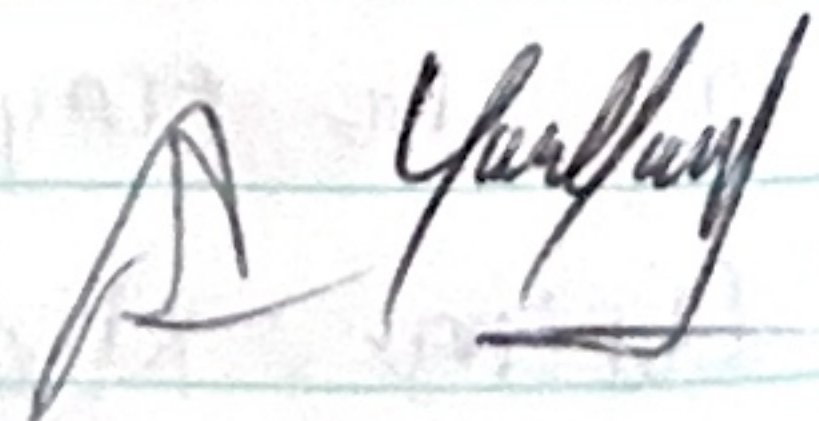

Norma

26 DE MAYO DE 2026. (MARTES)

CLIMA: LLOVIENDAS. INTERMITENTES.


ADMINISTRATIVOS: (1) SST, (1) RESIDENTE

OPERATIVO: (4) CIVILES.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE
LA CUBIERTA. PARQUEANDO. TUBOS. DURANTE
LA INSTALACION SE SUSPENDIO POR MOTIVOS
DE LLOVIENDAS. LA ACTIVIDAD.

SE FINALIZA CON LA INSTALACION DE RED.
PVC.-P. - PUNTO DE AGUA PRESION, INSTALACION
DE RED PVC. S. SIFONES. PISO. Y SIFON POZETA
ADYACENTE A SHUT BASURAS.

SE INSTALAN ACEROS DE REFUERZOS. EN
PLACA ADYACENTE A SHUT. Y SE FUNDE
PLACA EN CONCRETO.

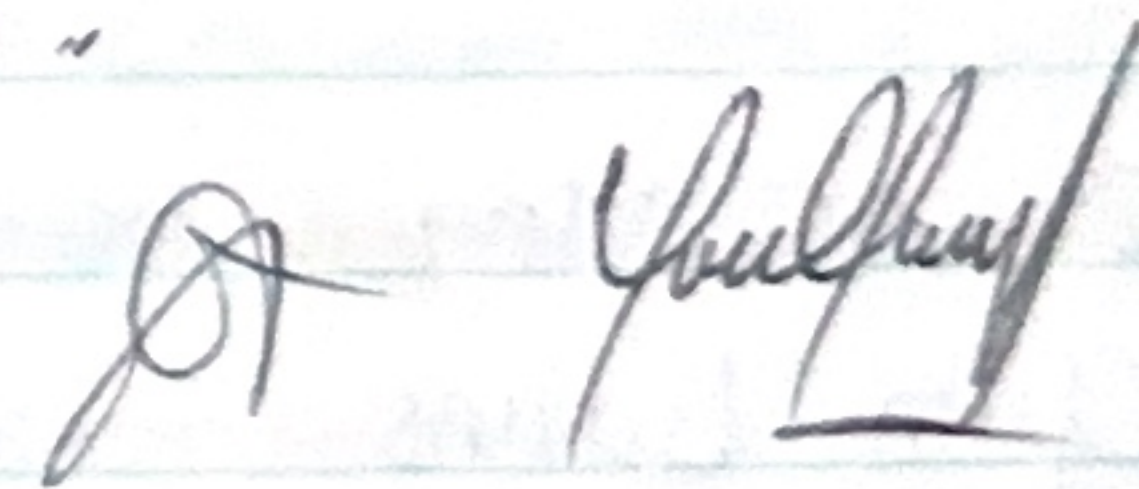

27 DE MAYO DE 2026. (MIÉRCOLES)

CLIMA: LLOVIENDAS. INTERMITENTES.

ADMINISTRATIVOS: (1) SST, (1) COORDINADOR, (1) RESIDENTE

OPERATIVOS: (1) OFICIAL PAER, (4) CIVILES

(3) ELECTRICOS.

Norma

T


UV

WX

YZ

SE SUMINISTRA Y SE INSTALA PUEBLO DE
SECADO, ADIENDO EN LABORATORIO EN PUNTO 2.
DE ACUERDO AL PLANO; PREVIO SE CONFIRMA
UBICACIÓN CON EL FUNCIONARIO MARCOS Y PAOLA.
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
EN ZONA DE PARQUEADEROS, EL REPOSICIONAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD QUE AFECTADO POR LLUVIAS
INTERMITENTES. SE DA FINALIZACIÓN A LA
ACTIVIDAD.

SE ADIANTAN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS
EN EL SITIO DE BASURA, INSTALACIÓN DE
TUBERÍA ENT, PUNTO SALIDA, LUMINARIAS,
INTERRUPTORES Y TORNAS.

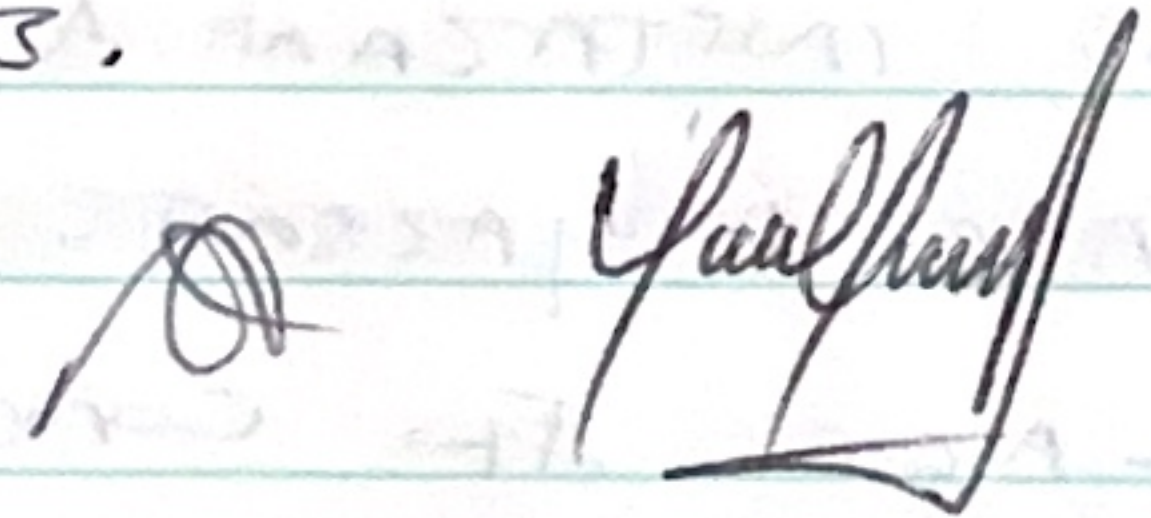

28 DE MAYO DE 2026 (VIERNES).
CLIMA: LLUVIAS.

ADMINISTRATIVOS: (2) SST, (1) RESIDENTE
OPERATIVOS: (4) CIVILES, (3) ELÉCTRICOS.


DURANTE LA NOCHE DEL DÍA 27 Y LA MAÑANA
DEL DÍA 28. SE EFECTÚAN ACTIVIDADES ELÉCT.
EN PUNTO 2 Y 3. ACTIVIDAD PARA AIRE.

Norma

SE REALIZAN DESMONTES DE LATIPAZAS, INSTALACIÓN
DE TUBERÍA ENT. 3/4, INSTALACIÓN DE TORNAS
BIFASICAS, PASES POR MUROS, INSTALACIÓN
DE RIEL CHANEL EN FACTORIAS Y LA INSTALACIÓN
DE CABLEADO BIFASICO.

EN PARQUEADEROS SE FINALIZA CON LA
INSTALACIÓN DE CUBIERTAS, SE PROCEDE
A INSTALAR PLANCHES METÁLICAS Y SELLOS
DE LOS TUBOS, EN EL SITIO DE BASURA
SE INSTALA EN SU TOTALIDAD PLANCHES
Y CANALES CON SUS SELLOS CON CORDON
DE SUDICIONA.

NOTA: LA INSTALACIÓN DE REPEL ELÉCTRICAS PARA
LOS AÍRES SE REALIZA PARA ADIANTAR ACTIVIDADES,
PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.
SE CONTINUA CON ADIENDO ESTRUCTURAS, MUROS
SOPOR BOARD. SITIO BASURA.

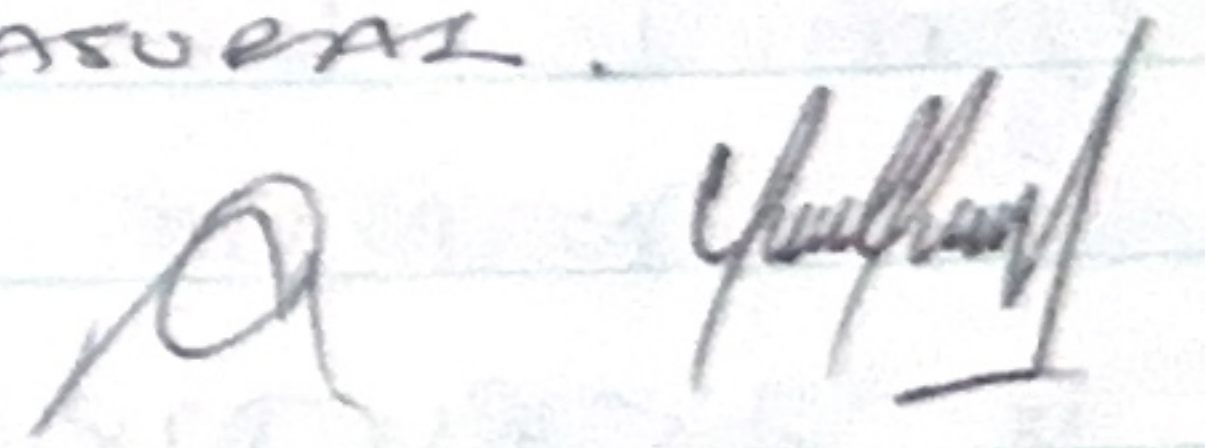

29 DE MAYO DE 2026 (VIERNES).
CLIMA: LLUVIAS.

ADMINISTRATIVOS: (2) SST,

T
UV
WX
YZ

Operativo: Electricos (3), Civiles (2).

Se continua con actividades electricas.

En shot de basuras, las cuales se finalizan el dia de hoy. Quedando


pendiente finalizando las actividades de ese componente. Se continua con

actividades civiles en shot de basuras

en plaza adyacente; quedando

finalizada la actividad. Hasta el

momento no se autorizan los equipos de aire acondicionado.

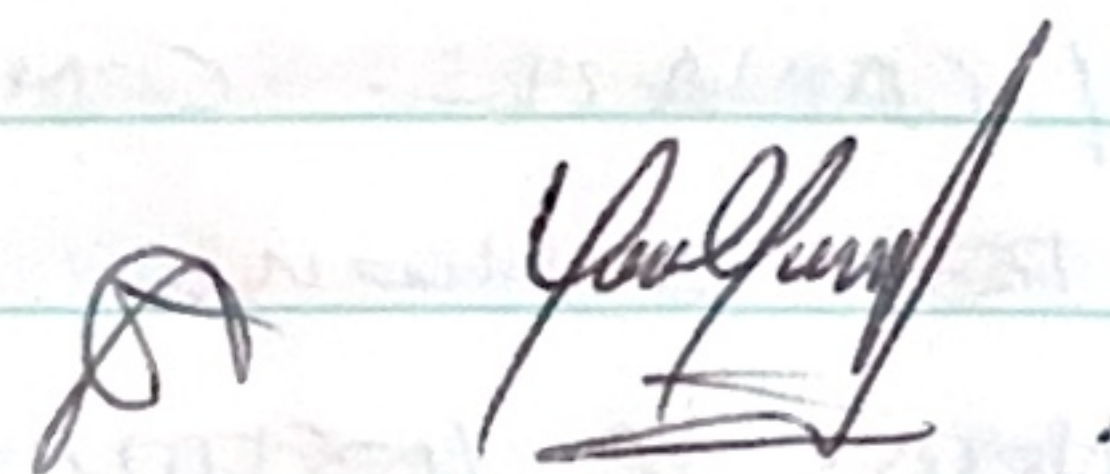

30 de Mayo de 2016. (SABADO).

Clima: Soleado.

Administrativo: (2) Residentes, (1) SST

Operativo: (2) Civiles.

Se continua con actividad de armado

de estructura para toros en


super board. Se toman fotos para

fabricacion de los soportes. Hacerlos

para la canal en las diferentes


Norma

CONSTRUCCIONES (SHOT, PARQUEADEROS)



31 de Mayo de 2016. (DOMINGO).

No se programan actividades.

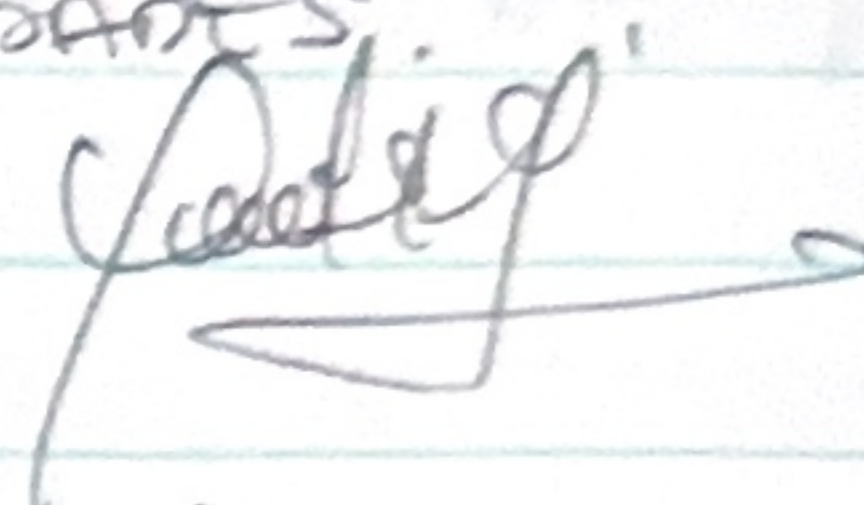

01 de Junio de 2016. (LUNES).

Clima: Soleado.

Administrativo: (1) SST, (1) Residente, (1) Inspector

Operativo: (2) Civiles.

Se continua con actividades de armado de estructura para toros en super board en area shot de basuras.

Se requieren canales distancias, para

que por las dimensiones y peso, no se

soportan bien a la estructura, por

tal motivo, y con evitar contratiempos

se toma la decision de reforzar

con piso de 4x160. Se le informa

a señores toreros (Entrada, Acceso de

la apertura de vando en laboratorio

lo cual se indica que programen

UV

WX

YZ
