

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo								
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	
1	1	CORREDOR VERDE PORTAL CALLE 200 Y LOTE 3 - DISEÑOS EN ESTAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	2658,5 días	mié 6/03/24	lun 26/04/32	0 días	\$ 446.445.908.446								
2	2	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	494,5 días	mié 6/03/24	sáb 24/10/26	2164 días	\$ 7.929.872.038								
3	3	Fecha Inicio del proyecto	0 días	mié 6/03/24	mié 6/03/24	0 días	\$ 0								
4	3	Elaboración y presentación PDT Preconstrucción	8,89 días	mié 6/03/24	mié 13/03/24	0 días	\$ 0								
5	3	Revisión PDT Preconstrucción por Interventoría	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24	0 días	\$ 0								
6	3	Ajustes PDT Preconstrucción por Consorcio	3 días	sáb 16/03/24	mar 19/03/24	2643,61 días	\$ 0								
7	3	Revisión PDT ajustado por Interventoría	3,89 días	mar 19/03/24	vie 22/03/24	0 días	\$ 300.282.997								
8	3	PDT No objetado por Interventoría	0 días	vie 22/03/24	vie 22/03/24	2639,72 días	\$ 0								
9	3	0. COMPONENTE PREDIAL	422 días	mar 12/03/24	lun 24/08/26	65,5 días	\$ 0								
14	3	1. REVISIÓN INFORMACIÓN IDU	8 días	mié 6/03/24	mié 13/03/24	0 días	\$ 0								
47	3	2. DISEÑOS PORTAL CALLE 200	224 días	mié 6/03/24	vie 11/10/24	0 días	\$ 0								
790	3	3. DISEÑOS CORREDOR VIAL LOTE 3	219 días	mié 13/03/24	mié 16/10/24	0 días	\$ 0								
1199	3	4. OBRAS ESPECIALES - QUEBRADA TIBABITA	60 días	mar 6/08/24	jue 3/10/24	0 días	\$ 0								
1213	3	5. ELABORACIÓN DE ACTAS DE ARMONIZACIÓN	235 días	sáb 14/09/24	lun 24/08/26	65,5 días	\$ 0								
1238	3	6. PROCESO REVISIÓN DE DISEÑOS INTERVENTORIA	305 días	jue 30/05/24	jue 21/05/26	2267,5 días	\$ 549.217.602								
1249	3	7. PRESUPUESTO	55 días	mar 5/05/26	lun 24/08/26	65,5 días	\$ 750.707.493								
1270	3	8. GESTIONES, TRAMITES Y PERMISOS REDES y LICENCIA	231 días	mié 18/09/24	lun 24/08/26	65,5 días	\$ 1.402.621.879								
1274	3	9. COMPONENTES TRANSVERSALES INICIALES	247 días	mié 6/03/24	mié 31/12/25	0 días	\$ 1.288.604.641								

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo								
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	
1556	3	Fin Etapa de Preconstrucción Inicial	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25	0 días	\$ 0								
1557	3	10. PRÓRROGA PRECONSTRUCCIÓN 1	181 días	vie 2/01/26	lun 24/08/26	2229 días	\$ 3.525.935.820								
1764	3	Fin prórroga de preconstrucción 1	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1765	3	11. PRÓRROGA PRECOSNTRUCCIÓN 2	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 112.501.606								
1766	4	Inicio Prórroga Precosntrucción 2	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1767	4	11.1 ENTREGA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DISEÑOS	14 días	lun 24/08/26	sáb 5/09/26	0 días	\$ 0								
1768	5	11.1.1 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS CORREDOR CR 7	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1769	6	Inicio de revisión por EAAB Diseños Redes hidrosanitarias segundo ciclo	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1770	6	Radicación Diseños hidrosanitarios a EAAB red pluvial y sanitaria	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1771	6	Radicación Diseños hidrosanitarios a EAAB red Matriz	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1772	6	Radicación Diseños hidrosanitarios a EAAB red Menor	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1773	5	11.2.1 ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL	14 días	lun 24/08/26	sáb 5/09/26	11 días	\$ 0								
1774	6	Radicación a Interventoría atención de observaciones "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL" componente estructuras	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1775	6	Radicación a Interventoría atención de observaciones "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL" componente geométrico	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								
1776	6	Radicación a Interventoría atención de observaciones "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL" componente de geotecnia	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0								


Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo								
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	
1777	6	Radicación a Interventoría atención de observaciones "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL" componente de urbanismo	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08				
1778	6	Radicación a Interventoría atención de observaciones "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL" componete de redes secas	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08				
1779	6	Proceso de revisión de diseños "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL" por parte de Interventoría	5 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26	0 días	\$ 0								
1780	6	Atención observaciones por parte de contratista a Diseños "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL"	4 días	vie 28/08/26	mar 1/09/26	0 días	\$ 0								
1781	6	Revisión a observaciones por parte de Interventoría "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL"	5 días	mar 1/09/26	sáb 5/09/26	0 días	\$ 0								
1782	6	Aprobación por Interventoría a Diseños "ACCESO N-S Y SALIDA S-N PARA BUSES DEL PATIO PORTAL"	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	0 días	\$ 0				5/09				
1783	4	11.2 PERMISOS TIPO A	38 días	lun 24/08/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								
1784	5	11.2.1 PERMISOS TIPO A NO OBJECCIÓN EAAB TRÁMITE A CARGO DEL IDU	38 días	lun 24/08/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								
1785	6	Gestión de No Objeción EAAB a cargo IDU Tipo A red pluvial y sanitaria	38 días	lun 24/08/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								
1786	6	Gestión de No Objeción EAAB a cargo IDU Tipo A red Matriz	38 días	lun 24/08/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								
1787	6	Gestión de No Objeción EAAB a cargo IDU Tipo A red menor	38 días	lun 24/08/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								
1788	6	No objeción a diseños Hidrosanitarios por parte de EAAB red pluvial y sanitaria	0 días	lun 28/09/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								
1789	6	No objeción a diseños Hidrosanitarios por parte de EAAB red Matriz	0 días	lun 28/09/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0								

Id	N	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo							
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
1790	6	No objeción a diseños Hidrosanitarios por parte de EAAB red menor	0 días	lun 28/09/26	lun 28/09/26	0 días	\$ 0					28/09		
1791	5	11.2.2 PERMISOS TIPO A SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CARGO DEL IDU	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08			
1792	6	Inicio permisos Tipo A SDM a cargo del IDU	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08			
1793	6	Definición por parte del IDU sobre la ampliación de línea base o actualización de insumos	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08			
1794	6	Fin permisos Tipo A SDM a cargo del IDU	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08			
1795	4	11.3 PERMISOS TIPO B	59 días	lun 24/08/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1796	5	Inicio permisos Tipo B	0 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26	0 días	\$ 0				24/08			
1797	5	11.3.1 POC QUEBRADA TIBABITA (BOX NORTE Y CUNETA VERDE)	55 días	lun 24/08/26	jue 15/10/26	4 días	\$ 0							
1798	6	Obtención de permiso de ocupación de cauce por parte del IDU para Quebradta Tibabita ante La CAR (BOX NORTE Y CUNETA VERDE)	55 días	lun 24/08/26	jue 15/10/26	0 días	\$ 0							
1799	6	Permiso de ocupación de cauce Quebrada Tibabita por parte de la CAR	0 días	jue 15/10/26	jue 15/10/26	4 días	\$ 0					15/10		
1800	5	11.3.2 POC CANAL TIBABITA (BOX SUR)	58 días	mar 25/08/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1801	6	Radicación Permiso de Ocupación de Cauce para Canal Tibabita a Interventoría	0 días	mar 25/08/26	mar 25/08/26	0 días	\$ 0				25/08			
1802	6	Revisión Permiso de Ocupación de Cauce para Canal Tibabita por Interventoría	9 días	mar 25/08/26	mié 2/09/26	0 días	\$ 0							
1803	6	Atención Observaciones Permiso de Ocupación de Cauce para Canal Tibabita por Contratista	9 días	mié 2/09/26	jue 10/09/26	0 días	\$ 0							
1804	6	Radicación a IDU Permiso de Ocupación de Cauce para Canal Tibabita al IDU	0 días	jue 10/09/26	jue 10/09/26	0 días	\$ 0				10/09			

ID	Nº de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
1805	6	Obtención de permiso de ocupación de cauce por parte del IDU para Canal Tibabita ante la CAR	40 días	jue 10/09/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1806	6	Permiso de ocupación de cauce Canal Tibabita (BOX SUR) por parte de la CAR	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1807	5	11.3.3 PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL (CAR)	59 días	lun 24/08/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1808	6	Obtención de permiso de aprovechamiento forestal jurisdicción CAR por parte del IDU.	59 días	lun 24/08/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1809	6	Permiso de aprovechamiento forestal por parte de la CAR	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1810	5	11.3.4 PERMISO DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES SITIO PRIVADO	59 días	lun 24/08/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1811	6	Obtención de permiso de tratamiento silvicultural en sitio privado ante la SDA por parte del IDU.	59 días	lun 24/08/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1812	6	Permiso tratamientos silviculturales en sitio privado SDA	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1813	5	11.3.5 ALCANCE MURO CALLE 183 COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL	30 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0							
1814	6	Definición por parte del IDU confirmación sobre la construcción del muro de la Calle 183 a cargo de Lote 2 acorde con lo especificado en el apendice A	30 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0							
1815	6	Definición a cargo del IDU de fechas de ejecución de muros calle 183 costado oriental y occidental por Lote 2	0 días	lun 21/09/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0							
1816	5	Fin permisos y definiciones	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0							
1817	4	11.4 COMPONENTE PREDIAL	30 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0							

Página 5

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo										
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34			
1818	5	Coordinación con la DTP a cargo del IDU para preparación, revisión, ajuste de entrega de la viabilidad predial.	30 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0										
1819	5	Entrega de concepto de viabiliad predial por parte del IDU	0 días	lun 21/09/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0										
1820	4	11.5 ELABORACIÓN DE ACTAS DE ARMONIZACIÓN	47 días	sáb 5/09/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0										
1821	5	11.5.1 PORTAL CALLE 200 CON LAGOS DE TORCA	40 días	sáb 5/09/26	mié 14/10/26	11 días	\$ 0										
1822	6	Definición por parte del IDU el límite de intervención de construcción a incluir en el acta de armonización.	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	0 días	\$ 0										
1823	6	Elaboración de las actas de armonización	27 días	sáb 5/09/26	jue 1/10/26	0 días	\$ 0										
1824	6	Revisión y observaciones interventoría	8 días	jue 1/10/26	jue 8/10/26	0 días	\$ 0										
1825	6	Ajustes actas de armonización	5 días	jue 8/10/26	mié 14/10/26	0 días	\$ 0										
1826	6	Entrega final Actas de Armonización	0 días	mié 14/10/26	mié 14/10/26	11 días	\$ 0										
1827	5	11.5.2 CORREDOR VIAL LOTE 3 CON EL LOTE 2	30 días	lun 21/09/26	mar 20/10/26	5 días	\$ 0										
1828	6	Elaboración de las actas de armonización	17 días	lun 21/09/26	mié 7/10/26	0 días	\$ 0										
1829	6	Revisión y observaciones interventoría (si los contratos de obra de Lote 2 y lote 3 están activos)	8 días	mié 7/10/26	jue 15/10/26	0 días	\$ 0										
1830	6	Ajustes actas de armonización (si los contratos de obra de Lote 2 y lote 3 están activos)	5 días	jue 15/10/26	mar 20/10/26	0 días	\$ 0										
1831	6	Entrega final Actas de Armonización (si los contratos de obra de Lote 2 y lote 3 están activos)	0 días	mar 20/10/26	mar 20/10/26	5 días	\$ 0										

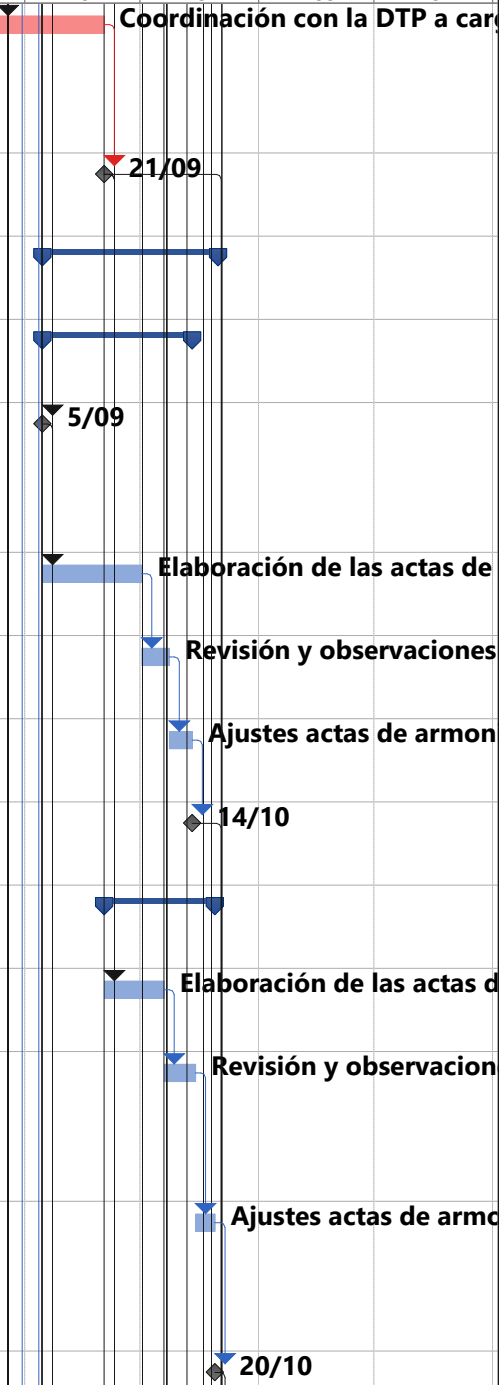

Id	N	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo											
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34				
1832	5	11.5.3 CORREDOR VIAL LOTE 3 CON ACCESOS NORTE	40 días	sáb 5/09/26	mié 14/10/26	11 días	\$ 0											
1833	6	Definición por parte del IDU del límite de intervención de construcción a incluir en el acta de armonización.	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	0 días	\$ 0											
1834	6	Elaboración de las actas de armonización	27 días	sáb 5/09/26	jue 1/10/26	0 días	\$ 0											
1835	6	Revisión y observaciones interventoría	8 días	jue 1/10/26	jue 8/10/26	0 días	\$ 0											
1836	6	Ajustes actas de armonización	5 días	jue 8/10/26	mié 14/10/26	0 días	\$ 0											
1837	6	Entrega final Actas de Armonización	0 días	mié 14/10/26	mié 14/10/26	11 días	\$ 0											
1838	5	11.5.4 CORREDOR VIAL LOTE 3 CON CONTRATO BUENAVISTA 2 DE EAAB	23 días	lun 28/09/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0											
1839	6	Elaboración de las actas de armonización	13 días	lun 28/09/26	sáb 10/10/26	0 días	\$ 0											
1840	6	Revisión y observaciones interventoría (si los contratos de obra de Buenavista 2 y lote 3 están activos)	5 días	sáb 10/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0											
1841	6	Ajustes actas de armonización (si los contratos de obra de Buenavista 2 y lote 3 están activos)	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0											
1842	6	Entrega final Actas de Armonización (si los contratos de obra de Buenavista 2 y lote 3 están activos)	0 días	mié 21/10/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0											
1843	4	11.6 ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA CON ESP	61 días	lun 24/08/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0											
1844	5	11.6.1 ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA CON EAAB	23 días	lun 28/09/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0											
1845	6	Elaboración Acta de competencia Red Pluvial	5 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	0 días	\$ 0											
1846	6	Elaboración Acta de competencia Red Sanitaria	5 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	0 días	\$ 0											

ID	Nº de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo
1847	6	Elaboración Acta de competencia Red Matriz	5 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	0 días	\$ 0
1848	6	Elaboración Acta de competencia Red Menor	5 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	0 días	\$ 0
1849	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencia Red Pluvial	5 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26	0 días	\$ 0
1850	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencia Red Sanitaria	5 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26	0 días	\$ 0
1851	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencia Red Matriz	5 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26	0 días	\$ 0
1852	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencia Red Menor	5 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26	0 días	\$ 0
1853	6	Ajustes Acta de Competencia Red Pluvial por contratista	5 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	0 días	\$ 0
1854	6	Ajustes Acta de Competencia Red Sanitaria por contratista	5 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	0 días	\$ 0
1855	6	Ajustes Acta de Competencia Red Matriz por contratista	5 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	0 días	\$ 0
1856	6	Ajustes Acta de Competencia Red Menor por contratista	5 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	0 días	\$ 0
1857	6	Revisión a observaciones por Interventoría Acta de Competencia Red Pluvial	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0
1858	6	Revisión a observaciones por Interventoría Acta de Competencia Red Sanitaria	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0
1859	6	Revisión a observaciones por Interventoría Acta de Competencia Red Matriz	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0
1860	6	Revisión a observaciones por Interventoría Acta de Competencia Red Menor	3 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0
1861	6	Revisión Acta de competencias por IDU red pluvial	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo							
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
1862	6	Revisión Acta de competencias por IDU red sanitaria	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0					Revisión Acta de com		
1863	6	Revisión Acta de competencias por IDU red Matriz	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0				Revisión Acta de com			
1864	6	Revisión Acta de competencias por IDU red menor	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0				Revisión Acta de com			
1865	6	Radicación y firma de Acta de Competencias Red Pluvial	0 días	mié 21/10/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0				21/10			
1866	6	Radicación y firma de Acta de Competencias Red Sanitaria	0 días	mié 21/10/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0				21/10			
1867	6	Radicación y firma de Acta de Competencias Red Matriz	0 días	mié 21/10/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0				21/10			
1868	6	Radicación y firma de Acta de Competencias Red Menor	0 días	mié 21/10/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 0				21/10			
1869	5	11.6.3 ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA CON ENEL	30 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	35 días	\$ 0							
1870	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencias	5 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26	0 días	\$ 0				Revisión por Interventoría Acta de Co			
1871	6	Ajustes Acta de Competencias por Contratista	10 días	vie 28/08/26	lun 7/09/26	0 días	\$ 0				Ajustes Acta de Competencias por			
1872	6	Revisión a observaciones Acta de Competencias por Interventoría	5 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	0 días	\$ 0				Revisión a observaciones Acta de			
1873	6	Revisión Acta de competencias por parte del IDU	10 días	vie 11/09/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0				Revisión Acta de competencias			
1874	6	Radciación y firma de Acta de Competencias	0 días	lun 21/09/26	lun 21/09/26	35 días	\$ 0				21/09			
1875	5	11.6.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA CON ETB	30 días	lun 24/08/26	lun 21/09/26	35 días	\$ 0							
1876	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencias	5 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26	0 días	\$ 0				Revisión por Interventoría Acta de Co			
1877	6	Ajustes Acta de Competencias por Contratista	10 días	vie 28/08/26	lun 7/09/26	0 días	\$ 0			Ajustes Acta de Competencias por				
1878	6	Revisión a observaciones Acta de Competencias por Interventoría	5 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	0 días	\$ 0			Revisión a observaciones Acta de				
1879	6	Revisión Acta de competencias por parte del IDU	10 días	vie 11/09/26	lun 21/09/26	0 días	\$ 0			Revisión Acta de competencias				
Página 9														

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo								
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	
1898	6	Revisión a observaciones Acta de Competencias por Interventoría	5 días	vie 4/09/26	mié 9/09/26	0 días	\$ 0				Revisión a observaciones Acta de C				
1899	6	Revisión Acta de competencias por parte del IDU	10 días	mié 9/09/26	vie 18/09/26	0 días	\$ 0				Revisión Acta de competencias				
1900	6	Radciación y firma de Acta de Competencias	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	38 días	\$ 0				18/09				
1901	5	11.6.7 ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPETENCIA CON VANTI	26 días	mié 26/08/26	vie 18/09/26	37 días	\$ 0								
1902	6	Radicación de Acta de Competencias	1 día	mié 26/08/26	jue 27/08/26	0 días	\$ 0				Radicación de Acta de Competencias				
1903	6	Revisión por Interventoría Acta de Competencias	5 días	jue 27/08/26	mar 1/09/26	0 días	\$ 0				Revisión por Interventoría Acta de C				
1904	6	Ajustes Acta de Competencias por Contratista	5 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	0 días	\$ 0				Ajustes Acta de Competencias por C				
1905	6	Revisión a observaciones Acta de Competencias por Interventoría	5 días	vie 4/09/26	mié 9/09/26	0 días	\$ 0				Revisión a observaciones Acta de				
1906	6	Revisión Acta de competencias por parte del IDU	10 días	mié 9/09/26	vie 18/09/26	0 días	\$ 0				Revisión Acta de competencias				
1907	6	Radicación y firma de Acta de Competencias	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	37 días	\$ 0				18/09				
1908	4	11.7 ELABORACIÓN DE BALANCE DE PRESUPUESTO POR OBRAS A PRECIOS UNITARIOS	63 días	lun 24/08/26	jue 22/10/26	2 días	\$ 0								
1909	5	11.7.3 Capítulo de redes	37 días	jue 10/09/26	vie 16/10/26	2 días	\$ 0								
1910	6	Elaboración de balance de presupuesto a precios unitarios capítulo redes	28 días	jue 10/09/26	mié 7/10/26	0 días	\$ 0				Elaboración de balance de				
1911	6	Revisión por Interventoría a balance de presupuesto a precios unitarios capítulo redes	5 días	mié 7/10/26	mar 13/10/26	0 días	\$ 0				Revisión por Intervento				
1912	6	Ajustes a balance de presupuesto por precios unitarios por contratista	4 días	mar 13/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0				Ajustes a balance de p				
1913	5	11.7.6 Capítulo de diseños adicionales	16 días	lun 24/08/26	mar 8/09/26	42 días	\$ 0								

Id	Nº de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo										
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34			
1914	6	Elaboración presupuesto "ACCESOS N-S PATIO PORTAL"	3 días	vie 28/08/26	mar 1/09/26	0 días	\$ 0				Elaboración presupuesto "ACCESOS N-S PATIO PORTAL"						
1915	6	Revisión presupuesto por interventoría "OBRAS CANAL TIBABITA"	5 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26	3 días	\$ 0				Revisión presupuesto por interventoría "OBRAS CANAL TIBABITA"						
1916	6	Revisión por Interventoría a presupuesto "ACCESO N-S PATIO PORTAL"	5 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	0 días	\$ 0				Revisión por Interventoría a presupuesto "ACCESO N-S PATIO PORTAL"						
1917	6	Ajustes a presupuesto por contratista	3 días	vie 4/09/26	mar 8/09/26	40 días	\$ 0				Ajustes a presupuesto por contratista						
1918	5	Aprobación de presupuesto y balance por interventoría	0 días	vie 16/10/26	vie 16/10/26	0 días	\$ 0					16/10					
1919	5	Revisión y aprobación de presupuesto y balance por IDU	7 días	vie 16/10/26	jue 22/10/26	2 días	\$ 0					Revisión y aprobación de presupuesto y balance por IDU					
1920	4	11.8 ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA (PDT) DE CONSTRUCCIÓN	29 días	lun 21/09/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0										
1921	5	Elaboración de cronograma de construcción (PDT)	14 días	lun 21/09/26	sáb 3/10/26	0 días	\$ 0					Elaboración de cronograma de construcción (PDT)					
1922	5	Entrega PDT de construcción a Interventoría	0 días	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26	0 días	\$ 0					3/10					
1923	5	Revisión de PDT de construcción por parte de Interventoría	5 días	sáb 3/10/26	jue 8/10/26	0 días	\$ 0					Revisión de PDT de construcción por parte de Interventoría					
1924	5	Ajustes a PDT de construcción por contratista	5 días	jue 8/10/26	mié 14/10/26	0 días	\$ 0					Ajustes a PDT de construcción por contratista					
1925	5	Aprobación PDT de construcción por parte de Interventoría	5 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0					Aprobación PDT de construcción por parte de Interventoría					
1926	4	11.9 COMPONENTES TRANSVERSALES PRORROGA 2	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 112.501.606										
1927	5	11.9.1 COMPONENTE AMBIENTAL	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 36.545.939										
1928	6	No objeción del MAO por parte del IDU	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0									No objeción del MAO por parte del IDU	
1929	6	No objeción del plan de sostenibilidad por parte del IDU	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0									No objeción del plan de sostenibilidad por parte del IDU	
1930	6	No objeción del plan de sostenibilidad por parte del IDU	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0									No objeción del plan de sostenibilidad por parte del IDU	
1931	6	No objeción del Programa de Manejo Ambiental de residuos de construcción y demolición – RCD por parte del IDU	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0									No objeción del Programa de Manejo Ambiental de residuos de construcción y demolición – RCD por parte del IDU	

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo										
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34			
1932	6	presentación lista de chequeo labores Componente Ambiental SST	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 36.545.939										presentación lista d
1933	5	11.9.2 COMPONENTE SOCIAL	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 52.732.305										
1934	6	Entrega arte para piezas de divulgación por parte del IDU	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0										Entrega arte para pie
1935	6	Elaboración lista de chequeo componente social.	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 52.732.305										Elaboración lista de
1936	6	Convocatoria de reunión de inicio ante la comunidad.	2 días	sáb 19/09/26	mar 22/09/26	0 días	\$ 0										Convocatoria de reunión de in
1937	6	Reunión de inicio de etapa de Construcción	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26	34 días	\$ 0										22/09
1938	6	Elaboración de Actas de Vecindad límite muro calle 183	30 días	lun 21/09/26	mar 20/10/26	5 días	\$ 0										Elaboración de Actas
1939	5	11.9.3 COMPONENTE TRANSITO	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 23.223.362										
1940	6	Recopilación y procesamiento de información primaria (aforos) (depende de confirmación de la actualización de la Linea base)	36 días	lun 24/08/26	sáb 26/09/26	0 días	\$ 0										Recopilación y procesamient
1941	6	Revisión por interventoría información primaria	5 días	sáb 26/09/26	jue 1/10/26	0 días	\$ 0										Revisión por interventoría i
1942	6	Aprobación por parte de interventoría de información primaria	0 días	jue 1/10/26	jue 1/10/26	0 días	\$ 0										1/10
1943	6	Radicación información primaria ante SDM	0 días	jue 1/10/26	jue 1/10/26	0 días	\$ 0										1/10
1944	6	Revisión por parte de SDM a información primaria	24 días	jue 1/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0										Revisión por parte d
1945	6	Aprobación por SDM a información primaria de Linea Base	0 días	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0										24/10
1946	6	Inicio gestión Permiso tipo A PMT POR PARTE DEL IDU (SDM)	13 días	lun 24/08/26	vie 4/09/26	0 días	\$ 0										Inicio gestión Permiso tipo A PMT
1947	6	Revisión SDM	1 día	vie 4/09/26	sáb 5/09/26	0 días	\$ 0										Revisión SDM
1948	6	Atención observaciones SDM	1 día	sáb 5/09/26	lun 7/09/26	0 días	\$ 0										Atención observaciones SDM
1949	6	Aprobación SDM	1 día	lun 7/09/26	mar 8/09/26	0 días	\$ 0										Aprobación SDM

ID	Nº de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo		M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
1950	6	Radicación diagnostico de las obras de adecuación de desvíos.	1 día	lun 24/08/26	mar 25/08/26	0 días	\$ 0								
1951	6	Revisión por parte de interventoría de diagnostico de las obras de adecuación de desvíos	5 días	mar 25/08/26	sáb 29/08/26	0 días	\$ 0								
1952	6	Elaboración y presentación lista de chequeo Componente Transito	61 días	lun 24/08/26	mié 21/10/26	4 días	\$ 23.223.362								
1953	5	11.9.5 COMPONENTE ARQUEOLOGÍA PRÓRROGA 2	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0								
1954	6	Elaboración y presentación informes mensuales y semestrales Componente Arqueología	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0								
1955	5	11.9.6 COMPONENTE TECNICO PRECONSTRUCCIÓN PRÓRROGA 2	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0								
1956	6	Elaboración y presentación informes mensuales Componente técnico	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0								
1957	4	11.10 REQUISITOS PARA CAMBIO DE ETAPA	59 días	sáb 29/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0								
1958	5	Puesta a disposición de infraestructura de la carrera 7 por parte del IDU	0 días	vie 9/10/26	vie 9/10/26	9 días	\$ 0								
1959	5	Manifestación de relación de personal, equipos y materiales pueestos en obra a cargo de contratista	0 días	jue 15/10/26	jue 15/10/26	4 días	\$ 0								
1960	5	Revisión de Estudios y diseños correspondientes al tramo de Obra que sea objeto de intervención en primera instancia por interventoría	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	45 días	\$ 0								
1961	5	Aprobación de Plan de Manejo de Tráfico por parte de SDM	0 días	mar 8/09/26	mar 8/09/26	43 días	\$ 0								
1962	5	Aprobación de Diagnostico de obras de adecuación de desvíos por interventoría	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26	53 días	\$ 0								
1963	5	Aprobación de cronograma de obra (PDT) por interventoría	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0								
Página 14															

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo							
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
1964	5	Concepto de Viabilidad Predial entregado por IDU	0 días	lun 21/09/26	lun 21/09/26	29 días	\$ 0					21/09		
1965	5	Revisión Acta de cambio de etapa por parte del IDU.	6 días	lun 19/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0						Revisión Acta de can	
1966	5	Suscripción Acta de cambio de etapa por Contratista, interventoría e IDU	0 días	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0						24/10	
1967	5	Definición fecha de inicio de proceso constructivo	0 días	lun 19/10/26	lun 19/10/26	0 días	\$ 0						19/10	
1968	4	11.11 COMPONENTE BIM	65 días	lun 24/08/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0							
1969	5	Entrega de modelos BIM a Interventoría del Patio Portal (autoría de diseños)	1 día	lun 24/08/26	mar 25/08/26	0 días	\$ 0							
1970	5	Entrega de modelos BIM a Interventoría del de diseños Corredor Vial (autoría de diseños)	3 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	34 días	\$ 0							
1971	5	Entrega de modelos BIM a Interventoría Autoría de diseños Adicionales	4 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	35 días	\$ 0							
1972	5	Coordinación de diseños Patio Portal	1 día	mar 25/08/26	mié 26/08/26	0 días	\$ 0							
1973	5	Coordinación de diseños Corredor Vial (pendiente de no objeción EAAB)	15 días	lun 28/09/26	mar 13/10/26	0 días	\$ 0							
1974	5	Coordinación de diseños Adicionales (pendiente de no objeción EAAB)	13 días	mié 7/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0							
1975	5	Simulación y cuantificación de diseños Patio Portal	1 día	mié 26/08/26	jue 27/08/26	57 días	\$ 0							
1976	5	Simulación y cuantificación de diseños Corredor Vial (Pendiente No objeción EAAB)	15 días	lun 28/09/26	mar 13/10/26	7 días	\$ 0							
1977	5	Simulación y cuantificación de diseños Adicionales (Pendiente No objeción EAAB)	12 días	mié 7/10/26	mar 20/10/26	0 días	\$ 0							
1978	5	Cargue de información final en plataforma ACC	0 días	mar 20/10/26	mar 20/10/26	0 días	\$ 0						20/10	

Id	N d e	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Demora permisible	Costo							
								M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
1979	5	Revisión por interventoría a información cargada en ACC	5 días	mar 20/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0							
1980	4	Fin Prórroga Preconstrucción 2	0 días	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0							
1981	3	Fin Etapa de Preconstrucción Inicial y Prorrogas	0 días	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0							
1982	2	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2164 días	sáb 24/10/26	lun 26/04/32	0 días	\$ 438.516.036.4...							
1983	3	Inicio Etapa de Construcción	0 días	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26	0 días	\$ 0							
1984	3	Construcción Patio Portal y Corredor	914 días	sáb 24/10/26	vie 23/02/29	0 días	\$ 438.516.036.4...							
1985	3	Etapa de recibo de construcción	67 días	vie 23/02/29	jue 26/04/29	0 días	\$ 0							
1986	3	Etapa de mantenimiento	1183 días	jue 26/04/29	lun 26/04/32	0 días	\$ 0							
1987	3	Fin etapa de Construcción y mantenimiento	0 días	lun 26/04/32	lun 26/04/32	0 días	\$ 0							

