

[illegible]

AUTORIZACIÓN HONORARIOS					
FORMA DE PAGO		AUTORIZACIONES			
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	% AUTORIZADO	PAGO DE HONORARIOS	FECHA	VALOR
Con la firma de los contratos derivados de obra e interventoría	60%				
Con un avance de obra del 50%	20%				
Con la terminación del contrato de obra	15%				
Con la entrega de la evaluación	5%				
VALOR TOTAL DE HONORARIOS	\$ 56.158.565	TOTAL AUTORIZADO			\$ -
		SALDO			\$ 56.158.565

4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Adicionalmente se han adelantado, construcción de campamento, rocería para evaluación ocular de las márgenes de la quebrada, formulación del PMT

CONVENIO: Se han adelantado reuniones para conocer la nueva propuesta de estabilización del talud y conformación de la banca para construcción del andén, además para evaluar contractualmente la posible implementación del mismo sin afectar las condiciones iniciales del convenio

PENDIENTES POR DESur:	
Evaluación económica de la nueva alternativa de diseño	
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES	
5. OBSERVACIONES GENERALES:	
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros	

6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN


En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015. No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	NATHALIA VILLAMIL CASTAÑO	
CARGO:	SUPERVISORA	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	DARLY DURANGO PÉREZ	
CARGO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	


7. REGISTRO FOTOGRAFICO




DESCRIPCIÓN: Visita de reconocimiento en compañía de DESur, contratista de obra e interventoría y municipio.

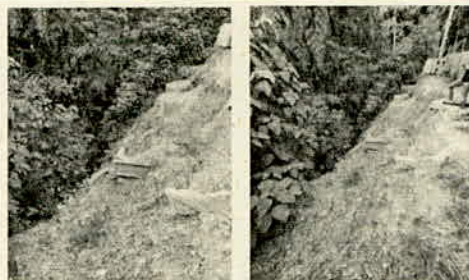

DESCRIPCIÓN: Cara externa del talud a estabilizar.

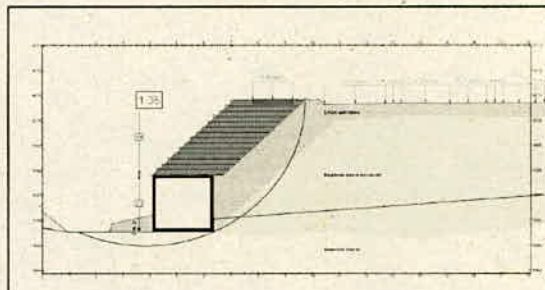

DESCRIPCIÓN: Alternativa inicial de conformación de banca para construcción de andén.

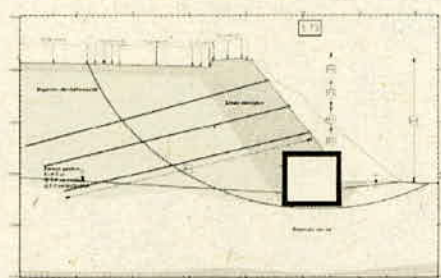

DESCRIPCIÓN: Alternativa actual y en evaluación para estabilización del talud existente que garantiza el ancho necesario para construcción de andén.
