

disposición final de un total de 15.804,4 kilogramos de material peligroso, evitando su acumulación en las instalaciones y reduciendo significativamente el riesgo de generación de impactos ambientales negativos.

Esta actividad contribuye al fortalecimiento de la gestión integral de residuos peligrosos, promoviendo el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y las buenas prácticas de manejo ambiental. Asimismo, evidencia el compromiso de la organización con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la implementación de estrategias orientadas a la sostenibilidad y al manejo adecuado de los residuos generados en sus procesos.



11.Actividad retiro de material RCD

La actividad de retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se realizó con el propósito de mantener las áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza, minimizando los impactos ambientales derivados de la acumulación de estos materiales. La recolección y evacuación oportuna de los RCD contribuye a prevenir la contaminación del suelo, la generación de material particulado, la obstrucción de drenajes y la afectación del paisaje, además de reducir riesgos para la seguridad de los trabajadores y la comunidad. Los residuos fueron separados y trasladados para su aprovechamiento o disposición final en sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, promoviendo una gestión integral de los residuos y fomentando prácticas de economía circular cuando fue posible. Esta actividad refleja el compromiso de la organización con la protección del medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos legales y la implementación de buenas prácticas de gestión ambiental en el desarrollo de sus actividades.

Como parte de las actividades de gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se realizó el retiro y transporte de un volumen total de 108 m³ de material hacia el relleno sanitario operado por Interaseo, ubicado en el municipio de Sincelejo, Sucre, autorizado para la recepción y disposición final de este tipo de residuos. El traslado se efectuó mediante volquetas con capacidades de 16 m³ y 7 m³, garantizando un transporte seguro y eficiente conforme a las condiciones operativas requeridas. Esta actividad permitió evitar la acumulación inadecuada de residuos en el área de intervención, reduciendo el riesgo de contaminación del suelo, la generación de material particulado, la obstrucción de sistemas de drenaje y otros impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de los RCD. Asimismo, la disposición en un sitio autorizado asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y fortalece las acciones de manejo responsable de los residuos, contribuyendo a la prevención de la contaminación y a la protección de los recursos naturales.













12. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL

Se realizó visitas de seguimiento y verificación ambiental en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de constatar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para el proyecto.

Como parte de estas actividades, se verificó el adecuado manejo y segregación de los residuos generados, así como la entrega de materiales susceptibles de reutilización o reciclaje, conforme a su clasificación y a los lineamientos ambientales establecidos.

Así mismo, se formularon observaciones y recomendaciones ambientales, las cuales fueron atendidas oportunamente por el personal de obra, evidenciándose mejoras progresivas en la gestión ambiental durante el periodo evaluado.

13. CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas, que incluyen charlas ambientales, inspección de productos químicos, implementación de puntos ecológicos y jornadas de aseo, evidencian un avance significativo en el fortalecimiento de la gestión ambiental

dentro del área intervenida. Estas acciones no solo permitieron sensibilizar al personal sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, sino también promover prácticas responsables en el manejo de residuos y sustancias químicas.

Asimismo, la inspección de productos químicos contribuyó a verificar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, etiquetado y manipulación, reduciendo riesgos para la salud y el ambiente. Por su parte, los puntos ecológicos facilitaron la correcta separación de residuos en la fuente, fomentando una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad.

De igual manera, las jornadas de aseo generaron un impacto positivo en el entorno, mejorando las condiciones de orden y limpieza, y fortaleciendo el sentido de pertenencia y responsabilidad ambiental entre los participantes.

En conclusión, la integración de estas actividades demuestra la importancia de implementar estrategias continuas de educación, control y participación, como base fundamental para consolidar procesos ambientales sostenibles y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la gestión ambiental.

ANEXOS

Como soporte de las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo reportado, se anexan al presente informe los registros y evidencias documentales, tales como registros fotográficos, listados de asistencia a capacitaciones y charlas que permiten verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas en la obra.

Elaboración	Revisión	Aprobación
		
Nombre: Andrés Mauricio Hoyos PROFESIONAL AMBIENTAL	Nombre: Francisco Javier Villanueva Tovar DIRECTOR DE OBRA	Nombre: Raiza Canchila RESIDENTE DE OBRA
Fecha.30-07-2026	Fecha.30-07-2026	Fecha.30-07-2026

ANEXO N°1.

REGISTRO ACTIVIDADES AMBIENTALES.

CONVOCATORIA COMITÉ DE FOMENTO PONAL		GESTION AMBIENTAL		FT-SST-012 Versión: 01 11-NOV-2025	
		REGISTRO DE ASISTENCIA			
RESPONSABLE	Andrés Lolo Navarro		TIPO DE EVENTO		
CARGO	Presidente Comité		CAPACITACION ()	CHARLA (X)	OTRO ()
LUGAR	ESCAN		REUNION ()	CUAL	
TEMA			FECHA	02-07-26	
OBJETIVO					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
Alexander M	7320169	obrero			
Yous Henry P	1129184909	obrero			
NEVIN KATCINA	1005382919	obrero			
Enrique L. Ramirez	7743577890	obrero			
Jesus Estrada	92552449	o/udomh			
Damian Diaz	3839175	obrero			
Francisco Quiroz	3836678	obrero			
Wilber Salgado Jr	3839440	obrero			
Jose Guillermo Jover	1005474909	obrero			
Carlos Jose Estrada	1102813962	obrero			
Jose Navarro M.	13074726	obrero			

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO BOTATORIO PONAL		GESTION AMBIENTAL		PT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2015																																																																																						
		REGISTRO DE ASISTENCIA																																																																																								
RESPONSABLE	Andrés Hoyos Nájomo		TIPO DE EVENTO																																																																																							
CARGO	R. Ambiental		CAPACITACION ()	CHARLA (X)	OTRO ()																																																																																					
LUGAR	ESPERAN		REUNION ()	CUAL																																																																																						
TEMA			FECHA	16-02-24																																																																																						
OBJETIVO																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CEDULA</th> <th>CARGO</th> <th>EMPRESA</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco Delgado</td> <td>3836678</td> <td>Oficial</td> <td></td> <td>Francisco</td> </tr> <tr> <td>Yover Nolasco Rivera</td> <td>1124184409</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Yover N.</td> </tr> <tr> <td>Carolina L. Diaz-Lopez</td> <td>7797777000</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Carolina Diaz</td> </tr> <tr> <td>Luis Guillermo Tovar</td> <td>700533499</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Luis Guillermo</td> </tr> <tr> <td>Alexander M.</td> <td>73201169</td> <td>Operario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enrique Ruiz</td> <td>1103220726</td> <td>Atendente</td> <td></td> <td>Enrique</td> </tr> <tr> <td>Serius Estrada</td> <td>92556449</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Serius</td> </tr> <tr> <td>Kevin</td> <td>7005582999</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Kevin</td> </tr> <tr> <td>Guillermo</td> <td>3890095</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Guillermo</td> </tr> <tr> <td>Wilber Sule</td> <td>3837970</td> <td>Oficial</td> <td></td> <td>Wilber Sule</td> </tr> <tr> <td>Presy Morales</td> <td>106749893</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Presy Morales</td> </tr> <tr> <td>Omara Lainez Camacho</td> <td>7320089</td> <td>T. Subalterno</td> <td></td> <td>Omara Lainez</td> </tr> <tr> <td>Helwin Diaz</td> <td>5154175</td> <td></td> <td></td> <td>Helwin Diaz</td> </tr> <tr> <td>David Cortes</td> <td>1053246178</td> <td>Técnico</td> <td></td> <td>David Cortes</td> </tr> <tr> <td>Fosé Diaz</td> <td>5151979</td> <td>Técnico</td> <td></td> <td>Fosé Diaz</td> </tr> <tr> <td>Damian Diaz</td> <td>3839175</td> <td>Operario</td> <td></td> <td>Damian Diaz</td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	Francisco Delgado	3836678	Oficial		Francisco	Yover Nolasco Rivera	1124184409	Operario		Yover N.	Carolina L. Diaz-Lopez	7797777000	Operario		Carolina Diaz	Luis Guillermo Tovar	700533499	Operario		Luis Guillermo	Alexander M.	73201169	Operario			Enrique Ruiz	1103220726	Atendente		Enrique	Serius Estrada	92556449	Operario		Serius	Kevin	7005582999	Operario		Kevin	Guillermo	3890095	Operario		Guillermo	Wilber Sule	3837970	Oficial		Wilber Sule	Presy Morales	106749893	Operario		Presy Morales	Omara Lainez Camacho	7320089	T. Subalterno		Omara Lainez	Helwin Diaz	5154175			Helwin Diaz	David Cortes	1053246178	Técnico		David Cortes	Fosé Diaz	5151979	Técnico		Fosé Diaz	Damian Diaz	3839175	Operario		Damian Diaz
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA																																																																																						
Francisco Delgado	3836678	Oficial		Francisco																																																																																						
Yover Nolasco Rivera	1124184409	Operario		Yover N.																																																																																						
Carolina L. Diaz-Lopez	7797777000	Operario		Carolina Diaz																																																																																						
Luis Guillermo Tovar	700533499	Operario		Luis Guillermo																																																																																						
Alexander M.	73201169	Operario																																																																																								
Enrique Ruiz	1103220726	Atendente		Enrique																																																																																						
Serius Estrada	92556449	Operario		Serius																																																																																						
Kevin	7005582999	Operario		Kevin																																																																																						
Guillermo	3890095	Operario		Guillermo																																																																																						
Wilber Sule	3837970	Oficial		Wilber Sule																																																																																						
Presy Morales	106749893	Operario		Presy Morales																																																																																						
Omara Lainez Camacho	7320089	T. Subalterno		Omara Lainez																																																																																						
Helwin Diaz	5154175			Helwin Diaz																																																																																						
David Cortes	1053246178	Técnico		David Cortes																																																																																						
Fosé Diaz	5151979	Técnico		Fosé Diaz																																																																																						
Damian Diaz	3839175	Operario		Damian Diaz																																																																																						

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL POMAL		GESTION AMBIENTAL		FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025	
		REGISTRO DE ASISTENCIA			
RESPONSABLE	Andrés Hoyos Navarro		TIPO DE EVENTO		
CARGO	D. ambiental		CAPACITACION ()	CHARLA (X)	OTRO ()
LUGAR	BUREAU		REUNION ()	CUAL	
TEMA			FECHA	21-07-26	
OBJETIVO					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
Enon Diaz Quiroga	1107220726	Aludendo		Enon Diaz	
Francisco Diaz Quiroga	1793577890	apoderado		Francisco Diaz	
Jose Esteban	3836678	oficial		Jose Esteban	
Kevin	9256447	oficial		Kevin	
Guillermo	1005582929	oficial		Guillermo	
Wilber	3840095	oficial		Wilber	
Proceso	383792	oficial		Proceso	
Daniel	406741813	oficial		Daniel	
Janier	7320684	T. C. C. C.		Janier	
David	5159175	Tecnic		David	
Jose	105346178	Tecnic		Jose	
Daniel	5159779	Tecnic		Daniel	
Daniel	3839175	Plomero		Daniel	

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO BOTATORIO PINAL		GESTION AMBIENTAL		FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025																																																																																						
		REGISTRO DE ASISTENCIA																																																																																								
RESPONSABLE	Andrés Hoyos Navarro		TIPO DE EVENTO																																																																																							
CARGO	R. ONG, vegetal		CAPACITACION ()	CHARLA X	OTRO ()																																																																																					
LUGAR	B. GRAN		REUNION ()	CUAL																																																																																						
TEMA			FECHA	23-09-26																																																																																						
OBJETIVO																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>CEDULA</th> <th>CARGO</th> <th>EMPRESA</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Goer Nandez Rivera</td> <td>112912401</td> <td>obrero</td> <td></td> <td>Goer</td> </tr> <tr> <td>Luis Guillermo Torres</td> <td>100573494</td> <td>obrero</td> <td></td> <td>Luis Guillermo</td> </tr> <tr> <td>Alexander M</td> <td>73201164</td> <td>obrero</td> <td></td> <td>Alexander</td> </tr> <tr> <td>Franco Edna</td> <td>1103220726</td> <td>AYUDANTE</td> <td></td> <td>Franco</td> </tr> <tr> <td>Guadalupe River</td> <td>7792174890</td> <td>ayudante</td> <td></td> <td>Guadalupe River</td> </tr> <tr> <td>Francisco Duran</td> <td>3836698</td> <td>oficial</td> <td></td> <td>Francisco</td> </tr> <tr> <td>Jesús Esteban</td> <td>925566149</td> <td>ayudante</td> <td></td> <td>Jesús Esteban</td> </tr> <tr> <td>KEVIN</td> <td>1006082919</td> <td>ayudante</td> <td></td> <td>KEVIN</td> </tr> <tr> <td>Camila W</td> <td>3840045</td> <td>ANAL</td> <td></td> <td>Camila W</td> </tr> <tr> <td>Wilmar Salgado</td> <td>3837940</td> <td>OFICIAL</td> <td></td> <td>Wilmar Salgado</td> </tr> <tr> <td>Fredy Amador</td> <td>1067401853</td> <td>OFICIAL</td> <td></td> <td>Fredy Amador</td> </tr> <tr> <td>Orma Luis Carpio</td> <td>7320684</td> <td>T. Cubierta</td> <td></td> <td>Orma Luis Carpio</td> </tr> <tr> <td>Marvin DIAZ</td> <td>5159175</td> <td></td> <td></td> <td>Marvin DIAZ</td> </tr> <tr> <td>David Cortes</td> <td>1053746128</td> <td>Tecnico</td> <td></td> <td>David Cortes</td> </tr> <tr> <td>JOSE D. L. S.</td> <td>5151974</td> <td>Tecnico</td> <td></td> <td>JOSE D. L. S.</td> </tr> <tr> <td>Dominio Diet</td> <td>3834175</td> <td>Plomero</td> <td></td> <td>Dominio Diet</td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	Goer Nandez Rivera	112912401	obrero		Goer	Luis Guillermo Torres	100573494	obrero		Luis Guillermo	Alexander M	73201164	obrero		Alexander	Franco Edna	1103220726	AYUDANTE		Franco	Guadalupe River	7792174890	ayudante		Guadalupe River	Francisco Duran	3836698	oficial		Francisco	Jesús Esteban	925566149	ayudante		Jesús Esteban	KEVIN	1006082919	ayudante		KEVIN	Camila W	3840045	ANAL		Camila W	Wilmar Salgado	3837940	OFICIAL		Wilmar Salgado	Fredy Amador	1067401853	OFICIAL		Fredy Amador	Orma Luis Carpio	7320684	T. Cubierta		Orma Luis Carpio	Marvin DIAZ	5159175			Marvin DIAZ	David Cortes	1053746128	Tecnico		David Cortes	JOSE D. L. S.	5151974	Tecnico		JOSE D. L. S.	Dominio Diet	3834175	Plomero		Dominio Diet
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA																																																																																						
Goer Nandez Rivera	112912401	obrero		Goer																																																																																						
Luis Guillermo Torres	100573494	obrero		Luis Guillermo																																																																																						
Alexander M	73201164	obrero		Alexander																																																																																						
Franco Edna	1103220726	AYUDANTE		Franco																																																																																						
Guadalupe River	7792174890	ayudante		Guadalupe River																																																																																						
Francisco Duran	3836698	oficial		Francisco																																																																																						
Jesús Esteban	925566149	ayudante		Jesús Esteban																																																																																						
KEVIN	1006082919	ayudante		KEVIN																																																																																						
Camila W	3840045	ANAL		Camila W																																																																																						
Wilmar Salgado	3837940	OFICIAL		Wilmar Salgado																																																																																						
Fredy Amador	1067401853	OFICIAL		Fredy Amador																																																																																						
Orma Luis Carpio	7320684	T. Cubierta		Orma Luis Carpio																																																																																						
Marvin DIAZ	5159175			Marvin DIAZ																																																																																						
David Cortes	1053746128	Tecnico		David Cortes																																																																																						
JOSE D. L. S.	5151974	Tecnico		JOSE D. L. S.																																																																																						
Dominio Diet	3834175	Plomero		Dominio Diet																																																																																						

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO ROTATORIO PONTAL		GESTION AMBIENTAL		FT-SST-012 Version: 01 11-NOV-2025	
		REGISTRO DE ASISTENCIA			
RESPONSABLE	Andrés Stas Navarro		TIPO DE EVENTO		
CARGO	Residente Ambiental		CAPACITACION ()	CHARLA (X)	OTRO ()
LUGAR	C-ROD		REUNION ()	CUAL	
TEMA			FECHA	28-07-2021	
OBJETIVO					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA	
Yaser Andres Pineda	1129184909	Obrero		Yaser Pineda	
Clara Chen	0000086752	Chem		Clara Chen	
Kevin	1005782979	STP		KEVIN	
Guillermo Lopez	3870093			Guillermo Lopez	
Andrés José Estrada	1-102813862	Obrero		Andrés Estrada	
Alexander M	73501169	Obrero		Alexander M	
Dominico Diaz	3859175	Obrero		Dominico Diaz	
Jesús Estrada	92556449	ayudante		Jesús Estrada	
Wilber Salazar	3839770	OFICIAL		Wilber Salazar	
Francisco Pérez	38336678	OFICIAL		Francisco Pérez	
María Chen	100000576	Obrero		María Chen	
José Guillermo Lopez	1005704949	Obrero		José Guillermo Lopez	
José Catalina Correa	103633161	POF SST		José Catalina Correa	

[Firma]
FIRMA DEL RESPONSABLE



INSPECCION AMBIENTAL



Código: FT-SST: 130
VERSION:001
FECHA:
Noviembre-2025

Fecha: 16-07-26 Quien realiza la Inspección: Andres Hoyos Navaro
Ubicación/Área: Casimio de Petrukkas

Item	DESCRIPCIÓN	RESULTADO			OBSERVACIONES
		B/SI	M/NO	N/A	
1	En que estado se encuentra el punto ecologico?	X			
2	Estan identificadas las canecas de acuerdo al codigo de colores?	X			
3	Hay una separacion adecuada de residuos?	X			
4	Hay evidencia de registros de entrega de residuos?	X			
5	Se observa el área en orden y aseo?	X			
6	Se observa separados los residuos peligrosos?	X			
7	Hay señalización y demarcación suficiente?	X			
8	Existen residuos líquidos recolectados y demarcados?		X		
9	Se observa un dique de contención de derrames?	X			
10	Se encuentra el KIT Ambiental en el sitio?	X			
11	Los productos químicos están rotulados con su contenido, rombo de NFPA y debidamente almacenados?	X			
12	Se evidencian las hojas de seguridad y fichas Técnicas de todos los Productos Químicos?	X			
13	Se evidencian registros de capacitación en temas relacionados al manejo de residuos y ambientales?	X			
14	Se observan permisos ambientales o licencias para el desarrollo de las actividades?	X			
15	Se encuentra evidencia de Incidentes ambientales?		X		
16	Se encuentran registros de simulacros ambientales en el último mes?	X			
17	Se evidencia en sitio la matriz de reactividad de productos químicos?	X			
18	Se evidencian registros de mediciones higiénicas?	X			
19	Se evidencian los indicadores de gestión ambientales, medidos y tabulada la información?	X			
20	El personal conoce la política integral, plan de emergencias?	X			

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN REALIZA:

PROFESIONAL SST

QUIEN VALIDA:

RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO
POTATORIO
PUNAL

PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
INSPECCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS

FT EST 140

Nombre: Aróns Koxa Narino

Proyecto: Tanque Humano



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESRAN

FECHA DE INSPECCIÓN: 15-03-2026

NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: Casino de Refineros

NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA: Rafael Gonzalez

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Aróns Koxa Narino

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(Firma y nombre y espacio reservado del funcionario o entidad pública)

ASPECTO A EVALUAR <small>(Las observaciones deben ser de los resultados y no de la inspección)</small>	CUMPLE <small>(Responde con una X, si se cumple o no al requisito y en caso contrario)</small>		OBSERVACIONES <small>(Si evidencia alguna condición o información diferente por favor diligenciar esta casilla)</small>	PLAN DE MEJORA <small>(Si responde a la identificación, proponer un plan de mejoramiento)</small>	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>(Firma y nombre y espacio reservado del funcionario o entidad pública)</small>
	SI	NO			
SITO DE ALMACENAMIENTO					
Se cuenta con un solo sitio en el área designado para el almacenamiento de los productos químicos	X				
El sitio de almacenamiento es de acceso restringido	X				
El sitio de almacenamiento de productos químicos se encuentra organizado, limpio y con espacio suficiente según el volumen de productos manejados	X				
El sitio de almacenamiento cuenta con iluminación y ventilación adecuadas	X				
Durante la inspección, en el sitio de almacenamiento se encuentran alimentos o materiales como plásticos, papeles, cartones que puedan ser en caso de incendio	X	X			
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia del área, están debidamente señalizadas	X				
Las salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos que dificulten la evacuación del personal en caso de emergencia	X				
Se cuenta con extintores en los sitios donde se manipulan productos químicos	X				
Se cuenta con kit de derrames	X				
Se realizan mantenimiento preventivo a los sistemas de ventilación, extracción, redes eléctricas, tuberías, etc	X				
ESTANTERIAS O GABINETES					
El sitio de almacenamiento cuenta con estanterías o gabinetes suficientes para la ubicación de los productos químicos	X				
Las estanterías o gabinetes son de materiales adecuados según el tipo de sustancias almacenadas	X				
Las estanterías se encuentran aisladas a la pared y/o piso para evitar derrames	X				
ETIQUETADO Y FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD					
Todos los recipientes o envases cuentan con etiquetas que permitan su identificación	X				

 CONSORCIO ROTATORIO POSAL		REGISTRAL INTERIO Y CONSTRUCCIONES SAS INSPECCION PRODUCTOS QUIMICOS		FT 527 142 Versión: 001 Protocolo: Tablero Humano			
INSPECCION							
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: <u>ESRAN</u>				NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION: <u>Arveler Roxo Navano</u>			
FECHA DE INSPECCION: <u>15-07-2026</u>				NOMBRE DEL AREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: <u>Casino de pefuvaluros</u>			
NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL AREA: <u>Raiza Conchilz</u>							
ASPECTO A EVALUAR <small>(Se detallamente solo uno de los requisitos a evaluar de la inspeccion)</small>	CUMPLE <small>(Marcar con una X, si se cumple con el requisito a evaluar)</small>			OBSERVACIONES <small>(Si evidencia alguna anomalía o inconsistencia, detallar por favor discrepancia y/o medidas)</small>	PLAN DE MEJORA <small>(De acuerdo a lo identificado, proponer un plan de mejoramiento)</small>	RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>(Señalar el nombre y apellido completo del funcionario o servidor público)</small>	
	SI	NO	NO APLICA				
La etiqueta de los recipientes o envases se encuentra en buen estado	X						
En la etiqueta se encuentra información relacionada con precauciones y peligros de las sustancias químicas	X						
La información de la etiqueta corresponde al contenido real del recipiente o envase	X						
Se dispone de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que se utilizan	X						
Las fichas de datos de seguridad corresponden a los productos químicos que se encuentran almacenados	X						

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

FT 837-140

Versión 001

Proceso Técnico Humano

INSPECCIÓN

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **ESRAN**

FECHA DE INSPECCIÓN: **15-07-2026**

NOMBRE DEL ÁREA O SERVICIO A INSPECCIONAR: **Casino de Peten (Leyva)**

NOMBRE DEL COORDINADOR O RESPONSABLE DEL ÁREA: **Raiza Contrilla**


NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: **Andrés Hoyos Navero**

ASPECTO A EVALUAR <small>(Las observaciones deben ser de los requisitos a evaluar en la inspección)</small>	CUMPLE <small>(Marque con una X, si se cumple; si no, marque con una O)</small>		OBSERVACIONES <small>(Si evidencia alguna condición de riesgo, indique por favor, el tipo de riesgo)</small>	PLAN DE MEJORA <small>(De acuerdo a lo identificado, indique el plan de mejoramiento)</small>	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA <small>(Indique el nombre y apellido completo del funcionario o personal público)</small>
	SI	NO			
Las fichas de datos de seguridad de los productos químicos están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando	X				
Se cumplen con las indicaciones de almacenamiento del producto químico expuestas en la ficha de datos de seguridad que entregan los proveedores	X				
Se agrupan los productos químicos por clase de peligro (peligros físico, para la salud, peligros y para el medio ambiente)	X				
Se ubican a una distancia prudente los productos químicos peligrosos de los productos que dentro de su misma clase de riesgo son incompatibles	X				
Se ordenan los recipientes de mayor capacidad de almacenamiento de líquidos y los productos más peligrosos en la parte inferior de la estantería o gabinete	X				
Se ordenan los recipientes con sustancia más inflamables en la parte superior del gabinete o estantería	X				
Se ordenan los contaminantes o recipientes altos en la parte posterior del gabinete o estantería y los pequeños acortados	X				
<div>Residente ambiental</div> <div>Andrés Hoyos Navero</div>			<div>Argueta</div> <div>Raiza Gonzalez C</div>		

GRADO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

GRADO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO

Scanned with
CamScanner



FORMATO INSPECCIÓN PUNTOS ECOLOGICOS CONSORCIO ROTATORIO PONAL

CODIGO: FT-SST:129
VERSION: 001
FECHA :
Enero 2025

FECHA DE INSPECCION: 14-02-2026

LUGAR: CSEAN

Alcance: Puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal de los residuos generados por CONSORCIO ROTATORIO PONAL.
Instrucciones: Realice mínimo una (1) inspección mensual, al final de cada mes para verificar las siguientes condiciones:

1. Revise los puntos ecológicos, contenedor por contenedor verificando los siguientes criterios:

Separación: Que los residuos dispuestos en los contenedores concuerden con el código de colores establecido para las instalaciones de CONSORCIO ROTATORIO PONAL.

Ubicación: Que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pasillos y áreas de tránsito); al alcance del personal, clientes, proveedores y visitantes.

Señalización/rotulado: Que los contenedores contengan su respectiva rotulación con el tipo de residuos para disponer.

Estado: Que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no se encuentren averiados, incompletos, sin tapa, etc.

Tenga en cuenta la siguiente calificación: Bueno

✓

Malo

✗

2. Diligencia:

PUNTO ECOLOGICO

LOCALIZACION DEL PUNTO ECOLOGICO	SEPARACION	UBICACION	SEÑALIZACION/ROTULADO	ESTADO	OBSERVACIONES
✓	✓	✓	✓	✓	

ALMACENAMIENTO TEMPORAL/RECEPCION DE RESIDUOS

ASPECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Facil acceso para la disposición y recolección por parte de administrativos, operativos y carro recolector.	✓		
Su ubicación no genera molestias al personal que labora en las instalaciones, visitantes y comunidad cercana en general.	✓		
Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
Permite la protección de los residuos de condiciones climáticas (lluvia, sol y vientos)	✓		
Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El espacio permite su facil limpieza	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		
Los contenedores son de material plastico, con tapa y se encuentran en buen estado	✓		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables	✓		
Cuenta con punto de agua cercana	✓		
Cuenta con elementos contra incendio, emergencias y derrames.	✓		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		

Inspeccionado Por:

Nombre: Amig Hoyas Navano

Firma:

[Firma manuscrita]

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema.

CONSORCIO ROTATORIO PONAL			SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					COD: FT SST: 021						
			FORMATO LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS					FECHA: Dic-2025 VERSION: 001						
Area:														
NOMBRE DE LA SUSTANCIA	CANTIDAD	CARGO QUE LO USA	FABRICANTE	AREA DE USO	ZONA DE ALMACENAMIENTO	TIPO DE ENVASE	NFPA 704				FICHA TECNICA	HOJA DE SEGURIDAD	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	RIESGOS PARA TRANSPORTE
							SAFETY	INFLAMABILIDAD	REACTIVIDAD	RESPECIAL				
Cemento	100 bolsas	Oficial Obrero	Argos	Suelo	Almacén de obra	Bolsa	2	0	0		NTC 121 NTC 330B	UTCTD UTCTD	Gafas Papas Papelitos	Intoxicación en piel Intoxicación en ojos Problemas respiratorios
Regule cerámica	300 bolsas	Oficial Obrero	Alfa	Piso	Almacén de obra	Bolsa	1	2	0		NTC 1050 NTC 600B	UTCTD UTCTD	Buenos Papas Papelitos	Intoxicación en piel Intoxicación en ojos Problemas respiratorios
Estuco	50 cubetas	Oficial Obrero	Stucco	Pared	Almacén de obra	Cubeta	1	0	0	No	No	No	Tapas Buenos Papelitos	Intoxicación en piel Intoxicación en ojos Problemas respiratorios

ANEXO N°2.

CERTIFICADO MATERIAL ASBESTO.



No.MAN-0002082

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

819.003.805-7

CERTIFICA QUE:

Recibió de INTERASEO S.A.S. E.S.P. con NIT. 819000939-1 los residuos recolectados y transportados provenientes de la empresa **CONSORCIO ROTATORIO PONAL** con NIT **902002640-5**, de su sede ubicada en **Escuela de policía Rafael Nuñez**, para su respectiva disposición final en la celda de seguridad de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Número de Recibo	MAN-0002082		
Fecha del Servicio	17-07-2026		
Corriente	Y36		
SUB-Corriente			
Nombre Operativo	TEJAS DE ASBESTO		
Cantidad	8988,10	Unidad	kg

Los residuos que se están certificando fueron ingresados a la celda 4 nivel 5 y sometidos a un proceso de estabilización, solidificación y/o encapsulamiento en la Celda de Seguridad del Relleno Sanitario La María de Ciénaga, con licencia ambiental aprobada mediante resolución No 4395 del 03 de octubre del año 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para la consulta que requieran en las instalaciones de INTERASEO S.A.S. E.S.P.

La presente certificación se expide como copia a los 18 días del mes de AGOSTO del año 2026

Carolina Pardo Pardo

REPRESENTANTE LEGAL

Escanee el código QR para verificar la
autenticidad del certificado



OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA





No.MAN-0002089

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

819.003.805-7

CERTIFICA QUE:

Recibió de INTERASEO S.A.S. E.S.P. con NIT. 819000939-1 los residuos recolectados y transportados provenientes de la empresa **CONSORCIO ROTATORIO PONAL** con NIT **902002640-5**, de su sede ubicada en **Escuela de policía Rafael Nuñez**, para su respectiva disposición final en la celda de seguridad de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Número de Recibo	MAN-0002089		
Fecha del Servicio	25-07-2026		
Corriente	Y36		
SUB-Corriente			
Nombre Operativo	TEJAS DE ASBESTO		
Cantidad	6816,30	Unidad	kg

Los residuos que se están certificando fueron ingresados a la celda 4 nivel 5 y sometidos a un proceso de estabilización, solidificación y/o encapsulamiento en la Celda de Seguridad del Relleno Sanitario La María de Ciénaga, con licencia ambiental aprobada mediante resolución No 4395 del 03 de octubre del año 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para la consulta que requieran en las instalaciones de INTERASEO S.A.S. E.S.P.

La presente certificación se expide como copia a los 18 días del mes de AGOSTO del año 2026

Carolina Pardo Pardo

REPRESENTANTE LEGAL

Escanee el código QR para verificar la
autenticidad del certificado



OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA





FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Grupo Infraestructura

			
Fecha:	Bogotá D.C., 10 de julio de 2026		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	15:32 horas
Lugar:	Virtual		
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes:

- Arq. Liliana Alarcon Torres – Supervisora de contrato No. 116-3-2025
- Ing. Anthony Pino Arias - Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025
- Ing. Miguel José Peralta - Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025
- Arq. Liliana Patricia Gutierrez – Profesional grupo de Infraestructura
- Arq. Sandra Martínez Arias – Profesional con funciones de interventoría ESRAN
- Ing. Francisco Javier Villanueva – Representante legal Consorcio Rotatorio Ponal
- Ing. Rodrigo Rojas Cortez – Coordinador de Proyectos Consorcio Rotatorio Ponal
- Arq. Raiza Canchila – Residente de Obra Consorcio Rotatorio Ponal

2. Lectura del acta anterior:

No aplica

3. Verificación de los compromisos:

No aplica

4. Temas por tratar

Al iniciar la sesión, la supervisión —representada por la arquitecta Liliana Yanet Alarcón Torres— y el Consorcio Rotatorio Ponal —representado por el ingeniero Francisco Javier Villanueva Tovar— acordaron cuatro temas para el desarrollo del comité. En primer lugar, la revisión del estado del Contrato de Obra No. 116-3-25 conforme al informe de supervisión del mes de junio de 2026. En segundo lugar, la preocupación manifestada por el Consorcio ante la ausencia de una fecha definida para la visita de la supervisión y de la supervisión de apoyo al proyecto ubicado en el municipio de Corozal (Sucre). En tercer lugar, el trámite del Acta Parcial de Obra No. 1, cuya preacta fue devuelta con observaciones y cuya radicación definitiva se encuentra condicionada a la verificación y medición en sitio. Por último, la definición de los acabados necesarios para la continuación del objeto contractual.

DESARROLLO

Arq. Liliana Alarcón Torres:

Buenos días a todos. Iniciamos con la revisión del estado del contrato, tomando como base el informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026. Ingeniero Anthony, por favor proyecte el corte y nos indica el avance físico y presupuestal.

Ing. Anthony Pino Arias:

Con gusto, arquitecta. Al corte del 30 de junio de 2026 el Contrato de Obra No. 116-3-25 registra una ejecución física del 20,45 % y una ejecución presupuestal del 0,00 %, esta última en razón a que el primer pago se encuentra supeditado a la aprobación del Acta Parcial de Obra No. 1, actualmente en trámite de ajuste por parte del contratista. El plazo vigente, con la Prórroga No. 2 suscrita el 31 de mayo de 2026, vence el 30 de septiembre de 2026, de manera que restan poco menos de tres meses de ejecución para el 79,55 % faltante.

Concepto	Estado al corte del 30 de junio de 2026
Valor total del contrato	\$2.020.455.757,17
Ejecución física	20,45 %
Ejecución presupuestal	0,00 %
Actas parciales tramitadas	Ninguna. Acta Parcial de Obra No. 1 en ajuste por el contratista
Modificaciones suscritas	Prórroga No. 1, Prórroga No. 2 y Modificadorio No. 1 (28/05/2026)
Tiempo transcurrido del plazo	Siete (7) meses y dieciséis (16) días de un plazo total de diez (10) meses y seis (6) días

Las actividades que jalonaron el avance del mes son las siguientes: desmontes y demoliciones menores en el Frente 4 — Casino de Patrulleros, incluido el desmonte de pañete deteriorado (ítem A3-1.36); impermeabilización de muros exteriores del casino (ítem A3-NP 27); ejecución de acometida y tubería conduit hacia las habitaciones, bajo los parámetros del RETIE; vaciado de las losas de contrapiso de las habitaciones 1 a 11 y de las franjas de circulación (ítems A3-12.04, concreto de 3.000 psi, y A3-12.36, malla electrosoldada); desmonte controlado de la cubierta del casino, iniciado el 24 de junio; y ejecución de las instalaciones hidráulicas de los baños de los alojamientos 2 y 3.

Arq. Raiza Canchila

informo que actualmente tenemos activos los siguientes frentes: culminación del desmonte de cubierta del Frente 4; alistamiento y retiro de material de la zona de cocina del casino; instalación de tubería conduit; y las instalaciones hidráulicas de los baños de los alojamientos 2 y 3.

Arq. Sandra Martínez Arias

Confirmando lo manifestado por la residente. En las visitas técnicas realizadas verifiqué la ejecución de las pruebas de presión hidráulica de 24 horas sobre los puntos hidráulicos del Frente 4, sin evidencia de fugas, conforme a las prácticas de la Resolución 330 de 2017; la toma de muestras de concreto para los ensayos de resistencia a compresión exigidos en el numeral C.5.6 de la NSR-10 en cada fundida de contrapiso; y el retiro permanente del material producto de demolición al punto de acopio de RCD.

Ing. Francisco Javier Villanueva:

Arquitecta Liliana, quiero dejar constancia de que las medidas correctivas requeridas en el comité del 05 de junio fueron adoptadas: incrementamos el personal, abrimos frentes simultáneos y sostuvimos la ejecución de contrapisos, instalaciones y desmonte de cubierta de manera continua durante todo el mes. Lo que hoy limita el avance no es el ritmo de obra, sino dos definiciones que dependen de la Entidad: la aprobación de las fichas técnicas de acabados y la visita de la supervisión para la medición del acta parcial.

Además, manifiesto formalmente su preocupación por este punto. Desde el inicio de la ejecución contractual la supervisión únicamente ha realizado una (1) visita presencial al proyecto, efectuada entre los días 10 y 12 de febrero de 2026 mediante vuelo de apoyo suministrado por la Policía Nacional haciendo que el seguimiento se haga por videoconferencia y mediante las verificaciones en sitio de la arquitecta Sandra Martínez,

funcionaria de la ESRAN, apoyo que agradecemos, pero que no reemplaza la verificación directa de la supervisión.

Ing. Rodrigo Rojas Cortez:

El efecto práctico, arquitecta, es que hoy no tenemos fecha cierta para la medición conjunta de las cantidades ejecutadas. Sin esa medición no es posible surtir el trámite del Acta Parcial de Obra No. 1, y el resultado es el que aparece en el propio informe: siete meses de ejecución con una ejecución presupuestal del 0,00 %. El Consorcio ha financiado la totalidad de la obra ejecutada hasta la fecha. Solicito que la fecha de la comisión quede definida en la presente acta.

Adicionalmente, hay actividades que no puedo dejar avanzar sin la definición de los acabados. Las losas de contrapiso del Casino de Patrulleros están vaciadas y curadas, y el personal de revestimientos cerámicos ya se encuentra autorizado para el ingreso; sin la aprobación de la ficha técnica de la cerámica ese frente queda detenido. Lo mismo ocurre con los baños de los alojamientos, que hoy están en obra gris a la espera del enchape.

Arq. Liliana Alarcón Torres:

La preocupación es válida y la comparto; de hecho, señalo que la visita técnica resulta indispensable para verificar directamente las cantidades de obra ejecutadas, el balance contractual, el estado real del avance físico y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad. Informo que la Entidad ya cuenta con contrato para el suministro de tiquetes aéreos, de manera que la limitación que se presentaba en los meses anteriores se encuentra superada. Proyecto en pantalla las alternativas de itinerario previstas, con el fin de definir la programación que mejor se ajuste a las necesidades de ejecución y a la disponibilidad del Consorcio:

H8				
	A	B	C	D
1				
2	ITINERARIO 1			
3	FECHA	SALIDA	DESTINO	HRAS
4	17 DE JULIO	BOGOTA	MONTERIA	mañana
5	18 DE JULIO	MONTERIA	BARRANQUILLA	mañana
6	25 DE JULIO	COROZAL	BOGOTA	tarde -noche
7				
8	ITINERARIO 2			
9	FECHA	SALIDA	DESTINO	HRAS
10	17 DE JULIO	BOGOTA	BARRANQUILLA	mañana
11	19 DE JULIO	BARRANQUILLA	MONTERIA	tarde
12	25 DE JULIO	COROZAL	BOGOTA	tarde -noche
13				
14	ITINERARIO 3			
15	FECHA	SALIDA	DESTINO	HRAS
16	17 DE JULIO	BOGOTA	COROZAL	mañana
17	22 DE JULIO	MONTERIA	BARRANQUILLA	mañana
18	25 DE JULIO	BARRANQUILLA	BOGOTA	tarde -noche
19				

Ing. Francisco Javier Villanueva:

considero que la alternativa que mejor se ajusta a las necesidades del consorcio corresponde al Itinerario No. 2, ya que permite gestionar con la debida anticipación la logística requerida para la visita técnica, incluyendo la adquisición de los tiquetes aéreos como usted sabe arquitecta nosotros viajamos desde la ciudad de Neiva y no es fácil coordinar escalas entre Neiva-Bogotá-corozal, la reserva de hospedaje y la coordinación de los demás aspectos operativos, de manera que todo se encuentre dispuesto para la fecha de su llegada. Adicionalmente, esta opción contempla tres (3) días efectivos de permanencia en sitio, tiempo estimado como necesario para desarrollar de manera conjunta las actividades de medición, así como la revisión, verificación y aprobación de los acabados objeto de evaluación.

Arq. Liliana Alarcón Torres:

Entonces ingeniero queda seleccionado el Itinerario No. 2. Una vez definido, será remitido para el trámite de aprobación correspondiente, con el fin de gestionar la expedición de los tiquetes aéreos y materializar la comisión programada. Me comprometo a remitir la solicitud a más tardar el 14 de julio de 2026 y a reiterar la gestión ante el Grupo TAHUM, así como a comunicar por escrito al Consorcio la fecha definitiva a más tardar el 16 de julio de 2026.

Arq. Raiza Canchila:

Relaciono los acabados cuya definición se requiere para la continuación de los frentes, indicando el estado del trámite de cada uno:

No.	Acabado	Aspecto pendiente de definición	Estado del trámite
1	Revestimiento cerámico de pisos — Frente 4, Casino de Patrulleros	Formato, referencia, color y despiece sobre las losas de contrapiso ya fundidas.	Ficha técnica radicada; observada mediante Oficio CTO-116-3-25 del 12/06/2026. Pendiente subsanar requerimientos.
2	Enchape de pisos y muros — baños alojamientos 1, 2 y 3	Referencia definitiva, despiece y remates.	Ficha técnica radicada; pendiente aprobación y muestra física en sitio.
3	Aparatos sanitarios y grifería	Marca, línea, consumo por descarga y garantía.	Ficha técnica radicada y observada. Pendiente aprobación.
4	Divisiones de baño y vestier	Material, altura, herrajes y anclajes.	Sin radicar. Pendiente presentación de ficha técnica.
5	Mesones de lavamanos y vestier	Material, espesor, borde y soporte.	Sin radicar. Pendiente presentación de ficha técnica.
6	Pintura de muros y cielorrasos	Tipo, acabado y carta de color institucional.	Sin radicar. Requiere concepto de la ESRAN.
7	Cubierta del Frente 4 — Casino de Patrulleros	Referencia de teja, traslapos, caballetes y detalle de remates, una vez culminado el desmonte controlado.	Sin radicar. Prioritaria por encontrarse la cubierta en desmonte desde el 24/06/2026.
8	Aparatos de iluminación y salidas eléctricas	Referencia, temperatura de color y ubicación definitiva sobre la tubería conduit instalada.	Sin radicar. Debe atender lo exigido en el RETIE.

Arq. Liliana Alarcón Torres:

Sobre este punto aclaro que mediante el Oficio No. CTO-116-3-25 del 12 de junio de 2026 esta supervisión evaluó la documentación técnica presentada por el contratista para los materiales propuestos, incluidos los acabados de pisos y los aparatos sanitarios, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la conformidad con las condiciones contractuales, y emitiendo las observaciones y requerimientos correspondientes para continuar con el proceso de aprobación. Solicito al Consorcio subsanar esos requerimientos y radicar las fichas técnicas faltantes antes del 17 de julio de 2026, junto con las muestras físicas en sitio, de modo que durante la comisión únicamente se surta la aprobación con la participación de la ESRAN.

Ing. Francisco Javier Villanueva:

Estamos de acuerdo. El Consorcio no ejecutará ningún acabado que no cuente con aprobación previa y escrita de la supervisión, para evitar reprocesos y eventuales reclamaciones de posventa.


COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes, se establece:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	Comunicar por escrito al Consorcio la fecha definitiva de la comisión, una vez aprobada la solicitud de tiquetes.	Arq. Liliana Yanet Alarcón Torres — Supervisión	16/07/2026
2	Subsanar los requerimientos del Oficio CTO-116-3-25 del 12/06/2026 y radicar las fichas técnicas y muestras físicas de los acabados relacionados en la tabla del numeral 4.4.	Ing. Rodrigo Rojas Cortez — Consorcio	17/07/2026
3	Adelantar la medición conjunta en sitio de las cantidades ejecutadas objeto del Acta Parcial de Obra No. 1.	Supervisión, supervisión de apoyo, ESRAN y residencia de obra	23/07/2026
4	Emitir concepto de aprobación de los acabados definidos durante la visita a obra.	Arq. Liliana Yanet Alarcón Torres / Arq. Sandra Martínez Arias	24/07/2026

Para los que en ella intervinieron: (Ver Formato registro de asistencia)

viernes, 5 junio 2026 3:38 p.m. - 5:24 p.m.

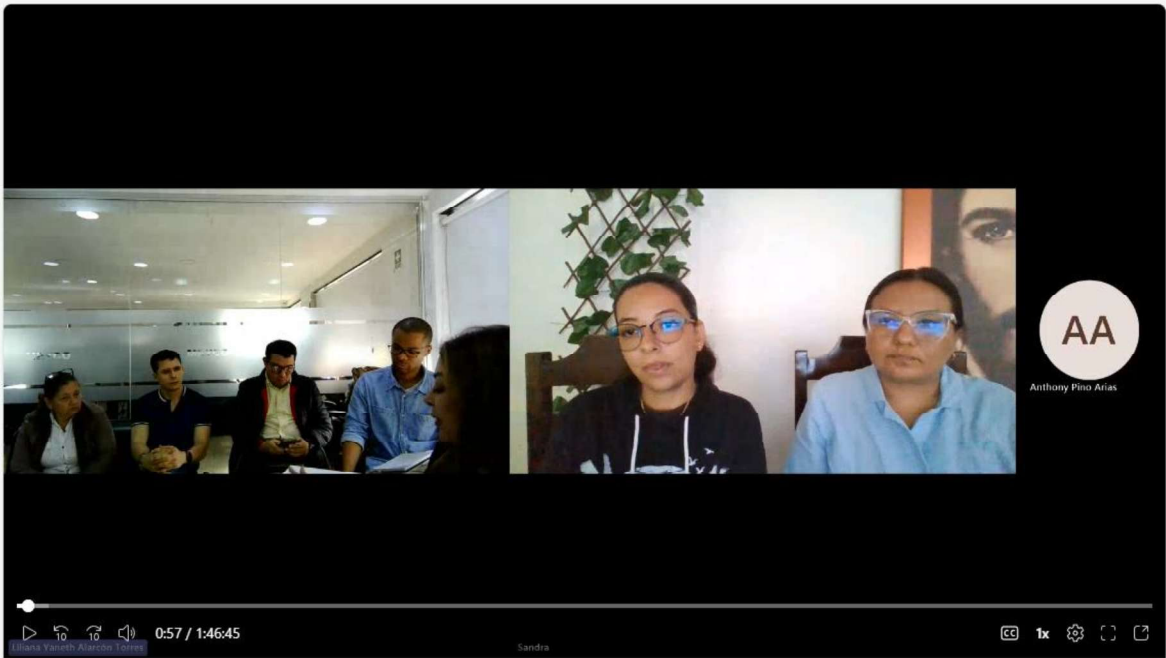



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Grupo Infraestructura

Fecha:	Bogotá, 24 de julio de 2026		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	11:00 horas
Lugar:	De manera virtual mediante la aplicación Teams		
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA No. 115-3-25 Y No. 116-3-25			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes:

- Arq. LILIANA YANETH ALARCÓN TORRES – Supervisora de los Contratos No. 115-3-2025 y No. 116-3-2025.
- Ing. MIGUEL JOSE PERALTA SILVA – Apoyo a la supervisión del contrato No. 115-3-2025.
- Ing. ANTHONY PINO ARIAS – Apoyo a la supervisión del contrato No. 116-3-2025.
- Arq. JOSÉ CARLOS PARDO GENÍS – Profesional con funciones de interventoría, Escuela ESANA (Contrato No. 115-3-25).
- Arq. SANDRA MARTÍNEZ A. – Profesional con funciones de interventoría, Escuela ESRAN (Contrato No. 116-3-25).

2. Lectura del acta anterior:

-

3. Verificación de los compromisos:

-

4. Temas por tratar

- 4.1. Seguimiento al atraso físico de la obra y reporte de presunto incumplimiento ante la aseguradora.
- 4.2. Verificación de cantidades y registro fotográfico del Acta Parcial de Obra No. 01.
- 4.3. Manejo y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en obra.
- 4.4. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los frentes de obra.
- 4.5. Disponibilidad de materiales en el frente de la Escuela ESRAN.
- 4.6. Vigencia de los contratos de interventoría y plazo contractual de las obras.

DESARROLLO

La sesión fue convocada por la Arq. Liliana Yaneth Alarcón Torres, Supervisora de los Contratos N.º 115-3-2025 (Escuela ESANA) y N.º 116-3-2025 (Escuela ESRAN), con la participación de los profesionales con funciones de interventoría de ambos contratos y del profesional de apoyo a la interventoría, con el propósito de realizar seguimiento al estado de avance físico de las obras y reiterar los lineamientos de reporte y control documental aplicables a ambos frentes. La reunión se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams.

4.1. Seguimiento al atraso físico de la obra y reporte de presunto incumplimiento ante la aseguradora.

La Supervisión manifestó su preocupación por el nivel de atraso físico evidenciado en los contratos de obra a cargo, señalando que el porcentaje de atraso reportado en el Contrato N.º 115-3-25 (ESANA) resulta significativamente elevado frente a la programación vigente, mientras que en el Contrato N.º 116-3-25 (ESRAN) se registra igualmente un atraso relevante, aunque en menor proporción.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la póliza correspondiente, la Supervisión informó la necesidad de remitir a la aseguradora un informe de presunto incumplimiento, para lo cual se requiere a los profesionales de interventoría de ambos contratos remitir, de manera inmediata, la siguiente información: horario de ingreso y salida del personal en obra, número de personal vinculado por frente, rendimiento diario de las actividades ejecutadas, porcentaje de avance físico a la fecha, y las causas técnicas que explican el atraso identificado.

Se reiteró la obligación de los profesionales de interventoría de efectuar recorridos periódicos en cada frente de obra, con una frecuencia mínima de dos (2) horas, remitiendo el respectivo registro fotográfico como soporte del seguimiento realizado, con el fin de contar con evidencia suficiente y actualizada del estado real de ejecución de las obras.

4.2. Verificación de cantidades y registro fotográfico del Acta Parcial de Obra No. 01.

El Arquitecto José Pardo continúa con el proceso de revisión y verificación de las cantidades reportadas en las memorias de cálculo correspondientes al Acta Parcial de Obra No. 01 del Contrato N.º 115-3-25, frente a lo efectivamente ejecutado en obra.

Al respecto, la Supervisión observó que algunas de las cantidades incluidas en el borrador del acta parcial no se encuentran claramente evidenciadas en el registro fotográfico aportado, por lo cual se requiere complementar dicho registro antes de la radicación definitiva del documento.

Se acordó que el borrador del Acta Parcial de Obra No. 01 sea remitido en formato editable a la Supervisión, para su revisión conjunta y ajuste previo a su radicación ante la entidad.

4.3. Manejo y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en obra.

El Arquitecto José Pardo informó que la Escuela ESANA ha solicitado destinar parte del material de escombros generado por la obra para la conformación de un relleno en un área ubicada detrás de la cafetería, en el marco de una ampliación de dicho espacio.

La Supervisión precisó que, en este escenario, la disposición del material por parte de la Escuela debe tratarse como un aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), para lo cual resulta necesario efectuar la cubicación correspondiente del material y que la Escuela expida el certificado de recibido, indicando la cantidad efectivamente aprovechada. Lo anterior, con el fin de soportar el reconocimiento del ítem correspondiente sin que ello implique un pago adicional por concepto de retiro y transporte de escombros.

4.4. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los frentes de obra.

Se identificaron observaciones relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el frente de Campo de Paradas, particularmente en cuanto a posturas inadecuadas del personal durante la ejecución de actividades de excavación manual.

Así mismo, se evidenció la falta de disposición adecuada de puntos de hidratación para el personal operativo en obra, por lo cual se instruyó al profesional SST del contratista adoptar las medidas correctivas correspondientes, garantizando condiciones seguras de trabajo y el suministro oportuno de agua para los trabajadores.

4.5. Disponibilidad de materiales en el frente de la Escuela ESRAN.

La Arquitecta Sandra Martínez informó que, a la fecha, se presenta desabastecimiento de materiales críticos en el frente de obra de la Escuela ESRAN, entre ellos piso, cemento, gravilla, arena y bloques de mampostería, situación que incide directamente en el ritmo de ejecución de las actividades programadas.

De igual manera, se reportó que, si bien la totalidad de la tubería y puntos eléctricos se encuentra instalada, aún se encuentra pendiente el suministro e instalación del cableado eléctrico correspondiente, lo cual representa un riesgo adicional para el cumplimiento del cronograma vigente.

4.6. Vigencia de los contratos de interventoría y plazo contractual de las obras.

Se informó que el contrato de interventoría del Arquitecto José Pardo (Escuela ESANA) tiene vigencia hasta el 5 de agosto de 2026, por lo cual la Supervisión adelantará las gestiones correspondientes ante la Escuela para su prórroga. De igual manera, se informó que el contrato de interventoría de la Escuela ESRAN se encuentra igualmente en proceso de prórroga.


La Supervisión reiteró que el plazo contractual máximo para la ejecución de ambas obras es el 30 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual no se aprobarán prórrogas adicionales, por lo que se insta a los contratistas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del cronograma vigente dentro de dicho plazo.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes, se establece:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1	Remitir a la Supervisión el informe de horarios de ingreso y salida de personal, rendimiento diario y porcentaje de avance físico, para soportar el reporte de presunto incumplimiento ante la aseguradora.	Arq. José Carlos Pardo Genís — Interventoría ESANA	24 de julio de 2026
2	Remitir en formato editable el borrador del Acta Parcial de Obra No. 01, complementando el registro fotográfico de las cantidades reportadas.	Arq. José Carlos Pardo Genís — Interventoría ESANA	24 de julio de 2026
3	Efectuar la cubicación del material de escombros a aprovechar por la Escuela y gestionar la expedición del certificado de recibido correspondiente.	Arq. José Carlos Pardo Genís — Interventoría ESANA / Escuela ESANA	A la mayor brevedad posible
4	Adoptar las medidas correctivas de SST identificadas en el frente Campo de Paradas (posturas de trabajo y suministro de hidratación al personal).	Contratista — Profesional SST ESANA	Inmediato
5	Remitir reporte de disponibilidad de materiales y plan de suministro para el frente de la Escuela ESRAN.	Arq. Sandra Martínez A. — Interventoría ESRAN	A la mayor brevedad posible
6	Adelantar las gestiones para la prórroga de los contratos de interventoría de las Escuelas ESANA y ESRAN.	Directivos escuelas ESANA y ESRAN	

Se suscribe el 24 de julio de 2026, para los que en ella intervinieron.

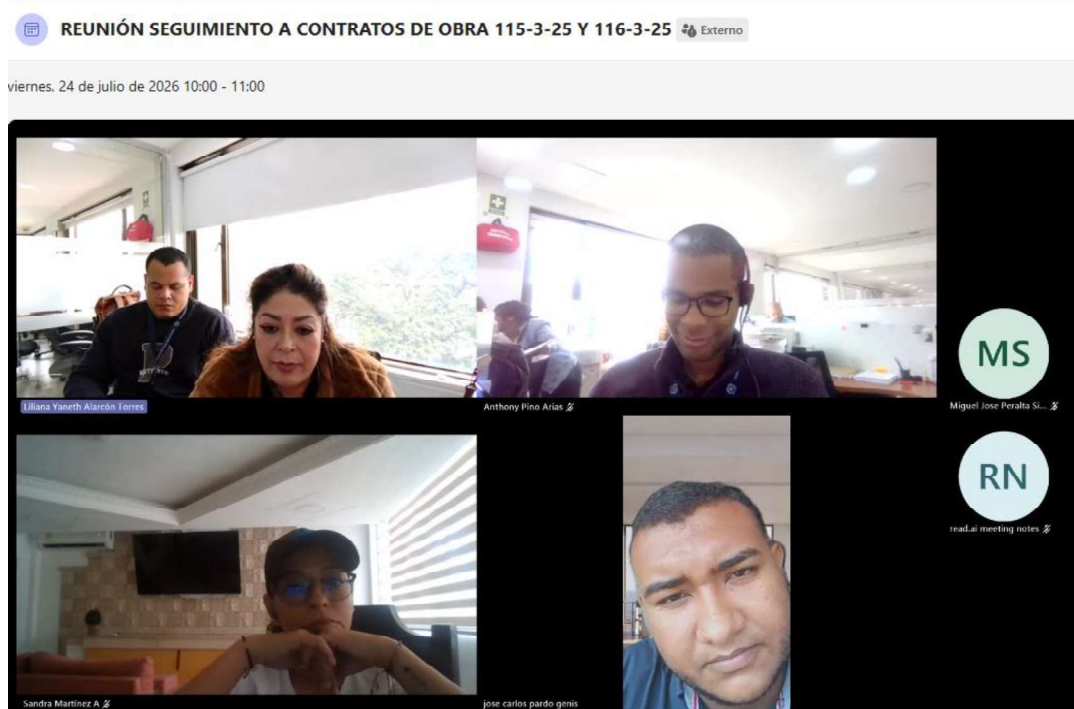

Miércoles 1 de Julio
 Personal en Obra
 Arg. Residente
 Profesional SST
 Ingeniero Ambiental
 Maestro de Obra

3 Oficiales
 8 Ayudantes + 1 plomero
 1 ayudante eléctrico

Estudio del tiempo: Sdeado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en diferencia entre el peligro y el riesgo.

Se realiza alistamiento para losa de contrapiso en casino, incluye instalación de malla y plástico.

Se continúa realizando regates para tubería conduit de pncamientos en casino.

Se continúan desmonte de muros en baño 1 frente 4.

Se continúan instalaciones sanitarias en baño de alojamiento 2.

Se realiza relleno con material seleccionado en baño de alojamiento 3.

Raquel
 Arg. Residente

Candra Martinez A.
 Profesional con funciones
 de interventora.

Jueves 2 de Julio

Personal en Obra:

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obra

3 Oficiales + 8 ayudantes

1 plomero + 1 auxiliar electrica

Estado del tiempo: Soleado en mañana

Tarde: llovias

Actividades a realizar:

Se realiza charla ambiental enfocada en

Cuidados del agua.

Se realiza fundición de concreto de losa de contapiso en área del comedor

en Casino

Se realiza alistamiento de losa en área

de cocina del casino. Se realizan

Cilindros.

Se alistan cajas de inspección del

baño de algamiente 2 y 3.

Se realiza fase 1 de prueba hidros-
tática en baño de algamiente 2 y 3,

Se instalan los manómetros para verificar
la presión y carencia de fugas.

Se continúa desmonte de cubierta en

Casino, frente 4.

El día de hoy se recibe material granbr
para casino

Ricard

Arg Residente.

Sandra Martinez A
Prof. en Función de
Intervención

Viernes 3 de Julio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro obra

3 Oficiales + 8 aprendices

1 plomero + 1 auxiliar electrico

Estado del tiempo:

Se realiza charla SST enfocada en uso adecuado epp.

Se continúa con concreto de base de contrapiso en casino.

Se continúa realizando el desmonte de cubierta en casino.

Se recibe acero de refuerzo para casino.

Se continúa realizando alistamiento para fundación de gas de inspección del bazo de alojamiento del 2 y 3

Realiza
Arg Residente

Santha M. A.
Profesional de Intervención

Sábado 4 de julio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro de obra

3 Oficiales + Apoyantes.

1 plomero

Estado del tiempo: Lluvias durante la mañana

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en prevención de riesgos en el trabajo en alturas.

Se continúa con desmonte de cubierta en casino.

Se continúa con concreto de losa de contrapiso en casino.

Se finden cajas de inspección de baño de alojamiento 2 y 3.

Se realiza fase 2 de prueba hidrostática en donde se evidencia ausencias de fugas y buen estado de instalaciones en baño de alojamiento 2 y 3.

Ricardo
Arg Residente

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones de
interventora.

Lunes 6 de Julio de 2020

Personal en obra:

Arg Residente

Profesional SST

Ingeniero Ambiental

Maestro obra:

2 oficiales + 6 aprendices

1 plomero

Actividades a realizar:

Estado del tiempo: Soleado

Se realiza charla SST enfocada en prevención de consumo de alcohol y drogas.

Se continúa con desmonte de cubierta en casino, cumpliendo con el manual del procedimiento.

Se realiza alistamiento de losa en casino: que incluye verificación de niveles, instalación de plástico y malla.

Se realizan topas de carpas de inspección de los baños internos del 2 y 3.

Se recibió agregados finos y grueso en casino.

Financ
Arg Residente

Diana Madue A
Prof. con Fincem de
Interventora

Martes 7 de Julio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

3 oficiales + 7 ayudantes

Maestro Obra

1 plomero

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla ambiental enfocada en impacto ambiental de la moda rápida.

Se continúa realizando concreto para base de contrapeso para casino.

Se realizan cilindros para muestras.

Se continúa realizando desmonte de cubierta en casino.

Se realizan limpiezas y retiro de rd en punto de acopio en casino.

Rojas
Arg Residente

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones
de interventora.

Miércoles 18 de Julio F 2018

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

3 Oficiales + 9 ayudantes

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realiza charla SST enfocada en seguridad basada en buen uso de epp.

Se continúa con el desmonte de cubierta en asbesto siguiendo con todo el protocolo de Seguridad, Se acopia en punto cercano para su posterior disposición.

Se continúa con concreto de losa de contrapiso en casino.

Se realiza en baño de alojamiento 1, excavación de viga de cimentación

En baño de alojamiento 3 Se realiza alistamiento de losa de contrapiso, Se realiza relleno y nivelación de terreno.

Rico
Arg Residente

Sandra Martinez A.
Profesional con funciones
de Interventora.

Jueves 9 de julio
 Personal en obra
 Arq Residente
 Profesional Sst
 Ing Ambiental
 Maestro obra
 3 Oficiales + 9 Ayudantes

Estado del tiempo: lluvias durante todo el día
 Actividades a realizar

Se realiza charla ambiental enfocada en contaminación lumínica.

El día de hoy se continúa el desmonte de cubierta, al finalizar la tarde se da por culminada en 100% el desmonte de toda la cubierta del casino, se dispone en punto de acopio. Se inicia desmonte de redablon en casino.

Se continúa con excavación de viga cimienta en baño de alojamiento 1.

Se realiza concreto en losa de baño de alojamiento 3.

Rosal
 Arq Residente

Sandra Martínez A.
 Prof. con funciones
 de intervención

Viernes 10 de julio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional Sst

Ing Ambiental

Maestro de obra

30 Oficial + 9 Ayudantes

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades a realizar

Se realiza charla SST enfocada en comité de convivencia laboral.

Se realiza alistamiento de viga Cimiento en baño de alojamiento.

Se realiza alistamiento de losa de contrapiso de baño 2, que consiste en nivelación, colocación de plástico y malla.

Se realiza concreto de losa de contrapiso de baño 3.

Se continúa desmontando redablon en casino, frente 4.

Se recibe cemento en casino.

Ricardo
Arg Residente

Jandra Martínez A.
Profesional Cee funciones
de interventora

Sábado 11 de julio
 Personal en obra
 Arq Residente
 Profesional SST
 Ing Ambiental
 Maestro de obra
 Oficial de Ayudantes

Estado del tiempo: Soleado
 Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en orden y aseo.

Se finaliza el día de hoy concreto para viga cimentación y concreto ciclopeo para baño de almacenamiento 1.

Se realiza concreto para losa de contrapiso en baño de almacenamiento 2.

Arq Residente

Sandra Martner A.
 Profesional con licencia
 de interventora

Lunes 13 de Julio de 2026

Personal en Obras

Arg Residente

Profesional Bst:

Ingeniero Ambiental

Maestro de Obras

Oficiales y Aprendices

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realiza charla enfocada en políticas SGSST.

Se realiza desmonte de muros de fachada del Casino frente 4. Se

Realiza porque estos contaban con grietas que amenazaban la estabilidad de la infraestructura, frente 4.

Se continúa realizando aislamiento para losa de contrapiso del baño de alojamiento 2.

Se inicia levante en bloque para sellar ventanas de cocina, se incorpora en mampostería grafites en acero de $\frac{1}{4}$.

Ricardo
Arg Residente.

Sandra Marthe A.
P. con funciones de Interent

Martes 14 de julio
 Personal en obra
 Arg Residente
 Profesional Sst
 Ingeniero Ambiental
 Maestro de obra
 Oficial + Ayudantes

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realiza charla ambiental enfocada
 contaminación acústica.

Se continúa desmontando muros
 fuchadas del casino, frente 4; Se
 continúa desmontando andenes
 perimetrales del casino.

Se realiza finalización de losa de
 contrapiso en baño de alojamiento 2
 Se continúa realizando demonte
 de panela en baño de alojamiento 3.

Rp
 Ay Residente.

Sandra Hinkes Arce
 Profesional en Rincón
 de Internet

Miércoles 15 de julio

Personal en obra:

Arg Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

3 Oficiales + 9 ayudantes

2 Instaladores de cubierta

Estado del tiempo Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en Señalización y demarcación del área.

Se continúa realizando desmonte de muros fachada en casino, frente 4.

Se continúa desmontando andenes en casino y se realiza retiro de escombros hasta punto de acopio.

Se continúa realizando levante de muros para sellar Ventanas con refuerzo con grafites, en casino.

Se continúa desmontando peniche en baño de alojamiento 3.

Se inicia pintura e instalación de platinas para el anclaje de tornillería de cubierta de casino.

El día de hoy se recibió pegante Cerámica, combos Sanitarios.

Primer
Arg Residente

Sandra Yañez A
Profesional en función
de interventora.

Jueves 16 de Julio
 Personal en obra
 Profesional sst
 Ing Ambiental
 Maestro de obra

3 Oficiales t. Tapantes

2 plomeros

4 instaladores de cubierta.

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se continúa realizando desmonte de
 andamios en casino y retiro de rcd hasta
 punto de acopio, frente 4

Se continúa realizando frente de muros
 para sellar ventanas de cocina en casino.

Se realiza pañete de mampostería
 nueva en cocina de frente 4.

Se hace aislamiento para concreto de
 bpsa en baños de habitaciones del
 casino.

Se inician instalaciones sanitarias en
 baño de alojamiento 1, se hacen
 excavaciones para tubería sanitaria.

Se continúa desmontando pañete
 de baño de alojamiento 3.

Se soldan planchas para cubierta,
 para fijar tornillos sobre estas.

Rafael
 Ing. Residual

Sandra Márquez A.
 Profesional con funciones de
 Intendente

Viernes 17 de julio

Personal en obra

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

3 Oficiales + ayudantes

2 plomeros

4 instaladores de Cobreita

Estado del tiempo

Actividades a realizar

Se realiza charla SST enfocada en manejo de extintores.

El día de hoy se realiza parte de la disposición final de las láminas de asbesto cemento, se envían 8988 kilos

Se inicia instalación de Cobreita en Casino.

Se continúa realizando desmonte de ordenes y retiro de rcd en casino.

Se realiza alistamiento para losa de contrapiso en baños de habitaciones en Casino, frente 4.

Se continúa realizando instalaciones sanitarias en baño de alojamiento 1.

Se continúa realizando desmonte de pared en baño de alojamiento 3.

Rajad
At Residue.

Sandra Martinez A
Prof. con funciones de interu.

Sábado 18 de julio

Personal en obra

Arg Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro obra

3 Oficiales + 9 ayudantes + 2 plomeros

4 instaladores de cubierta

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en prevención de enfermedades respiratorias.

Se continúa realizando instalación de cubierta en casino, frente 4, Se continúa levante en bloque 09 y 015 para sellar Ventanas de cocina, reforzada con grafites.

Se realiza levante con bloque 09 en fachada de casino.

Se continúa desmontando andenes en casino.

En baño de alojamiento 1 Se continúa realizando instalación Sanitaria

En baño de alojamiento 3 Se continúa desmontando pañete.

En casino se funden redoblon en colatas de habitaciones.

Piso
Arg Residente.

Sandra Martínez A
Prof. Con Funciones de Interventora

Lunes 20 de julio (festivo)

Personal en obra

Arg Residente

4 Instaladores de Obata.

Estado del tiempo: lluvias durante la mañana, tarde soleada.

Actividades a realizar:

Se continúa realizando instalación de cubierta en casino, en el día de hoy se logran cubrir 2 habitaciones.

Bi 200
Roy Residue

Sandip Watarke
Professional Calligrapher, Designer

Martes 21 de julio

Personal en obra

Arg. Residente

Profesional SST

Ing. Ambiental

Maestro obra

1 Oficial + 6 ayudantes

2 plomeros

4 instaladores de cubierta

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en lesiones comunes en obras civiles.

Se continúa realizando instalación de cubierta en casino, se cubren habitaciones y se inicia con el área del comedor.

Se soldan en las cerchas platinas para sujetar la tornillería de la cubierta.

Se continúa realizando desmonte de andenes, se realiza retiro de material del desmonte hasta lugar de acopio temporal del material rod hasta que se realice posteriormente la disposición final.

Se continúa realizando los redobles en concreto en los muros de alata del casino, frente 4.

En baño de alojamiento 1 se continúa realizando instalaciones sanitarias.

Pazuelo
Al. Resbante

Sandra Márquez A.
Ingr. conf. de int.

Miércoles 22 de Julio 2026

Personal en obra

Arg. Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro obra

2 oficial de construcción + 6 Aprendices

4 Instaladores de cubierta

2 Plomeros

Estado del tiempo

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en

Riesgos químicos, pintas y solventes.

Se continúa realizando el desmonte

de andenes en casino, Se continúa instalando

las platinas sobre los cachos en

las habitaciones del casino.

Se continúa realizando la instalación

de cubierta en casino.

En el baño de alojamiento 1 se

continúa realizando las instalaciones

hidrosanitaria.

Arg. Residente

Daniel Martínez
Ref. Con. Funciones de
Interventor

Jueves 23 de Julio 2026

Pasajal en obra

Aq Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro obra

Oficiales + Ayudantes

4 instaladores de cubierta

2 plomeros

Estado del tiempo:

Actividades a realizar:

Se realizaron charlas ambiental en focas
en infraestructura Verde Urbana.

Se suspendieron las actividades en periodo

9am a 12:30pm por mal estado del tiempo a q e

son en cielo abierto.

Se continúo con el aumento de andenes

en Casino de petuleros.

Se continúa con instalación de platines

y cubierta en casino.

Se inicia figuración de acero para
columnetas en casino.

Se continúan con las instalaciones

hidrosanitarias en baño de alojamiento.

Rael
Ay Residente

Sandra Palmer A.
Prof. con funciones de
interventora

Viernes 24 de julio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Oficial + Ayudantes + 3 instaladores Piso

4 Instaladores de cubierta

Plomeros

Estado del tiempo:

Actividades a realizar:

Se realizan pausas activas guiadas por la profesional SST

Se suspenden unos minutos las actividades para participar en un simulacro de seguridad.

En Casino de patulleros se continúa con instalación de platina y cubierta.

Se continúa realizando concreto para poyos de closec en las habitaciones.

Se construyen los peldaños dentro de los pasillos de circulación.

Se realizan cajea para acometida eléctrica.

Se inicia el día de hoy Piso Cerámica en habitaciones de casino.

Se continúan en baño de alojamiento las instalaciones hidrosanitarias.

Se construye en baño los 2 registros de 60x60 de inspección.

Realizo
Arg Residente

Sandra Martínez A.
Profesional con funciones
de interventora

Sabado 25 de julio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Oficiales + Ayudantes + 3 instaladores Pso

4 Instaladores de cubierta

2 Plomeros

Estado del tiempo:

Actividades a realizar:

Se hacen charlas SST enfocada en

Prevención de enfermedades respiratorias.

El día de hoy se realiza la segunda

parte del envío hasta la autoridad ambiental

Certificada del material de asbesto cemento,

Se envían 6891,3 kilos para un total enviado

de 15.804 kilos.

Se recibe insumos para el piso, pintura

y estuco para casino.

Se continúa realizando instalación de

platinas y cubierta para casino.

Se continúan construyendo los peldaños

para los pasillos de circulación de las

habitaciones.

Se continúa instalando piso cerámico

en habitaciones de casino.

Ramiro
Arg Residente

Sandra Martínez A
Profesional con funciones
de interventora

Lunes 27 de julio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro de obra

1 Oficiales + 1 Ayudantes

4 instaladores de cubierta

Estado del tiempo: Lluvias fuertes hasta las 10 am, tarde nublada.

Actividades realizadas:

Por motivo de lluvias las actividades en obra iniciaron luego de las 10 am

Se inicio desmonte de canal de

aguas lluvias en baño de almacenamiento

Se inicio lijado de estructura

metálica en baño de almacenamiento

Se inicio limpieza y pintura con

anticorrosivo y esmalte para estructura

metálica del baño de almacenamiento.

Rojero
Arg Residente

Sandra Martínez A
Profesional con función
de interventora

Martes 28

Personal en

Arg Residente

Ing Ambien

Profesional

Maestro de

3 Oficiales

2 Plomeros

4 Instaladores

Estado

Actividades

Se realiza

espécies in

Se con

con Cerce

Se contin

Cerámica

de circ

Se retir

rdc.

En baño

Con insta

Se cont

pintura d

de alje

Para la t

el filo

win me

Rojero
Arg Residente

Martes 28 de julio de 2026

Personal en obra

Arg Residente

Ing Ambiental

Profesional SST

Maestro obra

3 Oficiales + 6 Ayudantes

2 Plomeros + 3 instaladores de cerámica

4 Instaladores de celdita

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realiza charla ambiental enfocada en especies invasoras y sus efectos

Se continúa en casio de petulleros

con concreto para poyos de cierre,

Se continúa con la instalacion de pso
ceramica en habitaciones y pasillos
de circulacion.

Se retiran a pnto de acopio material
rdc.

en baño de alojamiento 1. Se continúa

con instalaciones hidrosanitarias

Se continúa realizando el lijado y
pintura de estructura metálica en baño
de alojamiento 2.

Para la terminacion final del cierre en
el filo del ing Antony Sigina mongerlo con
win metálico

Rojero
y Residente

Concha Martinez Ar.
Prof. de Residencia
Intervención

Miércoles 29 Julio 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

Oficiales + Ayudantes

4 Instaladores de cubierta

2 Plomeros

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar

Se realizó charla SST enfocada en trabajo en equipo

El día de hoy asistimos a una reunión de Seguimiento de obra con la arg Lilia y su equipo técnico donde se verificaron los elementos de grifería que se van a instalar.

Se continúan realizando en Casino:

- Retiro de red a punto de acopio

- Concreto de poyo de clase en habitaciones

- Piso Cerámico en habitaciones en Casino.

En baño de alojamiento 3 Se ligan y pautan la estructura metálica de cubierta.

Se instala la viga canal nueva.

En el baño 1 Se culmina el día de hoy las instalaciones sanitarias.

En el baño de alojamiento 2 Se realiza toda la instalación de la cubierta.

Arg Residente

Sandra Martinez A
Prof con experiencia de
interventora

Jueves 30 de julio

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

Oficiales + Ayudantes:

4 instaladores de obra

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla ambiental enfocada en adaptacion al cambio climatico

El dia de hoy se inicia una segunda jornada de disposicion hasta la escombrera

el Oasis, quien realiza recepcion de forma certificada, hoy se envian: 3

viajes de $16 m^3$ y 3 viajes de $7 m^3$,

cargados a traves de una pajarita.

Se continua en Casino: Piso Ceramico

en habitacion, Se inicia guarda esoba ceramico.

Se inicia hoy en casino la estructura para ciela raso en casino.

Se inicia la instalacion de flanchies metalicos para la cubierta de casino

que fueron previamente pintados.

Arg
Residente

Jandrea Martinez A.
Profesional con Funcion
de Interventora

Viernes 31 de julio 2026

Personal en obra

Arg Residente

Profesional SST

Ing Ambiental

Maestro de obra

Oficiales y Ayudantes

4 Instaladores de cubierta

Estado del tiempo: Soleado

Actividades a realizar:

Se realiza charla SST enfocada en buen uso de epp.

Se continúa con disposición final de

residuos, se envían en total del día de

hoy 2 viajes de $16m^3$ y 1 viaje de $7m^3$

Para un total dispuesto en esta segunda

jornada de $84m^3$.

En Casino se continúa con:

- Instalación de piso cerámico

- Instalación de guardas de encaucado

- Instalación de caballetes y flanchos para cubierta

- Instalación de estructura de cielo

- raso

- Concreto para poyos de cierre en

- habitaciones.

- Inicio de alzado de muros para

- estuco interior.

- Levante de muros en habitaciones.

Raiza
Arg Residente.

Sandra Martínez A.
Profesional con funciones
de interventora.



ANEXO. 07
REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE No.1, BAÑO DE ALOJAMIENTO 1

ITEM A3-1.05: Excavación manual

ANTES



ITEM A3-1.05: Excavación manual



ITEM A3-1.05: Excavación manual

DURANTE



ITEM A3-1.05: Excavación manual



ITEM A3-1.05: Excavación manual



ITEM A3-1.05: Excavación manual



ITEM A3-1.05: Excavación manual

DESPUES



ITEM A3-1.05: Excavación manual



ITEM A3-1.05: Excavación manual

ITEM A3-3.01: Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ANTES



ITEM A3-3.01: Red Hidráulica de 1/2"



ITEM A3-3.01: Red Hidráulica de 1/2"

DURANTE



ITEM A3-3.01: Red Hidráulica de 1/2"



ITEM A3-3.01: Red Hidráulica de 1/2"

DESPUES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-3.01: Red Hidráulica de 1/2"



ITEM A3-3.01: Red Hidráulica de 1/2"

ITEM A3-3.13: Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4"

ANTES



ITEM A3-3.13:Tubería sanitaria PVC 4"



ITEM A3-3.13:Tubería sanitaria PVC 4"

DURANTE



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 53


Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-3.13:Tubería sanitaria PVC 4"

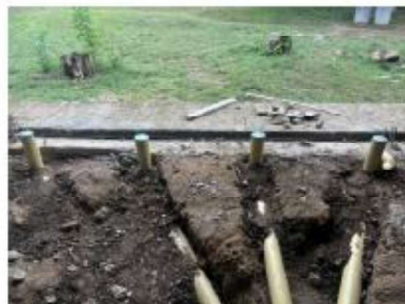

ITEM A3-3.13:Tubería sanitaria PVC 4"

DESPUES



ITEM A3-3.13:Tubería sanitaria PVC 4"



ITEM A3-3.13:Tubería sanitaria PVC 4"

ITEM A3-3.14: Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6"

ANTES



ITEM A3-3.14:Tubería sanitaria PVC 6"



ITEM A3-3.14:Tubería sanitaria PVC 6"

DURANTE



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1




ITEM A3-3.14: Tubería sanitaria PVC 6"



ITEM A3-3.14: Tubería sanitaria PVC 6"

DESPUES

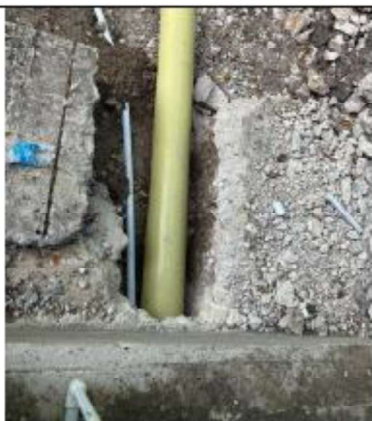

ITEM A3-3.14: Tubería sanitaria PVC 6"



ITEM A3-3.14: Tubería sanitaria PVC 6"

ITEM A3-3.30: Suministro e instalación de Punto de agua fría

ANTES



ITEM A3-3.30: Punto de agua fría



ITEM A3-3.30: Punto de agua fría



DURANTE



ITEM A3-3.30: Punto de agua fría



ITEM A3-3.30: Punto de agua fría

DESPUES



ITEM A3-3.30: Punto de agua fría



ITEM A3-3.30: Punto de agua fría

ITEM A3-3.46: Suministro e instalación de salida sanitaria 4"

ANTES



ITEM A3-3.46: Salida sanitaria de 4"



ITEM A3-3.46: Salida sanitaria de 4"



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 8 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

DURANTE



ITEM A3-3.46: Salida sanitaria de 4"



ITEM A3-3.46: Salida sanitaria de 4"

DESPUES



ITEM A3-3.46: Salida sanitaria de 4"



ITEM A3-3.46: Salida sanitaria de 4"

ITEM A3-3.47: Suministro e instalación de salida sanitaria 3"

ANTES





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 9 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-3.47: Salida sanitaria de 3"

ITEM A3-3.47: Salida sanitaria de 3"

DURANTE



ITEM A3-3.47: Salida sanitaria de 3"

ITEM A3-3.47: Salida sanitaria de 3"

DESPUES



ITEM A3-3.47: Salida sanitaria de 3"

ITEM A3-3.47: Salida sanitaria de 3"

ITEM A3-6.22: Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo

ANTES



ITEM A3-6.22: Viga cimienta



ITEM A3-6.22: Viga de cemento

DURANTE



ITEM A3-6.22: Viga cimienta



ITEM A3-6.22: Viga de cemento

DESPUES



ITEM A3-6.22: Viga cimienta



ITEM A3-6.22: Viga de cemento



ITEM A3-17.02: Retiro de escombro a lugar autorizado por autoridades ambientales

ANTES



ITEM A3-17.02: Retiro de escombro



ITEM A3-17.02: Retiro de escombro

DURANTE



ITEM A3-17.02: Retiro de escombro



ITEM A3-17.02: Retiro de escombro





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 12 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

DESPUES



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

Frente 2, Baño de alojamiento 2

ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

ANTES



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

DURANTE



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete




ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

DESPUES

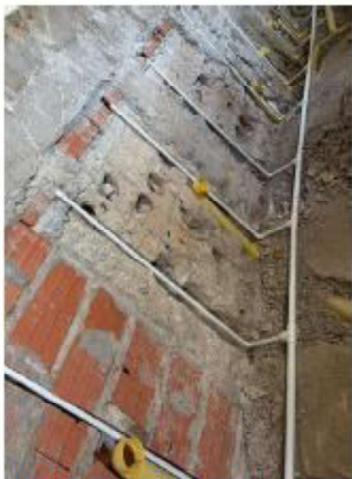

ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 14 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

ANTES



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

DURANTE



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

DESPUES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 15 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

ITEM A3-1.40: Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material

ANTES



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material

DURANTE



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 16 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material

DESPUES



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material

ITEM A3-2.07. Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior

ANTES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 17 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica

DURANTE



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica

DESPUES





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 18 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica

ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica

ITEM A3-11.21. Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
ANTES



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica

ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica

DURANTE



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica

ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 19 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

DESPUES



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica

ITEM A3-12.04 Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I

ANTES



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



DURANTE



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI

DESPUES



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI

ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 21 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ANTES



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada

DESPUES



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada

ITEM A3-17.02: Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 22 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ANTES



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

DURANTE



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

DESPUES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 23 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

Frente 3, Baño de alojamiento 3

ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

ANTES



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

DURANTE



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 24 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete

DESPUES



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



ITEM A3-1.36: Desmonte de pañete



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 25 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

ANTES



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

DESPUES



ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material

ITEM A3-1.16: Desmonte Cubierta en cualquier material



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 26 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-1.40: Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material

ANTES



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material

DURANTE



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 27 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

DESPUES



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material



ITEM A3-1.40: Desmonte de canal y/o bajante en cualquier material

ITEM A3-2.07. Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior

ANTES



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta arquitectónica

DURANTE



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 28 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de
cubierta arquitectónica



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de
cubierta arquitectónica

DESPUES



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de
cubierta arquitectónica



ITEM A3-2.07. Suministro e instalación de cubierta
arquitectónica



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 29 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-11.21. Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m

ANTES



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica

DURANTE



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 30 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

DESPUES



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica



ITEM A3-11.21. Suministro e instalación de canal metálica

ITEM A3-12.04 Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I

ANTES



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto
Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto
Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 31 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

DURANTE



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI

DESPUES



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.04. Suministro e instalación de concreto Suministro e instalación de concreto 3000 PSI



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm

ANTES



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada

DESPUES



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada



ITEM A3-12.36. Suministro e instalación de malla electrosoldada



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 33 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ANTES



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

DURANTE



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

DESPUES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 34 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros



ITEM A3-17.02: Retiro de escombros

Frente 4, CASINO DE PATRULLEROS

ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque o ladrillo

ANTES



ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque



ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque

DURANTE





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 35 de 53

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque



ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque

ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque



ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque

DESPUES



ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque



ITEM A3-1.09: Desmonte de muro en bloque

ITEM A3-1.12: Desmante de placa maciza

ANTES



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 36 de 53

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



ITEM A3-1.12: Desmonte de placa maciza



ITEM A3-1.12: Desmonte de placa maciza

DURANTE



ITEM A3-1.12: Desmonte de placa maciza



ITEM A3-1.12: Desmonte de placa maciza

