

Día 268 09 de Julio de 2026 (Jueves).


Hora inicio 7:30am salida: 4:30pm.

Estado del tiempo: Soleado

Personal: (2) oficiales, (5) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) asesor ambiental, (1) geotecnista, personal interventoria.

Actividades: Instalación de malla electrosoldada, trazado para canaletas.

Observaciones: Ninguna.



Día 269 10 de Julio de 2026 (Viernes)


Hora inicio 7:30am salida 4:30 pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (5) ayudantes, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Actividades: Instalación de malla electrosoldada, trazado de canaletas.

Observaciones: Ninguna.




Día 270 11 de Julio de 2026 (Sábado).

Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.




Día 271 12 de Julio de 2026 (domingo).

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.



Día 272 13 de Julio de 2026 (Lunes). Festivo.

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades: No se realizan.

13
 Día 273 14 de Julio de 2026 (martes).


Horas de inicio 7:30am. salida: 4:30pm.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador inyección, (1) operador perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interveitoria.

Actividades: Se inicia suministro y colocación de concreto para zapatas y lanzado.

Observaciones: Ninguna.



14
 Día 274 15 de Julio de 2026 (miércoles).

Horas de inicio 7:30am. salida: 4:30pm.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interveitoria.

Actividades: Se continúa con el suministro y colocación de concreto para zapatas y lanzado.

Observaciones: Ninguna.



14
 Lanzado

Día 275 16 de Julio de 2026 (Jueves).


Horas de inicio: 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenistas, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interveitoria.

Actividades: Se continúa con el suministro y colocación de concreto para zapatas y lanzado.

Observaciones: Ninguna.



Día 276 17 de Julio de 2026 (viernes).




Hora de inicio: 7:30 am - salida 4:30 pm.

Estado del tiempo: lluvia moderada

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, profesionales de interventoría.

Actividades: Se continúa con el suministro de concreto lanzado y para zapatos.

Observaciones: Ninguna.

16

Día 277 18 de Julio de 2026 (sábado)



Hora inicio 8:00 am salida: 12 m.

Estado del tiempo: lluvia moderada.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) profesional interventoría.

Actividades: Se continúa con el suministro y colocación de concreto lanzado para zapatos y pantalla.

Observaciones: Ninguna.


17

Día 278 19 de Julio de 2026 (domingo)

Estado del tiempo: lluvias fuertes.

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.



Día 279 20 de Julio de 2026 (lunes) → festivo.

Estado del tiempo: soleado.

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.

Día 280

21 de Julio de 2026 (martes).

Hora de inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: lluvias moderadas.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (1) almacenista, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) residente, (1) director, (1) geotecnista, (1) ambiental, (1) profesional SST, personal interventor.

Actividades: Se continúa suministro y colocación de concreto para zapatas y lanzado. Se inicia fundida de canaleta.

Observaciones: Ninguna.

Día 281 22 de Julio de 2026 (miércoles).

19

Hora de inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: lluvias moderadas.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) geotecnista, personal de interventoría.

Actividades: Se continúa suministro y colocación de concreto lanzado sobre la pantalla, zapatas y canaleta.

Observaciones: Ninguna.

Día 282 23 de Julio de 2026 (Jueves).

20

Festivo
Hora de inicio: 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: lluvias moderadas.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (1) almacenista, (1) profesional SST, (1) residente, (1) auxiliar residente, personal de interventoría.

Actividades: Se continúa con el suministro y colocación de concreto lanzado sobre el talud, zapatas y canaleta.

Observaciones: Ninguna.

283 24 de julio de 2026 (viernes).


Hora de inicio: 7:30am - Salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) residente, (1) director, (1) profesional SST, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, (1) auxiliar residente, personal de interventoría.

Actividades: Se continúa con el suministro y colocación de concreto lanzado sobre el talud, zapatas y canaleta.

Observaciones: Ninguna.



284 25 de julio de 2026 (sábado).


Hora de inicio: 8am - salida 12m.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) op. de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) residente, (1) profesional SST, (1) auxiliar residente, personal interventoría.

Actividades: Se continúa con el suministro de concreto lanzado para, zapatas, canaleta y la pantalla del talud. Se finaliza lanzado.

Observaciones: Ninguna.




285 26 de julio de 2026 (domingo).

Estado del tiempo: soleado.

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.



286 27 de julio de 2026 (lunes).

Hora de inicio: 7:30am - Salida 4:30pm

Estado del tiempo: soleado

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (2) oficiales, (7) ayudantes, (1) residentes, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista,

(1) asesor ambiental, (1) auxiliar residente, personal interventoria.
 Actividades: Se realizan el acabados de concreto en la canaleta.

Día 287 28 de Julio de 2026 (martes).

Hora de inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) operador de perforación, (1) ayudantes, (3) oficiales, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Actividades: Se realizan detalles y acabados en la canaleta.

Observaciones: Ninguna.

Día 288 29 de Julio de 2026 (miércoles).

Hora de inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (3) oficiales, (5) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) profesional interventoria.

Actividades: Se continúan con detalles y acabados de canaletas.

Observaciones: Ninguna.

Día 289 30 de Julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (5) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (2) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) profesional interventoria.

Actividades: Se realizan acabados en canaletas.




Observaciones: Ninguna.

31 de julio de 2026 (Viernes).
 Hora de inicio 7:30am salida 4:30 pm.
 Estado del tiempo: soleado.

Personal: (3) oficiales, (5) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.

Actividades: Se finalizan detalles y acabados de canaletas.

Observaciones: Ninguna.


01 de agosto de 2026 (Sábado)

Hora de inicio: 8:00am salida 12m.

Personal: (2) oficiales, (5) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, personal interventoria.

Actividades: Se realiza el alisfamiento de platinas con anticorrosivo.

Observaciones: Ninguna.


 

02 agosto de 2026 (domingo)

Estado del tiempo: soleado.

Actividades: no se realizan.

Observaciones: Ninguna.




03 de agosto de 2026 (lunes).

Hora de inicio 7:30am - Salida 4:30pm.

Personal: (1) oficial, (4) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, (1) almacenista.

Actividades: Se continúa con alisfamiento y pintura anticorrosivo para platinas.

Observaciones: Ninguna.



	<p>Consortio Estabilización Floridablanca Contrato 210.16224.6</p>	
	<p>Informe Mensual De Obra 01 al 30 Junio de 2026</p>	

Anexo No. 5.2: Bitácora Lagos II

Día 259 30 de Junio 2026 (martes)

Hora inicio 7:30am salida: 5:00pm.


Estado del tiempo: lluvias fuertes

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, profesionales interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se continúa con el suministro y conformación de relleno en el trasdós del gavión.

Observaciones: Ninguna.



Día 260 01 de Julio 2026 (miércoles)

Hora inicio: 7:30 am - salida: 4:30 pm.


Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras

Actividades: Se realiza conformación de jarillón en zonas donde se requiere.

Observaciones: Ninguna.



Día 261 02 de Julio 2026 (jueves)

Hora inicio: 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se inicia instalación de pasamuros y formaleta para recubrimiento del gavión.

Observaciones: Visita Vicente Vargas COMB.

Día 262 03 de Julio 2026 (viernes).

Hora inicio 4:30 pm - salida 7:30 am



Estado de tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar SST, (1) aux. residente, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (2) vibrocompactador.

Actividades: Se instalan pasamuros y formaleta para recepción del gavión.

Observaciones: Ninguna

Día 263 04 de Julio de 2026 (sábado).

Hora inicio 8 am - salida 12 m.


Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se realiza suministro y conformación de relleno en el trasdos del gavión. Se continúa con instalación formaleta.


Observaciones: Ninguna.



Día 264 05 de Julio de 2026 (domingo)

Hora inicio: No se realizan actividades.

Observaciones: Ninguna.



Día 265 06 de Julio de 2026 (lunes)

Hora de inicio 7:30 am - salida 4:30 pm

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente,

(1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, profesionales intervectoria.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se realiza suministro y conformación de rellenos, instalación de formaleta y pasamuros.

Observaciones: Ninguna.

Día 266 07 de Julio de 2026 (Martes).

Hora de inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) oficial, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) profesional intervectoria.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se realiza suministro y conformación de relleno.

Instalación de formaleta y pasamuros.

Observaciones: Ninguna.

Día 267 08 de Julio 2026 (Miércoles).

Hora de inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) oficial, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales intervectoria.

Maquinaria y equipos: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se realiza fundición de concreto para recubrimiento del gavión.

Observaciones: Ninguna.

Día 268 09 de Julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) profesional SST, personal interventor/a.

Observaciones: Ninguna.

Actividades: Suministro y conformación de rellenos.

Día 269 10 de Julio de 2026 (viernes)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30 pm.

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) asesor ambiental, personal interventor/a.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y compactación de relleno. Instalación de formaleta para recubrimiento.

Observaciones: Ninguna.

Día 270 11 de Julio de 2026 (sábado)

Estado del tiempo: soleado.

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.

Día 271 12 de Julio de 2026 (domingo)

Estado del tiempo: soleado

Actividades: no se realizan.

Observaciones: Ninguna.

Día 272 13 de Julio de 2026 (viernes festivo)

Estado del tiempo: soleado

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.

Día 273

14 de Julio de 2026 (martes)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y compactación de rellenos. Instalación de formaleta.

Observaciones: Ninguna.

Día 274

15 de Julio de 2026 (miércoles)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y colocación de concreto para recubrimiento del gavión.

Observaciones: Ninguna.

Día 275

16 de Julio de 2026 (jueves)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm


Estado del tiempo: soleado.

Día 272 13 de Julio de 2026 (viernes festivo),

Estado del tiempo: soleado

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.



Día 273 14 de Julio de 2026 (martes)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.


Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y compactación de rellenos. Instalación de formaleta.

Observaciones: Ninguna.



Día 274 15 de Julio de 2026 (miércoles)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y colocación de concreto para recubrimiento del gavión.

Observaciones: Ninguna.



Día 275 16 de Julio de 2026 (jueves)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.
 Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.
 Actividades: Se instala formaleta y pasamuros.
 Observaciones: Ninguna.

Día 276 17 de Julio de 2026 (viernes).

Hora inicio 7:30 am Salido 4:30 pm.

Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se instala formaleta y pasamuros.

Observaciones: Ninguna.

Día 277 18 de Julio de 2026 (sábado).

Hora inicio 8:00 am salida 12:00 pm.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) director, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: - Suministro y colocación de concreto de recubrimiento del gavión.


Observaciones: Visita de Martha Esteres Alcaldía.

Día 278 19 de Julio de 2026 (domingo)

Estado del tiempo: soleado

Actividades: No se realizan Observaciones: Ninguna.

Día 279 20 de Julio de 2026 (lunes) - festivo
 Estado del tiempo: soleado No actividades.
 Observaciones: Ninguna



Día 280 21 de Julio de 2026 (martes)

Hora inicio: 7:30am salida 4:30 pm.


Estado del tiempo: lluvias moderadas.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) aux. residente, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interventoria.

Maquinaria: (2) retroexcavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y compactación de relleno e instalación de formaleta en el gavión.

Observaciones: Ninguna.





Día 281 22 de Julio de 2026 (miércoles).

Hora inicio: 7-30 am salida 4-30 pm.


Estado del tiempo: lluvias moderadas.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibro compactador.

Actividades: Suministro y compactación de relleno e instalación de formaleta.

Observaciones: Ninguna.


Día 282 23 de Julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio: 7:30am salida 4-30 pm.

Estado del tiempo: lluvias moderadas.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente,

(1) auxiliar residente, (1) profesional SST, personal interviniente.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Se instala formaleta y pasamuros. Se realiza suministro y compactación de relleno.

Observaciones: Visita Vicente Vargas.




Día 288 24 de Julio 2026 (viernes)

Hora inicio 7:30 pm salida 4:30 pm.

Estado del tiempo: soleado.



Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) profesional SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interviniente.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Suministro y colocación de concreto para relleno del gavión.

Observaciones: Visita Martha Esteves. Hoy día.



Día 289 25 de Julio de 2026 (sábado)

Estado del tiempo: soleado

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.




Día 285 26 de Julio de 2026 (domingo)

Estado del tiempo: soleado

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.




Día 286 27 de Julio de 2026 (lunes)

Estado del tiempo: Soleado

Actividades: No se realizan.

Observaciones: Ninguna.



Día 287 28 de Julio de 2026 (martes).

Hora inicio: 7:30am - salida 4:30pm


Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) oficial, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) aux. residente, (1) SST, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental, personal interviniente.

Maquinaria: (2) excavadoras, (1) vibrocompactador.

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros.

Observaciones: Ninguna.



Día 288 29 de Julio de 2026 (miércoles).

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.


Estado del tiempo: soleado.

Personal: (1) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) SST, (1) profesional interviniente.

Maquinaria: (2) excavadoras.

Actividades: Instalación de formaletas y pasamuros

Observaciones: Ninguna.



Día 289 30 de Julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio 7:30am - salida 4:30pm.

Estado del tiempo soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) aux. residente, (1) profesional SST, (1) director, personal interviniente.

Maquinaria: (2) excavadoras.

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros.

Reforzamiento de jarillón.

Observaciones: Ninguna.

Día 240 31 de Julio 2026 (Viernes).

Hora inicio: 7:30am salida: 5:pm.

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) sst, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros en la cura del gavión.

Observaciones: Ninguna.

Día 241 01 de Agosto 2026 (sábado)

Hora inicio 8am. salida 5:00pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional sst, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras.

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros en la cara de gavión.

Observaciones: Visita de Martha Esteves Alcaldía.

Día 242 02 de agosto 2026 (domingo)

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades: No se realizan. Observaciones: Ninguna.

Maquinaria: (2) excavadoras.

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros.

Reforzamiento de jarillón.

Observaciones: Ninguna.

Día 200 31 de Julio 2026 (Viernes).

Hora inicio: 7:30 am salida: 5 pm.

Estado del tiempo: soleado

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) SSR, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras.

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros en la cara del gavión.

Observaciones: Ninguna.

Día 241 01 de Agosto 2026 (sábado)

Hora inicio 8 am. salida 5:00 pm.

Estado del tiempo: soleado.

Personal: (2) oficiales, (6) ayudantes, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SSR, personal interventoria.

Maquinaria: (2) excavadoras.

Actividades: Instalación de formaleta y pasamuros en la cara del gavión.

Observaciones: Visita de Martha Esteves Alcantara.

Día 242 02 de agosto 2026 (domingo)

Estado del tiempo: Soleado.

Actividades: No se realizan. Observaciones: Ninguna.

	Consorcio Estabilización Floridablanca <i>Contrato 210.16224.6</i>	
	Informe Mensual De Obra 01 al 30 Junio de 2026	

Anexo No. 5.2: Santa Ana y prados

Día 260

01 de Julio de 2026 (Miércoles)

Hora inicio: 7:00am - Salida: 5:00pm


Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales interventoria

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes

Observaciones: Ninguna



Día 261

02 de Julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales de interventoría, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación de anclajes e instalación.

Observaciones: Ninguna



Día 262

03 de Julio de 2026 (Viernes)

Hora inicio: 07:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección

el compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna

Día 263

04 de julio de 2026 (Sábado)

Hora inicio: 8:00am - Salida: 12:00pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacénista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales interventoria.

Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (1) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes

Observaciones: Ninguna

Día 264

05 de julio de 2026 (Domingo)

Actividades: No se realizan

Estado del tiempo: Soleado.

Observaciones: Ninguna

Día 265

06 de julio de 2026 (Lunes)

Hora inicio: 07:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado.


Personal: (1) operador de inyección, (1) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales interventoria, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental.

Maquinaria y equipos: (1) unidad de perforación, (1) unidad de inyección.

compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observación: Ninguna



Día 266

07 de julio de 2026 (Martes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm


Estado del tiempo: Soleado

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales intervinientes.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (2) compresor, (1) unidad de inyección.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna



Día 267

08 de julio de 2026 (Miércoles)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm


Estado del tiempo: Soleado

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales intervinientes.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna



Día 268

09 de julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (5) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales SST.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna

Día 269 10 de julio de 2026 (Viernes)

Hora inicio: 8:00am - Salida: 5:00pm

Estado del tiempo: Soleado

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (5) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresores.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna


Día 270 11 de julio de 2026 (Sábado)

Actividades: No se realizaron

Estado del tiempo: Lluvias moderadas


Observaciones: Ninguna

Día 271 12 de julio de 2026 (Domingo)
 Actividades: No se realizaron
 Estado del tiempo: Soleado
 Observaciones: Ninguna



Día 272 13 de julio de 2026 (Lunes)
 Actividades: No se realizaron
 Estado del tiempo: Soleado

Observaciones: Ninguna




Día 273 14 de julio de 2026 (Martes)
 Hora inicio: 07:30am - Salida: 4:30pm
 Estado de tiempo: Soleado

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (1) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventores, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (1) compresor

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes

Observaciones: Ninguna



Día 274 15 de julio de 2026 (Miércoles)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventores

Maquinaria y equipos: (1)unidad de perforación, (1)unidad inyectora, (2)compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna

Día 275 16 de julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio: 7:30am Salida: 5:00pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1)operador de inyección, (2)operador de perforación, (1)ayudante de perforación, (1)ayudante de obra, (1)almacenista, (1)residente, (1)auxiliar residente, profesional SST, profesionales interventoria.

Maquinaria y equipos: (2)unidad de perforación, (1)unidad de inyección, (2)compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna

Día 276 17 de julio de 2026 (Viernes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Personal: (1)operador de inyección, (2)operador de perforación, (1)ayudante de perforación, (1)ayudante de obra, (1)almacenista, (1)residente, (1)residente auxiliar, (1)profesional SST, profesionales interventoria, (1)director, (1)geotecnista, (1)asesor ambiental.

Maquinaria y equipos: (2)unidad de perforación, (1)unidad de inyección, (2)compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna

Día 277 18 de julio de 2026 (Sábado)

Hora inicio: 8:00am - Salida: 12:00pm


Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal de instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna.




Día 278 19 de julio de 2026 (Domingo)

Actividades: No se regularon.

Estado del tiempo: Lluvias fuertes.

Observaciones: Ninguna.




Día 279 20 de julio de 2026 (Lunes)

Actividades: No se regularon.

Estado del tiempo: Soleado.

Observaciones: Ninguna.



Día 280 21 de julio de 2026 (Martes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Lluvias moderadas.


Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacenerista,

(1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoria, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna



Día 281 22 de Julio de 2026 (Miércoles)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm


Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (5) ayudante de obra, (1) almacénista, (1) residente, (1) residente auxiliar, (1) profesional SST, profesionales interventoria.

Maquinaria y Equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (1) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna



Día 282 23 de Julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm


Estado del tiempo: Lluvias moderadas.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (5) ayudante de obra, (1) almacénista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales de interventoria.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (1) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna.



Día 283

24 de julio de 2026 (viernes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm



Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente de obra, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna.

Día 284

25 de julio de 2026 (sábado)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 12:00pm


Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (2) operador de perforación, (2) ayudante de perforación, (2) ayudante de obra, (1) almacenerista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna.





Día 285

26 de julio de 2026 (Domingo)

Actividades: No se realizaron.

Estado del tiempo: Soleado.

Observaciones: Ninguna.



Día 286

27 de julio de 2026 (Lunes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm





Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (1) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna.

Día 287

28 de julio de 2026 (Martes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) almacenista, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (1) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes.

Observaciones: Ninguna.




Día 288

29 de julio de 2026 (Miércoles)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm


Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) albañil, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna.



Día 289.

30 de julio de 2026 (Jueves)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm


Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (3) operador de perforación, (3) ayudante de perforación, (1) ayudante de obra, (1) albañil, (1) residente, (1) auxiliar residente, (1) profesional SST, profesionales interventoría, (1) director, (1) geotecnista, (1) asesor ambiental.

Maquinaria y equipos: (2) unidad de perforación, (1) unidad de inyección, (2) compresor.

Actividades: Perforación horizontal e instalación de anclajes, llenado de anclajes con lechada cementicia.

Observaciones: Ninguna.



Día 290.

01 de agosto de 2026 (viernes)

Hora inicio: 7:30am - Salida: 4:30pm

Estado del tiempo: Soleado.

Personal: (1) operador de inyección, (3) operador de perforación, (3) ayudante

	Consortio Estabilización Floridablanca <i>Contrato 210.16224.6</i>	 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
	Informe Mensual De Obra 01 al 31 Julio de 2026	

Anexo No. 6: Estado del tiempo.




ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	01 - 31 JUL	AÑO	2026
---------	-------------	-----	------

SECO	1	LLUVIA MODERADA	2	LLUVIA INTENSA	3
------	---	-----------------	---	----------------	---

RESUMEN MES	
1	81,00%
2	16,00%
3	3,00%

DÍA	FECHA																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
LUNES																																
MARTES																																
MIÉRCOLES																																
JUEVES																																
VIERNES																																
SÁBADO																																
DOMINGO																																

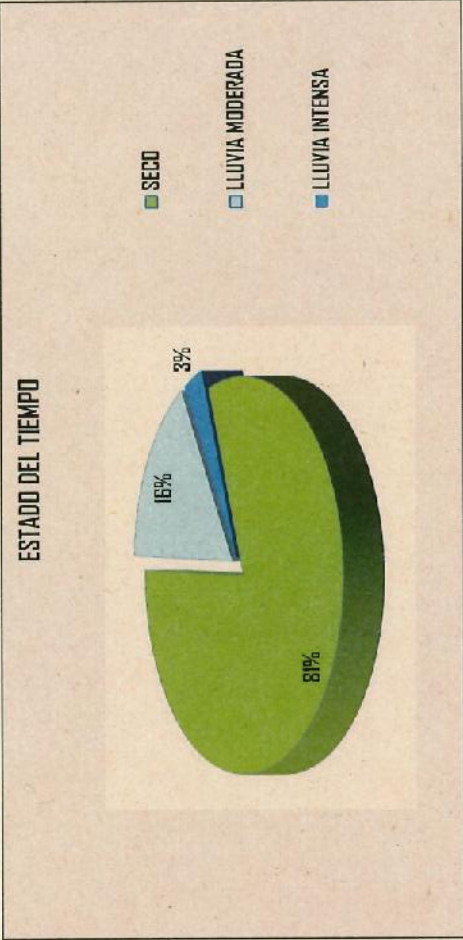

	Consortio Estabilización Floridablanca Contrato 210.16224.6	 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
	Informe Mensual De Obra 01 al 31 Julio de 2026	

Anexo No. 7: Actas y correspondencia.

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
CODIGO: A-24-F005	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA: COMITE DE SEGUIMIENTO “CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y SOCACION DE LA MARGEN DERECHA ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-0, PARA LA CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.	ACTA No. 11	FECHA DD MM AA 16 07 2026
LUGAR: Frente de Obra Lagos II	Hora Inicio 8:00 am	
	Hora final 11:00 am	

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Recorrido de frente de obra	Contratista – Interventoría
2	Estado del tiempo	Contratista – Interventoría
3	Seguimiento de actividades de obra	Contratista – Interventoría
4	Compromisos	Contratista – Interventoría

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA	
No.	<p>Se llevó a cabo reunión entre el equipo profesional del contratista de obra y la interventoría, con el propósito de desarrollar el Comité de Seguimiento No. 11 del proyecto. En el marco de esta jornada, se realizó la revisión de avances en cada una de las obras, evaluando su estado frente a la programación establecida.</p> <p>Así mismo, se efectuó la verificación integral de los componentes técnicos, ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y documentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos contractuales y la adecuada continuidad del proyecto.</p> <p>Durante el periodo objeto de seguimiento se presentaron condiciones climáticas favorables para la ejecución de las actividades programadas en los diferentes frentes de trabajo. No se registraron eventos meteorológicos que generaran afectaciones, restricciones o interrupciones en el normal desarrollo de las labores constructivas.</p> <p>En consecuencia, las condiciones climáticas permitieron mantener la continuidad operativa de los frentes de obra y ejecutar las actividades conforme a la programación establecida, sin evidenciarse impactos sobre los rendimientos previstos ni sobre el desarrollo de la programación contractual.</p>
1	
2	

		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
CODIGO: A-PI-F005	VERSION: 5	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
		APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
ACTA DE REUNIÓN			

Se realizó recorrido conjunto por los frentes Lagos II, Arrayanes, Santa Ana y Prados del sur, verificando actividades de obra en ejecución

En el frente Lagos II se evidenció:

- | |
|---|
| Conformación y compactación de rellenos estructurales |
| Suministro y colocación de concreto |
| Suministro e instalación de tubería 2" |



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
CODIGO: A-PL-F005	VERSION: 5	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
		APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
ACTA DE REUNIÓN			

En el frente Arrayanes se evidenció:

- Suministro y colocación de concreto para zapatas
- Suministro y colocación de concreto lanzado
- Colocación de malla electrosoldada
- Construcción de canaleta
- Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
CÓDIGO: A-214C05	VERSION: 5	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
		APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
ACTA DE REUNIÓN			

En los frentes de Santa Ana y Prados del sur se evidenció:

Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes
Instalación de nails
Ejecución de perforaciones horizontales



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
CODIGO: A-PL-F005	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

Compromisos: Por parte del contratista: Garantizar la adecuada protección y cubrimiento de los materiales e insumos almacenados en obra, mediante el uso de elementos de protección que eviten su deterioro por efecto de las lluvias y demás condiciones climáticas. <ul style="list-style-type: none"> • Mantener la continuidad de las actividades constructivas mediante una adecuada planificación de personal, maquinaria y suministro de materiales, evitando interrupciones que afecten el cronograma del proyecto. • Implementar medidas de protección sobre las obras ejecutadas y las excavaciones en proceso, con el fin de prevenir afectaciones ocasionadas por las precipitaciones y garantizar su estabilidad. • Fortalecer el control técnico permanente durante la ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de las especificaciones, alineamientos, niveles y parámetros establecidos en los diseños aprobados. • Mantener en adecuado estado de limpieza y funcionamiento los sistemas provisionales de drenaje, garantizando la correcta evacuación de aguas lluvias y evitando afectaciones en los frentes de trabajo. • Continuar con el seguimiento diario del avance de los diferentes frentes de obra, realizando los ajustes operativos necesarios para asegurar el cumplimiento de la programación y las metas establecidas. 		RESPONSABLE	FECHA
4		Contratista	16/07/2026
No.			
1	Lo manifestado en el punto No. 4 de la presente acta		

PRÓXIMA REUNIÓN			
FECHA:	Por definir	HORA:	LUGAR:
			Por definir
Elaboró Acta		Cargo	
PAULA ANDREA ALQUICHIRE		AUXILIAR DE INTERVENTORIA	
REVISÓ ACTA		CARGO	
NÉSTOR JACOME ORTIZ		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
		Firma	
		Firma	

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
CODIGO: A-PH-005	VERSION: 5	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
		APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
ACTA DE REUNIÓN			

TEMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-0, PARA LA CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	ACTA No. 11	FECHA DD MM AA 16 07 26
LUGAR: Frente Lagos II – Floridablanca, Santander		

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS					
No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA
		M	F		
1	Nestor Juana Otrera	X		Presidente del Comité	Interventora
2	Oscar Andrés Sánchez	X		Ing. Presidente	Cons. Est. Floridablanca
6	Oscar Yezid Blanco	X		Ing. Auxiliar	Cons. Est. Floridablanca
7	Karel Celis		X	Ing. Auxiliar	CCF
8					
9					

	Consortio Estabilización Floridablanca Contrato 210.16224.6	 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
	Informe Mensual De Obra 01 al 31 Julio de 2026	

Anexo No.8: Plan manejo Tránsito



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

CONTRATO No. 210.16224.6

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

INFORME MENSUAL DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
PERIODO DE EJECUCIÓN: PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

FLORIDABLANCA



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS.....	3
1.1	OBJETIVO GENERAL	3
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	3
3.	EQUIPO PARA EMPLEAR EN OBRA.....	4
4.	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.....	5
5.	IDENTIFICACION DE TIPOLOGIAS DE TRANSPORTE, IMPACTO Y CONTROL.....	6
6.	ACTIVIDADES DE MANEJO DE TRAFICO REALIZADAS	7



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El objeto principal del presente Informe de Manejo de Tráfico No. 01 es demostrar el desarrollo y ejecución de los parámetros para mitigar el impacto que puede ejercer la obra y las medidas de control de tráfico vehicular que **CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA**, implementó durante el periodo descrito en la ejecución de las actividades para desarrollo del contrato de obra que tiene como objeto **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demostrar el cumplimiento de los lineamientos básicos para mitigar el impacto sobre los movimientos vehiculares que causan las actividades a ejecutar durante la etapa de construcción del proyecto.
- Sustentar el cumplimiento de todos los procedimientos, guías y señalización como medio de apoyo para la buena ejecución al proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación, se presentan las actividades constructivas necesarias que se desarrollan en virtud del contrato **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

- Perforaciones horizontales
- Instalación de anclajes
- Inyección y llenado de anclajes



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

3. EQUIPO PARA EMPLEAR EN OBRA

En lo relacionado con el patio de maquinaria a emplear durante el presente periodo de este informe, se relaciona a continuación de acuerdo con las actividades de obra.

ITEM	MAQUINARIA / EQUIPO
1	UNIDADES DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA
2	COMPRESORES ATLAS COPCO 450



EQUIPOS DE PERFORACIÓN NEUMÁTICOS



COMPRESORES



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

4. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA


El área de influencia directa es el espacio geográfico que puede verse afectado directamente por las actividades constructivas que se realicen, teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presentan las consideraciones del área de influencia directa de construcción del proyecto

VIAS DE ACCESO





PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

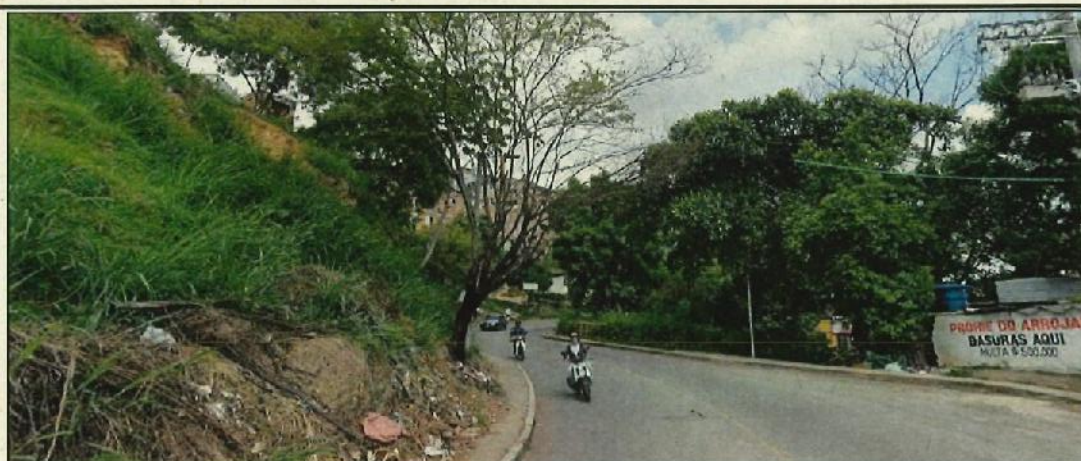

Carrera 3 entre los barrios Prados del Sur y Portal de Santa Ana, Floridablanca-Bucaramanga

5. IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE TRANSPORTE, IMPACTO Y CONTROL

El objetivo principal del plan de manejo de tráfico es el de mitigar las condiciones adversas que se puedan generar por las obras que se generen sobre el corredor vial, la tipología de transporte presentes en el sector se identificó mediante visitas al área de influencia directa e indirecta de las actividades de obra.

TIPOLOGÍA DE TRANSPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPACTO QUE SE PODRÍA GENERAR	CONTROL Y MITIGACIÓN
TRÁNSITO PARTICULAR	Hace referencia al acceso de vehículos particulares de diferente tipo (bicicletas, motocicletas y automóviles)	Impedimento parcial o en su totalidad el acceso particular de vehículos a espacios privados o públicos.	Socialización de cambios viales, señalización.
TRANSPORTE PÚBLICO	Consiste en medios de transporte para el uso de la población o uso colectivo de pasajeros.	Cambio de rutas establecidas y retrasos en tiempos de recorrido.	Ajuste de rutas en tiempo y acceso y socialización a la comunidad, señalización.
MANEJO DE VEHÍCULOS DE CARGA	Todos los vehículos vinculados a la ejecución del contrato y los que ingresen al municipio.	Accidentes de tránsito y generación de daños a infraestructura.	Acompañamiento de auxiliar de tránsito, establecer rutas de acceso.



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA


6. ACTIVIDADES DE MANEJO DE TRAFICO REALIZADAS

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	Ing. Civil Residente
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Registro fotográfico
NOMBRE DEL PROGRAMA	Instalación y mantenimiento de aislamiento de obra
OBJETIVO	Realizar el adecuado cerramiento de la obra y su mantenimiento, con el fin de controlar el material caído producto de las actividades contractuales y delimitar el carril de tránsito correctamente.





PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

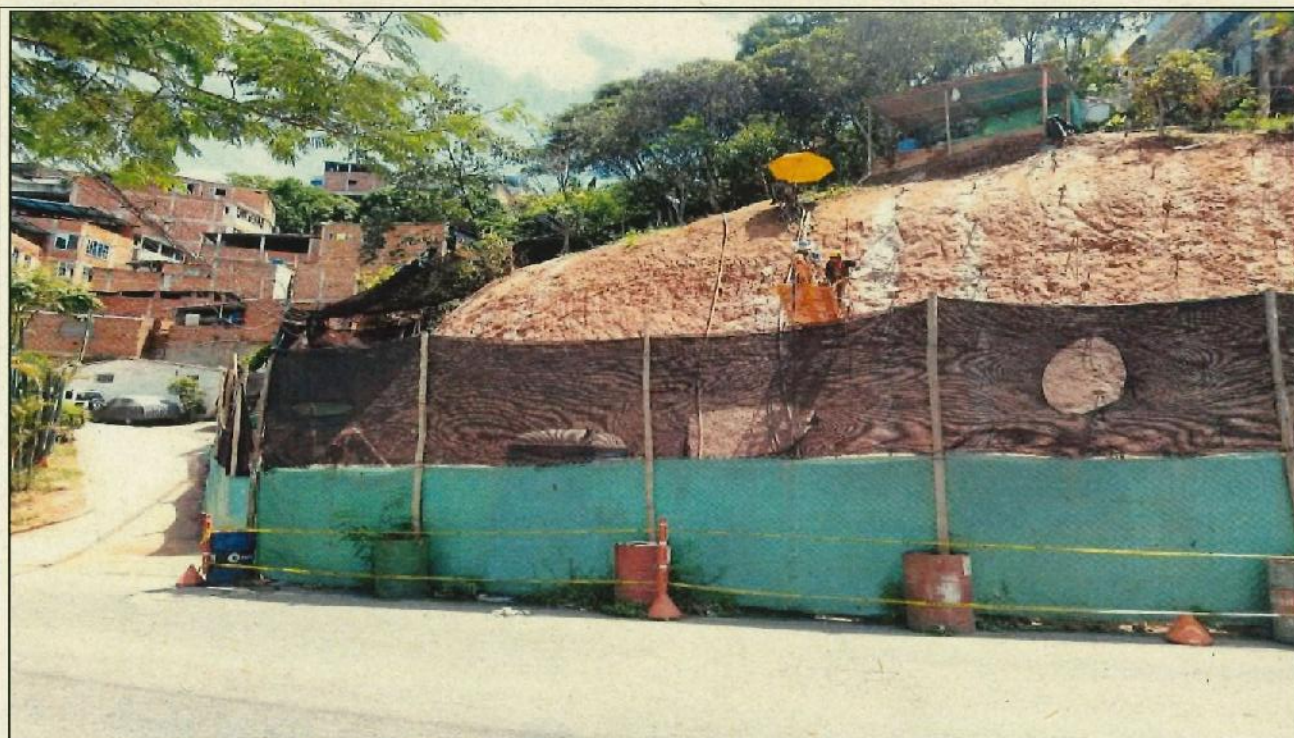

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	Ing. Civil Residente
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Registro fotográfico
NOMBRE DEL PROGRAMA	Limpieza de zonas de cargue
OBJETIVO	Limpiar las zonas de cargue de material con el fin de retirar cualquier residuo producto de la actividad, que pueda generar superficies inestables para los vehículos que transitan.
IMPACTOS A MANEJAR	Incidentes con la población, daños a terceros.




PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA





PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

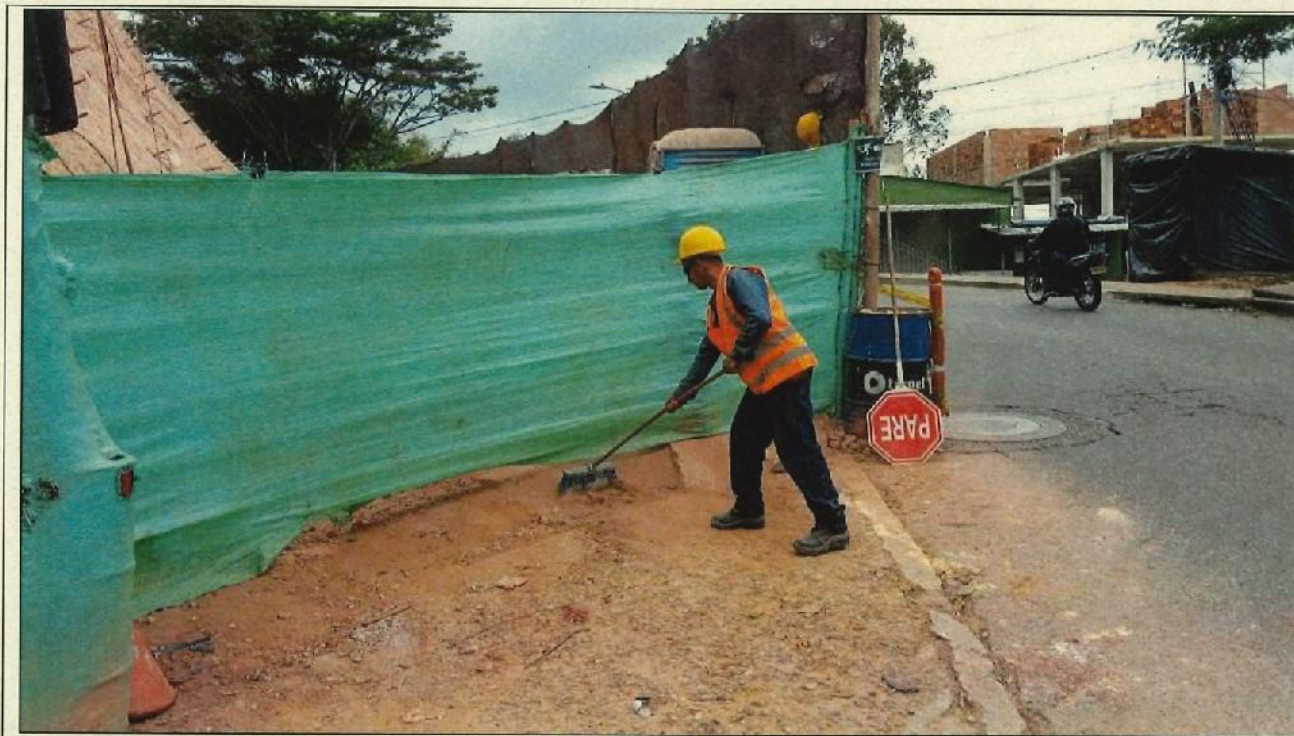

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	Ing. Civil Residente
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Registro fotográfico
NOMBRE DEL PROGRAMA	Control de ingreso y salida de maquinaria pesada
OBJETIVO	Realizar un proceso de ingreso y salida seguro de la maquinaria pesada, garantizando un espacio de ubicación óptimo que no interfiera con el tráfico y con el desarrollo de actividades de obra.



PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN OBRA

