

		FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS										CÓDIGO MA-GP-FR-038				
												VERSIÓN 1 de 10				
												FECHA 09/11/2025				
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA																
FECHA 30/06/2026 (Día / Mes / Año)																
DEPENDENCIA: DE CONCESIONES																
ACTA No. 5																
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 352.464.572,00																
MES JUNIO DE 2026																
ACTA FINAL																
CONTRATO No.: ICCU No. 1596 de 2025																
PLAZO INICIAL: 11 MESES (En meses según contrato principal)																
PLAZO ACUMULADO: 11 MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)																
OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"																
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 DE FEBRERO DE 2026 (Indique día/mes/año)																
FECHA DE VENCIMIENTO ACT: 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)																
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																
CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS NIT:900.062.688-7 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)																
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 5.329.960.965,00																
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1608 DEL 2025 INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS																
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 5.329.960.965,00																
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
1		MANTENIMIENTO RUTINARIO														
1		MANUAL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL INVIAS	MANTENIMIENTO RUTINARIO	KMME S	2.860,00		1.264.449,66	3.616.326.016,00	2.860,00	1.264.449,66	3.616.326.016,00	259,89	328.617.821,00	1.274,47	1.611.503.153,00	30,23%
SUBTOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO								\$ 3.616.326.016			\$ 3.616.326.016		\$ 328.617.821,00		\$ 1.611.503.153,00	30,23%
2		MANTENIMIENTO POR MONTO AGOTABLE														
2.1			FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	6.175,00	\$ 9.045,00	\$ 55.852.875,00		6.175,00	\$ 9.045,00	\$ 55.852.875,00					
2.2			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	617,50	\$ 1.377.381,00	\$ 850.532.767,50		617,50	\$ 1.377.381,00	\$ 850.532.767,50					
2.3			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3000,00	\$ 3.192,00	\$ 9.576.000,00		3000,00	\$ 3.192,00	\$ 9.576.000,00					
2.4			RIEGO DE IMPRIMACION	M2	1.000,00	\$ 7.206,00	\$ 7.206.000,00		1.000,00	\$ 7.206,00	\$ 7.206.000,00					
2.5			SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO	M	2.500,00	\$ 15.294,00	\$ 38.236.000,00		2.500,00	\$ 15.294,00	\$ 38.236.000,00					
2.6			SEREALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UND	25,00	\$ 797.667,00	\$ 19.941.675,00		25,00	\$ 797.667,00	\$ 19.941.675,00					
2.7			SERIAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UND	25,00	\$ 624.736,00	\$ 15.618.400,00		25,00	\$ 624.736,00	\$ 15.618.400,00					
2.8			SERIAL DE TRANSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UND	25,00	\$ 672.687,00	\$ 16.817.175,00		25,00	\$ 672.687,00	\$ 16.817.175,00					
2.9			SERIAL DE TRANSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UND	25,00	\$ 687.879,00	\$ 17.196.975,00		25,00	\$ 687.879,00	\$ 17.196.975,00					
2.10			DEFENSA METALICA	M	180,00	\$ 250.527,00	\$ 45.094.860,00		180,00	\$ 250.527,00	\$ 45.094.860,00					
2.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFARROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	60,00	\$ 16.490,00	\$ 989.400,00		60,00	\$ 16.490,00	\$ 989.400,00					
2.12			TOPE DEFENSA METALICA	UN	60,00	\$ 135.740,00	\$ 8.144.400,00		60,00	\$ 135.740,00	\$ 8.144.400,00					
2.13			SECCION FINAL DEFENSA METALICA	UN	60,00	\$ 117.891,00	\$ 7.073.460,00		60,00	\$ 117.891,00	\$ 7.073.460,00					
2.14			SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	1.875,00	\$ 21.936,00	\$ 41.130.000,00		1.875,00	\$ 21.936,00	\$ 41.130.000,00					
2.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEPOLES DE 10x3.0 CM	UN	358,75	\$ 23.380,00	\$ 8.387.575,00		358,75	\$ 23.380,00	\$ 8.387.575,00					
2.16			RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	225,00	\$ 129.120,00	\$ 29.052.000,00		225,00	\$ 129.120,00	\$ 29.052.000,00					
2.17			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	112,50	\$ 29.762,00	\$ 3.348.225,00		112,50	\$ 29.762,00	\$ 3.348.225,00					
2.18			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	112,50	\$ 67.138,00	\$ 7.553.025,00		112,50	\$ 67.138,00	\$ 7.553.025,00					
2.19			RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	15,00	\$ 14.338,00	\$ 215.070,00		15,00	\$ 14.338,00	\$ 215.070,00					
2.20			LINEAS DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIJO	M	12.900,00	\$ 6.530,00	\$ 84.237.000,00		12.900,00	\$ 6.530,00	\$ 84.237.000,00					
2.21			SERIAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IX (75X60cm)	UN	75,00	\$ 600.865,00	\$ 45.064.875,00		75,00	\$ 600.865,00	\$ 45.064.875,00					
2.22			SERIAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), REFLECTIVO TIPO IX (1,25m X 0,45m)	UN	25,00	\$ 644.272,00	\$ 16.106.800,00		25,00	\$ 644.272,00	\$ 16.106.800,00					
2.23			DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 9KM)	M3	10,50	\$ 87.838,00	\$ 922.299,00		10,50	\$ 87.838,00	\$ 922.299,00					
2.24			RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHO 30CM, ANCHO 4.5CM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	150,00	\$ 291.274,00	\$ 43.691.100,00		150,00	\$ 291.274,00	\$ 43.691.100,00					
2.25			AFIRMADO	M3	1.800,00	\$ 126.951,00	\$ 228.511.800,00		1.800,00	\$ 126.951,00	\$ 228.511.800,00	130,00	16.503.630,00	130,00	\$ 16.503.630,00	0,31%
SUBTOTAL MANTENIMIENTO POR MONTO AGOTABLE							\$ 1.600.498.757,00				\$ 1.600.498.757,00		\$ 16.503.630,00		\$ 16.503.630,00	0,31%
SUBTOTAL							\$ 1.600.498.757,00				\$ 1.600.498.757,00		\$ 16.503.630,00		\$ 16.503.630,00	0,31%
TOTAL							\$ 5.216.824.773				\$ 5.216.824.773		\$ 345.121.451		\$ 1.628.096.783,00	30,54%
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO							\$ 58.975.000,00				\$ 58.975.000,00		\$ 3.818.703		\$ 15.171.614	0,28%
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL							\$ 54.161.192,00				\$ 54.161.192		\$ 3.524.418		\$ 18.441.058	0,35%
VALOR TOTAL							\$ 5.329.960.965,00				\$ 5.329.960.965,00		\$ 352.464.572,00		\$ 1.661.619.455	31,18%



RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO					
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.					
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES		AIU	TOTAL PRESENTE MES	
FEBRERO	\$	193.118.540,31	\$	63.729.118,30	\$ 256.847.659,00
MARZO	\$	200.301.843,00	\$	66.099.608,00	\$ 266.401.451,00
ABRIL	\$	318.146.113,21	\$	104.988.217,36	\$ 423.134.331,00
MAYO	\$	272.760.483,00	\$	90.010.959,00	\$ 362.771.442,00
JUNIO	\$	265.010.956,39	\$	87.453.616,00	\$ 352.464.572,00
*					
*					
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$	265.010.956,39	\$	87.453.616,00	\$ 352.464.572,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	\$	5.329.960.965,00		% ejecución
VALOR ADICIÓN No. Xx	\$	-		
ANTICIPO	\$	723.265.203,00		13,6%
ACTA 1	\$	256.847.659,00		4,82%
AMORTIZACION ACTA 1	-\$	51.369.532,00		-0,96%
ACTA 2	\$	266.401.451,00		5,00%
AMORTIZACION ACTA 2	-\$	53.280.290,00		-1,00%
ACTA 3	\$	423.134.331,00		7,94%
AMORTIZACION ACTA 3	-\$	84.626.867,00		-1,59%
ACTA 4	\$	362.771.442,00		6,81%
AMORTIZACION ACTA 4	-\$	72.554.288,00		-1,36%
ACTA 5	\$	352.464.572,00		6,61%
AMORTIZACION ACTA 5	-\$	70.492.914,00		-1,32%
SALDO A FAVOR DEL ICCI	\$	3.277.400.198,00		61,49%
SUMAS IGUALES	\$	5.329.960.965,00	\$ 5.329.960.965,00	100%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$	281.971.658	VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			

OBSERVACIONES

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

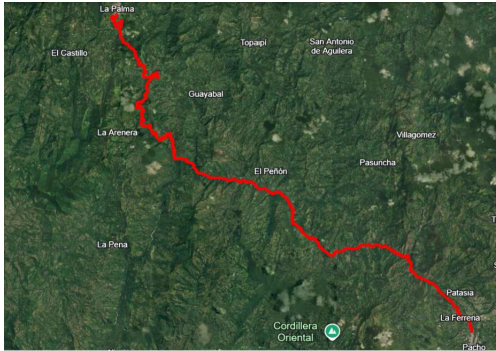
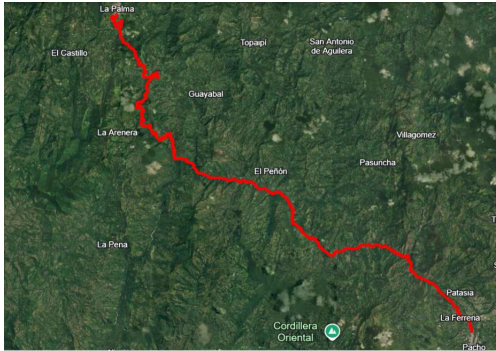
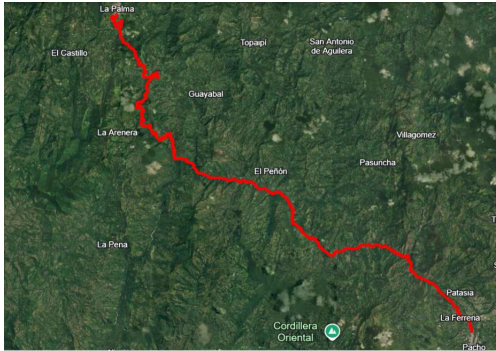
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Firma: 
Nombre: MARIA YESSICA SARMINETO MEZA
Representante Legal
Interventor: GS Vias y Estructuras S.A.S.

Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.

	AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO	 INSTITUTO CAROLINO Y CONSTRUCCIONES CUNDINAMARCA Gobernación de Cundinamarca																																																			
OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."																																																					
FECHA:	30/06/2026	CONTRATO: ICCU-CTO-1596-2025																																																			
CONTRATISTA:	V&M INGENIERIA SAS	INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S																																																			
CORREDOR VIAL	PACHO (Zipaquira - Pacho - La Palma)	ACTIVIDAD: Rocería - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas																																																			
No. ITEM PRESUPUESTO:	1	DESCRIPCION DEL ITEM: MANTENIMIENTO RUTINARIO																																																			
UND	KM/MES																																																				
<table><tr><th>LOCALIZACIÓN</th><th colspan="2">DIMENSIONES</th><th>LONGITUD</th><th>UNIDAD</th><th>TOTAL</th><th>FOTOS</th></tr><tr><td></td><td>Inicio</td><td>Fin</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CHARCO LARGO – LA PALMA</td><td>PR 76 +000</td><td>PR 93 +000</td><td>17,00</td><td>KM</td><td>17,00</td><td rowspan="10"></td></tr><tr><td>GUANACAS – CHARO LARGO</td><td>PR 0 +000</td><td>PR 5 +350</td><td>5,35</td><td>KM</td><td>5,35</td></tr><tr><td>PUENTE CAPITÁN – GUANACAS</td><td>PR 5 +350</td><td>PR 30+000</td><td>24,65</td><td>KM</td><td>24,65</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Localización del corredor</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>47,00</td></tr></table>			LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL	FOTOS		Inicio	Fin					CHARCO LARGO – LA PALMA	PR 76 +000	PR 93 +000	17,00	KM	17,00		GUANACAS – CHARO LARGO	PR 0 +000	PR 5 +350	5,35	KM	5,35	PUENTE CAPITÁN – GUANACAS	PR 5 +350	PR 30+000	24,65	KM	24,65							Localización del corredor						TOTAL					47,00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL	FOTOS																																															
	Inicio	Fin																																																			
CHARCO LARGO – LA PALMA	PR 76 +000	PR 93 +000	17,00	KM	17,00																																																
GUANACAS – CHARO LARGO	PR 0 +000	PR 5 +350	5,35	KM	5,35																																																
PUENTE CAPITÁN – GUANACAS	PR 5 +350	PR 30+000	24,65	KM	24,65																																																
																																																					
Localización del corredor																																																					
TOTAL					47,00																																																
<div>Elabora EL CONTRATISTA: Firma: _____ Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ Elabora: DIRECTOR DE OBRA</div> <div>Aprobó LA INTERVENTORIA Firma: _____ Nombre: ING. ALEJANDRA CASTAÑO VASQUEZ Aprobo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA</div>																																																					



AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."



FECHA: 30/06/2026

CONTRATO: ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL AMOLADERO (Guasca- Gacheta- Ubalá- Gachala)

ACTIVIDAD Rocería - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO:

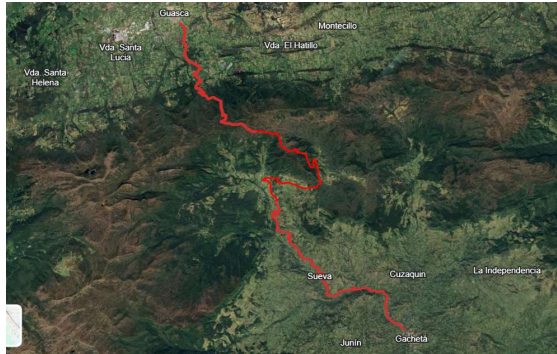
1

DESCRIPCION DEL ITEM:

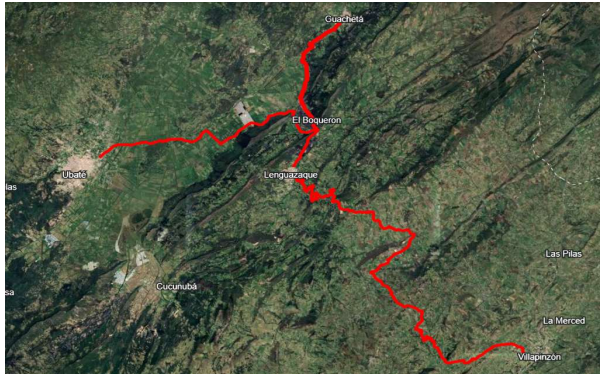
MANTENIMIENTO RUTINARIO

UND

KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL	FOTOS
	Inicio	Fin				
GUASCA - SUEVA - SAN ROQUE- GACHETA	PR 0+000 PR 45+000	PR 33+000 PR 46+700	34,7	KM	34,7	
GACHETA – RAMAL	PR 46+700	PR 49+200	2,5	KM	2,5	
RAMAL - UBALÁ	PR 49+200	PR 71+500	22,3	KM	22,3	
SAN ROQUE - JUNÍN	PR 0+000	PR 8+410	8,41	KM	8,41	
TRAMO GAMA	PR 0+000	PR 11+500	11,5	KM	11,5	
						
Localización del corredor						
TOTAL					79,41	

Elabora
EL CONTRATISTA:Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elabora: DIRECTOR DE OBRAAprobó
LA INTERVENTORIA
Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
Aprobó: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

	AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO		 					
OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."								
FECHA:	30/06/2026	CONTRATO:	ICCU-CTO-1596-2025					
CONTRATISTA:	V&M INGENIERIA SAS		INTERVENTORIA:	GS Vias y Estructuras S.A.S				
CORREDOR VIAL	La Balsa (Ubate- Guacheta- Lenguazaque- Villapinzon)		ACTIVIDAD	Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas				
No. ITEM PRESUPUESTO:	1	DESCRIPCION DEL ITEM:	MANTENIMIENTO RUTINARIO	UND	KM/MES			
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL	FOTOS	
		Inicio	Fin					
EL BOQUERÓN - GUACHETÁ		PR 0+000	PR 7+690	7,69	KM	7,690	 12 jun 2025 9:14:44 a.m. pr 4+150 Ubaté Lenguazaque Troncal 1 Mantenimiento rutinario CTO/INVCU 1596-2025	
EL BOQUERÓN LENGUAZAQUE		PR 16 +080	PR 16+620	0,54	KM	0,540	 12 jun 2025 4:27:29 p.m. pr 11+100 Ubaté Lenguazaque Troncal 1 Mantenimiento rutinario CTO/INVCU 1596-2025	
LENGUAZAQUE – VILLAPINZÓN		PR 17 +890	PR 45+080	27,19	KM	27,190	 12 jun 2025 8:32:51 a.m. pr 2+080 Ubaté Lenguazaque Troncal 1 Mantenimiento rutinario CTO/INVCU 1596-2025	
							 12 jun 2025 7:27:26 a.m. pr 3+400 Ubaté Lenguazaque Troncal 1 Mantenimiento rutinario CTO/INVCU 1596-2025	
							 6 jun 2025 8:36:32 a.m. pr 3+400 Ubaté Lenguazaque Troncal 1 Mantenimiento rutinario CTO/INVCU 1596-2025	
							 12 jun 2025 4:04:27 p.m. pr 13+100 Ubaté Lenguazaque Troncal 1 Mantenimiento rutinario CTO/INVCU 1596-2025	
Localización del corredor								
				TOTAL		35,42		
Elabora EL CONTRATISTA:		Aprobó LA INTERVENTORIA						
								
Firma:		Firma:						
Nombre:		Nombre:						
Elabora		Aprobo						
ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ DIRECTOR DE OBRA		ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA						



AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."



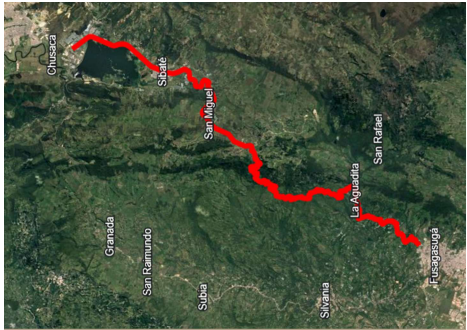
FECHA: 30/06/2026
CONTRATO: ICCU-CTO-1596-2025

CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S

CORREDOR VIAL: SAN MIGUEL (Chusaca- Sibate- Fusagasuga- Pasca)
ACTIVIDAD: Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas

No. ITEM PRESUPUESTO: 1
DESCRIPCION DEL ITEM: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UND: KM/MES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL	FOTOS
	Inicio	fin				
Fusagasuga - Pasca	PR 0+000	PR 9+600	9,60	KM	9,60	    
Chusaca - Sibate - Fusagasuga	PR 0+000	PR 21+900	21,90	KM	21,90	
TOTAL					31,50	



Localizacion del corredor

Elaboro
EL CONTRATISTA:






Firma:
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Elaboro: DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
LA INTERVENTORIA

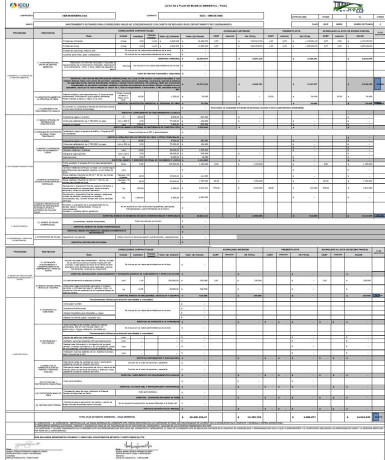


Firma:
Nombre: ING. ALEJANDRO CASTRO VASQUEZ
Aprobo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

	AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO							
OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."								
FECHA: 30/06/2026		CONTRATO: ICCU-CTO-1596-2025						
CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS		INTERVENTORIA: OS Vías y Estructuras S.A.S						
CORREDOR VIAL: Nuevo Salto (Chusaca- El Colegio- Viota el Portillo)		ACTIVIDAD: Roceria - Limpieza de señales - Limpieza de alcantarillas- Limpieza de cunetas						
No. ITEM PRESUPUESTO: 1		DESCRIPCION DEL I	MANTENIMIENTO RUTINARIO					
UND		KM/MES						
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		LONGITUD	UNIDAD	TOTAL	FOTOS	
		Inicio fin						
TRAMO 1								
Chusaca- Viota el portillo		PR 11+550 PR 16+800		5,25	KM	5,25		
Ramal - Pin la Victoria		PR 0+000 PR 6+000		6,00	KM	6,00		
Chusaca- Viota el portillo		PR 0+000 PR 6+100		6,10	KM	6,10		
TRAMO 2								
Chusaca- Viota el portillo		PR 29+100 PR 30+460		1,36	KM	1,36		
Ramal - Pin la Victoria		PR 0+000 PR 13+640		7,64	KM	7,64		
Bellavista- Santandercito		PR 0+000 PR 1+500		1,50	KM	1,50		
Chusaca- Viota el portillo		PR 16+800 PR 22+300		5,50	KM	5,50		
TRAMO 3								
Chusaca- Viota el portillo		PR 33+050 PR 48+740		15,69	KM	15,69		
Avenida Medina		PR 0+000 PR 1+300		1,30	KM	1,30		
El Colegio- Río Bogotá		PR 0+000 PR 3+220		3,22	KM	3,22		
Chusaca- Viota el portillo		PR 30+460 PR 35+050		4,59	KM	4,59		
TRAMO 4								
Chusaca- Viota el portillo		PR 63+130 PR 71+540		8,41	KM	8,41		
Localización del corredor								
TOTAL						66,56		
Elaborado por: EL CONTRATISTA:		Aprobado por: LA INTERVENTORIA						
Firma: 		Firma: 						
Nombre: ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ		Nombre: ING. ALEJANDRA CASTRO CASCO						
Eltitular: DIRECTOR DE OBRA		Aprobado: DIRECTORA DE INTERVENTORIA						

	AREA TECNICA - MEMORIA DE CALCULO							 
OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."								
FECHA: 30/06/2026			CONTRATO: ICCU-CTO-1596-2025					
CONTRATISTA: V&M INGENIERIA SAS			INTERVENTORIA: GS Vías y Estructuras S.A.S					
CORREDOR VIAL La Balsa (Ubate- Guacheta- Lenguaque- Villapinzon)			ACTIVIDAD AFIRMADO					
No. ITEM PRESUPUESTO:	2,25	DESCRIPCION DEL ITEM: MANTENIMIENTO RUTINARIO					UND	M3
LOCALIZACIÓN	Abs		UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	FOTOS
	Inicio	fin						
Via Ubate- Guacheta - Lenguaque	PR 2+300	PR 2+700	M3	400,00	6,50	0,05	130,00	        
			TOTAL			130,00		
<div><div><p>Elaboro</p><p>EL CONTRATISTA:</p><p>Firma:</p><p>Nombre:</p><p>Elaboro</p></div><div><p>ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ</p><p>DIRECTOR DE OBRA</p></div><div><p>Aprobó</p><p>LA INTERVENTORIA</p><p>Firma:</p><p>Nombre:</p><p>Aprobo</p></div><div><p>ING. ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ</p><p>DIRECTORA DE INTERVENTORIA</p></div></div>								

	ÁREA TÉCNICA - MEMORIA DE CÁLCULO	 
OBJETO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		
FECHA: 30/06/2026	CONTRATO: <u>ICCU-CTO-1596-2025</u>	
CONTRATISTA: <u>V&M INGENIERIA SAS</u> CORREDOR VIAL <u>LA BALSA, AMOLADERO, PACHO, SAN MIGUEL, NUEVO SALTO</u>	INTERVENTORIA: ACTIVIDAD	GS Vías y Estructuras S.A.S PAGA
No. ITEM PRESUPUESTO: 	DESCRIPCION DEL ITEM: 	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL
		UND GBL

LOCALIZACIÓN	UND	VALOR			TOTAL	FOTOS
PAGA mes de junio	GBL	\$ 3.524.418			\$ 3.524.418,00	
TOTAL					\$ 3.524.418,00	

Observacion: los soportes de cada uno de los ítems acá relacionados se encuentran dentro del informe mensual ambiental.

Elabora
EL CONTRATISTA:



Firma:
Nombre:
Elabora

ING. ISAIAS VARGAS GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

Aproba
LA INTERVENTORIA



Firma:
Nombre:
Aprueba

ING. ALVARO CASTRO VASQUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
