



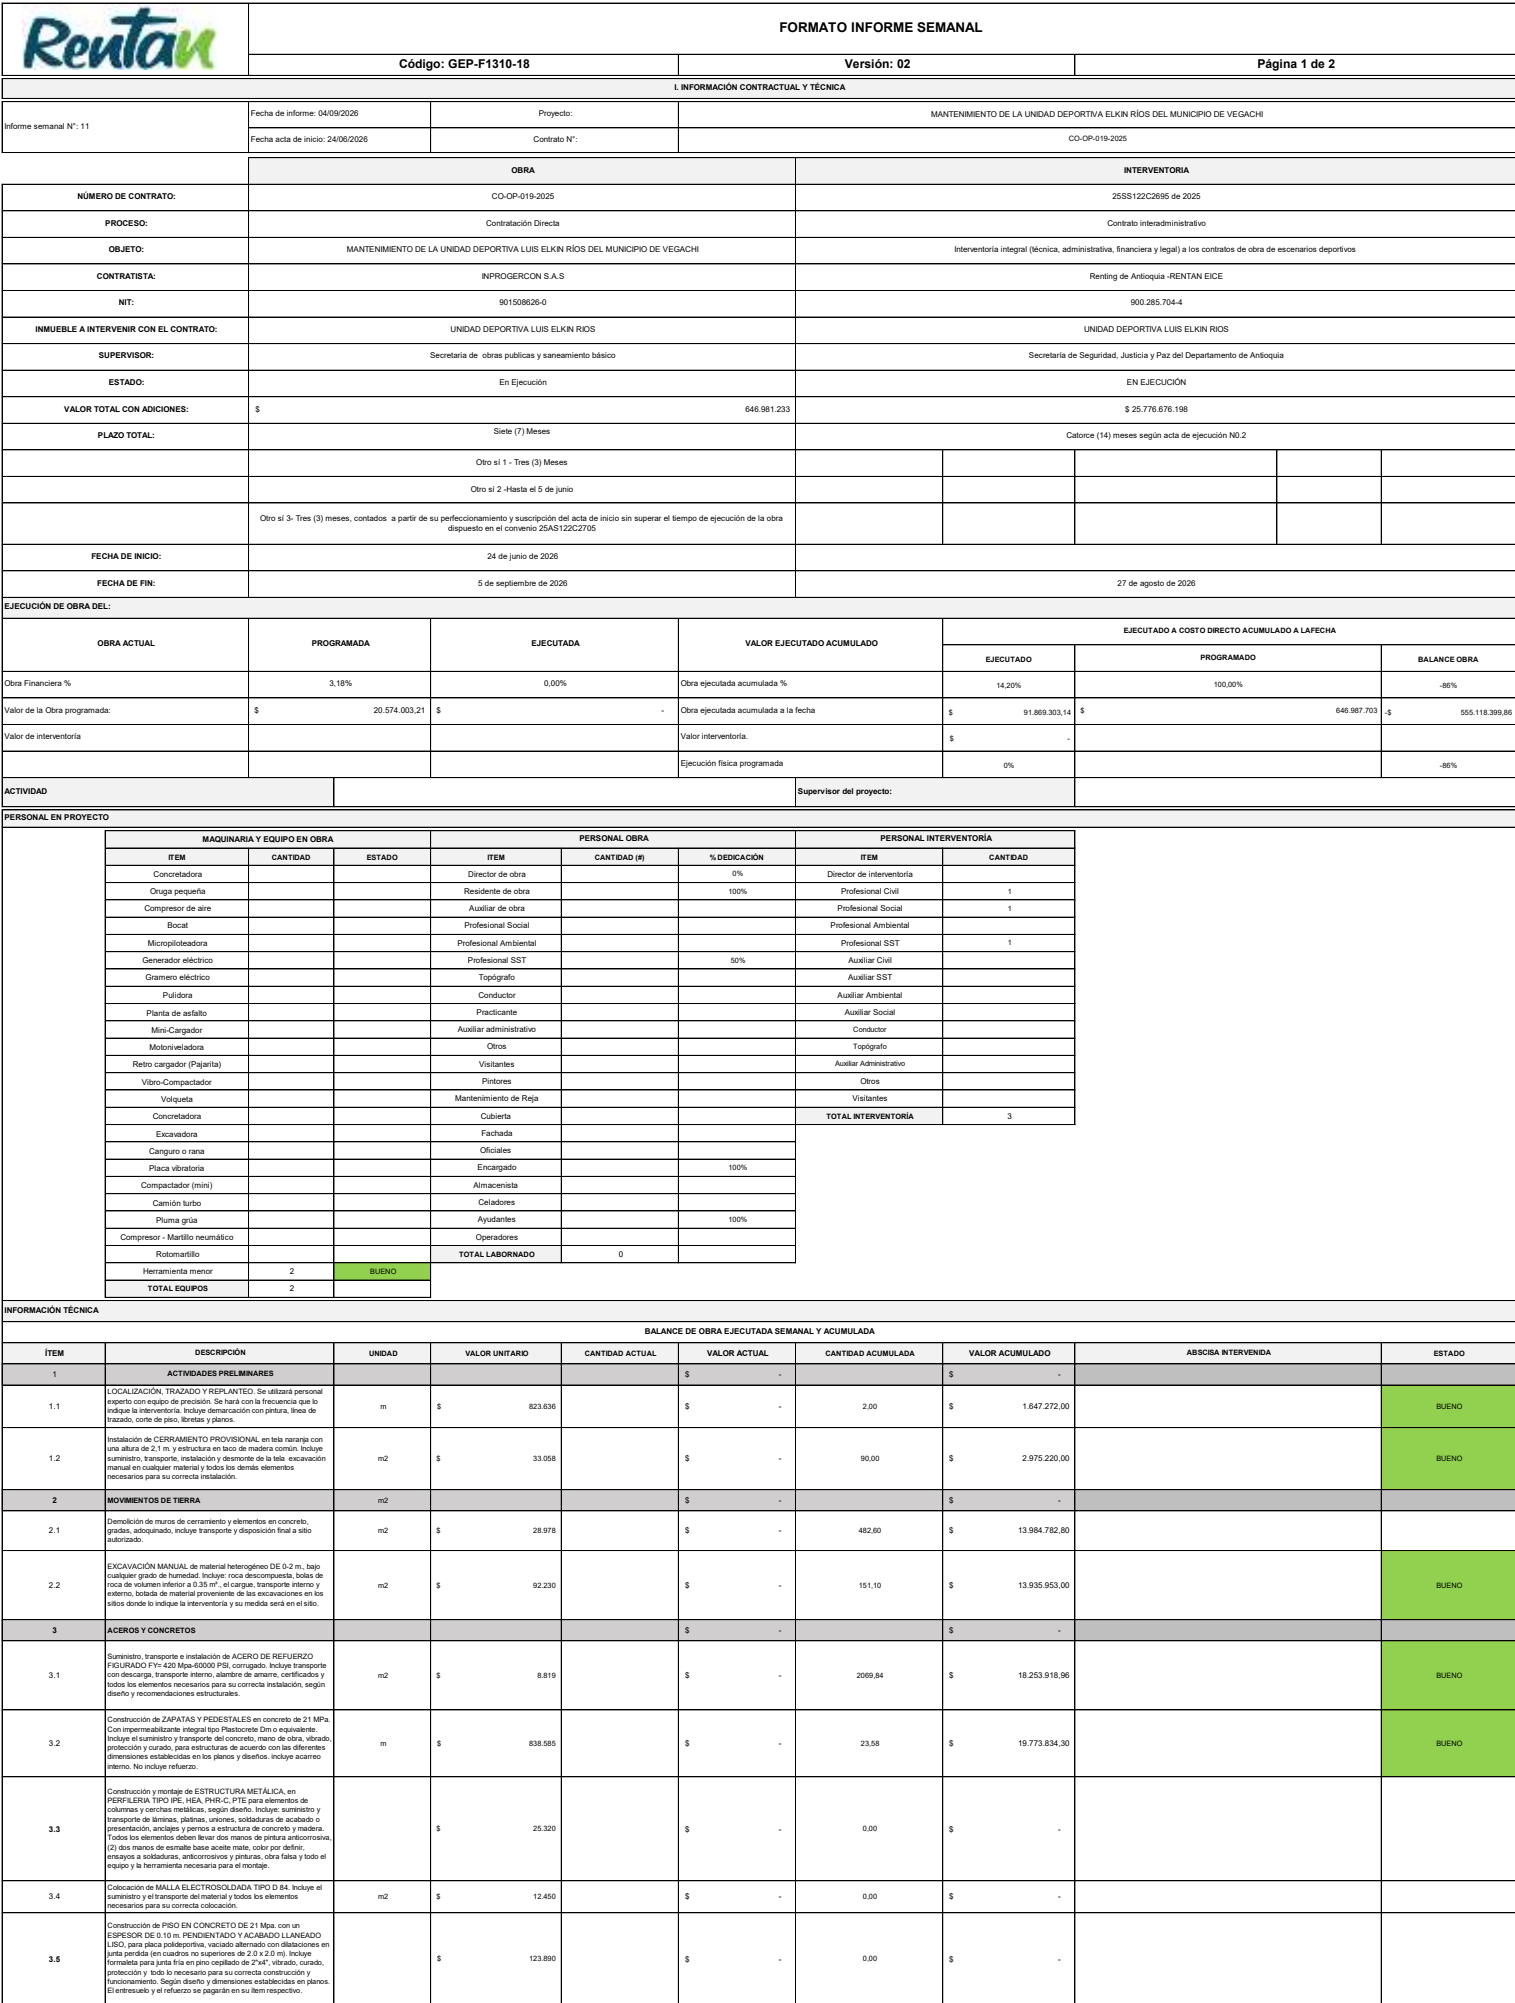


	CUBIERTA	m2	\$	-	\$ -		
4.1	Suministro, transporte y colocación de cubierta en Teja Termoaustica UPVC 2.0mm, incluye suministro de lamierilla de 2 y 3ª punta de broca y todo lo necesario para su correcta instalación, según diseño de cubierta.	m2	\$	113.769	\$ -	0.00	\$ -
4.2	Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo 1.00 m con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, bridas autopercutantes, anticonrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior e la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según Diseño de cubierta.		\$	98.694	\$ -	0.00	\$ -
4.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLADADA O LINA INJANTES con un DIÁMETRO DE 4" agua RESISTAL O LLUVIA, incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventista, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	\$	61.747	\$ -	0.00	\$ -
5	PINTURA Y DEMARCAACION	m2			\$ -		\$ -
5.1	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epoxico Incomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento anticorrosivos base agua reguladores adosada con arena de sílice; aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores requerimientos del cliente y demarcado de los juegos según la normativa.	m2	\$	63.300	\$ -	0.00	\$ -
5.2	Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (hidrorepelente) de primera calidad que cumple con la Norma NTC 1335, con selecto para poros tipo Sellamas+. Incluye pintura de superficie con grata, resaca de grietas y adecuación de la superficie a intervenir a satisfacción de la intervención. Color a definir aprobado por la intervención. Mínimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea.	m2	\$	-	\$ -	0.00	\$ -
					\$ -		\$ -
					\$ -		\$ -
					\$ -		\$ -
					\$ -		\$ -
					\$ -		\$ -
					\$ -		\$ -
					\$ -		\$ -
	Ejecución SEMANAL		\$	-		Ejecución ACUMULADA	\$ 70.570.981,06
	TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO		\$	-			\$ 70.570.981,06
	VALOR EJECUTADO + AU		\$	-		Ejecución ACUMULADA + AU	\$ 91.869.303,14



Observaciones: No se reportan actividades físicas durante este periodo, sin embargo el contratista manifiesta incertidumbre debido a que la administración municipal no le ha definido la adición de recursos de acuerdo a las cantidades mayores.
Se acuerda acta de suspensión de fecha de 04 de septiembre, por solicitud del contratista y concepto de viabilidad de la interventoría. Durante el periodo de suspensión el contratista debe gestionar ante la administración Municipal el ajuste en los diseños requeridos para el proyecto de la Paz II

II. GESTIÓN AMBIENTAL					
Fuentes de materiales			Permisos ambientales		
Ubicación:			Zonas de depósito:		
Permiso minero:					
Licencia ambiental:					
Ubicación:			Licencia ambiental:		El proyecto no requiere permisos
Permiso minero:			Aprovechamiento forestal:		El proyecto no requiere permisos
Licencia ambiental:			Ocupación de cauce:		El proyecto no requiere permisos
Ubicación:			Vertimientos:	(Protección de aguas)	El proyecto no requiere permisos
Permiso minero:			Emisiones (polvo, ruido mecánica):		El proyecto no requiere permisos
Licencia ambiental:			Concesión de aguas:		El proyecto no requiere permisos
Observaciones:			Ocupación de cauce:		El proyecto no requiere permisos
			Observaciones:		

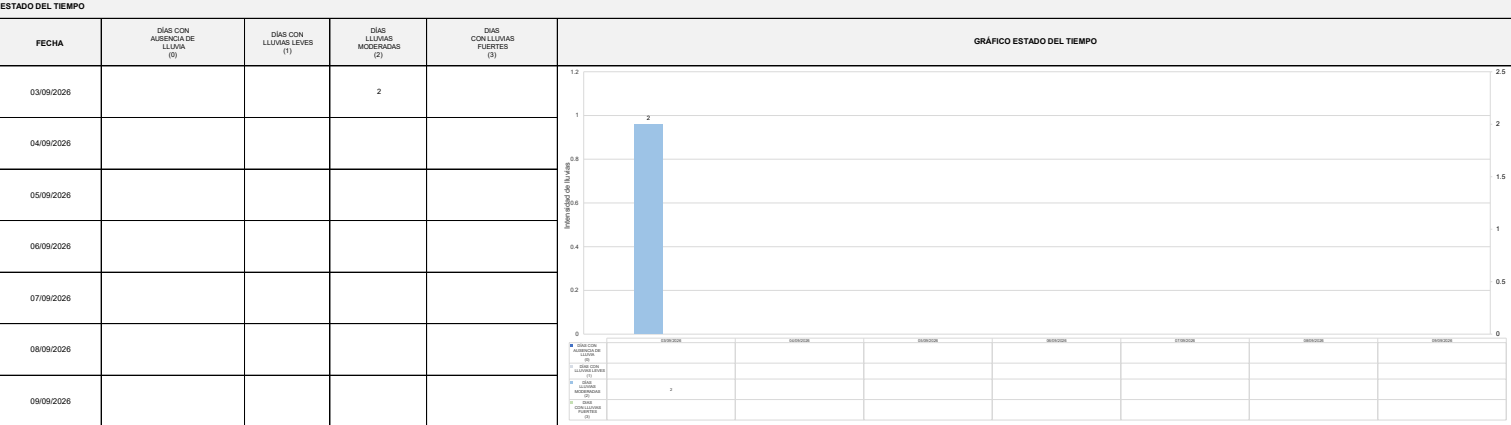


ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL:	
Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental:	Durante la visita de interventoría no se encontraban en ejecución actividades de obra. Se realizó un recorrido socioambiental en el área de influencia, verificando las condiciones del entorno y el estado del cerramiento en salirán, el cual se encuentra en buen estado y cumple con su función de protección y delimitación.
Actividades constructivas:	Durante la visita no se encontraban realizando actividades.
Gestión del recurso hídrico:	Durante la visita no se encontraban realizando actividades
Biodiversidad y servicios ecosistémicos:	No aplica para esta semana
Manejo de instalaciones temporales:	El contratista no cuenta con instalaciones temporales en la obra; dispone del arriendo de una habitación donde se encuentra el almacén de la obra.
Observaciones: Se le solicitó al contratista Durante el presente periodo, no se evidencio la realización de actividades por parte del contratista, en las visitas realizadas no se evidenció ejecución de actividades	

III. GESTIÓN SOCIAL				
Total empleos proyecto (contratista):	Mano de obra local: 0	Mano de obra foránea: 0	N° de socializaciones realizadas:	0
Empleos nuevos generados (última semana):	0		N° de capacitaciones realizadas:	0
Total actas de vecindad (última semana):	0		N° de inducciones realizadas:	0
Total actas de entorno (última semana):	0		N° de PQRSF atendidas:	0
Dirección punto de atención a la comunidad:	El Obra		Canales de atención a la comunidad virtual:	

Observaciones – Durante el presente periodo, no se evidencio la realización de actividades por parte del contratista, en las visitas realizadas no se evidenció ejecución de actividades

ACTIVIDADES GESTION SOCIAL:	
Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria y servicios públicos:	Durante la visita de interventoría se constató que el cerramiento perimetral de la obra se encuentra en buen estado, cumpliendo con su función de protección y delimitación del área de trabajo. Asimismo, se realizó recorrido social con el fin de verificar las condiciones del entorno y mantener comunicación directa con la comunidad vecina, garantizando atención oportuna a sus inquietudes y fortaleciendo el relacionamiento social.
Programa para el reconocimiento del entorno:	Hasta el momento no es necesario actualizaciones al acta de entorno. el contratista no se encuentra realizando actividades
Programa de contratación de mano de obra:	Durante la visita de seguimiento se evidenció que no estan realizando actividades.
Información y divulgación:	Durante la visita de interventoría se evidenció que la cartelera informativa comunitaria y el botón de sugerencias no se encontraban instalados, dado que actualmente no se adelantan actividades en la obra, se guardo por seguridad.
Atención a la comunidad e interesados en el proyecto:	Durante la visita de seguimiento se evidenció que no estan realizando actividades.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural:	No aplica para este proyecto.
Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria:	No aplica para este proyecto. ☐
Capacitación y participación comunitaria:	No reporta capacitaciones en la semana.

Foto 4.		Foto 5. Cerramiento en buen estado		Foto 6.	
					
Foto 6. Recorrido socioambiental interventoría		Foto 7. Recorrido socioambiental interventoría		Foto 8.	
Foto 9.		Foto 10.		Foto 11.	
Foto 12.		Foto 13.		Foto 14.	
Foto 15.		Foto 16.		Foto 17.	
IX. OBSERVACIONES					
					
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: CARLOS MAURICIO SOTOMAYOR PEREZ	NOMBRE:	NOMBRE: DORA TORRES ORTIZ		NOMBRE: SANDRA BENITEZ	
CARGO: PROFESIONAL TECNICO	CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL	CARGO: PROFESIONAL SOCIAL		CARGO: PROFESIONAL SST	
