














	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	10			
							Vigencia	12/03/2026			
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO											
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		6/10/2026		PERIODO REPORTADO DEL:			7/09/2026	AL:	6/10/2026		
CONTRATO N°		059-00-B-COFAC-BACOF-2026		CONTRATISTA		EFICIENCIA EN COORDINACIÓN E INSUMOS S.A.S					
OBJETO		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.									
FECHA DE INICIO		24/07/2026		FECHA DE TERMINACIÓN			30/11/2026				
VALOR INICIAL	\$ 789.894.434,00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0,00		VALOR TOTAL	\$ 789.894.434,00		
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES											
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 16 DE JULIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JULIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.560 47 994000200932 DE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA. NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 560-74-994000037984 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.											
3- CONTROL MODIFICATORIOS											
MODIFICATORIO No.1		31/07/2026									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN											
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO									
FORMA DE PAGO		30-08-2026 PRIMER CORTE - PAC OCTUBRE 2026 - PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30-08-2026. 30-09-2026 SEGUNDO CORTE - PAC NOVIEMBRE 2026 - SEGUNDO CORTE PARCIAL DE OBRA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30-09-2026 30-10-2026 TERCER CORTE - PAC DICIEMBRE 2026 - TERCER CORTE PARCIAL DE OBRA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30-10-2026 30-11-2026 CUARTO CORTE - PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR - CORTE FINAL DE OBRA									
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 789.894.434,00									
MODIFICATORIO No.2											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A									
FORMA DE PAGO		N/A									
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A									
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA											
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		CONCRETO	1			RESIDENTE	1	100	100	SI	
		PERFILERÍA METALICA	1	EQUIPO DE SOLDADURA	1	SISO	1	100	100	SI	
		PINTURA EPOXICA	8	COMPRESOR	1	OFICIAL	1	100	100	SI	
		BASE PRIMER	15			SOLDADOR	1	100	100	SI	
		PINTURA ACEITE	20			AYUDANTE	3	100	100	SI	
							TOTAL	5			
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN											

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA				
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	13,96%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 6 (11 SEPT)	5,00%	47,26%	35,00%	12,26%
Semana 7 (18 SEPT)	6,80%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO		
Semana 8 (25 SEPT)	7,30%	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		
Semana 9 (02 OCT)	7,00%			
Semana 10 (06-OCT)	7,20%			
CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS		
		GRÁFICO DE PORCENTAJE		
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			79,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			90,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			80,00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
6. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
7. CARPINTERÍA METALICA	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			4,00%
8. CARPINTERÍA MADERA	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
10. PINTURA	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			14,70%
11. CUBIERTA	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
12. ASEO	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			0,00%
6- PLAZO (DÍAS)		7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL		
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes	
Contractual	130	75	55	

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO			9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				Atribuir al contratista?	
<p>Durante el periodo objeto del presente informe, en el proyecto Casino La Vela, se desarrollaron diferentes actividades correspondientes a la etapa de construcción, en cumplimiento de la programación establecida y de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos de diseño y criterios de calidad definidos para el proyecto.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas se encuentra la fundida de vigas en concreto con resistencia especificada de 4.000 psi, empleando una mezcla con características de acelerado e impermeabilización, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos para los elementos estructurales. Previo a la colocación del concreto, desde la Residencia de Obra se efectuó la verificación de las condiciones de las formaletas, dimensiones, niveles, alineamientos, ubicación y disposición del acero de refuerzo, así como las condiciones generales requeridas para garantizar la correcta ejecución del elemento.</p> <p>A la fecha de corte del presente informe, en la edificación ESDEB se han ejecutado actividades correspondientes a la etapa de intervención y adecuación de la estructura de cubierta. Dentro de las labores desarrolladas se encuentra el desmonte de los cielorrasos existentes, el desmonte de la perfilera metálica estructural de la cubierta y el retiro de la cubierta existente, actividades ejecutadas de manera controlada y atendiendo las condiciones técnicas requeridas para garantizar la seguridad y estabilidad de los elementos intervenidos.</p> <p>De igual manera, se adelantó la instalación de la nueva perfilera metálica correspondiente al sistema estructural de la cubierta proyectada, de acuerdo con la configuración, características y criterios definidos para la nueva solución constructiva.</p>			Actividad atrasada				SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
OBSERVACIONES:								
10- CONTROL DE COSTOS								
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar			
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o Reducciones)	\$	%	\$	%		
Directos+AIU+IVA	\$ 789.894.434,00	\$ 789.894.434,00	\$ 373.304.109,51	47,26%	\$ 416.590.324,49	53%		
Adiciones	N/A	\$ 0,00						
Reducciones		\$ 0,00						
TOTAL	\$ 789.894.434,00	\$ 789.894.434,00						
11- CONTROL PAGOS								
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES				
VALOR INICIAL		\$ 789.894.434,00						
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00						
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0,00						
VALOR CORTE 1		\$ 109.964.596,57		De acuerdo a documentación de corte. Pendiente Pago PAC Octubre.				
VALOR TOTAL		\$ 789.894.434,00						
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 0,00						
12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)								
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	PROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES		
Entrega de estudios de seguridad	SI		SI	NO	SI	Se recibe documentación. Una vez se adelantan las revisiones previas, se determinan las novedades presentadas en los documentos. Se devuelven los documentos para realizar correcciones.		
Entrega de programación de obra	SI		SI	SI	SI	Se recibe la documentación ajustada posterior a la visita de campo.		
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES								
Se establece el agendamiento de comités de obra todos los viernes 11:00 hrs.								
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):								
Durante el lapso se han presentado fuertes lluvias en horas de la tarde y mañana								
ELABORO:								
<div> TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID Supervisor Firma y Posfirma</div>								
15- ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)								
<div></div>								



14 de septiembre de 2026 5:58 p.m.



14 de septiembre de 2026 5:58 p.m.



















18 de septiembre de 2026 3:32 p.m.



18 de septiembre de 2026 3:34 p.m.














Residente Obra


Supervisión.

Lunes 01 de septiembre del 2026.

Personal Obra.

Garita.

- 1 Ornamentador.
- 3 Oficiales Ornamentación.

Casina.

1 maestro Obra.

1 Oficial.

Administrativo.

1 Residente Obra.

1 Residente SIO.

Clima.

30.0° Soleado.

o Actividades.

Garita.

Se realizan procesos de cambio de piezas metálicas de la parte superior de la garita que figuran o cumplen su función de tránsito o piso, además o de realizar la primera base anticorrosiva de la estructura metálica.

o Polcorin.

Se realiza la primera base en epoxico azul al piso del primer a la polcorin.

o Plaza cubierta Centro Acuático.

Se continúan los procesos de excavación para la conformación de la cimentación de este espacio, no obstante existen interferencias en Redes que interfieren con las fundidas de zapatas.

Observaciones:

* Plaza cubierta Centro Acuatico.

Martes 02 de septiembre del 2026

Personal Obra

Barita

Clinica

1 Ornamentador

Soleado

2 Oficiales Ornamentación

Casino

1 Maestro Obra

1 Oficial

Administrativo

1 Residente Obra

1 Residente SISO

* Actividades

Barita


Se realizan actividades de aplicación de anticorrosivo y aplicación de masilla en la estructura metálica.


* Polvorin

Se Continúa con la aplicación de pintura epoxica al piso del polvorin.

* Plaza Cubierta Centro Acuatico

Se continúan los procesos de excavación y amarre de hierro para la cimentación de este, pendiente mesa de trabajo.


Residente Obra


Supervisión

Miercoles 3 de Septiembre del 2026

Personal Obra

Garita

2508 196 910m 1993 50 50 Climático

Presencia de lluvias

1 Ornamentador

2 Oficiales Ornamentador

Casino

1 maestro Obra

1 Oficial

Administrativo

1 Residente Obra

1 Residente Siso

Actividades

Garita:

Se continúan actividades de aplicación de anticorrosivo, masilla y limpieza de ella misma.

Polvorin

Se continúa con la aplicación de Pintura epoxica al piso del Polvorin

Plaza cubierta centro Acuatico

Continúan procesos de excavación y amarre de hierro para la cimentación de este.

Residente obra

Supervisión

2 910m 1993

1993 50 50

Jueves 4 de Septiembre del 2026

Personal Obra

Barita

Clima: nublado

1 Ornamentador

2 Oficiales Ornamentación

Casino

1 Maestro Obra

1 Oficial

Administrativo

1 Residente Obra

1 Residente SISO

Actividades

Barita


Se realizan actividades de aplicación de anticorrosivo, masilla, limpieza y lijado de ella misma.


Polvorin

Se continúa con la aplicación de Pintura epoxica al piso del Polvorin, actividades de limpieza.

Plazo Cubierta Centro Acuatico

Se adelantanta y continúa el proceso de excavación manual y amarre de hierro para la cimentación de este mismo.


Residente Obra


Supervisión

Viernes 05 de Septiembre del 2026

Personal Obra

Garita: ornito

chimias

1 Ornamentador

presencia de lluvias

2 Oficiales Ornamentador

Casino

1 Maestro de Obra

1 Oficial

Administrativo

1 Residente Obra

1 Residente SISO

Actividades

Garita

Se adelantaron actividades de aplicación de masilla en el area de garita.


Polvorín


Se realizaron actividades de anclaje de hierro

Plaza Cubierta Centro Acuatico

Se realiza aplicación de pintura epoxica al piso del polvorín

Observaciones: Las actividades fueron limitadas por presencia de lluvias intermitentes.


Residente Obra


Supervisión

Sábado 05 de Septiembre del 2026

Personal Obra

Garita

Clima:

1 Ornamentador

Soleado

2 Oficiales Ornamentador

Casino

1 maestro de obra

1 Oficial

Administrativo

1 Residente obra

1 Residente SISO

Actividades

Garita


Se inicia actividades de aplicación de pintura por un
Castado de la Garita Metálica.


Polvorín

Se finaliza la aplicación de pintura epóxica del área del
Polverín, Zona 1

Plaza Cubierta Centro Arcuático

Se realizan actividades de amarrado de hierro y continuación
de actividades de excavación para la cimentación.


Residente Obra


Supervisión

Domingo 27 de septiembre

Personal Obra

Barita

- 1 Ornamentador
- 2 Oficiales Ornamentador

Casino

- 1 Maestro de Obra
- 1 Oficial

Administrativo

- 1 Residente Obra
- 1 Residente SISO

Actividades

Barita


Se realizaron actividades de aplicación de pintura y aplicación de masilla.


Plaza Cubierta Centro Acuático:

No se realizaron actividades

Observaciones

Las actividades fueron limitadas por presencia de lluvias intermitentes


Residente Obra


Supervisión

Lunes 07 Septiembre 2026.

Personal Obra.

Garita.

1 Ornamentador.

2 Oficiales Ornamentación.

Casino.

1 maestro Obra.

2 Oficiales Obra.

Administrativo.

1 Residente Obra.

1 Residente sol.

Clima.

Soleado.

Actividades.

Garita.

Se continúan los procesos de pintura sobre la estructura.


Plaza cubierta.


- Se continúan los procesos de excavación, para el armado de la estructura.

Observaciones:

Plaza cubierta:

- Durante el proceso de excavaciones, se encontraron diferentes interferencias de redes que afectan los recorridos de ugos y zapatas, entre las redes que se encontraron se identifican como críticas, las redes hidráulicas, eléctricas, comunicaciones, gas y agua potable.


Residente Obra


Supervisor.

martes 08 de septiembre 2026.

Personal obra

Grita:

- 1 Ornamentador.
- 2 Oficiales Ornamentadores.

Casino.

- 1 maestro.

- 2 Oficiales.

Administrativos.

- 1 Residente Obra.

- 2 Oficiales Residente sol.

Clima.

- Soleado.


Actividades.


Grita: se continúan los procesos de pintura, en el ala norte de la estructura.

Plaza cubierta: se continúan los procesos de excavaciones, como ampliación de este espacio.

Observaciones:

Plaza cubierta: una vez realizados los procesos de balanceo de esta zona, se identifica que debe realizarse un cambio de diseño en el área de cimentación, contemplando mampostería estructural, como consolidación del relleno a implementar.


Residente Obra


Supervisor.

miércoles 09 de Septiembre 2026.

Personal Obra:

Garita:

- 1 maestro Ornamentador.
- 2 Oficiales Ornamentadores.

Plaza cubierta:

- 1 maestro
- 2 Oficiales.


Administrativo.


- 1 Residente Obra.
- 1 Residente sot.

Actividades.

Plaza cubierta:

- se agren adelantando excavaciones, en esta arza, se presentan dificultades debido alas interferencias de redes que pasan por la ubicación de las zapatas.


Residente Obra


Supervisor

Jueves 10 - Septiembre 2026

Personal Obra

Es:BO

1 ornamentador

2 Oficiales ornamentadores

Clima:

Soleado

Casino

1 maestro

2 Oficiales Agua

Administrativo

1 Residente Obra

1 Residente SST


Actividades


Es:BO

Se inician actividades de desmontajes de cielo raso PVC y estructura metálica.

Casino

Se sigue adelantando actividades de excavación manual para fundida de zapatas.


Residente Obra


Supervisor

Viernes 11 Septiembre 2025 - 9:00 - 51 observados

Personal Obra

comido

ESBED

1 ornamentador

2 oficiales ornamentadores

: 03/02/25

Clima:
Soleado

Casino

1 Maestro

2 Oficiales Aox

: 01/12/25

Administrativo

1 Residente Obra

1 Residente SST

: 01/12/25

Actividades

: 01/12/25


ESBED


: 03/02/25

Se inician actividades y continuación de desmontaje de Cielo Vazo en PVC y estructura metálica.

CASINO

Se continúan actividades de excavación manual para fundidas de zapatas, instalación de fleiro y amarre.


RESIDENTE OBRA


SUPERVISOR

Sábado 12 - Sep - 2016

Personal obra

Clima:

Despejado

ESBEO:

1 Ornamentador

2 Oficiales ornamentadores

Casino:

1 maestro

2 Oficiales Aux

Administrativo

1 Residente obra

1 Residente SISO


Actividades


ESBEO

Se inician actividades de Cielo raso, desmontaje PVC
Pintura de estructura Metálica.

CASINO

Se continúan actividades de excavación manual para
fundida de zapatas, Amarre de hierro.


RESIDENTE OBRA


SUPERVISOR

Lunes 14 - Sep 2016

Personal Obra

Clima: 9

Ami

Soleado

ESBO

1 Ornamentador

2 Oficiales ornamentadores

Casino:

1 maestro

2 Oficiales Aux

Administrativo:

1 Residente Obra

1 Residente ISO

Administrativo


Actividades:


ESBO

Se Continúan actividades de destecho y desmontaje de
tejas, pintura a estructura Metálica.

CASINO

Se Continúan actividades de excavación manual
Para fundida de zapatas. Anclaje de hierro.


RESIDENTE OBRA


SUPERVISOR

Martes 16-Sep-2026 (15-09/2026) 996-PI 23000

Personal Obra

15:40 15:00/2300

Clima:

05 Soleado

ESBEN

1 ornamentador

2 Oficiales ornamentadores

: 0116:00

Casino

1 Maestro

2 Oficiales Axil

: 0116:00/2300

Administrativo:

1 Residente Obra

1 Residente SISO

: 2300/2300

Actividades

02:00:00


ESBEN

Se continúan actividades de desmontaje de techos y pintura a estructura metálica.


0116:00

CASINO

Se Continúan con actividades de excavación y amarre de hierro.


Residente Obra

A-980


Supervisor

Microles 17-sep-2026 (16-09-2026)

Personal Obra

dima:

ESBED

03 Coleado

1 Ornamentador

2 Oficiales ornamentadores

CASINO

1 maestro

2 Oficiales Aux

ADMINISTRATIVO:

1 Residente obra

1 Residente SISU


Actividades


ESBED

Se continúan actividades de pintura a estructura metálica y desmontaje de teja.

CASINO

Se avanza y continúan actividades de amarrado de hierro y excavación manual.


Residente Obra


Supervisor

Jueves 18 - Sep - 2026 (17-09-2026) 25/09/26

Personal Obra

Comis

ESBED

- 1 ornamentador
- 2 Oficiales ornamentadores

Sleado

CASINO

- 1 maestro
- 2 Oficiales Aoxl

Administrativo:

- 1 Residente Obra
- 1 Residente Siso


Actividades


ESBED:

Actividades de soldadura y union estructura metalica para montaje y Pintura.

CASINO:

Se avanza excavacion manual para cimentacion de zapatas. Encofrado para fundido


Residente Obra


Supervisor

viernes 14 - sep 2026 (18-09-2026)

Personal Obra

ESDED

Soleado

1 ornamentador

2 Oficiales Ornamentadores

CASINO

1 maestro

2 Oficiales Auxl

ADMINISTRATIVO

1 Residente Obra

1 Residente SJO


ACTIVIDADES:


ESDED:

Actividades de desmontaje de techos y soldadura en estructura para montaje y pintura.

CASINO:

Se inicia fundida y cimentación de las zapatas en las áreas encapadas.


Residente Obra


Supervisor

Sábado 20 - Sep - 2026 (19-09-2026) 23:15:17

Personal Obra

Wido Landelima:

Soleado

ESBED

1 Ornamentador

2 Oficiales ornamentadores


Administrativo


1 Residente obra

1 Residente SISO

Actividades

ESBED: Montaje de estructura metálica (vigas)
pintura y desmontaje de techo.


Residente Obra


Supervisor

Lunes 22 - Sep 2026 (21-09-2026)

Personal Obra

Clima

Wido Sotelo

ESBED

1 Ornamentador

2 Oficiales Aux

Administrativo

1 Residente SISO

1 Residente Obra

CASINO

1 Maestro


2 Oficiales Auxl


Actividades

ESBED: se continúan con actividades de
Instalación de estructura Metálica y pintura.

CASINO:

Se realizan actividades de Amarrado de hierro y
Desenroscado de tapetas.


Residente Obra


Supervisor.

Martes 23 -09-2026 (22-09-2026)

Personal Obra

Clima:

Soleado

ESBED

1 Ornamentador

2 Oficiales Aux.

CASINO

1 Maestro

2 Oficiales Aux.

ADMINISTRATIVO

1 Residente Obra


1 Residente SIO


Actividades

ESBEO: Se continon realizando actividades de pintura y soldadura a estructura metálica.

CASINO:

Se realizan actividades de amarre de hierro y medidas de instalacion de Plafillas de hierro.


Residente Obra


Supervisor

Miércoles 24-06-2026 (20-09-2026)

Personal Obra

Clima:

ESBEO:

- 1 Ornamentador
- 2 Oficiales Auxl

Soleado

CASINO:

- 1 maestro
- 2 Oficiales Auxl

ADMINISTRATIVO:


- 1 Residente SISO
- 1 Residente Obra


Actividades

ESBEO: Instalacion de estructura metálica, instalacion de Plafinas y pintura.

CASINO

Se inician actividades de mampostería e instalación de hierro y marre.


Residente Obra


Supervisor

Jueves 28-08-2026 (24-09-2026)

Personal Obra

clima.

lluvias en la
mañana

ESBED

- 1 ornamentador
- 2 Ocrucles Auxl

Tarde soleada.

CASINO

- 1 maestro
- 2 Ocrucles Auxl

ADMINISTRATIVO


- 1 Residente Obra
- 1 Residente ESBD


Actividades

ESBED: Instalación de Platinas e instalación de estructura metálica, Continúan desmontaje de PVC.

CASINO:

Se continúan actividades de Mampostería y se inician actividades de relleno de material.


Residente Obra


Supervisor.

Viernes 25 septiembre 2026

Personal Obra.

Clima.

EODEB.

° Soleado.

1 Oromentador.

1 Oficial Oromentación.

Casino.

1 maestro obra.

2 oficiales.

Administrativo.

1 Residente Obra.

1 Residente OST.


Actividades.


° EODEB: se realiza el proceso de instalación de perfilería metálica como apoyos para la cubierta, generando apoyos horizontales y verticales.


° Casino Ueba: se continúan los procesos de relleno con material seleccionado, además se generan las primeras muestras para instalación de las platinas de anclaje, para apoyos de instalación de las columnas.


novedades:

- ° Se realiza reconocimiento en los diferentes puntos de intervención en cabeza del supervisor del contrato, el representante legal de la empresa, la coordinadora del proyecto, residente de obra y el arca sat, y verificar el avance del proyecto en cada punto vigilado.
- Por parte de la ejecución, se manifiesta que el día de hoy se recibe el avise frente al recurso que se asignará como ejecución del contrato.
- Por parte de la empresa, se manifiesta que se allegará un documento de maniobra para la intervención de las puertas del hogar donde se recalcarán procedimientos y requisitos para dichas intervenciones, incluidos tiempos y flujos como rutas críticas.


Carlos Guerra


Johanna Grass


Giovanni Pineda


Fe. Pineda

Sábado 26 de Septiembre

Personal Obra

ESBED

1 Ornamentador

1 Oficial Ornamentación

Casino

1 Maestro

2 Oficiales

Administrativos

1 Residente Obra

1 Residente SST

Actividades


ESBED

Se continúan actividades de instalación de perfilera metálica, como soportes para la cubierta.

Casino

Se realiza la instalación de Platinas de soporte para Columnas Metálicas, de igual manera se realiza fundido o Cimentación de piso y soportes metálicos.

Jonathan Venasco
Residente Obra


Supervisor

Lunes 28 de septiembre.

Personal Obra

ESBED

1 Ornamentador

1 Oficial Ornamentador

CASINO

1 Maestro

2 Oficiales

ADMINISTRATIVAS

1 Residente Obra

1 Residente SST

Actividades

ESBED


Se realizan y continúan actividades de instalación de perfilera metálica, como soportes para la cubierta.

CASINO

Se continúan actividades de instalación de soporteria metálica para instalación de columnas y laterales de la ampliación del Bar Lavela.

JHONATAN VELASCO

Residente obra


Supervisor

Martes 24 de septiembre

Personal obra

ESBEO

- 1 ornamentador
- 2 Oficiales ornamentación

CASINO

- 1 maestro
- 2 oficiales

Administrativos

- 1 Residente obra
- 1 Residente SST

Actividades


ESBEO

Se continúan actividades de instalación de platinas de soporte y columnas metálicas.

CASINO

se continúan actividades de instalación del perimetral metálico en ampliación de Bar Lavela.

JUANATA VELASCO
Residente Obra


Supervisor

Miércoles 30 de Septiembre

Personal obra

ESBEO

- 1 ornametador
- 2 Oficiales ornamentación

CASINO

- 1 Maestro
- 2 Oficiales

Administrativos

- 1 Residente obra
- 1 Residente SST

Actividades


ESBEO:

Se realizan actividades de instalación y desinstalación de PVC y instalación de plafones y periferia metálica

CASINO

Se realiza y continúa actividades de instalación y soldadura de periferia metálica y involucración de la ampliación Vela-Casino.

Jhonatan Velasco
Residente Obra


Supervisor.

INFORME DE OBRA No.2

31 de agosto al 30 de septiembre del 2026.

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO:

*“OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE
LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE*

CONTRATO NRO: 059-00-B-COFAC-BACOF-2026

CONINCAG SAS.

2026



CONINCAG

construcción | interventoría | consultoría

NIT 900934461-5

Calle 77 A No 73 - 36
Oficina 507

(57) 317 894 5464
conincag@gmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO.....	4
1.1. DATOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	6
1.2. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	7
1.1.....	7
1.3. DOCUMENTOS SUSCRITOS PARA EL INICIO DEL CONTRATO.....	7
1.2.....	7
2. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA.....	9
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL CONTRATO.....	9
2.2. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO PROGRAMADO VS EJECUTADO	12
2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS	12
3. INFORMACIÓN TÉCNICA	13
3.1. CONTROL DE PERSONAL.	13
3.2. BITÁCORA.....	13
3.3. CONTROL DE ENSAYOS.	13
3.4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.	13
3.5. COMITÉS DE OBRA Y/O VISITAS DE OBRA.	13
4. CONTROL PRESUPUESTAL	13
4.1. ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.....	13
4.2. MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA.	13
4.3. ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA.....	14
4.4. APUS ÍTEMS NO PREVISTO O COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE SOPORTE.....	14

1. INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad contextualizar el inicio y las condiciones generales de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 059-00-B-COFAC-BACOF-2026, suscrito el 16 de julio de 2026 entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la empresa Eficiencia en Coordinación e Insumos S.A.S., cuyo objeto corresponde a la ejecución de la obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare, ubicado en Yopal, Casanare.

De acuerdo con el Acta de Inicio, suscrita el 24 de julio de 2026, se deja constancia del inicio real y material de las actividades contractuales, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, entre ellos el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales correspondientes.

El contrato contempla un plazo de ejecución de tres (3) meses, sin sobrepasar el 30 de noviembre de 2026, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y presenta un valor contractual de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$789.894.434,00), incluido IVA, impuestos y gravámenes.

En este contexto, el desarrollo de las actividades deberá orientarse al cumplimiento de las condiciones, especificaciones, obligaciones y demás disposiciones establecidas en los documentos contractuales, procurando que las intervenciones previstas se ejecuten de manera técnica, organizada y dentro del plazo establecido. Para tal efecto, la supervisión realizará el seguimiento correspondiente al avance y desarrollo de las actividades, verificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y dejando constancia de los aspectos relevantes que se presenten durante la ejecución contractual.

De esta manera, el presente documento constituye un referente para el seguimiento de la ejecución del contrato, permitiendo establecer las condiciones iniciales bajo las cuales se desarrollarán las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare, así como facilitar la trazabilidad de los avances, situaciones y aspectos relevantes que se presenten durante el desarrollo de la obra.

CONTRATANTE	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATISTA	EFICIENCIA EN COORDINACIÓN E INSUMOS S.A.S
CONTRATO DE OBRA NO.	059-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 789.894.434,00) incluido IVA e impuestos y gravámenes
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, SIN SOBREPASAR EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE ACTA DE INICIO OBRA	16 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN OBRA	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
LUGARES DE EJECUCIÓN	YOPAL-CASANARE

1.1. DATOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en general se desarrolla en GRUPO AEREO DEL CASANARE- YOPAL.



1.2. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

1.1

El objeto del presente contrato de obra es “OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

1.3. DOCUMENTOS SUSCRITOS PARA EL INICIO DEL CONTRATO

1.2

Para la suscripción de inicio del contrato de obra se realiza entrega de los siguientes documentos:

1. Registro Presupuestal
2. APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
3. APROBACION DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
4. ACREDITACIÓN DEL CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.

- **Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.**

Los análisis de precios unitarios se encuentran revisados y aprobados, conforme a la propuesta contractual. La evidencia de su verificación está incluida en los documentos de supervisión y soportes anexos, asegurando coherencia entre programación y ejecución

- **Programa de Obra y flujo de inversiones**

El programa general de obra y flujo de inversiones se implementa y da seguimiento semanal por sede, con avance ejecutado que se evidencia en los informes de supervisión. La programación específica se respalda con los PDF firmados por supervisión, asegurando trazabilidad.

- **Plan de manejo ambiental y RCD.**

El plan de manejo ambiental y la gestión de RCD se encuentran implementados, con seguimiento continuo frente a cada sede y las respectivas entidades territoriales donde se realizan las intervenciones. La interventoría ha revisado y aprobado formalmente la implementación de este plan, confirmando que se cumplen las medidas de control ambiental y manejo de residuos de construcción y demolición conforme a lo estipulado en el contrato y la normativa vigente. La evidencia de ejecución y control se

encuentra registrada en los informes ambientales y en los formatos de interventoría, garantizando la trazabilidad y la correcta gestión de los aspectos ambientales sin necesidad de anexar los planes completos al informe.

- **Plan de seguridad y salud en el trabajo.**

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se encuentra implementado y en ejecución, conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y la normativa vigente, particularmente la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. La supervisión ha revisado y aprobado el plan, verificando que incluye los procedimientos, programas y medidas necesarias para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como la protección integral de los trabajadores, visitantes y terceros durante el desarrollo de las actividades contractuales. El contratista mantiene actualizado el cronograma de capacitaciones, la matriz de peligros, los procedimientos de trabajo seguro y los registros de inspección, garantizando el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad industrial y salud en el trabajo. La evidencia documental del cumplimiento del plan, incluyendo los reportes de inspección, inducción y seguimiento, se encuentra consolidada y disponible en los registros de supervisión y en el anexo técnico correspondiente, garantizando trazabilidad, control y la ejecución segura de las actividades en todas las sedes del contrato.

- **Acta de inicio del contrato**

El acta de inicio del contrato se encuentra formalmente suscrita y archivada, constituyendo evidencia del comienzo de la ejecución de las obras y actividades contractuales. La supervisión ha revisado y aprobado esta acta, certificando que todos los requisitos previos al inicio se encuentran cumplidos y que el contrato se encuentra en etapa operativa conforme a los términos establecidos.

- **Pólizas de cumplimiento, póliza de pago de salarios, póliza de estabilidad y calidad de la obra y póliza de responsabilidad civil extracontractual**

Todas las pólizas exigidas por el contrato se encuentran vigentes y aprobadas, asegurando cobertura frente a cumplimiento de obligaciones, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra, así como responsabilidad civil extracontractual. La supervisión ha verificado la validez y suficiencia de cada póliza, garantizando que la ejecución del contrato se realiza bajo condiciones de respaldo contractual y financiero, conforme a lo estipulado en el contrato.

2. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se presenta avance de obra programado del 12,66% vs un ejecutado del 13,92%.

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe, se evidencia la ejecución de actividades en tres (3) frentes de obra, correspondientes a las áreas del Polvorín, Garita y ampliación del Casino La Vela. Los trabajos se desarrollan de manera progresiva, atendiendo las condiciones particulares encontradas en cada frente y de conformidad con las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos y requerimientos de calidad establecidos para el proyecto.

1. Frente de obra – Polvorín

En el área correspondiente al Polvorín se culminan las actividades contempladas para su intervención, registrándose a la fecha un avance físico del 100 %. Las actividades ejecutadas comprenden los trabajos previstos en el alcance contractual, desarrollados de acuerdo con los procedimientos constructivos aplicables y las condiciones verificadas en campo.

Durante la ejecución se deberá garantizar el adecuado control de tiempos de aplicación de pinturas, dimensiones, alineamientos y demás parámetros geométricos requeridos, así como la correcta utilización de materiales e insumos, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y contar con las respectivas fichas técnicas y certificados de calidad cuando sean aplicables.

2. Frente de obra – Garita

En el frente correspondiente a la Garita se adelantan actividades de mantenimiento y recuperación de la estructura metálica existente, culminando con la preparación de las superficies mediante la eliminación de corrosión, óxido, pintura deteriorada y demás agentes contaminantes que puedan afectar la adherencia de los sistemas de protección.

Posteriormente, se realizó la aplicación de recubrimientos anticorrosivos, de acuerdo con el sistema especificado para la protección de los elementos metálicos. Previamente a su aplicación deberá verificarse que las superficies se encuentren debidamente preparadas, limpias, secas y libres de contaminantes, atendiendo las condiciones ambientales y los tiempos de aplicación, secado y curado establecidos en la ficha técnica del fabricante.

De igual manera, se adelantó la aplicación de masillas en aquellos elementos que requieren recuperación superficial, con el propósito de corregir irregularidades, discontinuidades y defectos localizados, garantizando posteriormente una superficie uniforme y adecuada para la aplicación de los acabados.

Así mismo, se realiza el cambio y/o reposición de piezas metálicas que presentan condiciones de deterioro, deformación, pérdida de sección o afectación que comprometa su funcionalidad. Los elementos nuevos deberán garantizar compatibilidad con la estructura existente y cumplir con las características dimensionales y mecánicas definidas para cada componente. Las uniones, soldaduras y elementos de fijación deberán ejecutarse bajo procedimientos adecuados, garantizando posteriormente su protección mediante el sistema anticorrosivo y de acabado correspondiente.

3. Frente de obra – Ampliación del Casino La Vela

Durante el periodo objeto del presente informe, en el proyecto Casino La Vela, se desarrollaron diferentes actividades correspondientes a la etapa de construcción, en cumplimiento de la programación establecida y de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos de diseño y criterios de calidad definidos para el proyecto.

Entre las principales actividades ejecutadas se encuentra la fundida de vigas en concreto con resistencia especificada de 4.000 psi, empleando una mezcla con características de acelerado e impermeabilización, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos para los elementos estructurales. Previo a la colocación del concreto, desde la Residencia de Obra se efectuó la verificación de las condiciones de las formaletas, dimensiones, niveles, alineamientos, ubicación y disposición del acero de refuerzo, así como las condiciones generales requeridas para garantizar la correcta ejecución del elemento.

Estas actividades se desarrollan bajo los criterios establecidos en la NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, particularmente en lo relacionado con los requisitos aplicables a elementos de concreto estructural, complementados con las especificaciones técnicas del proyecto y las disposiciones aplicables de las normas NTC 3318 – Concreto premezclado, NTC 550 – Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra y NTC 673 – Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, según corresponda a los controles de calidad previstos.

De igual manera, se adelantó la construcción del muro de cimentación en bloque estructural, verificando durante su ejecución aspectos relacionados con la correcta disposición, modulación, alineamiento, nivelación, verticalidad y conformación de las juntas, así como la adecuada integración del muro con los elementos de cimentación y demás componentes estructurales previstos en los diseños.

Asimismo, se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción de la placa en concreto, realizando desde la Residencia de Obra el seguimiento a la preparación del área, niveles, pendientes, espesores, disposición del acero de refuerzo y condiciones previas al vaciado, procurando que la ejecución se ajustara a los planos estructurales y arquitectónicos, las especificaciones técnicas y los criterios de calidad establecidos para el proyecto.

De manera complementaria, se avanzó en la fabricación, construcción y montaje de la perfilería metálica correspondiente a columnas y vigas del área arquitectónica del Casino La Vela. Para estas actividades se efectuó seguimiento a la correcta ubicación, alineamiento, verticalidad, nivelación y disposición de los elementos metálicos, así como a la ejecución de las uniones y condiciones de montaje requeridas, de conformidad con los planos y detalles estructurales aprobados.

El desarrollo de estas actividades se enmarca en los requisitos aplicables de la NSR-10, particularmente en los capítulos relacionados con estructuras de concreto y estructuras metálicas, así como en las especificaciones particulares del proyecto y demás normas técnicas aplicables a los materiales y procedimientos constructivos. Desde la Residencia de Obra se mantiene un seguimiento permanente a la ejecución, verificando que los trabajos se desarrollen conforme a los diseños aprobados, las cantidades y características establecidas contractualmente, los procedimientos constructivos y los parámetros de calidad exigibles.

Por otro lado, se realiza la construcción de alisado de piso en mortero impermeabilizado de 4cm, para garantizar la correcta nivelación y preparación de la superficie para recibir los acabados de piso duro.

En consecuencia, las actividades ejecutadas durante el periodo representan un avance en la consolidación de los componentes estructurales, de cimentación y arquitectónicos del proyecto, dando continuidad a la secuencia constructiva prevista y manteniendo el control técnico sobre los procesos desarrollados en obra.

4. Frente de obra – ESDEB

A la fecha de corte del presente informe, en la edificación ESDEB se han ejecutado actividades correspondientes a la etapa de intervención y adecuación de la estructura de cubierta. Dentro de las labores desarrolladas se encuentra el desmonte de los cielorrasos existentes, el desmonte de la perfilería metálica estructural de la

cubierta y el retiro de la cubierta existente, actividades ejecutadas de manera controlada y atendiendo las condiciones técnicas requeridas para garantizar la seguridad y estabilidad de los elementos intervenidos.

De igual manera, se adelantó la instalación de la nueva perfilería metálica correspondiente al sistema estructural de la cubierta proyectada, de acuerdo con la configuración, características y criterios definidos para la nueva solución constructiva.

Las actividades de desmontaje, adecuación e instalación de los nuevos elementos estructurales se han desarrollado conforme a los parámetros técnicos establecidos para el proyecto y a los conceptos y lineamientos impartidos por el ingeniero estructural diseñador, garantizando que la intervención se ejecute de acuerdo con las especificaciones y criterios de diseño establecidos para la nueva cubierta.

2.2. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO PROGRAMADO VS EJECUTADO

Se presenta el siguiente avance de obra por programado VS ejecutado a corte de la semana 1 de ejecución (31 DE AGOSTO DEL 2026)

VALOR TOTAL DEL FRENTE	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
\$ 789.894.434,58	\$ 268.599.999,64	\$ 345.406.107,90	34,00%	47,27%

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS

- 23/07/2026 – VISITA DE RECONOCIMIENTO
- 24/07/2026 – FIRMA DEL ACTA DE INICIO
- 31/07/2026 – ENVIO DE ALCATA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES VERSIÓN 1.
- 24/08/2026 – ENVÍO DE ALCATA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES VERSION 2.
- 25/08/2026 – MESA DE TRABAJO CON SUPERVISIÓN
- 26/08/2026 – RADICACION DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES V3.
- 27/08/2026 – INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
- 24/09/2026 – VISITA DE OBRA POR PARTE DE LA COORDINACION DE OBRA
- 25/09/2026 – VISITA DE OBRA POR PARTE DE LA RESPRESENTACION LEGAL Y SUPERVISON

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1. CONTROL DE PERSONAL.

Se presenta el listado del personal administrativo de obra, su documentación hace parte del a

RELACION DE PERSONAL	CANTIDAD DE PERSONAL	INGRESO
ADMINISTRATIVO	2	27 DE AGOSTO DEL 2026
OPERATIVO	5	27 DE AGOSTO DEL 2026

3.2. BITÁCORA.

Se presenta la bitácora de obra , **ver anexo.**

3.3. CONTROL DE ENSAYOS.

A la fecha no se ha requerido realizar ensayos a los materiales empleados en obra

3.4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

Ver anexo.

3.5. COMITÉS DE OBRA Y/O VISITAS DE OBRA.

Se presentan las actas de comité de obra como anexo **ver anexo.** y las actas de visita de obra **ver anexo.**

4. CONTROL PRESUPUESTAL

4.1. ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

Ver anexo.

4.2. MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA.

SE ANEXAN MEMORIAS DE CALCULO DEL ACTA PARCIAL N°2 CON SU RESPECTIVA GALERIA FOTOGRAFICA.

4.3. ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA.

Ver anexo.

4.4. APUS ÍTEMS NO PREVISTO O COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE SOPORTE

Se enviaron los APU de las 10 actividades No Previstas relacionadas en el balance de obra.

NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EN GRANIPLAST	m²
NP02	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE RESERVA CON MEMBRANA PVC NO TOXICA REFORZADA SIKAPLAN NTR TERMO SOLDADA DE 1MM DE ESPESOR, INCLUYE GEO TEXTIL, PERFILERÍA DE ANCLAJE.	m²
NP03	DESMONTE DE CIELO RASO EN PVC	m²
NP04	SELLADO DE DILATACIONES CON POLIURETANO	ml
NP05	RETIRO Y PODA DE ARBUSTOS, ALTURA SUPERIOR A 1M Y MENOR A 2M	ml
NP06	CONCRETO DE 4.000 PSI ACELERADO E IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m²
NP07	PLACA METALDECK COLABORANTE + IMPERMEABILIZANTE EN CONCRETO BOMBEABLE 4000 PSI	m²
NP08	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE SUB BASE GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO	m²
NP09	MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL	m²

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN Residente de Obra Firma y Posfirma	TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY Residente Supervisor Firma y Posfirma

ANEXO

Registro fotográfico



EXCAVACIONES EN EL CASINO



SOLADO DE LIMPIEZA EN EL CASINO



FORMALETA Y FIGURADO DE ACERO LA VELA



FORMALETA Y FIGURADO DE ACERO LA VELA



INSTALACION DE MALLA Y CONCRETO POBRE
LA VELA



GROUTING PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL



MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA RELLENO
DEL CASINO LA VELA



SOLADOS DE LIMPIEZA CASINO LA VELA



FUNDIDA DE PLACA 12 CM



INSTALACION PERFILERIA METALICA



COMPACTACION DE TERRENO



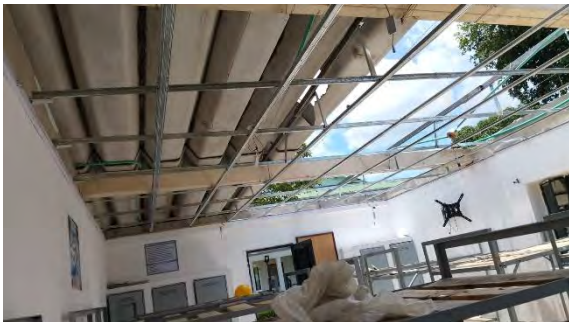
COMPACTACION DE TERRENO



INSTALACION DE LA NUEVA PERFILERIA METALICA PARA LA CUBIERTA DEL ESDEB



INSTALACION DE LA NUEVA PERFILERIA METALICA PARA LA CUBIERTA DEL ESDEB



INSTALACION DE LA NUEVA PERFILERIA METALICA PARA LA CUBIERTA DEL ESDEB



INSTALACION DE LA NUEVA PERFILERIA METALICA PARA LA CUBIERTA DEL ESDEB



INSTALACION DE LA NUEVA PERFILERIA METALICA PARA LA CUBIERTA DEL ESDEB



INSTALACION DE LA NUEVA PERFILERIA METALICA PARA LA CUBIERTA DEL ESDEB



CONINCAG

construcción | interventoría | consultoría

NIT 900934461-5

Calle 77 A No 73 - 36
Oficina 507

(57) 317 894 5464
conincag@gmail.com

1. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL HSE N° 2
PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS
INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE**

YOPAL-CASANARE
2026

1. OBJETO

OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE

2. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2.1 Planillas de Seguridad Social Integral del personal (ARL, Pensión y Salud)

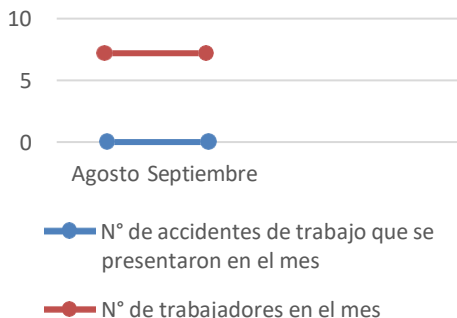
Anexo No.1 Planilla de Seguridad Social y certificados de afiliación (Ingresos)

Los certificados de afiliación del personal fueron radicados para la legalización del acta de inicio del contrato. Dichas afiliaciones reposan en la carpeta del contrato en el archivo de la empresa contratante. Para el personal ingresado en el presente mes, se adjuntan al presente informe las afiliaciones correspondientes.

2.2 Indicadores SG-SST y autogestión PESV

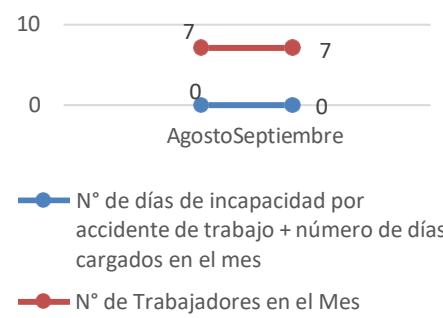
Frecuencia de los accidentes laborales

Fórmula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Período	No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	Número de trabajadores en el mes	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	07	0		 <p>10 5 0</p> <p>Agosto Septiembre</p> <p>—●— N° de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes</p> <p>—●— N° de trabajadores en el mes</p>
Septiembre	0	07	0		

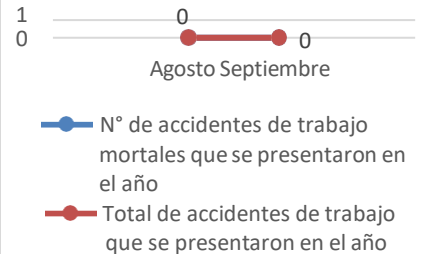
Severidad de accidentalidad

Fórmula: $(\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$.

Período	Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes	Número de trabajadores en el mes	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	07	0		 <p>—●— N° de días de incapacidad por accidente de trabajo + número de días cargados en el mes</p> <p>—●— N° de Trabajadores en el Mes</p>
Septiembre	0	07	0		

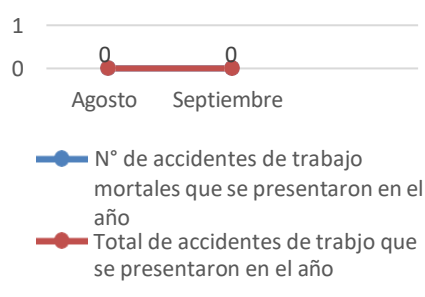
Proporción de accidentes de trabajo mortales

Fórmula: $(\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}) * 100$

Período	No. de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año	Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	0	0		 <p>—●— N° de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año</p> <p>—●— Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año</p>
Septiembre	0	0	0		


Prevalencia de la enfermedad laboral

Fórmula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000

Período	No. de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año	Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	0	0		 <p>1 0</p> <p>Agosto Septiembre</p> <p>—●— N° de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año</p> <p>—●— Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año</p>
Septiembre	0	0	0		

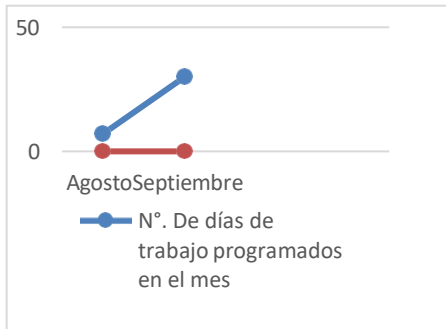
Incidencia de la enfermedad laboral

Fórmula: (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000

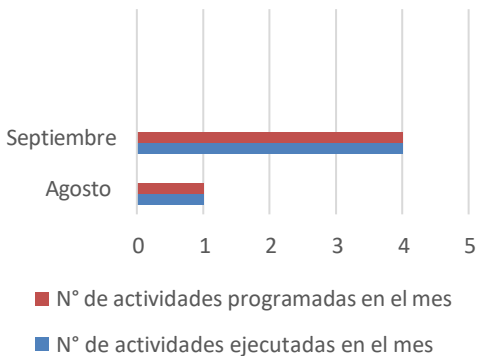
Período	No. de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z»	Promedio de trabajadores en el periodo «Z»	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	07	0		 <p>8 6 4 2 0</p> <p>AgostoSeptiembre</p> <p>—●— N° de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo</p> <p>—●— Promedio de trabajadores en el periodo</p>
Septiembre	0	07	0		

Ausentismo por causa médica

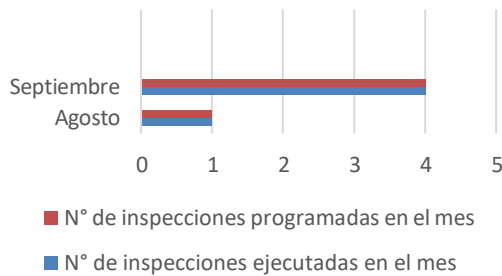
Fórmula: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100

Período	No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	No. de días de trabajo programados en el mes	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	07	0		 <p>50 0 AgostoSeptiembre N°. De días de trabajo programados en el mes</p>
Septiembre	0	30	0		


Cumplimiento plan de trabajo anual SST

Período	No. de actividades ejecutadas en el mes	No. de actividades programadas en el mes	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	1	1	100%		 <p>Septiembre Agosto 0 1 2 3 4 5 N° de actividades programadas en el mes N° de actividades ejecutadas en el mes</p>
Septiembre	4	4	100%		

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo

Período	No. de inspecciones ejecutadas en el mes	No. de inspecciones programadas en el mes	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	1	1	100%		 <p>Septiembre Agosto</p> <p>0 1 2 3 4 5</p> <p>■ N° de inspecciones programadas en el mes ■ N° de inspecciones ejecutadas en el mes</p>
Septiembre	4	4	100%		

Capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo

Período	No. de capacitaciones ejecutadas en el mes	No. de capacitaciones programadas en el mes	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Agosto	0	0	0%		 <p>Septiembre Agosto</p> <p>0 0,5 1</p> <p>■ N° de capacitaciones programadas en el mes ■ N° de capacitaciones ejecutadas en el mes</p>
Septiembre	0	0	0%		

3.3 Entrega de Elementos de Protección personal y Dotación

En este periodo se realizó la entrega de elementos de protección personal y dotación al personal afiliado a la empresa.

Anexo No.3 Registros entrega de EPP y Dotación

Inspecciones Pre operacionales

Elementos inspeccionados	No. de inspecciones realizadas	Registro fotográfico
Extintores	1	
Herramienta menor	4	
Botiquines y camillas	1	

Anexo No. 4 Registros de inspección preoperacionales

Análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo

Registros	Cantidad
Permiso de Trabajo Alturas	2
Total	2

Registros	Cantidad
Análisis de Trabajo Seguro	2
Total	2

Anexo No.5 Registros de Análisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados

3.4 Accidentes de Trabajo y/o incidentes durante el mes

No se han presentado a la fecha de corte del presente informe.

3.5 Enfermedades Laborales

No se han presentado casos de enfermedades laborales a la fecha de corte del presente informe.

3.6 Tarjetas y/o reporte mensual de actos y condiciones seguras e inseguras diligenciadas

Reportes	Cantidad
Actos inseguros	0
Condiciones Inseguras	0
Total	0

3.7 Certificado de curso de Trabajo en Alturas – Coordinador de Alturas personal nuevo.

Nombre y Apellidos	Cargo	Curso	Vigencia
Liliana Del pilar Lemus Murillo	Inspector sst	Coordinador	25/01/2026
Carlos Andres Araque VArgas		Reentrenamiento	02/02/2026
David Troncoso parra		Reentrenamiento	02/06/2026

Anexo No. 8 Certificados de cursos realizadas por Empleador

Anexo No. 15 Soporte consulta realizada en página Minitrabajo- Centro de entrenamiento

3.8 Comités

Cumplimiento reuniones COPASST

En el presente periodo no se realizaron reuniones

Cumplimiento reuniones Comité de Convivencia Laboral

En el presente periodo no se realizaron reuniones .

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRABAJADORES

Para el suministro de agua potable, cada profesional contratado, se encarga de su hidratación.

4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA


A la fecha de corte del presente informe, no es necesario implementar acciones correctivas, preventivas o de mejor.

5 ACTIVIDADES RELEVANTES

- **Divulgación de políticas y objetivos mediante charlas:** Se realiza la divulgación, de las políticas integrales (política de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente (SSTA). La política para la prevención del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco. La política de seguridad vial y la política de prevención de acoso laboral.
- **Seguimiento y actualización matriz programa de capacitación:** Se realizan capacitaciones o charlas de 15 minutos al personal, seis (03) veces al mes, antes de iniciar labores. *Anexo No.4 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia – evaluaciones)*, relacionada a continuación:

TEMARIO	FECHA DE EJECUCIÓN
1. Biomecánico- Ergonomía	(01-09-26)
2. Riesgos y Peligros	(02-09-26)
3. Riesgo físico : Temperaturas Altas	(03-09-26)
4 Accidentes e Incidentes	(04-09-2026)
5 Manejo de Residuos	(05-09-2026)
6 Uso obligatorio de Epp's	(07-09-2026)
7 Uso Correcto de herramientas Manuales	(08-09-2026)
8 Actos y Condiciones Inseguras	(09-09-2026)
9 Uso correcto de EPP'S	(10-09-2026)
10 Responsabilidad Social	(11-09-2026)
11 Riesgo Locativo -Puntas expuestas	(12-09-2026)
12 Golpe de Calor	(13-09-2026)
13 Trabajo en Equipo	(15-09-2026)
14 Riesgos y Peligros en actividades a realizar	(16-09-2026)
15 Ergonomia, Higiene Postural	(17-09-2026)
16 Riesgos y peligros en Excavaciones	(21-09-2026)
17 Uso correcto y adecuado de EPP'S	22-09-2026
18 La Comunicación y el trabajo en equipo	23-09-2026
19 Manejo de Residuos y Disposición final	24-09-2026
20 Manejo Manual de cargas	25-09-2026
21 Cuidado del Medio Ambiente	26-09-2026
22 Exceso de Confianza	27-09-2026
23 Riesgos y Peligros	29-09-2026
24 Actos y condiciones Inseguras	30-09-2026

Elaborado por:



LILIANA DEL PILAR LEMUS MURILLO

Profesional HSE

Licencia en Salud Ocupacional Resolución 0535 del 15 de Mayo de 2017

ANEXOS

Anexo No.1 Planilla de Seguridad Social del periodo

Anexo No.2 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia charlas 15 min)

Anexo No.3 Registros entrega de EPP y Dotación –

Anexo No. 4 Registros de inspección

Anexo No. 5 Registro de Preoperacionales

Anexo No.6 Registros de Análisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados

Anexo No. 7 Certificados de cursos realizadas por Empleador

Anexo No. 8 Registro Fotográfico.

Anexo No.1 Planilla de Seguridad Social del periodo

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
Tipo	RECORRIDO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	901303221-1	TOTAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 135 10A 50	3057143018	total@ingenieriaconstruccion.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	B - mision de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO DE LA PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPL
		94597208	26/04/2026	16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2025.08	2025.07	E	\$22.353.521	\$7.186.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacitados		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.110.880	0	0	0	0	0	1	200	0	1.110.880	3
EPS006	Compensar EPS	860060942-7	70.100	0	0	0	0	0	1	100	0	70.200	1
EPS010	EPS Suro	800060702-2	289.590	0	0	0	0	0	1	300	0	289.890	2
EPS017	Familiares EPS	830033554-7	140.200	0	0	0	0	0	1	200	0	140.400	2
EPS037	Nueva EPS	900150254-2	70.100	0	0	0	0	0	1	100	0	70.200	1
EPS041	MUEVA E.P.S. S.A. MOV	900150264-2	294.500	0	0	0	0	0	1	300	0	294.800	6
EPS034	Secuato SGR Capital Salud	900290372-9	8.400	0	0	0	0	0	1	100	0	9.500	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	PROTECCIÓN (PAG - PENSIONES)	800229733-6	1.401.000	0	0	0	0	0	0	0	1.401.000	5	
230301	Porvenir	800234026-8	1.453.100	0	0	0	0	0	1	1.200	0	1.454.300	7
231001	Colombiase	800227940-8	401.800	0	0	0	0	0	1	400	0	402.200	2
25.14	Colpensiones	800836034-7	311.800	0	0	0	0	0	1	300	0	312.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacitados		Aportes Otros Sumas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14-23	Provida Seguros	800011133-6	1.536.500				1.536.500	1	1.200	1.537.700			15.555	1.557.700	18

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	800060942-7	895.100	1	700	895.800	16

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	1	100	35.200	1
ICBF				
32.800	1	100	32.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor aportes de IGE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.043.900	1.043.900
Pension	4	3.577.300	3.580.900
Riesgos Laborales	1	1.536.500	1.537.700
CCF	1	895.100	895.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.800	52.900
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.200
TOTALES	15	7.182.500	7.186.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

ENCLOSURE

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO (PARAFISCOS Y SALUD)
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CÓDIGO		
Nº	301030001-1	TOTAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 135 10A 58	3057141010	Mailing@construccionesfregal.co in		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SIGLAS	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - número de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MM/AA/YY)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO SUBSCRIBIDO	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD LIC.
		94597028	26/07/2026	16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL MÓNEDA	TOTAL A PAGAR	
2025-08	2026-01	E	\$22.351.221	\$7.566.900	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

Anexo No.2 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia charlas 15 min)

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 01-09-2026 HORA INICIO: 7:10 am HORA FINALIZACIÓN: 7:20 am
TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST
BIO MECANICO - ERGONOMIA

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	RICHARD MOLINA	118530768	Auxl	RICHARD
2	LUIS VARGAS	1023953565	Soldador	Luis Vargas
3	ALEXANDER BERMUDEZ	91003033	Maestro	Alex
4	David Troncoso	7724205	OFICIAL	David
5	LUIS ANDRES GUILLEN	1029640150	Auxl	Andres
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1


FECHA: 02-09-2026 HORA INICIO: 7:20 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:30 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☐ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

RIESGOS Y PELIGROS

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER BERMUDEZ	91003033	Maestro	
2	LUIS ANDRES GUILLEN	1026640150	Auxl	Andres
3	RICHAR MOLINA	1118530768	Auxl	RICHAR
4	DAVID TRANCOSO	7724 205	Aux	
5	LUIS VARGAS	1028953565	Soldador	Luis Vargas
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH-FOR-04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1


FECHA: 03-09-2026 HORA INICIO: 7:05 AM HORA FINALIZACIÓN: 07:10 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

RIESGO FISICO : TEMPERATURAS ALTAS

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	LUIS VAREAS	1623953565	SOLDADOR	Luis Vareas
2	ALEXANDER BEMOLCZ	91003033	MAESTRO	Alex
3	LUIS ANDRES GUILLEN	1029640150	Auxl	Andres
4	DAVID TRONCOSO	2724205	Auxl	David
5	LICHAD MOLINA	1118530768	Auxl	Richad
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1


FECHA: 04-09-2026 HORA INICIO: 7:20 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:25 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

ACCIDENTES E INCIDENTES

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Richard Molina	1118580768	Auxl	Richard Molina
2	Luis Vargas	702398365	Soldador	Luis Vargas
3	David Troncoso	7724205	OFICIAL	David Troncoso
4	Alexander Bermudez	71005033	MAESTRO	Alexander Bermudez
5	Luis Andres Guillen	1029640150	Auxl	Andres
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 05-09-26 HORA INICIO: 7:05 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:10 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

MANEJO DE RESIDUOS

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Andres Guillen	1024640180	Aux	Ancha
2	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
3	Alexander Bermudez	71003033	Muestrab.	As 2
4	Richard Molina	1118530768	Aux1	Richard Molina
5	David Troncoso	7724205	Oficial	David
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 07-09-2026 HORA INICIO: 07:00 Am HORA FINALIZACIÓN: 07:10 Am

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN USO OBLIGATORIO DE EPP'S Inspector SST

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	RICHARD MOLINA	1119520768	ayudante	RICHARD
2	Alexander Berrueta	71003035	M4074	
3	Luis Ernesto Vargas Bolivar	1023953565	soldador	Luis Vargas
4	Luis Andres Guillen Mosquera	1029640150	Ayudante	Andres
5	David Tirona	7724205	oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1



FECHA: 08-09-2026 HORA INICIO: 07:00AM HORA FINALIZACIÓN: 07:10AM


TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

USO CORRECTO DE HERRAMIENTAS MANUALES

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Bermudez	21003033	Muestro 6.	
2	Luis Vargas	1023953865	Soldador	Luis Vargas.
3	Ricard Molina	1118520768	Aux	Molina
4	Luis Andres Guillen	1029640150	Aux.	Andres
5	David Troncoso	7724205	Oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1


FECHA: 09-09-2016 HORA INICIO: 7:10 Am HORA FINALIZACIÓN: 7:20Am

TIPO CAPACITACION: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Guillen	1024646150	Aux	Andres
2	David Troncoso	7724205	Maestro	David
3	Alexander B.	71003033	Maestro	Alexander
4	Richard Molina	118530768	Aux	RICHARD
5	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023 Página 1 de 1

FECHA: 16-09-2016 HORA INICIO: 7:05 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:10 AM


TIPO CAPACITACION: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

USO CORRECTO DE EPP'S

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Vargas	1028483865	Soldador	Luis Vargas
2	Alexander Bermudez	71003033	Maestro	Alexander
3	Richard Molina	118830760	Aux	RICHARD
4	Luis Guiller M.	1029640780	Aux	Andres
5	David Troncoso	7724205	Aux	David
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1


FECHA: 11-09-2026 HORA INICIO: 7:20 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:25 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

RESPONSABILIDAD SOCIAL

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Pichay Molina	1178530768	Aux	NICHAY
2	Luis Vargas	1028953885	Soldador	Luis Vargas
3	Luis Guillen M.	1029640180	Aux	Andres
4	Alexander B.	11003033	Maestro	
5	David Troncoso	7724105	Aux	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST


	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 12-04-26 HORA INICIO: 7:15 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:20 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST
RIESGO LOCATIVO - PUNTAS EXPUESTAS.

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	RICHAR MOLINA	118530768	Aux	RICHAR
2	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
3	Alexander Bermudez	71003033	Maestro	Alexander
4	Andres Guillen	1024640180	Aux	Andres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				





Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023 Página 1 de 1

FECHA: 14-04-2026 HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:10 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN GOLPE DE CALOR Inspector SST

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALEXANDER BERMUDEZ	91003033	OFICIAL	
2	LUIS ANDRES GUILLEN	1029640150	AUX OBRA	Andres
3	RICHARD MOLINA DOTELO	1118530768	AUX OBRA	RICHARD
4	Luis Vargas	1023953565	SOLDADOR.	Luis Vargas.
5	David Francisco	7724205	OFICIAL	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 15-09-26 HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINALIZACIÓN: 07:15 AM


TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☐ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

Inspector SST

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Andres Guillen Maquera	1029640150	Auxiliar Ob	Andres
2	Alexander Borda	81003033	Oficial	Lex
3	RICHARD Molina Boteillo	1118520768	Aux oblas	RICHARD
4	Luis Vargas	1023953565	Abldador	Luis Vargas.
5	David Troncoso	7724705	Oficial	DE
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04 Fecha 13-03-2023 Página 1 de 1

FECHA: 16 - 09 - 2026 HORA INICIO: 7:00AM HORA FINALIZACIÓN: 07:15 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

RIESGOS Y PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, USO DE EPP

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Andres Gulla Mosquera	1029640150	Aux Obra	Andres
2	Alexandra Pineda	91003033	Oficial	Alex
3	NICHAN Molina Botello	1118530768	Aux Obra	NICHAN
4	José Vargas	102395365	Soldador	José Vargas
5	David Troncoso	7724205	Oficial	David
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 17-09-26 HORA INICIO: 7:00AM HORA FINALIZACIÓN: 7:15AM

TIPO CAPACITACION: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

ERGONOMIA , HIGIENE POSTURAL

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Andres Gullon Marquez	1029640150	Aux obra	Andres
2	Alvaro Izquierdo	71203633	Oficial	Alvaro
3	RICHARD Molina Botello	1118530768	Aux obra	RICHARD
4	Luis Vargas	1023953585	Soldador	Luis Vargas
5	David Arango	7724705	Oficial	David
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 21-09-26 HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:10 AM

TIPO CAPACITACION: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

RIESGOS Y PELIGROS EN EXCAVACIONES

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Bermudez	9003033	Oficial	Alexander
2	RICHARD Molina	1118530768	Auxiliar	RICHARD
3	Luis Ande Guillen Mosquera	1029640150	Auxiliar	Ande
4	Luis Ernesto Vargas	1023453565	Soldador	Luis Vargas
5	Andres Arce	1027449392	SP	Andres Arce
6	David Trancoso		Auxiliar	David T.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH-FOR-04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 22-09-26 HORA INICIO: 7:30 am HORA FINALIZACIÓN: 7:35 am


TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

USO CORRECTO Y ADECUADO DE EPP'S

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Andre Gullen Mosquera	1029640150	Asesor	Andre
2	Alexander Banda	91003033	Oficial	Alex
3	RICHARD Molina	1118530768	AUXILIAR	RICHARD
4	Luis Ernesto Vargas	1023153565	Soldador	Luis Vargas
5	Archi Angue	1023944542	SP	Archi Angue
6	David Trancoso		Auxiliar	David T.
7	Jonathan Velasco	1094247954	E.dora	Jonathan
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 23-09-26 HORA INICIO: 7:10 am HORA FINALIZACIÓN: 7:20 am

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	David Trancoso		Auxiliar	David T.
2	Jon Vargas	1023953768	Soldador	Jon Vargas
3	Alexander Benavides	71003033	Oficial	Alex
4	RICHARD MOLINA	1118530768	Auxiliar	RICHARD
5	Jon Ande Guillen Mosquera	1029640150	Auxiliar	Andres
6	Ande Rojas	1023741572	JD	Ande Rojas
7	Jonathan Velasco Pl.	1094247954	R. Choca	Jonathan
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


 Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 24-09-26 HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:10 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

MANEJO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2	David Troncoso		Auxiliar	David T.
3	Archi Arce	1023944592	SP	Archi A.
4	Jois Varga	1023953865	adddor	Jois Varga.
5	Alexander Benda	9003033	oficial	Alex
6	RICHARD MOLINA	1118570768	AUXILIAR	RICHARD
7	Luis Andres Guillen Mosquera	1029640150	Auxiliar	Andro
8	Archi Arce	1023944592	SP	Archi Arce
9	Jonathan Velazco R.	1094867959	K-Barra	Jonathan
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 25-09-26 HORA INICIO: 7:00AM HORA FINALIZACIÓN: 7:15 am


TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

MANEJO MANUAL DE CARGAS - POSTURAS CORRECTAS

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andrés Anger	1023941972	SP	Andrés Anger
2	Luis Vargas	1023953765	Soldador	Luis Vargas
3	Luis Andrés Gaitán Moiguer	1029640150	Auxiliar	Andrés
4	Alexander Bermudez	91063033	Oficial	Alexander
5	RICHARD MOLINA	1118530768	AUXILIAR	RICHARD
6	Yhonatan Velazquez	1094247959	Obra	Yhonatan
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023 Página 1 de 1


FECHA: 26-09-26 HORA INICIO: 7:10 Am HORA FINALIZACIÓN: 7:15AM

TIPO CAPACITACION: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Inspector SST

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Andres Guillen	1029640150	Aux	Andres
2	Richard Molina	1118530768	Aux	RICHARD
3	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
4	David Troncoso	7724200	Aux	David
5	Alexander Bermudez	71003033	Muestro	Alexander
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


 Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1


FECHA: 28-09-26 HORA INICIO: 7:05 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:10 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

Inspector SST

EXCESO DE CONFIANZA

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Bermudez	71003033	Maestro	
2	Andres Guillen	1024640150	Aux	Andres
3	Richard Molina	1118530768	Aux	RICHARD
4	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023 Página 1 de 1

FECHA: 29-06-26 HORA INICIO: 7:15 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:20 AM

TIPO CAPACITACIÓN: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN RIESGOS Y PELIGROS Inspector SST

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Richard Molina	1118530769	AUX	RICHARD
2	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
3	Alexander Bermudez	91003033	71003033	Alexander
4				
5	Andres Guiter M.	1029640180	Ayudante.	Andres
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Inspector SST


	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Versión: 1
	FORMATO REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES	GTH - FOR - 04
		Fecha 13-03-2023
		Página 1 de 1

FECHA: 30-09-26 HORA INICIO: 7:10 AM HORA FINALIZACIÓN: 7:20 AM

TIPO CAPACITACION: ☐ CHARLA ☒ PAUSAS ACTIVAS ☐ RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN Actos y condiciones INSEGURAS Inspector SST

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Richard Molina	1118530760	Ayudante	Richard Molina
2	Luis Vargas	1023953565	Soldador	Luis Vargas
3				
4	Luis Andres Gullen	1029646150	Ayudante	Andres
5	Alexander Bermudez	71003033	Maestro	Alexander
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Inspector SST

Anexo No.3

Registros entrega de EPP y Dotación

[illegible]

Anexo No. 4

Registros de


inspección


ECONINCAG		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												VERSIÓN: 1										
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR												fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024										
PROYECTO U OBRA: <u>Montenimiento FAC</u>																								
SEMANA DEL <u>02</u> al <u>12</u> DE <u>09</u> del <u>2026</u>																								
ÁREA DE TRABAJO: <u>Cubierta Centro Académico</u>																								
CONVENCIONES SC: SI CUMPLE. NC: NO CUMPLE. N.A: NO APLICA																								
HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓																					
Hombre solo	Tomillo, resorte, manija					✓			✓			✓			✓									
Cinta métrica	Estado general	1	✓																					
Destornilladores	Mango, punta																							
Taladro inalámbrico	Batería, Mandril, Octurador																							
Martillos de uña	mango, Encabado																							
Mazo de caucho	mango, Encabado																							
Tijeras Planas	Curva, manija, pin																							
Llaves Expansivas	luerca de ajuste, manija																							
Centro punto (rallador)	Mango																							
Flexómetro	Carcasa, cinta	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.																							
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcasa.																							
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcasa, bordes	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Cuchillo	Punta, filo, lomo, botón, hoja, espiga, catch, remaches, cabo.																							
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Otros																								
Quien Inspecciona:			     																					
FIRMA SST			     																					
FIRMA SUPERVISOR			     																					
Descripción del hallazgo:			Identificación y análisis de causas:										Descripción de la acción tomada:											
RESPONSABLE: _____			PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: _____																					


ECONINCAG		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												VERSIÓN: 1												
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR												fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024												
PROYECTO U OBRA: <u>GARITA - Mantenimiento</u>																										
SEMANA DEL <u>07</u> AL <u>12</u> DE <u>2026</u>														ÁREA DE TRABAJO: <u>GARITA</u>												
CONVENCIONES SC: SI CUMPLE NC: NO CUMPLE N/A: NO APLICA																										
HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
			SC	NC	N/A	SC	NC	N/A	SC	NC	N/A	SC	NC	N/A	SC	NC	N/A	SC	NC	N/A	SC	NC	N/A			
Alicates	Mango, aislamiento																									
Hombre solo	Tornillo resorte, manija																									
Cinta métrica	Estado general	1	✓			✓			✓																	
Destornilladores	Mango, punta																									
Taladro Inalámbrico	Batería, Mandril, Oclurador																									
Martillos de uña	mango, Encabado																									
Mazo de caucho	mango, Encabado																									
Tijeras Planas	Curva, manija, pin																									
Llaves Expansivas	tuerca de ajuste, manija																									
Centro punto (rallador)	Mango																									
Flexómetro	Carcasa, cinta																									
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.																									
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcasa.																									
Nivel	Gola y/o Burbuja, carcasa, bordes																									
Cuchillo	Punta, filo, lomo, boton, hoja, espiga, catch, remaches, cabo.																									
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón																									
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.	1	✓			✓			✓																	
Otros	Esputulas	2	✓			✓			✓																	
Quien Inspecciona			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA SST			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
FIRMA SUPERVISOR			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]			[Firma]		
Descripción del hallazgo:			Identificación y análisis de causas:									Descripción de la acción tomada:														
RESPONSABLE: _____ PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: _____																										

ECONINCAG		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Versión: 1										
		FORMATO DE INSPECCIÓN PARA PULIDORA												Fecha de aprobación: 15 marzo 2024										
ACTIVIDAD:		Mantenimiento Estructura Metal			FECHA DE INSPECCION:			07			04			2026			EQUIPO PROPIO		SI		X		NO	
CONTRATISTA:		Total Ingeniería			FRENTE DE OBRA O PROYECTO:			(E.S.E NUEVO COLON)			6A BITA			EQUIPO ALQUILADO		SI				NO				
MARCA DEL EQUIPO:		Discover			PROPIO		ALQUILADO		MARCAR CON UNA X															
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO							
ESTADO FISICO	Extensión eléctrica		✓		C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A					
	Mango		✓		✓			✓			✓			✓			✓							
	Guardas		✓		✓			✓			✓			✓			✓							
	Seguro de bloqueo		✓		✓			✓			✓			✓			✓							
	portadisco		✓		✓			✓			✓			✓			✓							
	Brazo de extensión		✓		✓			✓			✓			✓			✓							
	Llave		✓		✓			✓			✓			✓			✓							
OTROS																								
OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS																								
APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES																						
SI		NO																						
PRÓXIMA REVISIÓN		SEGUIMIENTO										ESTADO												
												BUEN ESTADO												
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		DAVID TRANCOSO																						
CARGO:		OFICIAL																						
		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN																						

ECONINCAG		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												Versión: 1			
		FORMATO DE INSPECCIÓN PARA EXTENSION ELECTRICA												Fecha de aprobación: 15 marzo 2024			
ACTIVIDAD:		09 04 26			EQUIPO PROPIO		SI	X	NO								
CONTRATISTA:		TOTAL INGENIERIA			EQUIPO ALQUILADO		SI		NO								
MARCA DEL EQUIPO:		PROPIO		ALQUILADO		MARCAR CON UNA X											
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO						
ESTADO FISICO	Cable de extension	35mts	✓		C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	
	Polaridad del cable	110	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Polo a Tierra		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Aislamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Clavija		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OTROS																	
OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS																	
APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES															
SI		NO															
PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO BUEN ESTADO															
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Luis Vargas															
CARGO: COORDINADOR DE OBRA		SOLDADOR															
		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN															

		PROCESO DE GESTION HSE										CODIGO PSG-FOR-73		VERSION 01	
		LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICO													
INSPECCIONADO POR: <u>LUIS VARGAS</u>		PERIODO:													
LOCALIZACION: <u>FAC YUPA</u>		DEL <u>14-09-26</u> AL <u>19/09/26</u> DE <u>SEP 12026</u>													
ITEM	LISTA Y ESTADO DE PARTES DEL EQUIPO	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Carcasa					✓		✓		✓		✓			
2	Cable de alimentación					✓		✓		✓		✓			
3	Panel trasero					✓		✓		✓		✓			
4	Interruptor					✓		✓		✓		✓			
5	Ventilador					✓		✓		✓		✓			
6	Placa base					✓		✓		✓		✓			
7	Goma					✓		✓		✓		✓			
8	Conector 10-25					✓		✓		✓		✓			
9	Kit de perilla					✓		✓		✓		✓			
10	Panel frontal					✓		✓		✓		✓			
11	Tarjeta Frontal					✓		✓		✓		✓			
12	Tarjeta de Poder					✓		✓		✓		✓			
13	Mica de aislamiento					✓		✓		✓		✓			
14	Correa y Hebilla					✓		✓		✓		✓			
15	Conectores					✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo.						Luis V.		Luis V.		Luis V.		Luis V.			
OBSERVACIONES:															
Yo, como supervisor del trabajo he verificado la lista anterior y certifico que el equipo está en condiciones normales de funcionamiento.															
															
<u>LUIS VARGAS</u> NOMBRE DEL SUPERVISOR		 FIRMA				<u>14-09-26</u> FECHA									

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-FT-06	
		INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA		Versión: 1 Fecha de aprobación: 07/09/2026 Revisión: 01	
Fecha de la Inspección	01-09-2026	Firma de quien inspecciona			
Responsable	Liliana Cones				
Cargo	SUPERVISORA SST				
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL BOTIQUIN: Campo					
CONTENIDO		ESTADO			
Elemento	Cantidad	Fecha de vencimiento	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Botiquín Plástico					
Alcohol antiséptico 120 ml	1	04-06-2027	✓		
Espuma de gasa x 5 un					
Baja lengua pq x 20 un	1				
Curas: catx x 10 cm					
Españador microperforado					
Guantes desechables pq x 2	1				
Venda de algodón laminado 3x5					
Venda de algodón laminado 3x5					
Linterna	1				
Algodón alcoholizado					
Tapebocón	2				
Parche Ocular					
Solución Salina al 0.9% 500 ml	1	03-04-2029	✓		
Silvato					
Preservativo	1				
Termómetro	1				
Tijeras					
Venda elastica 3" x 5"	1				
Venda elastica 2" x 5"					
Inmovilizador de cuello	1				
CAMILLA					
Elemento	Revisión Estado		OBSERVACIONES		
	C	N			
Instalación (sitio de ubicación)	X				
Señalización	X				
Cintas de Seguridad	X				
Soportes para Cargos	X				
Soporte de Descanso	X				
Kí Inmovilizador de extremidades		X			
Inmovilizador de cuello		X			
OBSERVACIONES ADICIONALES					
Elemento	Revisión Estado	OBSERVACIONES			
	Cumple				
Estado general del botiquín en buenas condiciones	X				
Ubicación y señalización adecuadas	X				
Sin presencia de elementos vencidos o en mal estado	X				
Sin presencia de medicamentos de formulación	X				
VoBo SST /					
VoBo COPASST /					

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código: SST-FT-09														
		FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES										Versión: 1														
FECHA INSPECCIÓN: 01-09-2026												N° INSPECCIÓN: 1														
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Liliana Cemus M												FRENTES DE OBRA O PROYECTO: Oficina Principal - Campo														
No.	UBICACIÓN	TIPO					CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES						
		BC	ABC	CO2	SOLVAFLEX 123	AGUA			OTROS	CILINDRO	PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO	FECHA TIPO	MANEJO DE TRANSPORTE	MANEJO DE DISPARO	PRESION	MANÓMETRO			BOQUILLA	MANEJO DE	RING O ARO DE	SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN
1	FRENTE DE OBRA			X			20lbs		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12-26	
		B	BUENO				NT	NO TIENE																		
		R	REGULAR				NA	NO APLICA																		
		M	MALO				NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																		
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:																										
Vo.Bo. SG-SST																										

Anexo No. 5

Registros de

inspección

preoperacionales

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												VERSIÓN: 1													
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR												fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024													
PROYECTO U OBRA: <u>PAC SUPAL - ALQUILER</u> SEMANA DEL <u>14</u> AL <u>20</u> DE <u>01</u> / 2024 CONVENCIÓNES SC: SI CUMPLE. NC: NO CUMPLE. N.A: NO APLICA ÁREA DE TRABAJO: <u>PAC SUPAL - ALQUILER</u>																										
HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A			
Alicates	Mango, aislamiento																									
Hombre solo	Tomillo, resorte, manija																									
Cinta métrica	Estado general	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Destornilladores	Mango, punta	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Taladro inalámbrico	Batería, Mandril, Oclurador																									
Martillos de uña	mango, Encabado																									
Mazo de caucho	mango, Encabado																									
Tijeras Planas	Curva, manija, pin																									
Llaves Expansivas	tuerca de ajuste, manija	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Centro punto (rafador)	Mango																									
Flexómetro	Carcasa, cinta	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.																									
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcasa.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcasa, bordes	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Cuchillo	Punta, filo, lomo, botón, hoja, espiga, cachas, remaches, cabo.																									
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón.																									
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.																									
Otros	<u>Rulos, Picas, Baras</u>	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
Quien Inspecciona			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>			<u>Daniel</u>		
FIRMA SST			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>		
FIRMA SUPERVISOR			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>		
Descripción del hallazgo:			Identificación y análisis de causas:												Descripción de la acción tomada:											
RESPONSABLE: _____ PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: _____																										

PROYECTO U OBRA: FAC TOTAL - BARSEMANA DEL 14 al 19 DE 09/2024ÁREA DE TRABAJO: BAR - AMPLIACIÓN

CONVENCIONES SC: SI CUMPLE; NC: NO CUMPLE; N.A: NO APLICA

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A
Alicates	Mango, aislamiento		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Hombré solo	Tornillo, resorte, manija		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinta métrica	Estado general		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Destornilladores	Mango, punta		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Taladro inalámbrico	Batería, Mandril, Oclurador		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Martillos de uña	mango, Encabado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mazo de caucho	mango, Encabado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tijeras Planas	Curva, manija, pin		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llaves Expansivas	fuera de ajuste, manija		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Centro punto (rallador)	Mango		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Flexómetro	Carcasa, cinta		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados,		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de Herramienta (Rimar y/o plástica)	Manija, estado carcasa.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcasa, bordes		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuchillo	Punta, filo, lomo, botón, hoja, espiga, cachá, remaches, cabo.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Carretilla	Uñita y pasador en buen estado Mangos y platón		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Otros			✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Quien Inspecciona

FIRMA SST

FIRMA SUPERVISOR

Descripción del hallazgo:

Identificación y análisis de causas:

Descripción de la acción tomada:

RESPONSABLE:

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

Anexo No.06 Registros de Análisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados

PROCESO DE GESTIÓN DE PERIGO DE TRABAJO		CODIGO PRO-FORMA	VERSION 3.1
1. DATOS GENERALES DE TRABAJO			
PROYECTO DE TRABAJO	FECHA DEL PERIGO	CIUDAD DEL PERIGO	PAIS
FECHA: 13-04-2014	FECHA DEL PERIGO: 13-04-2014	CIUDAD DEL PERIGO: E.A.C.	PAIS: PERU
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR			
TIPO DE TRABAJO	EMPRESA SOLICITANTE	LOCALIZACIÓN	PROYECTO
TIPO DE TRABAJO: 13-04-2014	EMPRESA SOLICITANTE: 13-04-2014	LOCALIZACIÓN: 13-04-2014	PROYECTO: 13-04-2014
3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR			
TIPO DE TRABAJO EN CASO DE LAJERAS SOMETRÍDAS			
Trabajo en Cielo	Trabajo en Agua	Trabajo en Espacios Confinados	
Trabajo en Cielo	Trabajo en Agua	Trabajo en Espacios Confinados	
Trabajo en Cielo	Trabajo en Agua	Trabajo en Espacios Confinados	
4. PELIGROS Y RIESGOS DETERMINADOS			
INJUNTA PLATMAS, MONIA R. COSTAS			
5. CONTROLES A APLICAR (CONDICIONES DE EXPOSICIÓN)			
6. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
7. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
8. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
9. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
10. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
11. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
12. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
13. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
14. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
15. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
16. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
17. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
18. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
19. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
20. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
21. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
22. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
23. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
24. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
25. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
26. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
27. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
28. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
29. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
30. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
31. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
32. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
33. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
34. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
35. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
36. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
37. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
38. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
39. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
40. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
41. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
42. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
43. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
44. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
45. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
46. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
47. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
48. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
49. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
50. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
51. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
52. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
53. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
54. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
55. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
56. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
57. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
58. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
59. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
60. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
61. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
62. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
63. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
64. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
65. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
66. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
67. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
68. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
69. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
70. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
71. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
72. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
73. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
74. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
75. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
76. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
77. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
78. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
79. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
80. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
81. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
82. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
83. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
84. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
85. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
86. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
87. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
88. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
89. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
90. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
91. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
92. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
93. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
94. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
95. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
96. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
97. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
98. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
99. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			
100. RIESGOS Y RIESGOS DETERMINADOS			

[illegible]

[illegible]

Anexo No. 07

Certificados de cursos realizadas por Empleador



Bogotá D.C., agosto 27 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que DAVID TRONCOSO PARRA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 7724205, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: TECNIRESATE SAS
ENTRENADOR: FRANDIER ASCANIO ANGARITA
SEDE DONDE SE FORMÓ: TECNIRESATE SAS
EMPLEADOR: "INGENIERÍA ZAVANY CTV SAS"
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: COLPATRIA
SECTOR ECONÓMICO: "SECTOR CONSTRUCCIÓN"
FECHAS DE FORMACIÓN: 02/06/2026 a 02/06/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día agosto 27 de 2026



Bogotá D.C., septiembre 2 de 2026.

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que LILIANA DEL PILAR LEMUS MURILLO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1118555027, registra la siguiente información de capacitación laboral:

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS COORDINADOR 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: CERTITAR
ENTRENADOR: FREDY ORLANDO MORENO ULLOA
SEDE DONDE SE FORMÓ: CERTITAR S.A.S.
EMPLEADOR: LILIANA DEL PILAR LEMUS MURILLO
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: POSITIVA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
FECHAS DE FORMACIÓN: 18/01/2026 a 25/01/2026
INTENSIDAD HORARIA: 80 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día septiembre 2 de 2026

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5155555
Dirección en Bogotá: Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 40-32 pasaje 8, 7, 10, 11, 12 y 13 Bogotá D.C.
5155555 Recepción de correspondencia: 2da y 3a Bogotá D.C.



Bogotá D.C., septiembre 2 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CARLOS ANDRES ARAQUE VARGAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1023944572, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

OFERENTE DE CAPACITACIÓN: TECNIRESATE SAS

ENTRENADOR: FRANDIER ASCANIO ANGARITA

SEDE DONDE SE FORMÓ: TECNIRESATE SAS

EMPLEADOR: "INGENIERÍA ZAVANY CTV SAS"

ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: "SECTOR CONSTRUCCIÓN"

FECHAS DE FORMACIÓN: 02/06/2026 a 02/06/2026

INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día septiembre 2 de 2026

Anexo No. 08
Registro
fotografico







INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha de la visita: 17 de septiembre 2026

Proyecto: Base Fuerza Aerea Yopal Casanare

Empresa contratista: ECONINCAG S.A.S.

Empresa subcontratista: TOTAL INGENIERÍA S.A.S

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

1. OBJETIVO

Realizar visita de inspección al área de trabajo ubicada en la sede de la Fuerza Aérea de Yopal, con el propósito de verificar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante las actividades de desmonte de techo y alistamiento del área para la fundición de piso correspondiente al proyecto de ampliación del bar de oficiales y suboficiales.

La visita tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos de SST, las condiciones de seguridad de los trabajadores, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), el manejo de las áreas de trabajo, la documentación requerida y la implementación de controles frente a los peligros identificados.

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS

Durante la visita se evidenció la ejecución de las siguientes actividades:

- Desmonte y retiro de la estructura de techo existente.
- Limpieza y organización del área posterior a las actividades de desmonte.
- Traslado del material retirado hacia el área destinada para acopio.
- Excavación y adecuación del terreno para la ejecución de las actividades constructivas.
- Armado e instalación de acero de refuerzo de acuerdo con las condiciones requeridas para la obra.
- Instalación y adecuación de formaleta en madera para la posterior ejecución de las actividades de fundición.
- Verificación de las condiciones generales de seguridad del área de trabajo.
- Revisión de la documentación y registros de SST asociados a las actividades ejecutadas.
- Verificación del uso de Elementos de Protección Personal por parte de los trabajadores.
- Revisión de los controles implementados por la inspectora SST durante la ejecución de las actividades.

3. ASPECTOS POSITIVOS EVIDENCIADOS

Durante el recorrido de inspección se identificaron condiciones favorables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellas:

Uso adecuado de EPP: Se evidenció que los trabajadores realizan las actividades utilizando de manera adecuada los Elementos de Protección Personal requeridos de acuerdo con las labores ejecutadas y los peligros asociados.

Se recomienda mantener la verificación permanente del estado, uso y adecuado ajuste de los EPP durante toda la jornada laboral.

Orden y aseo: En el área donde se realizó el desmonte del techo se evidenció adecuada limpieza y organización una vez finalizadas las actividades.

El material producto del desmonte fue retirado del área de trabajo y trasladado al sitio destinado para su acopio, contribuyendo a mantener condiciones seguras de circulación y operación. Así mismo, se recomienda mantener estas condiciones durante el desarrollo de las actividades de excavación, instalación del acero de refuerzo y adecuación de formaleta.

Gestión documental SST: Durante la visita se realizó revisión de la documentación asociada a las actividades de SST, evidenciándose que los registros se encuentran siendo diligenciados de manera adecuada y con frecuencia diaria.

Se verificó la gestión de documentos y registros relacionados con las actividades desarrolladas en obra.

Acompañamiento de la inspectora SST: Se comprobó presencia y seguimiento por parte de la inspectora SST, quien realiza el control y diligenciamiento de los documentos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades.

Durante la visita se realizó entrega de formatos y recomendaciones para fortalecer y estandarizar el diligenciamiento de:

- Análisis de Trabajo Seguro – ATS.
- Permisos de trabajo.
- Formatos de inspecciones de seguridad.
- Registros de pausas activas.
- Otros registros asociados al control de las actividades.

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PELIGROS IDENTIFICADOS

Durante el desarrollo de las actividades al aire libre se identificó exposición de los trabajadores a condiciones de altas temperaturas y radiación solar directa, propias de las condiciones climáticas de la zona.

Esta condición puede favorecer la aparición de fatiga, deshidratación, estrés térmico, agotamiento y afectaciones asociadas a la exposición prolongada a radiación ultravioleta. Por lo anterior, se considera necesario fortalecer las medidas de prevención y protección frente a este peligro.

5. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el propósito de mantener y fortalecer las condiciones de seguridad identificadas durante la visita, se establecen las siguientes recomendaciones:

5.1 Protección frente a radiación solar

- Garantizar el uso permanente de elementos de protección frente a la exposición solar, de acuerdo con las condiciones y características de la actividad.
- Realizar aplicación de protector solar de manera periódica, recomendándose su reaplicación aproximadamente cada dos horas y de acuerdo con las condiciones de exposición.
- Promover el uso de protección complementaria como casco, ropa de trabajo adecuada, protección para cuello cuando sea compatible con el EPP y demás elementos definidos por el SG-SST.

5.2 Hidratación

- Disponer de un área o punto de hidratación cercano a los trabajadores.
- Garantizar disponibilidad permanente de agua potable durante la jornada laboral.
- Promover pausas de hidratación, especialmente durante las actividades realizadas bajo exposición directa al sol.
- Realizar sensibilización a los trabajadores sobre la importancia de mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la jornada.

5.3 Control de exposición a altas temperaturas

- Implementar pausas activas y pausas de recuperación cuando las condiciones ambientales y la intensidad de la actividad lo requieran.
- Evaluar la posibilidad de programar las actividades de mayor exigencia física en horarios con menor exposición a temperaturas elevadas.
- Realizar seguimiento a signos y síntomas asociados al estrés térmico y establecer medidas

oportunas cuando se identifiquen trabajadores afectados.

5.4 Elementos de Protección Personal

- Realizar entrega y reposición periódica de EPP, teniendo en cuenta el desgaste, deterioro, pérdida de funcionalidad o las condiciones propias de cada actividad.
- Mantener registros de entrega y reposición de los elementos.
- Continuar realizando inspecciones periódicas de los EPP antes y durante la ejecución de las actividades.

5.5 Documentación y registros SST

- Continuar con el diligenciamiento diario y oportuno de los formatos establecidos.
- Implementar los formatos entregados durante la visita para fortalecer el registro de ATS, permisos de trabajo, inspecciones y pausas activas.
- Verificar que los documentos sean diligenciados antes del inicio de las actividades y que contengan la información completa, legible y acorde con las condiciones reales del trabajo.
- Mantener disponible la documentación SST para consulta y seguimiento durante las jornadas de trabajo.

5.6 Orden y aseo

- Mantener las áreas intervenidas libres de residuos, herramientas y materiales que puedan generar condiciones inseguras.
- Garantizar que el material producto de desmontes, demoliciones y excavación sea trasladado oportunamente a las áreas destinadas para acopio.
- Mantener despejadas las zonas de circulación y acceso.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la visita de inspección realizada en la sede de la Fuerza Aérea de Yopal, se evidenció que las actividades de desmonte de techo, excavación y adecuación de terreno, armado e instalación de acero de refuerzo e instalación y adecuación de formaleta en madera para la ampliación del bar de oficiales y suboficiales se vienen desarrollando bajo condiciones generales adecuadas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se destaca el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal, el mantenimiento del orden y aseo del área, el traslado del material producto del desmonte al sitio de acopio y el diligenciamiento diario de la documentación SST.

Como principal aspecto a fortalecer se identifica el control de la exposición de los trabajadores a altas temperaturas y radiación solar, por lo cual se recomienda garantizar hidratación permanente, aplicación periódica de protector solar, pausas de recuperación y seguimiento a las condiciones de los trabajadores durante la jornada.

Así mismo, se recomienda continuar fortaleciendo la gestión documental mediante el adecuado diligenciamiento de ATS, permisos de trabajo, inspecciones y registros de pausas activas, así como mantener un programa de entrega y reposición periódica de los EPP.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1. Desmonte de techo	
2. Área desmonte y condiciones de orden y aseo	
3. Acopio de material retirado	
4. Uso de Elementos de Protección Personal	

5. Actividades de excavación y adecuación de terreno, armado e instalación de acero de refuerzo e instalación y adecuación de formaleta en madera.



Cordialmente,



YORLEIDA TIRADO MURILLO
Coordinadora SG-SST
ECONINCAG S.A.S

