

SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026  
CRONOGRAMA  
GRUPO No 2

CRONOGRAMA -FLUJO DE CAJA - GRUPO 2


Estrategia: actividades de 3–10 días, ejecución intercalada, cuadrillas paralelas y cierre máximo 19/12/2026.

| Frete | Escenario                                           | Cap. | Actividad                                | Costo          | Dur.<br>(días) | Inicio     | Fin        | Cuadrilla | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 30-nov | 01-dic | 02-dic | 03-dic | 04-dic | 05-dic | 07-dic | 09-dic | 10-dic | 11-dic | 12-dic | 14-dic | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic | 19-dic |
|-------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               |      | PRECONSTRUCCIÓN                          |                | 7              | 2026-11-10 | 2026-11-18 | C0        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 1    | PRELIMINARES                             | 38.817.152,24  | 11             | 19/11/2026 | 01/12/2026 | C1        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 2    | ÁREA DE MÁQUINAS CALISTENIA              | 125.749.525,11 | 18             | 24/11/2026 | 15/12/2026 | C3        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 3    | ANDEN DE CIRCULACIÓN                     | 262.308.609,88 | 26             | 19/11/2026 | 19/12/2026 | C2        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 4    | DOTACION CALISTENIA                      | 45.064.740,00  | 12             | 02/12/2026 | 16/12/2026 | C1        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 5    | SISTEMAS DE DRENAJE                      | 10.738.017,40  | 7              | 05/12/2026 | 14/12/2026 | C4        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 6    | ATRAQUES BORDILLO                        | 19.596.834,05  | 9              | 10/12/2026 | 19/12/2026 | C7        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 7    | ÁREAS CANINAS                            | 50.298.300,11  | 12             | 05/12/2026 | 19/12/2026 | C5        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6     | ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA               | 8    | OTROS                                    | 48.524.638,77  | 12             | 05/12/2026 | 19/12/2026 | C6        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS |      | PRECONSTRUCCIÓN                          |                | 7              | 2026-11-10 | 2026-11-18 | C0        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.1  | PRELIMINARES                             | 3.758.796,95   | 11             | 19/11/2026 | 01/12/2026 | C1        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.2  | HIDROSANITARIO                           | 5.020.732,28   | 12             | 20/11/2026 | 03/12/2026 | C3        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.3  | INSTALACIONES ELECTRICAS                 | 2.071.746,95   | 9              | 21/11/2026 | 01/12/2026 | C4        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.4  | ADECUACIONES MUROS                       | 8.517.890,95   | 15             | 23/11/2026 | 10/12/2026 | C5        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.5  | PISOS Y ENCHAPES                         | 14.439.576,93  | 19             | 24/11/2026 | 16/12/2026 | C7        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.6  | ACABADO DE MUROS Y CIELOS                | 18.723.888,80  | 22             | 24/11/2026 | 19/12/2026 | C8        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.7  | DOTACION BAÑOS                           | 17.546.326,56  | 21             | 25/11/2026 | 19/12/2026 | C10       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 1.8  | CARPINTERIA METALICA                     | 21.872.559,35  | 23             | 23/11/2026 | 19/12/2026 | C6        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.1  | PRELIMINARES                             | 2.827.564,36   | 10             | 28/11/2026 | 10/12/2026 | C11       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.2  | HIDROSANITARIO                           | 4.136.141,60   | 11             | 30/11/2026 | 12/12/2026 | C13       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.3  | INSTALACIONES ELECTRICAS                 | 1.327.483,04   | 7              | 01/12/2026 | 09/12/2026 | C16       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.4  | ADECUACION DE MURO                       | 2.361.777,48   | 9              | 02/12/2026 | 12/12/2026 | C1        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.5  | PISOS Y ENCHAPES                         | 10.516.420,98  | 16             | 01/12/2026 | 19/12/2026 | C17       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.6  | ACABADO DE MUROS Y CIELOS                | 11.707.582,08  | 17             | 30/11/2026 | 19/12/2026 | C14       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.7  | DOTACION BAÑOS                           | 12.226.673,50  | 18             | 28/11/2026 | 19/12/2026 | C12       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 2.8  | CARPINTERIA METALICA                     | 9.776.862,00   | 16             | 01/12/2026 | 19/12/2026 | C18       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.1  | PRELIMINARES                             | 1.765.219,22   | 8              | 09/12/2026 | 17/12/2026 | C3        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.2  | HIDROSANITARIO                           | 2.798.288,28   | 10             | 09/12/2026 | 19/12/2026 | C21       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.3  | INSTALACIONES ELECTRICAS                 | 785.615,40     | 6              | 11/12/2026 | 17/12/2026 | C5        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.4  | ADECUACION DE MURO                       | 246.926,85     | 5              | 12/12/2026 | 17/12/2026 | C11       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.5  | PISOS Y ENCHAPES                         | 6.800.426,30   | 14             | 03/12/2026 | 19/12/2026 | C4        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.6  | ACABADO DE MUROS Y CIELOS                | 6.735.887,36   | 14             | 03/12/2026 | 19/12/2026 | C20       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.7  | DOTACION BAÑOS                           | 9.711.629,44   | 16             | 01/12/2026 | 19/12/2026 | C19       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 3.8  | CARPINTERIA METALICA                     | 10.554.642,08  | 17             | 30/11/2026 | 19/12/2026 | C15       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 4.1  | RED SANITARIA EXTERNA                    | 18.909.768,35  | 22             | 24/11/2026 | 19/12/2026 | C9        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2     | ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS AI     | 4.2  | RED HIDRAULICA EXTERNA - SISTEMA DE BOMB | 27.789.455,37  | 26             | 19/11/2026 | 19/12/2026 | C2        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

FLUJO DE CAJA SEMANAL - GRUPO 2 - PROGRAMACIÓN FINAL

Distribución proporcional del costo según días laborables de cada actividad.

| Semana | Inicio     | Fin        | Valor semanal  | Acumulado      | %       |
|--------|------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 1      | 16/11/2026 | 22/11/2026 | 46.151.459,01  | 46.151.459,01  | 5,53%   |
| 2      | 23/11/2026 | 29/11/2026 | 154.761.114,30 | 200.912.573,31 | 18,56%  |
| 3      | 30/11/2026 | 06/12/2026 | 202.638.443,20 | 403.551.016,50 | 24,30%  |
| 4      | 07/12/2026 | 13/12/2026 | 218.751.014,13 | 622.302.030,64 | 26,23%  |
| 5      | 14/12/2026 | 20/12/2026 | 211.725.669,38 | 834.027.700,02 | 25,39%  |
| TOTAL  |            |            | 834.027.700,02 |                | 100,00% |

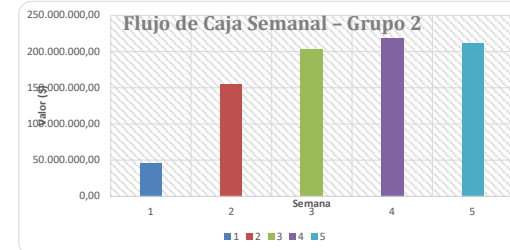

| PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR  | FIRMA |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| JENNYFFER CASTELLANOS   |       | JOSE D MONTEALEGRE      |       | NELSON ALONSO USURRIAGA |       | FRANCIS GOMEZ   |       |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO |       | JUAN GUILLERMO GONZALES |       | CARLOS ANDRES BEDOYA    |       | MARIA C. PENAGO |       |
