

SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION
 PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026
CRONOGRAMA
GRUPO No 3

CRONOGRAMA -FLUJO DE CAJA – GRUPO 3


Estrategia: actividades de 3–10 días, ejecución intercalada, cuadrillas paralelas y cierre máximo 19/12/2026.


Frete	Escenario	Cap.	Actividad	Costo	Dur. (días)	Inicio	Fin	Cuadrilla	19-nov	20-nov	21-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	30-nov	01-dic	02-dic	03-dic	04-dic	05-dic	07-dic	09-dic	10-dic	11-dic	12-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	18-dic	19-dic
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL		PRECONSTRUCCIÓN		7	2026-11-10	2026-11-18	C0																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	1	PRELIMINARES	3.444.577,21	13	19/11/2026	03/12/2026	C1																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	2	HIDROSANITARIO	1.184.034,04	9	21/11/2026	01/12/2026	C3																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	3	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.398.979,50	9	24/11/2026	03/12/2026	C4																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	4	ADECUACION DE MURO	705.765,84	7	26/11/2026	03/12/2026	C5																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	5	PISOS Y ENCHAPES	1.037.467,86	8	28/11/2026	07/12/2026	C6																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	6	ACABADO DE MUROS Y CIELOS	2.102.091,39	11	01/12/2026	14/12/2026	C7																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	7	DOTACION BAÑOS	5.324.540,00	16	01/12/2026	19/12/2026	C8																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	8	CARPINTERIA METALICA	3.164.872,00	13	04/12/2026	19/12/2026	C1																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	9	ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	15.605.817,87	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	10	CUBIERTA	1.917.686,55	10	09/12/2026	19/12/2026	C5																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	11	ADECUACION ZONA VERDE	3.779.987,48	14	03/12/2026	19/12/2026	C3																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	12	LIMPIEZA GENERAL	112.000,00	5	15/12/2026	19/12/2026	C6																										
3	ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA EL GUABAL	13	VARIOS	3.306.202,00	13	04/12/2026	19/12/2026	C4																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA		PRECONSTRUCCIÓN		7	2026-11-10	2026-11-18	C0																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	1	PRELIMINARES	5.346.793,91	6	19/11/2026	25/11/2026	C1																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	2	MURO DE CONTECIÓN	187.759.327,54	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	5	SISTEMA DE DRENAJE - MURO	10.149.726,68	8	27/11/2026	05/12/2026	C1																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	6	SISTEMA DE DRENAJE - CANCHA	15.580.552,30	9	02/12/2026	12/12/2026	C3																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	7	CANAL DISIPADOR	30.355.550,33	11	05/12/2026	18/12/2026	C4																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	8	ANDEN CANCHA	17.665.264,96	9	10/12/2026	19/12/2026	C5																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	9	CERRAMIENTO	4.719.462,00	6	14/12/2026	19/12/2026	C3																										
10	ESCENARIO / FRENTE DE OBRA	10	VARIOS	22.875.345,00	10	09/12/2026	19/12/2026	C1																										

FLUJO DE CAJA SEMANAL – GRUPO 3 – PROGRAMACIÓN FINAL

Distribución proporcional del costo según días laborables de cada actividad.

Semana	Inicio	Fin	Valor semanal	Acumulado	%
1	16/11/2026	22/11/2026	27.065.067,81	27.065.067,81	8,02%
2	23/11/2026	29/11/2026	55.729.773,08	82.794.840,89	16,51%
3	30/11/2026	06/12/2026	71.778.113,48	154.572.954,37	21,27%
4	07/12/2026	13/12/2026	83.956.124,35	238.529.078,72	24,87%
5	14/12/2026	20/12/2026	99.006.965,72	337.536.044,44	29,33%
TOTAL			337.536.044,44		100,00%

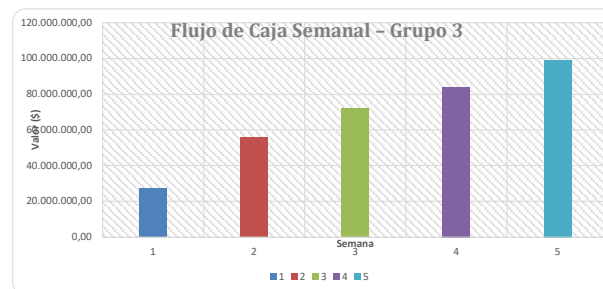

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCIS GOMEZ
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA C. PENAGO
