

SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026
CRONOGRAMA
GRUPO No 4

CRONOGRAMA FLUJO DE CAJA – GRUPO 4


Estrategia: actividades de 3–10 días, ejecución intercalada, cuadrillas paralelas y cierre máximo 19/12/2026.

Frete	Escenario	Cap.	Actividad	Costo	Dur. (días)	Inicio	Fin	Cuadrilla	19-nov	20-nov	21-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	30-nov	01-dic	02-dic	03-dic	04-dic	05-dic	07-dic	09-dic	10-dic	11-dic	12-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	18-dic	19-dic
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA		PRECONSTRUCCIÓN		7	2026-11-10	2026-11-18	C0																										
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	1	PRELIMINARES	79.100.413,53	22	19/11/2026	15/12/2026	C1																										
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	2	ESTRUCTURA	111.221.416,37	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																										
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	3	PINTURA	22.473.084,44	13	01/12/2026	16/12/2026	C3																										
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	4	ELEMENTOS DE LA CANCHA	20.860.714,00	12	05/12/2026	19/12/2026	C5																										
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	5	CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)	38.022.981,30	16	01/12/2026	19/12/2026	C4																										
7	ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA	6	VARIOS	20.772.364,00	12	05/12/2026	19/12/2026	C6																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO		PRECONSTRUCCIÓN		7	2026-11-10	2026-11-18	C0																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	1	PRELIMINARES	803.279,42	7	19/11/2026	26/11/2026	C1																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	2	HIDROSANITARIO	1.301.700,00	8	21/11/2026	30/11/2026	C3																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	3	ADECUACION DE MURO	2.946.329,67	10	25/11/2026	05/12/2026	C4																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	4	INSTALACIONES ELECTRICAS	742.796,00	6	28/11/2026	04/12/2026	C1																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	5	PISOS Y ENCHAPES	1.463.044,20	8	01/12/2026	10/12/2026	C3																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	6	ACABADO DE MUROS Y CIELOS	3.789.239,86	11	03/12/2026	16/12/2026	C6																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	7	DOTACION BAÑOS	5.784.760,00	14	03/12/2026	19/12/2026	C7																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	8	CARPINTERIA METALICA	586.264,00	6	11/12/2026	17/12/2026	C3																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	9	ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN	23.764.122,86	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	10	BORDILLO DE CONFINAMIENTO	7.473.847,97	15	02/12/2026	19/12/2026	C5																										
9	ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO	11	VARIOS	3.681.316,00	11	07/12/2026	19/12/2026	C1																										

FLUJO DE CAJA SEMANAL – GRUPO 4 – PROGRAMACIÓN FINAL

Distribución proporcional del costo según días laborables de cada actividad.

Semana	Inicio	Fin	Valor semanal	Acumulado	%
1	16/11/2026	22/11/2026	26.868.649,66	26.868.649,66	7,79%
2	23/11/2026	29/11/2026	55.460.972,12	82.329.621,78	16,09%
3	30/11/2026	06/12/2026	84.448.404,15	166.778.025,93	24,49%
4	07/12/2026	13/12/2026	90.505.954,25	257.283.980,18	26,25%
5	14/12/2026	20/12/2026	87.503.693,45	344.787.673,63	25,38%
TOTAL			344.787.673,63		100,00%

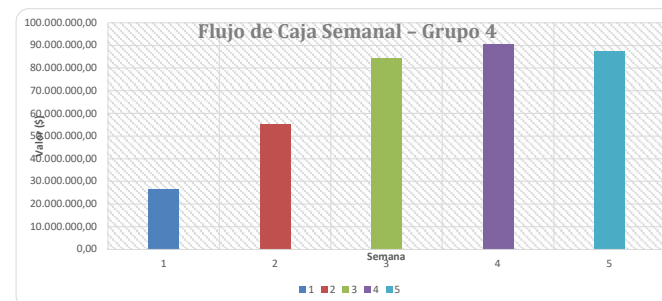

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCIS GOMEZ
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA C. PENAGO
