
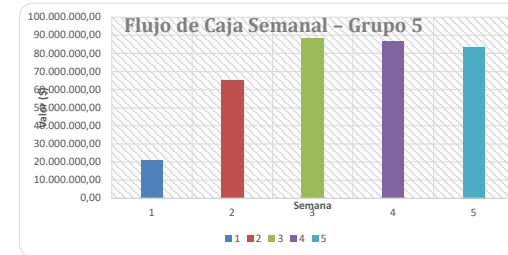



SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION
 PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026
CRONOGRAMA
GRUPO No 5

CRONOGRAMA - FLUJO DE CAJA – GRUPO 5																																			
Estrategia: actividades de 3–10 días, ejecución intercalada, cuadrillas paralelas y cierre máximo 19/12/2026.																																			
Frente	Escenario	Cap.	Actividad	Costo	Dur. (días)	Inicio	Fin	Cuadrilla	19-nov	20-nov	21-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	30-nov	01-dic	02-dic	03-dic	04-dic	05-dic	07-dic	09-dic	10-dic	11-dic	12-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	18-dic	19-dic	
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA		PRECONSTRUCCIÓN		7	2026-11-10	2026-11-18	C0																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	1	PRELIMINARES	4.739.820,07	10	19/11/2026	30/11/2026	C1																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	2	HIDROSANITARIO	2.533.657,38	8	21/11/2026	30/11/2026	C4																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	3	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.474.912,80	7	24/11/2026	01/12/2026	C5																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	4	PISOS Y ENCHAPES	4.889.582,00	10	26/11/2026	07/12/2026	C6																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	5	ACABADO DE MUROS Y CIELOS	4.403.632,54	10	28/11/2026	10/12/2026	C7																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	6	DOTACION BAÑOS	13.748.467,40	16	01/12/2026	19/12/2026	C1																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	7	CARPINTERIA METALICA	9.788.350,00	14	03/12/2026	19/12/2026	C4																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	8	CUBIERTA	3.266.187,50	9	04/12/2026	15/12/2026	C10																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	9	ACONDICIONAMIENTO ANDEN	36.572.819,74	25	20/11/2026	19/12/2026	C3																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	10	BORDILLO CONFINAMIENTO	19.704.492,00	18	28/11/2026	19/12/2026	C8																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	11	ADECUACIÓN RMPA PMR - MOV. TIERRA	3.597.842,34	9	10/12/2026	19/12/2026	C6																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	12	CIMENTACION Y PISO RAMPA	40.383.200,32	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	13	CARPINTERIA METALICA	19.404.887,00	18	28/11/2026	19/12/2026	C9																											
4	ADECUACIÓN ESCENARIO LA SELVA	14	VARIOS	10.772.998,00	14	03/12/2026	19/12/2026	C5																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVEDRA GALI		PRECONSTRUCCIÓN		7	2026-11-10	2026-11-18	C0																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	1	PRELIMINARES/ DEMOLICIONES	10.432.874,71	11	19/11/2026	01/12/2026	C1																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS AREA BI	28.021.689,82	17	23/11/2026	12/12/2026	C3																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	3	ESTRUCTURA CONCRETO BIOSALUDABLES	22.079.886,84	15	26/11/2026	14/12/2026	C4																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	4	ACABADO PISO AREA BIOSALUDABLES	73.706.895,95	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	5	DRENAJES - ZANJAS DE INFILTRACION Y ALCANT	5.145.703,34	8	02/12/2026	11/12/2026	C1																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	6	ANDENES	8.519.501,67	10	05/12/2026	17/12/2026	C5																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	7	ADECUACION ACCESO - CERRAMIENTO	5.402.320,92	8	10/12/2026	18/12/2026	C7																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	8	DOTACIONES	5.577.446,68	9	10/12/2026	19/12/2026	C8																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	9	ADECUACION ZONA VERDE	727.309,00	5	15/12/2026	19/12/2026	C1																											
8	ADECUACION PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO SAAVE	10	VARIOS	9.457.350,00	10	09/12/2026	19/12/2026	C6																											

FLUJO DE CAJA SEMANAL – GRUPO 5 – PROGRAMACIÓN FINAL					
Distribución proporcional del costo según días laborables de cada actividad.					
Semana	Inicio	Fin	Valor semanal	Acumulado	%
1	16/11/2026	22/11/2026	20.674.050,12	20.674.050,12	6,00%
2	23/11/2026	29/11/2026	64.980.230,32	85.654.280,44	18,87%
3	30/11/2026	06/12/2026	88.402.311,43	174.056.591,86	25,67%
4	07/12/2026	13/12/2026	86.684.492,95	260.741.084,82	25,17%
5	14/12/2026	20/12/2026	83.610.743,21	344.351.828,03	24,28%
TOTAL			344.351.828,03		100,00%



PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCIS GOMEZ
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA C. PENAGO
