

Medellín, 1 de septiembre de 2026

721

1300 2629

Señor:
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Director de Desarrollo Físico Gobernación de
Antioquia

Radicado: R 2026010591163
Fecha: 02/09/2026 10:58:10.0
Tipo: INFORME
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Asunto: Entrega en físico del informe del componente Ambiental de Enero a Junio del 2026

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Respetado Ingeniero Juan Diego:

Mediante la presente, remito en físico informe mensual del componente Ambiental aprobado por el apoyo Ambiental a la supervisión de RENTAN, el cual se detalla a continuación.

- Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Suroeste del mes de febrero de 2026. Página de la 1 a la 13 Tomo 1.
- Memoria USB 1. Anexos Informe Ambiental del mes de febrero página 13 A.
- Informe mensual Ambiental No. 2 correspondiente a la subregión Suroeste, del mes de marzo 2026. Página de la 14 a la 30 Tomo 1.
- Memoria USB 2. Anexos Informe Ambiental del mes de marzo página 30 A.
- Informe mensual Ambiental No. 3 correspondiente a la subregión Suroeste, corredor vial Pueblo Rico – San José- Andes del mes de abril 2026. Página de la 31 a la 61 Tomo 1.
- Memoria USB 3. Anexos Informe Ambiental del mes de abril página 61 A.
- Informe mensual Ambiental No. 4 correspondiente a la subregión Suroeste, corredor vial Pueblo Rico – San José- Andes del mes de mayo 2026. Página de la 62 a la 113 Tomo 1.
- Memoria USB 4. Anexos Informe Ambiental del mes de mayo página 113 A.

- Informe mensual Ambiental No. 5 correspondiente a la subregión Suroeste, corredor vial Pueblo Rico – San José- Andes del mes de junio 2026. Página de la 114 a la 152 Tomo 1.
- Memoria USB 5. Anexos Informe Ambiental del mes de abril página 152 A.

La documentación remitida corresponde a los informes mensuales ambientales de interventoría del Lote 5 – Suroeste- contrato No.20260029 de los meses de enero a junio del 2026 y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo. Cordialmente,




CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ESTEFANIA BETANCUR JARAMILLO Profesional Ambiental Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		24/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Recibido
02/09/2026.
10:30am.
Verónica Martínez T.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**INTERVENTORÍA
SADING GROUP S.A.S**

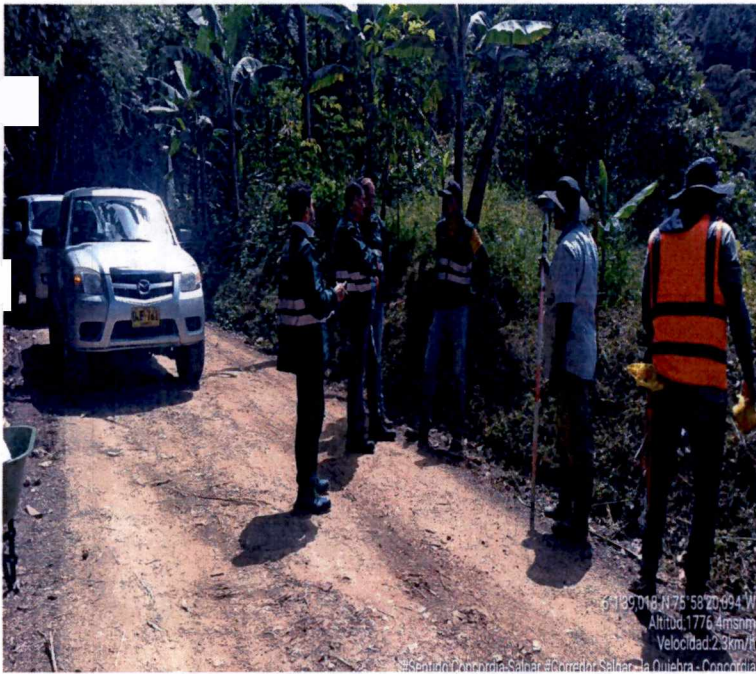

**CONTRATO DE
INTERVENTORÍA NO. 20260029**

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE ACTIVIDADES
DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS
EN LA SUBREGIÓN SUROESTE
(LOTE 5) A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”**

**JUNIO
2026**

**INFORME AMBIENTAL No. 1
CORREDOR VIAL
SALGAR – LA QUIEBRA – CONCORDIA
CORRESPONDIENTE A LA SUBREGIÓN SUROESTE L5**



 GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME AMBIENTAL MENSUAL
(Versión 1- Periodo del 01 al 30 de junio de 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Entidad Contratante

Razón Social RENTAN

OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
No. DE CONTRATO 4600018656 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA.
CONTRATO No. 20260029

CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)
CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025

Firma:  ALEJANDRA VILLADA ALFARO Residente Ambiental Interventoría	Firma:  JOHN FREDDY HENAO LONDOÑO Director(a) de Interventoría	Firma:  MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ GUZMÁN Coordinador Ambiental RENTAN
Elaboró	Aprobó	Aprobó

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	5
2	GENERALIDADES	6
2.1	Contrato de obra	6
2.2	Contrato de interventoría.....	8
2.3	Localización	9
2.4	Alcance del componente ambiental	10
3	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	11
4	MANEJO AMBIENTAL	12
4.1	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	12
4.1.1	Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental	12
4.1.2	Proyecto 2. Capacitación ambiental al personal vinculado al proyecto	12
4.1.3	Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales.....	13
4.2	PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	15
4.2.1	Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.	16
4.2.2	Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción.....	16
4.2.3	Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME	16
4.2.4	Proyecto 4. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.....	17
4.2.5	Proyecto 5. Señalización de frente de obra y sitios temporales	18
4.3	PROGRAMA 3. PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA	19
4.3.1	Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales	19
4.3.2	Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.....	20
4.4	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	20
4.4.1	Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.....	20
4.4.2	Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas	21
4.4.3	Proyecto 3. Protección de fauna.	22
4.4.4	Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.....	23
4.5	PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES	23

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.5.1	Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.....	24
4.5.2	Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y/o concreto	24
4.5.3	Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.....	24
4.5.4	Proyecto 4. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.....	25
4.6	Presupuesto ambiental	25
4.7	INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	26
5	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.....	31
6	ANEXOS	32

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Ficha del contrato de obra	6
Tabla 2.	Recurso humano contratista de Obra	7
Tabla 3.	Ficha del contrato de interventoría	8
Tabla 4.	Recurso humano interventoría	9
Tabla 5.	Grupo de la gestión ambiental.....	12
Tabla 6.	Consolidado de capacitaciones ambientales.....	13
Tabla 7.	Registro fotográfico de capacitaciones.....	13
Tabla 8.	Permisos ambientales	14
Tabla 9.	Posible sitio para disposición final de RCD	14
Tabla 10.	Permisos minero ambientales a terceros.....	14
Tabla 11.	Registro fotográfico de actividades de inspección y limpieza	15
Tabla 12.	Permisos ambientales de posibles fuentes de materiales	16
Tabla 13.	Gestión de zodme, predio la Esmeralda.....	17
Tabla 14.	Consolidado de RCD dispuestos.....	17
Tabla 15.	Información del gestor de residuos sólidos.....	18
Tabla 16.	Consolidado de residuos sólidos generados en obra.....	18
Tabla 17.	Registro fotográfico de sitios temporales.....	19
Tabla 18.	Registro fotográfico de Inspección para el inventario de áreas de drenaje.....	20
Tabla 19.	Reporte de material vegetal generado por limpieza.....	21
Tabla 20.	Disposición de sobrantes de limpieza.....	21
Tabla 21.	Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.....	21
Tabla 22.	Instalaciones temporales.....	23
Tabla 23.	Registro de documentos de vehículos.....	24
Tabla 24.	Tabla de indicadores ambientales	26

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Área de influencia de la ruta.....	10
----------------	------------------------------------	----

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la gestión ambiental desarrollada por la Interventoría, se ejecutan actividades permanentes de acompañamiento, apoyo técnico, verificación y control sobre las acciones implementadas por el contratista, con el propósito de asegurar una adecuada gestión ambiental en la obra. Estas acciones están orientadas a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución del proyecto que tiene como objeto “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)”. En el frente de obra del corredor Salgar – La Quebra – Concordia, para un total de 15,93 km.

Durante el periodo de ejecución del proyecto, comprendido en sus diferentes etapas (preliminar y constructiva), se implementan diversas actividades de interés ambiental enfocadas en la conservación de un ambiente sano y sostenible, mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente, la Guía de Manejo Social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo para proyectos de infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

De acuerdo con el ejercicio de identificación, evaluación y valoración de los impactos ambientales, se determina que el proyecto puede generar un impacto tipo II según la clasificación, indica, que su afectación no trasciende el área de influencia directa de la obra y que, con la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se puede prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales que se generan a partir de las actividades constructivas del contrato.

Con el propósito de dar cumplimiento al PMA, se presenta este informe para evidenciar las actividades de control y seguimiento requeridas para garantizar la ejecución adecuada de labores constructivas, de forma equilibrada y armónica con el proyecto, de conformidad con los lineamientos ambientales establecidos por la Rentan y la Gobernación de Antioquia.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2 GENERALIDADES

Como resultado del proceso de identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales, el proyecto fue clasificado con impactos Tipo II, caracterizados por generar afectaciones localizadas dentro del área de influencia directa y susceptibles de manejo mediante la aplicación de medidas de prevención, mitigación y control establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

En este contexto, el presente informe consolida las actividades de seguimiento, inspección y control ambiental ejecutadas durante el periodo reportado, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos definidos por la Rentan y la Gobernación de Antioquia en la Guía de Manejo Socioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la adecuada gestión ambiental del proyecto.

2.1 Contrato de obra

Contrato #: 25OO111B2824 de 2025
Objeto: “Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 5 suroeste) a cargo del Departamento de Antioquia”
Razón Social Contratista: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025.
Dirección: Calle 17 A sur No 44-170 interior 108 Edificio Natuzzi Living, Barrio Santa María de los Ángeles – Medellín.
Teléfono: 6043131726
Residente Ambiental: Alvaro Congote Rodríguez
E-mail: ambsalgar.viasantioquia2025@gmail.com
Teléfono de contacto: 3113392052

Tabla 1. Ficha del contrato de obra

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	05/02/2026	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	05/02/2027	Fecha de reinicio	N/A
Fecha de Prórroga	N/A	OBSERVACION: N/A	
Plazo total del contrato	12 meses	Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
Se firma acta de inicio de contrato de obra 25OO111B2824 de 2025			

Fuente: Elaboración propia

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tabla 2. Recurso humano contratista de Obra

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO SALGAR						
CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMP.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	HECTOR FABIO PARRA HENAO	AYUDANTE OBRA	1039759372	Contratista	11/06/26	
2	JOHN FREDY VELEZ RESTREPO	AYUDANTE OBRA	1039759335	Contratista	11/06/26	
3	JUAN FERNANDO ALVAREZ PARRA	AYUDANTE OBRA	1040200555	Contratista	11/06/26	
4	JOSE FREDY MONTOYA VELEZ	AYUDANTE OBRA	71230775	Contratista	11/06/26	
5	LUIS ESTEBAN RUA CADAVID	AYUDANTE OBRA	1017170614	Contratista	11/06/26	
6	JUAN ESTEBAN URAN LORA	AYUDANTE OBRA	1039760511	Contratista	11/06/26	
7	LUIS FERNANDO MONTOYA VELEZ	AYUDANTE OBRA	1039758056	Contratista	11/06/26	
8	MAURICIO OSPINA BETANCUR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES	1040201140	Contratista	13/06/26	
9	ARNOBIS DE JESUS MARTINEZ ALVAREZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES	1041531901	Contratista	13/06/26	
10	KEVIN ALEXIS MONTOYA VELEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES	1040201276	Contratista	13/06/26	

Fuente: Equipo SST de Interventoría.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2.2 Contrato de interventoría

Contrato: 20260029
Objeto: “Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la subregión suroeste (lote 5) a cargo del departamento de Antioquia”
Razón Social Contratista: SADING GROUP S.A.S
Dirección: Calle 48B # 66-37 / Oficina 201 - Medellín – Colombia
Teléfono: (4) 358 18 59
Residente Ambiental: Alejandra Villada Alfaro
E-mail: i.sadingsuroestel5@gmail.com
Teléfono de Contacto: 3012094507

Tabla 3. Ficha del contrato de interventoría

AVANCE GENERAL		SUSPENSIÓN	
Fecha de inicio	14/01/2026	Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación	14/01/2027	Fecha de reinicio	N/A
Fecha de Prórroga	N/A	OBSERVACION: N/A	
Plazo total del contrato	13 MESES	Contados a partir de la suscripción del acta de inicio	

Se firma acta de inicio de contrato de obra el 20260029

Fuente: Elaboración propia

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tabla 4. Recurso humano interventoría

Listado personal de Interventoría						
CONTRATO No. 20260029						
No	Nombre	Cargo	Cedula	Empresa	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
1	John Fredy Henao Londoño	Director Interventoría	70.419.829	SADING GROUP S.A.S	6/02/2026	
2	Yenner Francisco Cárdenas Comas	Residente Técnico	1.015.429.618	SADING GROUP SAS.	09/06/2026	
3	Eliane López	Profesional Social	1.098.632.763	SADING GROUP SAS.	26/03/2026	
4	Alejandra Villada Alfaro	Profesional Ambiental	1.096.208.878	SADING GROUP SAS.	01/06/2026	
5	John Fredy Moreno Bedoya	Tecnólogo Civil	70.421.672	SADING GROUP SAS.	20/06/2026	
7	Alcibiades Herrera Franco	Conductor	98.485.678	SADING GROUP SAS.	01/06/2026	
8	Javier Ernesto Rodríguez Díaz	Topógrafo	79.353.827	SADING GROUP SAS.	03/03/2026	

Fuente: Equipo SST de Interventoría.

2.3 Localización

La vía entre Salgar y Concordia en el Suroeste antioqueño tiene una distancia de aproximadamente **20 a 30 km** dependiendo de la ruta exacta y se destaca por su topografía montañosa y su conexión estratégica con el suroeste antioqueño, combinando infraestructura moderna con desafíos de transitabilidad en zonas rurales. Además, se caracterizan por su arquitectura tradicional, el ecoturismo y la cultura cafetera.

El tramo de la vía a intervenir dentro de Salgar – La Quiebra – Concordia corresponde a un total de **15,93km** de acuerdo al alcance contractual.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

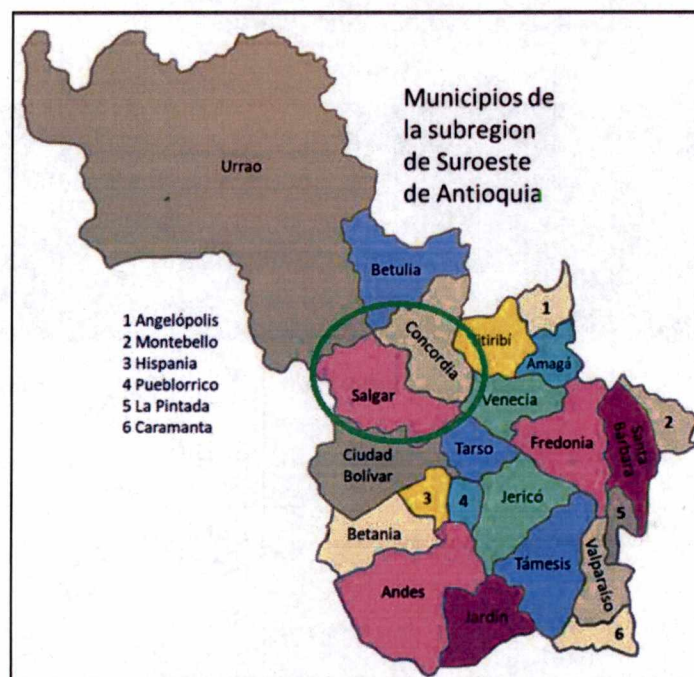


Ilustración 1. Área de influencia de la ruta.
(Fuente: <https://www.antioquia.gov.co/suroeste>)

2.4 Alcance del componente ambiental

Durante el periodo de ejecución del proyecto, comprendido en sus diferentes etapas (preliminar y constructiva), se implementan diversas actividades de interés ambiental enfocadas en la conservación de un ambiente sano y sostenible, mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente, la Guía de Manejo Socioambiental y SST y el Plan de manejo ambiental (PMA).

El presente informe describe las acciones de gestión ambiental desarrolladas durante el mes de junio de 2026, en el marco del contrato cuyo objeto es “Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (lote 5 Suroeste)”. En el frente de obra del corredor Salgar – La Quebra – Concordia para un total de 15.93 km”.

Estas acciones se orientan a garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto, el fortalecimiento de la gestión ambiental en campo y la preservación de las condiciones ambientales de las zonas intervenidas, en articulación con las autoridades competentes y la comunidad del área de influencia.

		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

En el presente capítulo se describen todas las actividades ambientales que se realizaron en el periodo reportado con el objetivo de controlar y mitigar los impactos asociados a las actividades de ejecución del proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el periodo reportado por parte del contratista:

- Gestión interna para el pedido de elementos requeridos para la gestión ambiental en obra (punto ecológico, señalización, plástico, bolsas y demás insumos establecidos en la inversión ambiental contractual).
- Gestión logística para la consecución de campamento, acopios temporales y demás instalaciones requeridas para la ejecución de las actividades.
- Avance en la atención de observaciones generadas por interventoría del PMA.
- Gestión de documentación durante la consecución de zonas de depósitos.
- Gestión de documentos ambientales que facilite el empleo de fuentes de materiales pétreos.
- Gestión para los proveedores de USP (Unidad sanitaria portátil).
- Gestión para conseguir los proveedores para el manejo y disposición de Respel/Especiales.
- Consolidación de soportes de la gestión ambiental mensual.
- Desarrollo de inducciones y capacitaciones al personal operativo.
- Participación en mesa de trabajo ambiental convocada por la interventoría.
- Reconocimiento del corredor Salgar – La Quiebra para identificar aspectos ambientales a tener en cuenta durante la ejecución del proyecto.
- Gestión en la Empresa de Servicios públicos y Bombreros del Municipio de Salgar para el suministro del recurso hídrico.
- Inspección durante las actividades de limpieza de obras transversales existentes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.
- Mesa de trabajo ambiental (18/06/2026).

4 MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se describen todas las medidas de manejo ambiental implementadas durante el periodo del 01 al 30 de junio del 2026, para la ejecución del contrato de obra con el propósito de prevenir, mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos y fortalecer los positivos, evidenciando el cumplimiento del contenido del Plan de Manejo Ambiental revisado a la fecha, conforme a la guía de manejo social ambiental y SST de la gobernación de Antioquia.

4.1 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

4.1.1 Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental

La gestión ambiental del proyecto se encuentra a cargo del profesional ambiental, quien cuenta con una dedicación del 100 % en el corredor comprendido entre Salgar – La Quebra – Concordia.

El profesional actualmente adelanta actividades de gestión administrativa y operativa orientadas al cumplimiento de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la normatividad ambiental vigente, los lineamientos contractuales definidos por la Rentan y la Gobernación de Antioquia, así como los requerimientos establecidos por la Interventoría asignada, garantizando el adecuado desarrollo ambiental del proyecto.

Para la gestión ambiental dentro de las intervenciones técnicas en el corredor, se cuenta con la disponibilidad del profesional ambiental del contratista y se proyecta el ingreso de un auxiliar ambiental, el cual se encuentra contemplado dentro de la bolsa del presupuesto de dicho componente y una vez inicien actividades constructivas será vinculado al contrato para apoyar la implementación de los programas de gestión ambiental, ya que por el momento sólo han adelantado labores de limpieza de obras transversales existentes.

Tabla 5. Grupo de la gestión ambiental

CARGO	PROFESIÓN	CANTIDAD
Profesional ambiental del contratista	Ingeniero Ambiental	1
Auxiliar ambiental (proyectado para agosto/2026)	Personal operativo (ayudante)	1
Total:		2

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 Proyecto 2. Capacitación ambiental al personal vinculado al proyecto

Durante el mes de junio/2026, el contratista desarrolló 2 inducciones correspondiente a la gestión ambiental que se debe garantizar en obra y fue dirigido al personal administrativo y operativo del corredor, información que se especifica a continuación:

Tabla 6. Consolidado de capacitaciones ambientales

FECHA	TEMA	LUGAR	No. ASISTENTES
25/06/2026	Inducción del Sistema de Gestión Ambiental (personal administrativo)	Tramo Salgar – La Quiebra	8
25/06/2026	Inducción del Sistema de Gestión Ambiental (personal operativo)	Tramo Salgar – La Quiebra	9
TOTAL			17

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Registro fotográfico de capacitaciones.



Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales

En este periodo se ejecutaron actividades de trazado, levantamiento topográfico y limpieza de algunas obras existentes de drenaje transversales. Es decir que no se realizaron actividades que impliquen suministro de material pétreo, ni disposición final de RCD, ya que el material sobrante generado de las actividades de limpieza fue muy poco y se encuentra acopiado en el sitio de intervención sin generar obstrucción del tránsito vehicular.

Actualmente, de acuerdo a lo identificado en el corredor mediante recorridos en conjunto, no se contempla tramitar permisos para aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución del contrato de obra que corresponde a este tramo del corredor Salgar – La Quiebra – Concordia.

Sin embargo, se encuentra pendiente adelantar la inspección de obras transversales objeto de intervención y avanzar conforme a las determinaciones del componente técnico del contratista e interventoría para definir el alcance y así mismo realizar las respectivas validaciones, determinando en la marcha la necesidad de tramitar permisos ambientales.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tabla 8. Permisos ambientales

	PERMISO	VIGENCIA	AUTORIDAD	TRAMITE
1	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Cumplimiento legal de terceros: Actualmente el contratista se encuentra adelantando la gestión para la consecución zodme avalado por la Secretaría de Planeación y así mismo que sea viable para el proyecto considerando la ubicación de las intervenciones. Por el momento se dispone de documentación parcial (ver anexo 3) que demuestra en la gestión del contratista y se proyecta que para el próximo periodo se cuente con los soportes completos y autorizados conforme a los lineamientos establecidos por la Gobernación de Antioquia mediante comunicado N°2026030586955 del 10 de junio/2026.

Tabla 9. Posible sitio para disposición final de RCD

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MUNICIPIO	VÍA	ABSCISA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MATRICULA INMOBILIARIA N°
Zodme, las Brisas, sector Esmeralda	Salgar, Antioquia	Salgar – La Quebra	Predio la Esmeralda LT 2	Kilómetro 1	005-35421 de la oficina de Instrumentos Públicos de Ciudad Bolívar, zona urbana del Municipio de Salgar

Fuente: Anexo 3, documentación de posible zodme.

Ahora bien, para el suministro de material pétreo se cuenta con la siguiente cantera aprobada por Interventoría, considerando la revisión de la documentación minero ambiental presentada por el contratista:

Tabla 10. Permisos minero ambientales a terceros

Nombre de la Fuente de Material	Vía	Abscisa	Coordenadas Geográficas	No. Título Minero	No. Resolución Licencia ambiental
Cantera los Guerreros	Fredonia – La Pintada	-75.62270389	5.75312145700002	HJBM-04	Aplica PMA, según comunicación 160CA-COI2606-15906 de Corantioquia

Fuente: Anexo 2, Posible fuente de suministro de material.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Nota: De igual forma se encuentra en gestión otras alternativas para zodme dentro del área de influencia directa de la intervención en el corredor Salgar – La Quiebra - Concordia.

4.2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

En el periodo reportado no aplica, debido a que aún no se ha dado inicio a las actividades constructivas, sólo se han adelantado labores administrativas, de logística, de inspección en campo, levantamiento topográfico y limpieza de obras transversales existentes para los inventarios de estructuras hidráulicas y drenajes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

Tabla 11. Registro fotográfico de actividades de inspección y limpieza

	
Foto 1. Limpieza de drenajes.	Foto 2. Verificación con topografía.
	
Foto 3. Inspección de topografía.	Foto 4. Personal designado en campo.

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, de logística, de inspección en campo, levantamiento topográfico y limpieza de obras transversales existentes para los inventarios de estructuras hidráulicas y drenajes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

4.2.2 Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción

A continuación, para el suministro de material pétreo se cuenta con la siguiente cantera aprobada por Interventoría, considerando la revisión de la documentación minero ambiental presentada por el contratista:

Tabla 12. Permisos ambientales de posibles fuentes de materiales

Nombre de la Fuente de Material	Vía	Abscisa	Coordenadas Geográficas	No. Título Minero	No. Resolución Licencia ambiental
Cantera los Guerreros	Fredonia – La Pintada	-75.62270389	5.75312145700002	HJBM-04	Aplica PMA, según comunicación 160CA-COI2606-15906 de Corantioquia

Fuente: Anexo 2, Posible fuente de suministro de material

4.2.3 Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME

Actualmente el contratista se encuentra adelantando la gestión para la consecución zodme avalado por la Secretaría de Planeación y así mismo que sea viable para el proyecto considerando la ubicación de las intervenciones. Por el momento se dispone de documentación parcial (ver anexo 3) que demuestra en la gestión del contratista y se proyecta que para el próximo periodo se cuente con los soportes completos y autorizados conforme a los lineamientos establecidos por la Gobernación de Antioquia mediante comunicado N°2026030586955 del 10 de junio/2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tabla 13. Gestión de zodme, predio la Esmeralda.

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MUNICIPIO	VÍA	ABSCISA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MATRICULA INMOBILIARIA N°
Zodme, las Brisas, sector Esmeralda	Salgar, Antioquia	Salgar – La Quebra	Predio la Esmeralda LT 2	Kilómetro 1	005-35421 de la oficina de Instrumentos Públicos de Ciudad Bolívar, zona urbana del Municipio de Salgar

Fuente: Anexo 3, documentación de posible zodme.

Tabla 14. Consolidado de RCD dispuestos

PERIODO	IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VOLÚMEN DEPOSITADO (m³)	TIPO DE MATERIAL
Junio/26	NA	NA	NA
TOTAL		NA	

Fuente: Elaboración propia

4.2.4 Proyecto 4. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, de logística, de inspección en campo, levantamiento topográfico y limpieza de obras transversales existentes para los inventarios de estructuras hidráulicas y drenajes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

Además, el Contratista se encuentra gestionando en las áreas de influencia directa, que municipio cercano les puede prestar el servicio de recolección de los residuos generados para hacer el respectivo convenio o en su efecto de acuerdo a la cantidad y tipo de residuos se gestionará con la Empresa de Aseo y Servicios Públicos del Municipio donde se realice la intervención, es decir que para residuos convencionales y/u ordinarios se manejará de esta manera y para residuos reciclables se entregarán a recuperadores de la zona avalados para el manejo y aprovechamiento de estos residuos. De igual forma en el campamento del contratista se encuentra el respectivo punto ecológico para la correcta clasificación de los residuos.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Para residuos especiales y respel, el contratista presentó a la interventoría mediante el PMA la documentación del gestor Ecotransa S.A.S., el cual cumple con las regulaciones en materia de transporte, tratamiento y disposición final.

Tabla 15. Información del gestor de residuos sólidos.

CLASIFICACIÓN	USO Y/O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN SU CLASIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	NIT
ORDINARIOS (No aprovechables)	Posiblemente la Empresa de Servicios públicos de Salgar	Empresas Públicas de Salgar S.A. E.S.P.	811042944
APROVECHABLES (Reciclable y/o reutilizable)	Posible recuperador de la zona	Empresa/persona natural preferiblemente constituida	Cuando se generen los residuos se gestionarán adecuadamente.
ESPECIALES o PELIGROSOS	Copacabana	Ecotransa	900202810-1

Fuente: <https://www.epsalgar.gov.co/politicas/>

Tabla 16. Consolidado de residuos sólidos generados en obra.

Período	Residuos Sólidos Ordinarios (Kg)	Residuos Aprovechables (Kg)	Residuos Sólidos Especiales o Peligrosos (Kg)	Total, Residuos Generados (Kg)
Jun/2026	NA	NA	NA	NA

Fuente: Elaboración propia

Nota: Hasta acumular una cantidad considerable, se realizará la entrega a un gestor autorizado.

4.2.5 Proyecto 5. Señalización de frente de obra y sitios temporales

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, de logística, de inspección en campo, levantamiento topográfico y limpieza de obras transversales existentes para los inventarios de estructuras hidráulicas y drenajes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Sin embargo, se evidencia en el campamento del contratista que han llegado varios elementos de señalización y se realiza seguimiento al contratista con el suministro y disponibilidad de la señalización completa, ya que informaron a la interventoría que se realizó la respectiva gestión para el pedido en almacén y se encuentra en proceso de traslado desde Medellín hasta Salgar donde está ubicado el campamento principal de obra.

Tabla 17. Registro fotográfico de sitios temporales.



Fuente: Elaboración propia

4.3 PROGRAMA 3. PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA

4.3.1 Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, de logística, de inspección en campo, levantamiento topográfico y limpieza de obras transversales existentes para los inventarios de estructuras hidráulicas y drenajes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

Adicionalmente a lo descrito, se realizó el reconocimiento del área de trabajo, identificando obras de drenaje transversales que posiblemente requieran permiso de ocupación de cauce de acuerdo con el alcance de las intervenciones, determinadas por el equipo técnico del contratista e interventoría mediante el replanteo y elaboración de un inventario que permita precisar las condiciones específicas de cada obra a intervenir, las cuales serán objeto de evaluación por parte del componente ambiental para la gestión pertinente y debido trámite de obtención de permisos de ocupación de cauce. Una vez se finalice el inventario será entregado oficialmente a la entidad contratante.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Tabla 18. Registro fotográfico de Inspección para el inventario de áreas de drenaje.

	
Foto 1. Inspección en campo para levantamiento de inventario.	Foto 2. Inspección en campo de condiciones de obras existentes.

Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Para este proyecto se contempla que el proveedor de servicio de suministro de unidades sanitarias portátiles, sea la empresa Veolia quien cuenta con la respectiva documentación ambiental que lo avala para realizar el debido transporte y tratamiento de aguas residuales. Dicha documentación se encuentra en uno de los anexos del PMA revisado por interventoría.

Es importante aclarar que para este periodo no se obtuvieron USP, ya que el personal operativo es local y por lo tanto cuentan con el servicio sanitario, mientras se logra avanzar con la instalación de tubería en donde se garantizará el suministro de USP.

4.4 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Al no haber iniciado las actividades constructivas, este programa no plica para el presente periodo.

Por el momento, el contratista se encuentra en proceso de gestión con Empresas de Servicios Públicos de Salgar para el futuro suministro de agua para cuando inicien las obras constructivas.

4.4.1 Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades de carácter constructivo, solo se adelantaron labores administrativas, de logística, de inspección en campo, levantamiento topográfico y limpieza de obras transversales existentes para los inventarios de estructuras hidráulicas y drenajes, asegurando una gestión adecuada de residuos vegetales aprovechados y utilizados para paisajismo de áreas aledañas a la intervención.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Dentro de las actividades de limpieza de estructuras hidráulicas existentes, se generó las siguientes cantidades promedio de material vegetal:

Tabla 19. Reporte de material vegetal generado por limpieza.

Período	Clasificación	Ubicación	Abscisa	Total, Residuos Generados (m3)	Observaciones
Mes 1 (Junio/2026)	Material vegetal proveniente de limpieza de obras hidráulicas	Salgar – La Quiebra	Del km 0 + 00 al km 15 + 100	7	Este material es ubicado en las márgenes de la vía, para su posterior manejo, sin obstaculizar el tránsito.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Disposición de sobrantes de limpieza.

ABSCISA	MUNICIPIO	VÍA	VERDEDA	NOMBRE DEL PROPIETARIO
Del km 0 + 00 al km 15 + 100	Salgar – La Quiebra	Área de influencia directa del proyecto.	Vía Salgar	Actividades y almacenamiento temporal en sector público

Fuente: Elaboración propia

Nota: El material será seleccionado para determinar si es apto para paisajismo y se pueda aprovechar al máximo con previa evaluación y gestión entre el equipo ambiental y técnico del contratista e interventoría.

Tabla 21. Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.

Tipo de vegetación existente	Tipo de vegetación que será afectada	Actividad requerida	Permiso Ambiental Requerido.	No. Resolución que otorga el permiso ambiental	Requerimientos ambientales	Cumplimiento de requerimientos ambientales
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

4.4.2 Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

Para el periodo reportado no se ejecutaron labores que requieran recuperar áreas afectadas dentro del marco del proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.4.3 Proyecto 3. Protección de fauna.

En el periodo reportado no se evidencio fauna silvestre atropellada durante los recorridos e inspecciones, pero dentro de las medidas de manejo se tiene contemplado:

- Verificación a través de inspección visual la presencia de nidos o madrigueras en las zonas de trabajo.
- Las especies que se rescaten que no reporten condiciones de salud que amerite su atención, serán ahuyentadas/reubicadas en el menor tiempo posible en espacios que garanticen su protección y se informará oportunamente a la autoridad competente del Municipio de Salgar.
- Cuando el individuo identificado no responda al ahuyentamiento y se requiera su captura, se informará a la entidad competente para su relocalización cercana en donde el animal no sufra ninguna afectación posterior.
- Se capacitará al personal en el manejo y protección de fauna.
- Realizar recorridos periódicos de inspección ambiental previos al inicio de actividades constructivas, con el fin de identificar posibles zonas de tránsito o refugio de fauna silvestre.
- Implementar señalización preventiva en los frentes de obra y vías de acceso, orientada a sensibilizar a conductores y operarios sobre la posible presencia de fauna silvestre y la necesidad de reducir la velocidad.
- Establecer límites de velocidad para la maquinaria y vehículos vinculados al proyecto, especialmente en zonas con cobertura vegetal o cercanas a cuerpos de agua.
- Evitar la remoción innecesaria de cobertura vegetal y realizar las actividades de desmonte de manera gradual, permitiendo el desplazamiento natural de la fauna hacia áreas seguras.
- Programar las actividades constructivas de mayor impacto (movimiento de maquinaria pesada, o rocería) en horarios diurnos, reduciendo la afectación sobre especies de hábitos nocturnos.
- Mantener las áreas de trabajo libres de residuos orgánicos y alimentos que puedan atraer fauna silvestre hacia zonas operativas.
- Prohibir expresamente la caza, captura, tenencia, comercialización o alimentación de fauna silvestre por parte del personal del proyecto, dejando esta disposición incluida dentro de las normas internas de obra.
- Contar con el contacto actualizado de autoridades ambientales y centros de atención de fauna silvestre para la atención oportuna de individuos heridos o en condición de vulnerabilidad.

- Registrar mediante informes de seguimiento ambiental cualquier avistamiento, rescate, relocalización o incidente relacionado con fauna silvestre, con el fin de generar trazabilidad y análisis preventivo.
- Evitar el uso innecesario de bocinas, ruidos excesivos o iluminación directa hacia áreas naturales durante horarios nocturnos, con el fin de minimizar alteraciones en el comportamiento de la fauna.

4.4.4 Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

Este programa no aplica para este proyecto, ya que no se encuentra en una zona de reserva natural o destinada a la conservación, por los ecosistemas frágiles que requieran de un manejo especial.

Con base en lo anterior, es importante mencionar que, en caso de llegar a observarse algún cambio en las condiciones del entorno, que altere considerablemente el estado ambiental del área de influencia directa de las obras, se realizará el debido reporte a la Entidad Contratante y Autoridad Ambiental competente de ser necesario, para adoptar las medidas pertinentes frente al caso.

4.5 PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Para la implementación de este programa el contratista tiene contemplado acondicionar más campamentos temporales de obra, adicionales al existente actualmente en donde se han adecuado acopios de materiales e insumos, equipos y maquinaria.

Tabla 22. Instalaciones temporales.

	
Foto 1. Campamento temporal del contratista.	Foto 2. Acondicionamiento inicial del espacio para labores administrativas.

Fuente: Elaboración propia

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.5.1 Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

No aplica para este mes, debido a que aún no se inician labores constructivas y el contratista se encuentra gestionando todo lo correspondiente a selección de espacios y generación de acuerdos con los propietarios de sitios de interés identificados durante la avanzada en el área de influencia directa de las intervenciones.

4.5.2 Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y/o concreto

De acuerdo con la información que suministra el contratista, no se tiene contemplado la instalación de plantas de trituración, plantas de asfalto, ni de concreto. Por lo tanto, el suministro de materiales se realizará mediante terceros, es decir canteras debidamente autorizadas por la autoridad ambiental y respaldadas con los soportes minero ambientales presentados a la interventoría de manera oportuna, tal como se llevó a cabo la revisión de documentación de la Cantera Los Guerreros (Ver anexo 2).

4.5.3 Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

En el presente informe el contratista reporta la documentación del ingreso de una retroexcavadora. Sin embargo su operación no es permanente. (Ver anexo 6)

Tabla 23. Registro de documentos de vehículos

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA DE SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
				Fecha de vencimiento	CDA	Aprobado S/N
Retroexcavadora de neumático Caterpillar MC305095	TR88618 Linea: 416	2021	2027	NA	NA	NA

Fuente: Elaboración propia

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.5.4 Proyecto 4. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.

Este programa no plica en el presente informe, toda vez que no se han ejecutado labores constructivas, como se mencionó en los programas y proyectos anteriores.

4.6 Presupuesto ambiental

Mediante mesa de trabajo ambiental entre el contratista e interventoría llevada a cabo el 18/06/2026 (ver anexo 7), se acordó trabajar con el presupuesto del PMA contractual hasta que se identifique un posible agotamiento del recurso de cualquier ítem, lo que generará necesariamente una reunión entre las partes (Contratista – Interventoría – Entidad Contratante) para evaluar y determinar alternativas de solución.

A partir del mes de julio/2026, se empezará con el proceso documental y reconocimiento del recurso utilizado para la gestión ambiental en obra de acuerdo a lo evidenciado en los frentes de trabajo y con la presentación de las respectivas facturas y memorias para facilitar el control y seguimiento.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.7 INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

A la fecha no se cuenta con la aprobación del PMA, ya que éste apenas fue revisado por interventoría y tampoco se han iniciado actividades constructivas, lo que conlleva a tener información parcial e imposibilitar calcular todos los indicadores para el monitoreo y seguimiento; por ende para este mes no aplica la implementación de este registro en todos los proyectos.

Tabla 24. Tabla de indicadores ambientales

INDICADORES Y REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA AMBIENTAL	PARAMETRO DE CONTROL MEDIDO			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	FÓRMULA DEL INDICADOR	VALOR			
		MES	INDICADOR	(%)	
PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número de programas cumplidos / total de programas propuestos que aplican en el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número profesionales vinculados /Número de profesionales requeridos) *100.	1/1	100%	100%	Ver proyecto en e presente informe.
Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental	(Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos) *100.	1/1	100%	100%	Ver proyecto en e presente informe.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL TRIMESTRAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	(Número de capacitaciones ambientales ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas) *100	1/1	100%	100%	Ver proyecto en el presente informe.
Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	(Número de inducciones ambientales realizadas/ Número de inducciones programadas) *100	1/1	100%	100%	Ver proyecto en el presente informe.
Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	(Número de evaluaciones realizadas/ No. de personas capacitadas) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	(Número de permisos obtenidos/ Número de permisos requeridos) *100.	1/2	50%	50%	Ver proyecto en el presente informe. (Cantera/zodme)
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					
Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1			
		PERIODO JUNIO DE 2026			
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			

Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción	(volumen de material aluvial y cantera adquirido con licencia en el periodo /Volumen total de material aluvial y de canteras requerido para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y de depósito.	(Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de RCD generados) *100.	NA	NA	NA	NA
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Cantidad de residuos no aprovechables dispuestos adecuadamente/Cantidad totales de residuos no aprovechables generados) *100.	NA	NA	NA	NA
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Cantidad residuos aprovechables/Total residuos aprovechables generados) *100.	NA	NA	NA	NA
Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos.	(Cantidad de RESPEL gestionados para tratamiento o disposición final/Cantidades totales de RESPEL generados) *100.	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO					
Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales	(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) *100.	NA	NA	NA	NA

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, e industriales.	(No. De unidades sanitarias disponibles/ No. De unidades sanitarias requeridas) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 3. Manejo para el uso eficiente del agua.	(Número de medidas para el uso eficiente del agua realizadas/ Número de medidas para el uso eficiente del agua proyectadas) *100	NA	NA	NA	NA
PRORAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS					
Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.	(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) *100.	NA	NA	NA	NA
Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.	(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) *100.	NA	NA	NA	NA
Proyecto 3. Protección de fauna.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES					
Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	1/1	100%	100%	Ver proyecto en el presente informe.
Proyecto 2. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de trituración, asfalto y/o concreto.	(No. De medidas ambientales implementadas/No. Medidas ambientales establecidas que aplican para el periodo) *100	NA	NA	NA	NA
Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	(Número de revisiones realizadas /Número de maquinaria, equipo y vehículos del proyecto) *100	1/1	100%	100%	Ver proyecto en el presente informe.
Proyecto 4. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido	(Cantidad vehículos con revisiones técnico-mecánicas vigente/ Cantidad vehículos vinculados a la obra) *100.	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento del PMA (%) = $\sum$ indicadores de los programas que conforman el PMA				Se realiza cumplimiento de los programas ambientales aplicados para el periodo.	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

5 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- En términos generales la Interventoría considera que la gestión adelantada a la fecha, está enmarcada en los lineamientos ambientales del proyecto. Por el momento se presentó el PMA, el cual se encuentra en fase de revisión y atención de observaciones. Por ende, no se tiene aprobado el documento a la fecha.
- Se recomienda agilizar las gestiones de tramites ambientales como son los ZODMES y permisos ambientales en caso de requerirse.
- Se recomienda acatar en el menor tiempo posible las solicitudes o recomendaciones impartidas por la Interventoría de forma escrita y verbal, bien sea en bitácora de obra, oficios, reuniones y correos electrónicos; con el fin de mejorar la gestión ambiental de la obra.
- Para los vehículos y maquinaria empleada para la ejecución de las obras, deben presentar la documentación como la Hoja de vida, Ficha de mantenimiento, SOAT, RTM vigentes y por lo menos con un día de antelación para su revisión y aprobación.
- Se recomienda realizar las gestiones para la consecución y generación de contratos o acuerdos para campamento y adecuación de sitios de acopio temporal y suministro de agua para las futuras labores constructivas.
- Se encuentra programado el levantamiento de información para la elaboración de inventario de obras transversales que posiblemente requieran de permiso de ocupación de cauce.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
		PERIODO JUNIO DE 2026
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

6 ANEXOS

Para el periodo reportado se anexan la siguiente información:

- Anexo 1. Capacitaciones
- Anexo 2. Documentación de posibles fuentes de suministro de materiales.
- Anexo 3. Documentación de posible zodme.
- Anexo 4. Correspondencia.
- Anexo 5. Informes semanales Contratista.
- Anexo 6. Documentos Maquinaria.
- Anexo 7. Mesa de trabajo ambiental.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
