



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO NO 20000791-01-H3-2020. "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA."



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 3
DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021**

**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ARG SAS**



ENERO 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	4
2. CONTRATO DE OBRA	6
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	6
2.2 CONTROL DE OBRA	7
2.3 DESCRIPCION GENERAL	8
2.3.1 Informes Técnicos.....	8
2.3.2 Informe descripción de la obra construida.	8
3. CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	9
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA	10
3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA	10
3.3.1 Actividades administrativas	10
3.3.2 Actividades técnicas	11
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	12
4.1 ÁREA TÉCNICA.....	12
4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA	12
5. ANEXOS.....	13

INTRODUCCIÓN

La ejecución del contrato de Obra No 20000785 01 H4 de 2020, cuyo objetivo es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA", a realizar en un plazo de 2.5 meses, se adelanta en el Aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca.

El acta de inicio para los contratos de Obra e Interventoría se firmó el 7 de octubre de 2020 dando inicio a su contrato.

El 21 de diciembre de 2020 se realizó la prórroga al contrato hasta el día 6 de marzo de 2021.

El presente documento corresponde al Informe de Interventoría No 3 del periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, en este informe se evidencia el porcentaje ejecutado, las actividades ejecutadas semana a semana y el estado del contrato.

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes labores del contrato de obra: Se inicia la segunda Rocería, se continua limpieza, retiro de maleza, soldadura en el Área del Cerramiento de la malla eslabonada en el VOR, se realiza el cerramiento en madera en el VOR, se continua con el estuco y Pintura en el lado tierra del aeropuerto. Además las labores de control técnico, administrativo y financiero por parte de esta Interventoría.

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto como ya se mencionó se adelanta en el Aeropuerto Gerardo López Tovar de Buenaventura – Valle del Cauca (código IATA: BUN, código OACI: SKBU) está ubicado a 7 km al sur del casco urbano de la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca-Colombia. Cuenta con una pista de 1.200 m por 30m de ancho, orientación 09-27. La ciudad de Buenaventura es un importante puerto Marítimo del Pacífico.

El planteamiento arquitectónico básicamente hace alusión a obras de adecuación y mantenimiento dentro de las instalaciones del aeropuerto y algunas exteriores a la edificación como zonas verdes, andenes y entorno de él.

El proyecto Plantea realizar las reparaciones y detalles constructivos a optimizar en las áreas o espacios de aeropuerto, dentro del cual existen actividades Prioritarias como:

- ✚ Rocería y limpieza de descoles, ya que se evidencio maleza con más de 1.70mts de altura.
- ✚ Cerramiento perimetral del VOR, está en madera mantenimiento, cerramiento perimetral, limpieza, pintura anticorrosiva, arreglo líneas de alambre de púas, templar las existentes y cambiar por nuevo dónde se requiera, instalar concertina en las puertas de acceso
- ✚ Pintura fachada
- ✚ Cambio de piso en la entrada de aeropuerto
- ✚ Desinstalar puerta e instalar un muro en mampostería para minimizar la vulnerabilidad del aeropuerto.
- ✚ Instalación de pisos en las garitas, reparación cambio de escaleras ya que no cumple con la norma.
- ✚ Verificación y reparación de todas las baterías sanitarias
- ✚ Verificación y reparación de puntos eléctricos hidrosanitarios e hidráulicos.
- ✚ Instalar un obstáculo visible para el paso impedimento de objetos o elementos no permitidos en las instalaciones del aeropuerto en las áreas de sala de espera y sala de llegada se propone lamina micro perforada.
- ✚ Cambio de puerta área sala de llegada

- ✚ Realizar impermeabilización en las áreas que se encuentran con humedad en los muros internos y externos del aeropuerto y VOR.
- ✚ Construir una viga en concreto e instalar malla electro soldada cerca a la garita situada al norte del aeropuerto, ya que se encuentra sin seguridad esta área y es pasó de transeúntes de predios aledaños.
- ✚ Realizar la señalización en la pista en las partes que se evidencio desgastada e igualmente el re parcheo, fisuras y grietas de la pista donde se vea desgastada por rodadura, ya que se evidencian láminas de agua superficial en la pista.
- ✚ Realizar la reparación y mantenimiento de las cerraduras y bloqueo de todas las ventanas.
- ✚ Realizar la reparación de cielo falso en diferentes espacios.
- ✚ Instalación de un reflector
- ✚ Realizar la reubicación de letrero del aeropuerto, ya que la palma impide su visibilidad.
- ✚ Realizar la instalación de ventiladores en sala de espera y sala de abordaje.
- ✚ Realizar la limpieza de canales y bajantes.
- ✚ Realizar desmanchada, lavada y pulida de pisos.

El mantenimiento se llevara a cabo en las siguientes áreas.

- ❖ Batería de baños terminal de pasajeros.
- ❖ Mantenimiento en cubierta terminal.
- ❖ Mantenimiento general terminal.
- ❖ Mantenimiento y adecuación torre de control.
- ❖ Mantenimiento zona VOR.
- ❖ Mantenimiento cerramiento del aeropuerto y el VOR.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO JCB-02-785
No. DE CONTRATO	20000785-01-H4 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA"
FECHA DE CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	\$ 558.849.637,00
FECHA DE ACTA DE INICIO	7 DE OCTUBRE 2020
PLAZO PACTADO	75 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 DE DICIEMBRE 2020
PRORROGA No 1	21 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	6 DE MARZO DE 2021
CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	ING. YEFER CUEVAS MONTOYA
DIRECTOR DE OBRA	ING. JUAN CARLOS BELALCAZAR B.
RESIDENTE DE OBRA	ING. HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO
AUXILIARES RESIDENTE DE OBRA	SISOMA KAROL ELIANA GONGORA CASTELLAR
DIRECCION OFICINA	Calle 150 # 16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: 7028090 Celulares: 3142645967 - 3134825562
EMAIL	correo: proyectos.jcb@hotmail.com

2.2 CONTROL DE OBRA

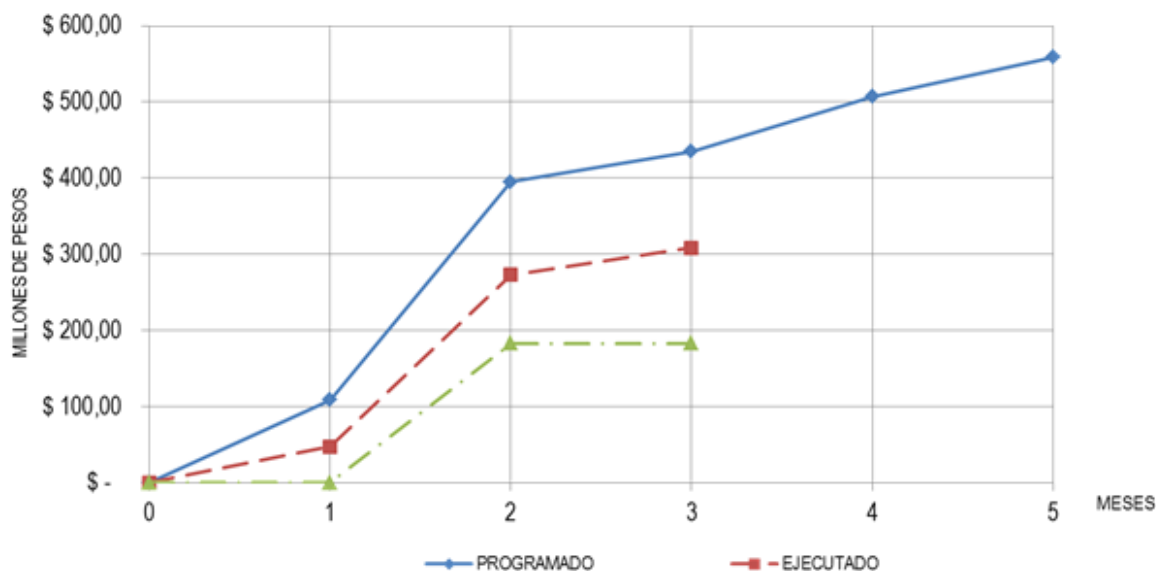
Durante el tercer periodo de ejecución de actividades constructivas la Interventoría representada por la firma Ingenieros Consultores y Constructores ARG S.A.S. efectuó la revisión e inspección de los nuevos NP ya que para la ejecución de algunos trabajos que están pendientes no hay ITEM de ejecución y esto afecta para el desarrollo de los trabajos faltantes para que las especificaciones técnicas se cumplan con el contrato, como también se adelantó el seguimiento al avance de los trabajos acorde con la Reprogramación de Obra luego que se prorrogaran los contratos.

Durante este periodo se ejecutó el 14.82 % equivalente a \$ 82.341.781,58, para completar un % total ejecutado del 55.49 % equivalente a \$ 308.217.904,03.

De acuerdo a lo anterior se tiene:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	\$ PROGRAMADO COSTO TOTAL	\$ EJECUTADO COSTO TOTAL
76.26 %	55.49 %	\$ 426.180.485,86	\$ 308.217.904,03

Lo que nos evidencia un atraso de 50.58 % equivalente a \$ 272.758.885,71.



De acuerdo a la reprogramación entregada se tiene un atraso de \$ 117.962.581,83 equivalente al 21.24 %.

2.3 DESCRIPCION GENERAL.

Durante el lapso comprendido entre el 7 de diciembre y el 6 de enero de 2021, Se inicia la segunda Rocería, se continua Limpieza, retiro de maleza, soldadura en el Área del Cerramiento de la malla eslabonada en el VOR y se realiza el cerramiento en madera en el VOR, se continua con el estuco y Pintura en el lado tierra.

2.3.1 Informes Técnicos.

La Interventoría ha elaborado los informes semanales No 10, 11, 12, 13 y 14, correspondientes a las semanas del 7 de diciembre al 6 de enero de 2021, período que corresponde al tercer mes de ejecución del contrato se realizaron 5 informes semanales. En el informe se da a conocer las actividades ejecutadas durante este periodo, la cantidad o porcentaje realizados y estado del avance financiero del proyecto, el cual está relacionado con la ejecución de la obra.

2.3.2 Informe descripción de la obra construida.

Durante el tercer mes se revisan las actividades que se han realizado y con preocupación se ve el poco avance ya que se nota que el personal no es el suficiente para ejecutar las actividades programadas diariamente, se continua con la pintura del lado tierra sin embargo se ha evidenciado durante recorridos de las instalaciones que se deben intervenir goteras identificadas, la segunda fase de la rocería se encuentra 92% se da por terminada la actividad en el cerramiento de la malla eslabonada recibiendo a conformidad, se realiza el mantenimiento de las baterías sanitarias en un 50% y se termina el cerramiento del VOR.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DATOS INTERVENTORIA	
NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	INGENIEROS COLSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S
No. DE CONTRATO	20000791-01-H3-2020
FECHA DE CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	\$ 154.462.000,00
FECHA DE ACTA DE INICIO	7° DE OCTUBRE 2020
PLAZO PACTADO	75 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 DE DICIEMBRE 2020
PRORROGA No 1	21 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	6 DE MARZO DE 2021
CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	ING. NATALIA AMADOR BAQUIRO
DIRECTOR DE OBRA	ING. NATALIA AMADOR BAQUIRO
RESIDENTE DE OBRA	ING. MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ
PROFESIONAL SST	CARMEN HELENA CORTES
DIRECCION OFICINA	CALLE 98 No. 22-64 Of. 603 BOGOTA
EMAIL	argsastecnica@gmail.com
DATOS SECRETARIA DE AERONÁUTICA CIVIL	
DIRECCIÓN OFICINA	AEROPUERTO EL DORADO – BOGOTA
CARGO	NOMBRE
SUPERVISOR AERO CIVIL	ARQ. ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS FORERO

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría cuenta para el desarrollo de las actividades, con los siguientes recursos:

- Personal:
 - Coordinador de Interventoría
 - Director de Interventoría.
 - Residente de Interventoría.
 - Profesional SST.

- Equipo: Los equipos disponibles para atender el contrato de Interventoría comprenden:
 - Computador.
 - Impresora.
 - Cámara Digital.
 - Elementos de Medición.

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante este mes de trabajo, la Interventoría desarrollo las siguientes actividades:

3.3.1 Actividades administrativas

- Evaluación de obra a la fecha (GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA).
- Recorrido para sacar los NP: (Suministros e instalación de cielorraso plano PVC incluye retiro 50 M2, Escaleras nuevas metálicas- garitas 5 unidad, Piso antideslizante 250 m2, Cerramiento malla nuevo aéreo ml, lamina micro perforada 54,50 m2, goteras cubierta 12 unidades y goteras cubierta 23,14m2
- Entrega de los informes semanales.

3.3.2 Actividades técnicas

- Medición y Revisión de cantidades de obra para soportes pre acta 3.
- Revisión de la documentación del contratista del personal con el que cuentan en obra y verificación de la seguridad social en compañía del área de seguridad de la interventoría.
- Asistencia a reuniones con el contratista y Aero civil.
- Revisión y recepción de trabajos entregados por el contratista a la interventoría a conformidad según especificaciones técnicas.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 ÁREA TÉCNICA

Hasta el momento no se logra alcanzar un buen avance por parte del contratista ya que no ha alcanzado ninguna de las metas propuestas.

En las actividades programada se dan los siguientes avances la poda un 92% solo falta un 8% para darse por terminada esta actividad, la limpieza de canales un 100%, el cerramiento de la malla eslabonada en un 100%, el cerramiento del VOR AL 100%, estuco y pintura en metros lineales un 46%, estuco y pintura en metros cuadrados un 83%, pintura en un 53%, y Mantenimiento de baterías sanitarias un 50%, pero el avance no es todavía el óptimo esperado por la Interventoría.

La bitácora de obra se mantiene al día con las actividades diarias y observaciones de otra y acontecimientos de obra.

Se solicita de nuevo al contratista agilizar en los tramites de los NP, ya que se nota muy poca gestión en este tema y se sugiere invertir más recursos en el menor tiempo posible, iniciar labores en otros frentes y tener a la mano el personal necesario y calificado para las actividades constructivas.

4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA

Durante el tercer periodo, la Interventoría ha verificado el cumplimiento de lo relacionado con las exigencias de personal en todas las áreas y funciones de la obra de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta. Se han realizado los respectivos reportes e informes semanales, recomendaciones técnicas adicionales, control de personal, lo que ha servido para mantener dentro de los márgenes aceptables la correcta ejecución de la obra y garantizando la calidad y estabilidad de la misma, al tiempo que se mitigan riesgos e impactos que podrían ser nocivos para el personal operativo como para la comunidad circundante dada la emergencia sanitaria a nivel mundial para ello se verifica constantemente el cumplimiento del protocolo de bioseguridad propuesto por el contratista.

5. ANEXOS

- ANEXO 1. INFORME EJECUTIVO.
- ANEXO 2. CONTROL DE PERSONAL
- ANEXO 3. CONTROL DE EQUIPOS.
- ANEXO 4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO.
- ANEXO 6. INFORMES SEMANALES
- ANEXO 7. LIBRO O BITACORA DE OBRA.
- ANEXO 8. DOCUMENTOS ANTICIPO DE OBRA.
- ANEXO 9. ACTA PARCIAL DE OBRA NAOA 2.

ANEXO 1.

INFORME EJECUTIVO.



INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	7 DE DICIEMBRE DE 2020	Y EL	6 DE ENERO DE 2021
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.				
LOCALIZACIÓN	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020		CONTRATO No.:	20000785-01-H4 DE 2020	
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB-02-785	
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS		PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE OCTUBRE DE 2020		FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE OCTUBRE DE 2020	
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE MARZO DE 2021		FECHA DE TERMINACIÓN:	6 DE MARZO DE 2021	
PLAZO ACTUALIZADO:	150		PLAZO ACTUALIZADO:	150	
VALOR INICIAL :	\$	154.462.000,00	VALOR INICIAL :	\$	558.849.637,00
VALOR ADICION(ES):		-	VALOR ADICION(ES):		-
VALOR ACTUALIZADO:	\$	154.462.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	558.849.637,00
VALOR PAGADO:	\$	48.813.081,00	VALOR PAGADO:	\$	182.558.641,00
VALOR POR PAGAR:	\$	105.648.919,00	VALOR POR PAGAR:	\$	376.290.996,00

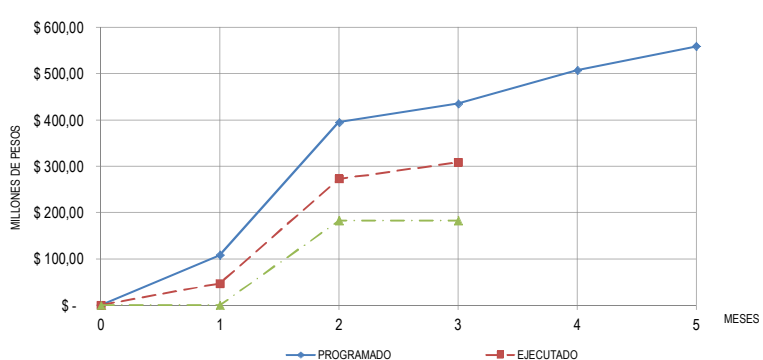
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
ASEGURADORA:	SEGUROS DE ESTADO S.A		ASEGURADORA:	HDI SEGUROS S.A	
POLIZA No	2144101332152 - 2140101154450		POLIZA No	4002247- 4000486	
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	VALOR
CUMPLIMIENTO	DESDE 15/09/2020 HASTA 01/05/2021	\$ 30.892.400,00	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	DESDE 24/09/2020 HASTA 30/04/2021	\$ 111.769.927,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2020 21/12/2020	\$ 30.892.400,00	ANTICIPO	24/09/2020 30/04/2021	\$ 111.769.927,40
CALIDAD DEL SERVICIO	21/12/2020 21/12/2025	\$ 30.892.400,00	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	24/09/2020 30/12/2023	\$ 111.769.927,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	15/09/2020 21/12/2020	\$ 175.560.600,00	ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/09/2020 24/09/2025	\$ 111.769.927,40
			RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	24/09/2020 05/01/2021	\$ 175.560.600,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1		\$ 48.813.081,00	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1		\$ 182.558.641,00
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 2		\$ 21.108.777,00	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2		\$ 90.030.301,00

4. CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

La Interventoría en conjunto con el contratista realiza el análisis de 7 NP necesarios para actividades que se deben ejecutar, se solicita al contratista dar celeridad en la entrega de estos APUS para dar su VoBo y remitir a la Entidad.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se sugiere por parte de la Interventoría realizar las actividades revisadas que ya debieron iniciar o deberían de estar ejecutadas y a la fecha no se han realizado.

ANEXO 2.

CONTROL DE PERSONAL.



CONTROL DE PERSONAL



INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL

07 DE DICIEMBRE DE 2020

Y EL

06 DE ENERO 2021

PLAZO:

75 DÍAS

CONTRATISTA:

CONSORCIO JCB-02-785

INTERVENTOR:

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.

CONTRATO No. 20000785-01-H4 DE 2020

CONTRATO No. 20000791-01-H3-2020

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	DICIEMBRE																															ENERO						OBSERVACIONES			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6										
CARGO																																									
DIRECTOR																																									
ESPECIALISTAS																																									
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
SISOMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
MAESTRO																																									
ALMACENISTA																																									
ENCARGADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
SOLDADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
AYUDANTE DE SOLDADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
OPERADORES DE GUADANA 1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
OPERADORES DE GUADANA 2							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
OPERADORES DE GUADANA 3														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
OPERADORES DE GUADANA 4															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
OPERADORES DE GUADANA 5																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
OPERADORES DE GUADANA 6																																									
AYUDANTE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE BRILLADO 1																																									
AYUDANTE BRILLADO 2																																									
AYUDANTE BRILLADO 3																																									
ELECTRICO																																									
PERSONAL CONTRATISTA	11	11	11	11	11	13		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		11		11	11	11	11	11					8	8	8								
PROCEDENCIA / CONDICIÓN																																						TOTAL PERIODO		283	
MANO OBRA NO CALIFICADA	6	6	6	6	6	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8		7		7	7	7	7				5	5	5		173	61.13%	CUMPLE S/N						
De la región	6	6	6	6	6	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8		7		7	7	7	7				5	5	5		173	61.13%							
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0								0	0.00%							
MANO OBRA CALIFICADA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		0		0	0	0	0				0	0	0		16	5.65%							
De la región	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		0		0	0	0	0				0	0	0		16	5.65%							
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0		0	0.00%							
PROFESIONALES - TÉCNICOS	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		3		3	3	3	3				2	2	2		67	23.67%							
De la región	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		2		2	2	2	2				1	1	1		44	15.55%							
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		23	8.13%							
POBLACIÓN VULNERABLE	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		23	8.13%							
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0		0	0.00%							
En condición de desplazamiento	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		23	8.13%							
MUJERES	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		23	8.13%							
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0		0	0.00%							
Mano de Obra Calificada	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0		0	0.00%							
Profesionales - Técnicos	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		23	8.13%							
PROVEEDORES	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		3		3	3	3	3				3	3	3		69	24.38%							
Local																																									
Nacional																																									
Internacional																																									

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ANEXO 3.

CONTROL DE EQUIPOS



CONTROL DE EQUIPOS



INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE DICIEMBRE Y EL 06 DE ENERO DE 2021 FECHA INICIO 7 DE OCTUBRE DE 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785 CONTRATO No. 20000785-01-H4 DE 2020
INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S. CONTRATO No. 20000791-01-H3-2020

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
GUADAÑA 1	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	DESMONTE AREAS VERDES	EQUIPO EN OBRA DEL 12 AL 6
GUADAÑA 2	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	DESMONTE AREAS VERDES	EQUIPO EN OBRA DEL 12 AL 6
GUADAÑA 3	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	DESMONTE AREAS VERDES	EQUIPO EN OBRA DEL 12 AL 6
GUADAÑA 4	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	DESMONTE AREAS VERDES	EQUIPO EN OBRA DEL 12 AL 31
GUADAÑA 5	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	DESMONTE AREAS VERDES	EQUIPO EN OBRA DEL 12 AL 31
GUADAÑA 6	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	DESMONTE AREAS VERDES	EQUIPO EN OBRA DEL 12 AL 31
EQUIPO DE SOLDADURA	SI	SI		ALQUILADO	BUENAVVENTURA	SOLDADURA DE MALLA DE CERRAMIENTO	EQUIPO EN OBRA DEL 7 AL 18

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

EL TRABAJO DESOLDADURA E LA MALLA TERMINA EL DIA 18 DE DICIEMBRE

ANEXO 4.

CONTROL DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL



Libertad y Orden

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
NÚMERO DE CONTRATO:	20000785-01-H4 DE 2020	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	07/12/2020	Y EL	06/01/2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB-02-785				
INTERVENITOR:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	Bueno		
- Regularidad del mantenimiento	Bueno		
- Vibraciones /Ruidos	Bueno		
- Protecciones / Guardas / Frenos	Bueno		
- Idoneidad operarios	Bueno		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	Bueno		
- Buen estado	Bueno		
- Fácil acceso y operación	Bueno		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	Bueno		
- Buen estado	Bueno		
- Uso según zona de trabajo	Bueno		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente			NO APLICA
- Uso según zona de trabajo			NO APLICA
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			NO APLICA
- Diurna			NO APLICA
- Nocturna			NO APLICA
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Comentario del intervisor:

SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS QUE SE HAN HECHO RESPECTO A LAS BOTAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA CON GUADAÑA.

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2020

FOTOGRAFÍA (1)



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



ROCEO Y LIMPIEZA MANUAL A LOS ALREDEDORES DE LA PISTA DE ATERRIZAJE.

 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

FOTOGRAFÍA (2)



ROCEÍA Y LIMPIEZA MANUAL A LOS ALREDEDORES DE LA MALLA DE CERRAMIENTO

 Libertad y Orden	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

DEL AEROPUERTO. FOTOGRAFÍA (3)



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR. AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

FOTOGRAFÍA (4)



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



SOLDADURA DE MALLA, REPARACION ALAMBRES Y PINTURA EN MALLA DEL CERRAMIENTO AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

 Libertad y Orden	<h2 style="text-align: center;">FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

FOTOGRAFÍA (5)



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



ESTUCO Y PINTURA M2 DE AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

FOTOGRAFÍA (6)



 Libertad y Orden	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



ESTUCO Y PINTURA ML DE AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

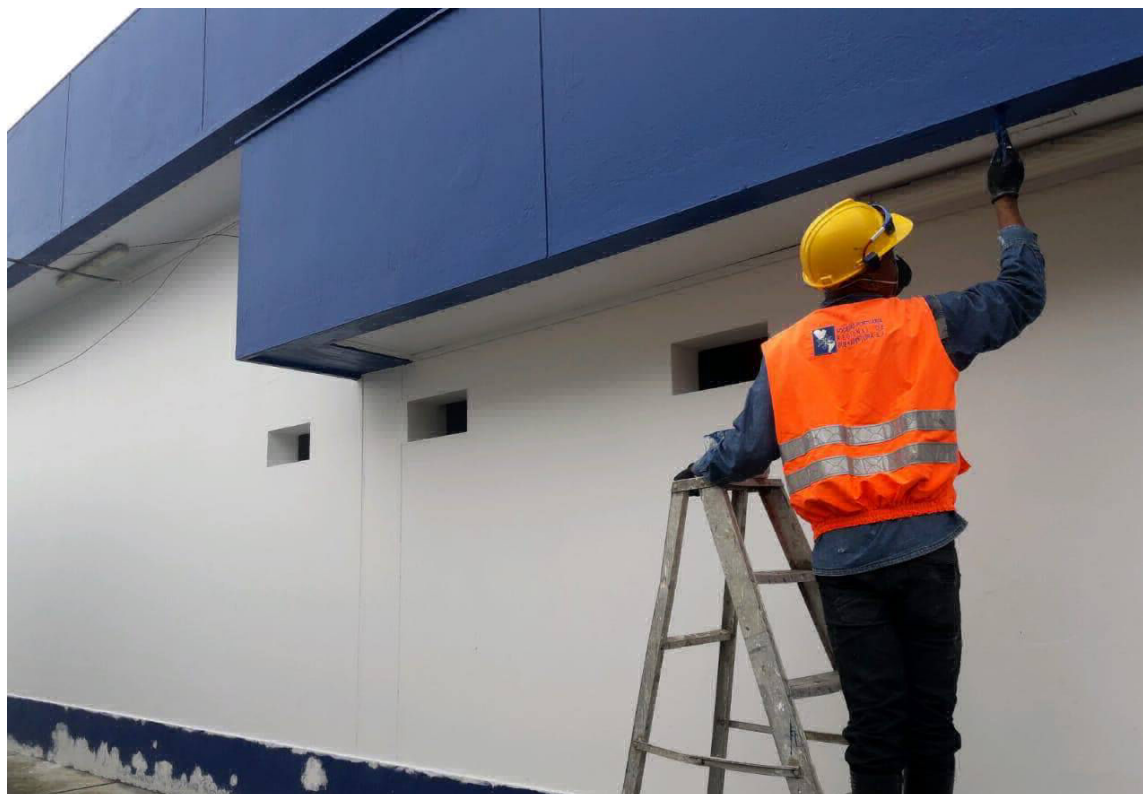
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

FOTOGRAFÍA (7)



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



PINTURA DE AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

 Libertad y Orden	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
---	--	---

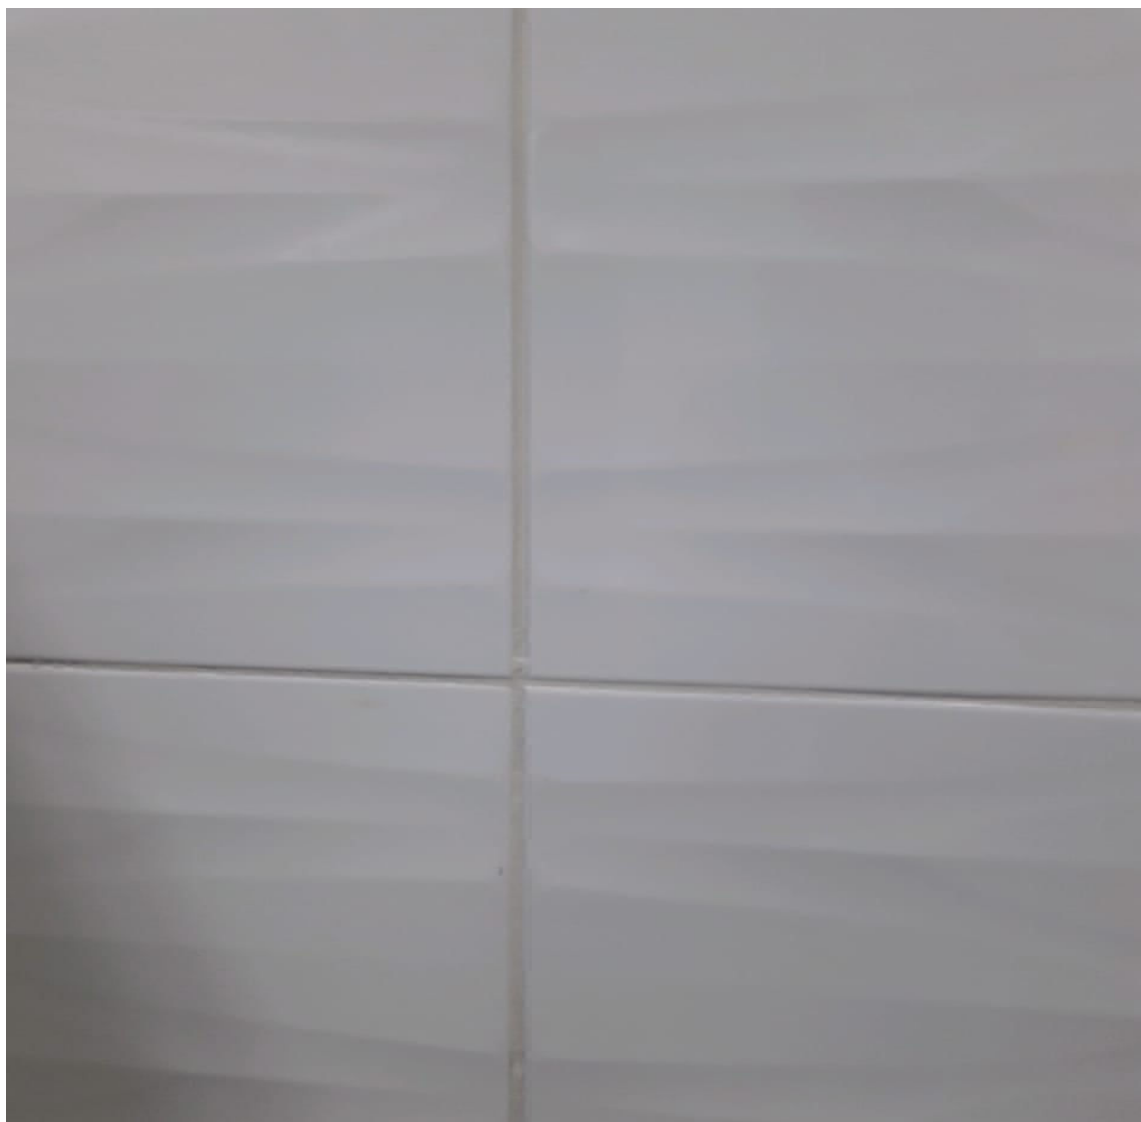
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021

FOTOGRAFÍA(8)



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



 Libertad y Orden	<h2>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</h2>	
---	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021





FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 1- REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
CONTRATO No.:	20000791-01-H3-2020
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021



MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN, AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

ANEXO 6.

INFORMES SEMANALES.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSION 1	PAGINA 1 de 3
--	---	--------------	------------------

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA: 12/13/2020	
Semana No 10	Del : 12/7/2020	AL:	12/13/2020

Plazo Total 75 días Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 días porcentaje del tiempo transcurrido(%) 90.67%	
---	--

Nombre del Supervisor :

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

BUENAVENTURA					
(%) Programado	Semanal	Acumulado	(%) Ejecutado	Semanal	Acumulado
	15.24%	85.87%		2.15%	51.36%
Valor programado (\$)	\$ 85,147,377.24	\$ 479,906,718.82	Valor ejecutado(\$)	\$ 5,909,518.00	\$ 287,047,098.45
			Evaluación	Porcentaje avance	-34.51%
				Valor avance	-192,859,620.37

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista: CONSORCIO JCB-02-785 Contrato No: 20000785-01-H4 DE 2020 Valor inicial: \$ 558,849,637.00 Valor actualizado: \$ 558,849,637.00 Plazo inicial: HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Plazo actualizado: HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Fecha de iniciación: 7-Oct-20 Fecha de vencimiento: 21-Dec-20 Nueva fecha de terminación: 21-Dec-20	Contratista: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS Contrato No: 20000791-01-H3-2020 Valor total contrato: \$ 154,462,000.00 Valor actualizado: \$ 154,462,000.00 Plazo inicial: HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Plazo actualizado: HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Fecha de iniciación: 7-Oct-20 Fecha de vencimiento: 21-Dec-20 Nueva fecha de terminación: 21-Dec-20		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)

SE CONTINÚA CON LA SEGUNDA PASADA DE LA ROSERÍA A LOS LADOS DE LA PISTA DEL AEROPUERTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

SE CONTINÚA CON EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL VOR Y LAS PUERTAS DE ACCESO CON LA INSTALACION DE LA CONCERTINA.

ESTUCCO Y PINTURA

SE CONTINÚA CON EL ESTUCCO EN ZONAS DE SALA DE ESPERA 1 Y 2

PINTURA

SE INICIA CON LA PRIMERA CAPA DE SALA DE ESPERA 2 INTERIOR Y EXTERIOR.

ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)

ESTA ACTIVIDAD DE BE D SER LA ULTIMA POR SOLICITUD DE LA ADMINSTRACION DEL AEROPUERTO

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORIA

* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS

* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS

* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

* ENTREGAS DE EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)




SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA





	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSION 1	PAGINA 1 de 3
UNIDAD EJECUTORA:		FECHA: 12/13/2020	
Semana No 10	Del : 12/7/2020	AL: 12/13/2020	
Plazo Total	75 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	68 días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	90.67%		
ESTUCO Y PINTURA			
 			
PINTURA			
    			
SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento, se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion cnstante al porte de los elementos de biseguridad durante las actividades diarias.			
RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO			
DURANTE LA SEMANA 10 SE CONTINUA CON LA SEGUNDA FASE DE LA PODADAS, COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MALLA ESLABONADA. SE CONTINUA CON EL ESTUCO DE LOS INTERIORES Y EXTERIORES EN ZONA DE SALA DE ESPERA 1 Y 2. SE PINTAN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS ZONAS NOMBRADAS Y SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO QUE LA BRILADA Y LA PODA DE LA ZONA DE ENTRADA DEBEN SER LAS DOS ULTIMAS ACTMVIDADES PARA LA ENTREGA.			
COMPROMISOS			
  			
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA TENER EN CUENTA DE FRMA PRIORTARA DENTRO DEL MONTO AGOTABLE LAS ESCALERAS DE LAS 5 GARITAS Y EL CERRAMIENTO EN LA ZONA DEL HUMEDAL DEL AEROPUERTO YA QUE ESO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR ES PRIORITARIO Y SE VIZO EN LA VISITA DE INICIO. COMO TAMBIEN EL CERRAMIENTO DEL VO YA QUE LA MADERA QUE SE TRAJO NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE Y NO ES ACEPTADA PARA ESTA ACTIVIDAD SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA TENER ESTOS TEMAS MUY EN CUENTA.			
PERSONAL DE OBRA			
DIRECTOR DE OBRA	0	DIRECTOR DE OBRA INTERV	1
RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA INTERV	1
INGENIERO AMBIENTAL	0	SST	1
SST	1		
OPERADOR DE GUADAÑA	5		
SOLDADOR	1		
AYUDANTE DE SOLDADOR	1		
ENCARGADO	1		
OFICAL	1		
AYUDANTE	2		
13		TOTAL	3

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSION	1
			PAGINA	1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	
Semana No	10	Del :	12/7/2020
		AL:	12/13/2020

Plazo Total	75	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	68	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	90.67%	

AVANCE FINANCIERO OBRA		
Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 182,558,641.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 90,030,301.00
3		
4		
5		
6		
Total Acumulado		\$ 272,588,942.00

Valor Total Contrato Obra	
\$ 558,849,637.00	
Valor facturado Contrato Obra	
\$ 272,588,942.00	
% Avance facturado Acumulado	
48.78%	

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA		
Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 48,813,081.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 21,108,777.00
3		
4		
5		
6		
Total Acumulado		\$ 69,921,858.00

Valor Total Contrato interventoria	
\$ 154,462,000.00	
Valor facturado Contrato Interventoria	
\$ 69,921,858.00	
% Avance facturado Acumulado	
45.27%	

OBSERVACIONES		DIRECTORA DE INTERVENTORIA
		NATALIA AMADOR BAQUIRO

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.	11/10/2020	18/10/2020	25/10/2020	1/11/2020	8/11/2020	15/11/2020	22/11/2020	29/11/2020	6/12/2020	13/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	ACUMULADO
PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	7.81%	11.57%	12.70%	11.84%	12.52%	14.19%	15.24%	12.35%	1.77%	100%
EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	4.43%	4.36%	3.02%	21.84%	1.06%	14.50%	2.15%			51.36%
EJECUTADO ACUMULADO	0.00%	0.00%	0.00%	4.43%	8.79%	11.82%	33.66%	34.71%	49.21%	51.36%			
TOTAL	0.00%	0.00%	0.00%	-3.38%	-7.21%	-9.67%	10.00%	-11.46%	0.30%	-13.08%			-34.51%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES). LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 10 (Dic.07 - Dic.13)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	cantidad	valor	cantidad	valor	%
TORRE DE CONTROL ARMENIA										
1	ROCERIA									
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)	M2	557,361.24	\$ 109	\$ 60,752,375.69	40,000.00	\$ 4,360,000	438,073.00	\$ 47,749,957.00	79%
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.)	UN	65.00	\$ 48,654	\$ 3,162,510			26.00	\$ 1,265,004.00	40%
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2,800.70	\$ 19,650	\$ 55,033,755			2,760.00	\$ 54,234,000.00	99%
3	CERRAMIENTOS									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	3,721.63	\$ 32,828	\$ 122,173,670	234.00	\$ 7,681,752	3,832.00	\$ 125,796,896.00	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.	ML	1,070.76	\$ 24,285	\$ 26,003,407			702.00	\$ 17,048,070.00	66%
4	SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	1,000.00	\$ 6,447	\$ 6,447,000			-	\$ -	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	1,842.00	\$ 43,326	\$ 79,806,492			-	\$ -	0%
5	PAVIMENTOS									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	-	\$ 243,002	\$ 0			-	\$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO IDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	-	\$ 726,484	\$ 0			-	\$ -	0%
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO.	M3	1.00	\$ 5,436,237	\$ 5,436,237			-	\$ -	0%
5.4	ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	-	\$ 4,972	\$ 0			-	\$ -	0%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 1,077,961	\$ 0			-	\$ -	0%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 679,702	\$ 0			-	\$ -	0%
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	500.00	\$ 3,363	\$ 1,681,500			-	\$ -	0%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	300.00	\$ 4,135	\$ 1,240,500			-	\$ -	0%
6	MAMPOSTERIA									
6.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1.50	\$ 31,201	\$ 46,802			-	\$ -	0%
6.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	120.79	\$ 35,096	\$ 4,239,246			-	\$ -	0%
6.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0.04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	47.15	\$ 18,102	\$ 853,509			-	\$ -	0%
6.4	ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	\$ 20,922	\$ 2,092,200			20.20	\$ 422,624.00	20%
6.5	ESTUCO Y PINTURA	ML	100.00	\$ 12,023	\$ 1,202,300			81.80	\$ 983,481.00	82%
6.6	PINTURA	M2	2,469.51	\$ 13,491	\$ 33,316,107			1,015.15	\$ 13,695,389.00	41%
6.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	35.00	\$ 67,225	\$ 2,352,875			-	\$ -	0%
6.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	10.00	\$ 42,000	\$ 420,000			-	\$ -	0%
6.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	500.00	\$ 4,379	\$ 2,189,500			-	\$ -	0%
7	PISOS									
7.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 25,151.00	\$ 0			144.00	\$ 3,621,744.00	0%
7.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	70.00	\$ 89,792	\$ 6,285,440			-	\$ -	0%
7.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	-	\$ 169,057	\$ 0			-	\$ -	0%
8	CUBIERTA Y CIELORASO									
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 54,771	\$ 0			-	\$ -	0%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES). LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 10 (Dic.07 - Dic.13)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	cantidad	valor	cantidad	valor	%
TORRE DE CONTROL ARMENIA										
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	50.00	\$ 108,981	\$ 5,449,050			-	\$ -	0%
9	CARPINTERIA METÁLICA									
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 245,430	\$ 0			-	\$ -	0%
9.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	20.48	\$ 8,703	\$ 178,237			-	\$ -	0%
9.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	55.95	\$ 13,532	\$ 757,115			-	\$ -	0%
10	CARPINTERIA MADERA									
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 369,786	\$ 0			-	\$ -	0%
10.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	18.59	\$ 11,381	\$ 211,573			-	\$ -	0%
10.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	5.36	\$ 27,059	\$ 144,928			-	\$ -	0%
11	CRISTALERIA									
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	6.00	\$ 325,449	\$ 1,952,694			-	\$ -	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	6.00	\$ 40,233	\$ 241,398			-	\$ -	0%
12	LIMPIEZA PROFUNDA									
12.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	658.00	\$ 6,279.00	\$ 4,131,582			427.00	\$ 2,681,133.00	65%
12.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	250.00	\$ 8,538.00	\$ 2,134,500			-	\$ -	0%
12.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	250.00	\$ 5,018.00	\$ 1,254,500			-	\$ -	0%
12.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16.00	\$ 721,800.00	\$ 11,548,800			16.00	\$ 11,548,800.00	100%
12.5	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	250.00	\$ 32,000.00	\$ 8,000,000			250.00	\$ 8,000,000.00	100%
13	BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA									
13.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS		1.00	\$ 104,738,158.68	\$ 104,738,159			-	\$ -	0%

[illegible]

PERSONAL DE OBRA												
PERIODO DEL INFORME: DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020												
SEMANA REPORTADA: 05												
NUMERO	NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA	FUNCION	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	SEMANA 10 (DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE)						
						LU	MA	MIE.	JU	VI	SA	DO
						7	8	9	10	11	12	13
1	YEFER CUEVAS MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	JUAN CARLOS BELALCAZAR B.	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
3	KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	9/11/2020		X		X	X	X	X	
4	HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO	INGENIERO RESIDENTE	CALI	3/10/2020	11/14/2020	X		X	X	X	X	
5	BELISARIO RISCOS DELGADO	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R		R	R	R	R	
6	FLORENCIO GAMBOA	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X		X	X	X	X	
7	WILSON VALENCIA	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X		X	X	X	X	
8	JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	X		X	X	X	X	
9	VENTURA SINISTERRA PARAMENO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R		R	R	R	R	
10	CESAR ANTONIO DELGADO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		R		R	R	R	R	
11	HAMILTON VALENCIA MOSQUERA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	X		X	X	X	X	
12	OLEICER GARCES	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X		X	X	X	X	
13	ANGEL ANTONIO GRANJA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X		X	X	X	X	
14	VICTOR FERNANDO TOVAR	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X		X	X	X	X	
15	HERVIN VALENCIA MURILLO	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R		R	R	R	R	
16	JAIME PALACIOS	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X		X	X	X	X	
17	ALVARO CRUZ DEVIA	OFICIAL	BUENAVENTURA	9/11/2020		X		X	X	X	X	
18	KEVIN TOVAR	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R		R	R	R	R	
19	CARLOS HURTADO	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R		R	R	R	R	
20	JOSE SINISTERRA	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R		R	R	R	R	
21	ARVEY OBREGON	AYUDANTEDE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X		X	X	X	X	
22	DANIEL CUERO	AYUDANTEDE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X		X	X	X	X	
PERSONAL INVENTORÍA												
1	NATALIA AMADOR BAQUIRO	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	NATALIA AMADOR BAQUIRO	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020					X	X		
3	CARMEN HELENA CORTES	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	10/3/2020		X		X	X	X	X	
4	MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ	INGENIERO RESIDENTE	CHAPARRAL	10/7/2020		X		X	X	X	X	

REPORTE DE LLUVIAS**PERIODO DEL INFORME:**

lunes, 07-dic.-20

AL

domingo, 13-dic.-20

SEMANA REPORTADA:

9

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	11/30/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MARTES	12/1/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MIÉRCOLES	12/2/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
JUEVES	12/3/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
VIERNES	12/4/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
SÁBADO	12/5/2020						7:00 AM A 12:00 PM	SECO
DOMINGO	12/6/2020						7:00 AM A 12:00 PM	SECO

OBSERVACIÓN :

PERIODO DEL INFORME: DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020									
SEMANA REPORTADA: 06									
MAQUINARIA DE OBRA									
			SEMANA 10 (7 DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020)						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MI	JUE.	VI	SA	DO
			7	8	9	10	11	12	13
1	GUADAÑAS		T	X	T	T	T	T	
2	GUADAÑAS		T	X	T	T	T	T	
3	GUADAÑAS		T	X	T	T	T	T	
4	GUADAÑAS		T	X	T	T	T	T	
5	GUADAÑAS		T	X	T	T	T	T	
1	EQUIPO DE SOLDADURA		T	X	T	T	T	T	
1	PLANTA DE ENERGIA		T	X	T	T	T	T	
1	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X	X	X	
2	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIÓN:
X: RETIRADA DE OBRA
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA
V: VARADO
T: TRABAJANDO
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		VERSION	1
			PAGINA	1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:		12/20/2020
Semana No	11	Del :	12/14/2020	AL: 12/20/2020
Plazo Total	75	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	75	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	100.00%			
Nombre del Supervisor :				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA				
REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.				

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN				
BUENAVENTURA				
(%) Programado	Semanal <u>12.35%</u>	Acumulado <u>98.23%</u>	(%) Ejecutado	Semanal <u>2.62%</u>
Valor programado (\$)	<u>\$ 69,034,679.94</u>	<u>\$ 548,941,398.76</u>	Valor ejecutado(\$)	<u>\$ 14,654,640.00</u>
			Evaluación	Porcentaje avance <u>-44.24%</u>
				Valor avance <u>-247,239,660.31</u>

DATOS CONTRACTUALES				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:	CONSORCIO JCB-02-785	Contratista:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	
Contrato No:	20000785-01-H4 DE 2020	Contrato No:	20000791-01-H3-2020	
Valor Inicial:	\$ 558,849,637.00	Valor total contrato:	\$ 154,462,000.00	
Valor actualizado:	\$ 558,849,637.00	Valor actualizado:	\$ 154,462,000.00	
Plazo inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	
Plazo actualizado:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo actualizado:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	
Fecha de iniciación:	7-Oct-20	Fecha de iniciación:	7-Oct-20	
Fecha de vencimiento:	21-Dec-20	Fecha de vencimiento:	21-Dec-20	
Nueva fecha de terminación	21-Dec-20	Nueva fecha de terminación	21-Dec-20	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)				
SE CONTINUA CON LA SEGUNDA PASADA DE LA ROSERÍA EN UN 80% DENTRO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				
SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN LAS ZONAS DE LA MALLA REPARADAS.				
ESTUCO Y PINTURA				
SE CONTINUA CON EL ESTUCO EN ZONAS DE SALA DE ABORDAJE, ENFERMERIA OFICINAS Y OTRAS				
PINTURA				
SE CONTINUA CON LA PINTURA EN ZONAS DE SALA DE ABORDAJE, ENFERMERIA OFICINAS Y OTRAS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.				
SE DEJA CONSTANCIA DE LOS DETALLES DE LA MADERA.				
SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:				
<p>* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORÍA</p> <p>* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</p> <p>* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL</p> <p>SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:</p> <p>* FORMATOS DE CHARLAS</p> <p>* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO</p> <p>* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS</p> <p>* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA</p> <p>* ENTREGAS DE EPP</p>				
REGISTRO FOTOGRAFICO				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)				
  				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				
  				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		VERSION	1		
			PAGINA	1 de 3		
UNIDAD EJECUTORA:						
Semana No		11		Del :	12/14/2020	
				AL:	12/20/2020	
Plazo Total		75		días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		75		días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		100.00%				
ESTUCO Y PINTURA						
 						
PINTURA						
 						
PINTURA						
 						
SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD						
Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento, se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion crstante al porte de los elementos de biseguridad durante las actividades diarias.						
RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO						
DURANTE LA SEMANA 11 SE CONTINUA CON LA SEGUNDA FASE DE LA PODADAS QUE VA AL 80% EN SU SEGUNDA FASE. COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MALLA ESLABONADA ENLA FACE DE ANTICORROCIYO Y PINTURA. SE CONTINUA CON EL ESTUCO DE LOS INTERIORES Y EXTERIOES EN OTRAS ZONA. SE PINTAN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS ZONAS DE ABORDAJE, ENFERMERIA Y OFICINAS Y SE CONTINUA CON INSTALACION DE CERRAMIENTO DEL VOR.						
COMPROMISOS						
SE HABLA CON EL INGENIERO RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR LA MADERA QUE SE INSTALA ALREDEDOR DEL VOR.						
PERSONAL DE OBRA						
DIRECTOR DE OBRA	0		DIRECTOR DE OBRA INTERV	1		
RESIDENTE DE OBRA	1		RESIDENTE DE OBRA INTERV	1		
INGENIERO AMBIENTAL	0		SST	1		
SST	1					
OPERADOR DE GUADAÑA	5					
SOLDADOR	1					
AYUDANTE DE SOLDADOR	1					
ENCARGADO	1					
OFICAL	1					
AYUDANTE	4					
	15		TOTAL	3		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		VERSION	1
			PAGINA	1 de 3
UNIDAD EJECUTORA:				
Semana No 11		Del : 12/14/2020	FECHA: 12/20/2020	
			AL: 12/20/2020	
Plazo Total		75	días	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		75	días	
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		100.00%		
AVANCE FINANCIERO OBRA				
Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total		
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 182,558,641.00		
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 90,030,301.00		
3				
4				
5				
6				
7				
Total Acumulado		\$ 272,588,942.00		
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA				
Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total		
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 48,813,081.00		
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 21,108,777.00		
3				
4				
5				
6				
7				
Total Acumulado		\$ 69,921,858.00		
OBSERVACIONES			DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	
SE PIERDEN 4 HORAS POR LLUVIA DURANTE LA SEMANA				
			NATALIA AMADOR BAQUIRO	

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.	11/10/2020	18/10/2020	25/10/2020	1/11/2020	8/11/2020	15/11/2020	22/11/2020	29/11/2020	6/12/2020	13/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	ACUMULADO
PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	7.81%	11.57%	12.70%	11.84%	12.52%	14.19%	15.24%	12.35%	1.77%	100%
EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	4.43%	4.36%	3.02%	21.84%	1.06%	14.50%	2.15%	2.62%		53.99%
EJECUTADO ACUMULADO	0.00%	0.00%	0.00%	4.43%	8.79%	11.82%	33.66%	34.71%	49.21%	51.36%	53.99%		
TOTAL	0.00%	0.00%	0.00%	-3.38%	-7.21%	-9.67%	10.00%	-11.46%	0.30%	-13.08%	-9.73%		-44.24%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 11 (Dic.14 - Dic.20)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial					
	TORRE DE CONTROL ARMENIA					cantidad	valor	cantidad	valor	%
1	ROCERIA									
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	557,361.24	\$ 109	\$ 60,752,375.69	20,000.00	\$ 2,180,000	458,073.00	\$ 49,929,957.00	82%
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	65.00	\$ 48,654	\$ 3,162,510			26.00	\$ 1,265,004.00	40%
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2,800.70	\$ 19,650	\$ 55,033,755			2,760.00	\$ 54,234,000.00	99%
3	CERRAMIENTOS									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESIABONADA	ML	3,721.63	\$ 32,828	\$ 122,173,670	380.00	\$ 12,474,640	4,212.00	\$ 138,271,536.00	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.	ML	1,070.76	\$ 24,285	\$ 26,003,407			702.00	\$ 17,048,070.00	66%
4	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	1,000.00	\$ 6,447	\$ 6,447,000			-	\$ -	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	1,842.00	\$ 43,326	\$ 79,806,492			-	\$ -	0%
5	PAVIMENTOS									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	-	\$ 243,002	\$ 0			-	\$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	-	\$ 726,484	\$ 0			-	\$ -	0%
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARACHOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO.	M3	1.00	\$ 5,436,237	\$ 5,436,237			-	\$ -	0%
5.4	ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	-	\$ 4,972	\$ 0			-	\$ -	0%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 1,077,961	\$ 0			-	\$ -	0%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 679,702	\$ 0			-	\$ -	0%
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	500.00	\$ 3,363	\$ 1,681,500			-	\$ -	0%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	300.00	\$ 4,135	\$ 1,240,500			-	\$ -	0%
6	MAMPOSTERIA									
6.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1.50	\$ 31,201	\$ 46,802			-	\$ -	0%
6.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	120.79	\$ 35,096	\$ 4,239,246			-	\$ -	0%
6.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	47.15	\$ 18,102	\$ 853,509			-	\$ -	0%
6.4	ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	\$ 20,922	\$ 2,092,200			20.20	\$ 422,624.00	20%
6.5	ESTUCO Y PINTURA	ML	100.00	\$ 12,023	\$ 1,202,300			81.80	\$ 983,481.00	82%
6.6	PINTURA	M2	2,469.51	\$ 13,491	\$ 33,316,107			1,015.15	\$ 13,695,389.00	41%
6.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	35.00	\$ 67,225	\$ 2,352,875			-	\$ -	0%
6.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	10.00	\$ 42,000	\$ 420,000			-	\$ -	0%
6.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	500.00	\$ 4,379	\$ 2,189,500			-	\$ -	0%
7	PISOS									
7.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 25,151.00	\$ 0			144.00	\$ 3,621,744.00	0%
7.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	70.00	\$ 89,792	\$ 6,285,440			-	\$ -	0%
7.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	-	\$ 169,057	\$ 0			-	\$ -	0%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 11 (Dic.14 - Dic.20)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial					
8	CUBIERTA Y CIELORASO									
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 54,771	\$ 0			-	\$ -	0%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	50.00	\$ 108,981	\$ 5,449,050			-	\$ -	0%
9	CARPINTERIA METÁLICA									
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 245,430	\$ 0			-	\$ -	0%
9.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	20.48	\$ 8,703	\$ 178,237			-	\$ -	0%
9.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	55.95	\$ 13,532	\$ 757,115			-	\$ -	0%
10	CARPINTERIA MADERA									
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 369,786	\$ 0			-	\$ -	#DIV/0!
10.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	18.59	\$ 11,381	\$ 211,573			-	\$ -	0%
10.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	5.36	\$ 27,059	\$ 144,928			-	\$ -	0%
11	CRISTALERIA									
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	6.00	\$ 325,449	\$ 1,952,694			-	\$ -	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	6.00	\$ 40,233	\$ 241,398			-	\$ -	0%
12	LIMPIEZA PROFUNDA									
12.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	658.00	\$ 6,279.00	\$ 4,131,582			427.00	\$ 2,681,133.00	65%
12.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	250.00	\$ 8,538.00	\$ 2,134,500			-	\$ -	0%
12.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	250.00	\$ 5,018.00	\$ 1,254,500			-	\$ -	0%
12.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16.00	\$ 721,800.00	\$ 11,548,800			16.00	\$ 11,548,800.00	100%
12.5	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	250.00	\$ 32,000.00	\$ 8,000,000			250.00	\$ 8,000,000.00	100%
13	BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA									
13.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS		1.00	\$ 104,738,158.68	\$ 104,738,159			-	\$ -	0%

**PERIODO DEL INFORME: DEL 7 DICIEMBRE DE 2020**

SEMANA REPORTADA: 10

[illegible]

PERSONAL DE OBRA												
PERIODO DEL INFORME: DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020												
SEMANA REPORTADA: 11												
NUMERO	NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA	FUNCION	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	SEMANA 11 (DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE)						
						LU	MA	MIE.	JU	VI	SA	DO
						14	15	16	17	18	19	20
1	YEFER CUEVAS MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	JUAN CARLOS BELALCAZAR B.	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
4	HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO	INGENIERO RESIDENTE	CALI	3/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X	X	X	
3	KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	9/11/2020		X	X	X	X	X	X	
6	FLORENCIO GAMBOA	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
12	OLEICER GARCES	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
18	KEVIN TOVAR	AYUDANTE	BUENAVENTURA	26/11/2020		X	X	X	X	X	X	
13	ANGEL ANTONIO GRANJA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
4	HARYN VALENCIA	AYUDATE SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	R	
7	WILSON VALENCIA	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	R	
17	ALVARO CRUZ DEVIA	OFICIAL	BUENAVENTURA	9/11/2020		X	X	X	X	X	X	
16	JAIME PALACIOS	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X		
8	JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X	X		
11	HAMILTON VALENCIA MOSQUERA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X	X	X	
21	ARVEY OBREGON	AYUDANTE DE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X	X	X	
22	DANIEL CUERO	AYUDANTE DE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X	X	X	
14	VICTOR FERNANDO TOVAR	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
5	BELISARIO RISCOS DELGADO	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R	R	R	
9	VENTURA SINISTERRA PARAMENO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R	R	R	
10	CESAR ANTINIO DELGADO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
15	HERVIN VALENCIA MURILLO	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
19	CARLOS HURTADO	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R	R	R	
20	JOSE SINISTERRA	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R	R	R	
PERSONAL INTERVENTORÍA												
1	NATALIA AMADOR BAQUIRO	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	NATALIA AMADOR BAQUIRO	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020					X	X		
3	CARMEN HELENA CORTES	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	10/3/2020		X	X	X	X	X	X	
4	MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ	INGENIERO RESIDENTE	CHAPARRAL	10/7/2020		X	X	X	X	X	X	

REPORTE DE LLUVIAS**PERIODO DEL INFORME:**

lunes, 14-dic.-20

AL

domingo, 20-dic.-20

SEMANA REPORTADA:

11

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	11/30/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MARTES	12/1/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MIÉRCOLES	12/2/2020	7:00	8:00		X		7:00 AM A 5:00 PM	HUMEDO
JUEVES	12/3/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
VIERNES	12/4/2020	7:00	10:00		X		7:00 AM A 5:00 PM	HUMEDO
SÁBADO	12/5/2020						7:00 AM A 12:00 PM	SECO
DOMINGO	12/6/2020						7:00 AM A 12:00 PM	SECO

OBSERVACIÓN :

4 HRAS DE LLUVIA

PERIODO DEL INFORME: DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020									
SEMANA REPORTADA: 11									
MAQUINARIA DE OBRA									
			SEMANA 11 (14 DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020)						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MI	JUE.	VI	SA	DO
			14	15	16	17	18	19	20
1	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
2	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
3	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
4	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
5	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
6	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
1	EQUIPO DE SOLDADURA		T	T	T	T	T	T	
1	PLANTA DE ENERGIA		T	T	T	T	T	T	
1	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X	X	X	
2	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIÓN:
X: RETIRADA DE OBRA
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA
V: VARADO
T: TRABAJANDO
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSION	1
			PAGINA	1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA: 12/27/2020	
Semana No	12	Del :	12/21/2020
			AL: 12/27/2020

Plazo Total	150	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	81	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	54.00%	

Nombre del Supervisor :

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

BUENAVENTURA

(%) Programado	Semanal 5.09%	Acumulado 71.12%	(%) Ejecutado	Semanal 0.02%	Acumulado 54.33%
Valor programado (\$)	\$ 28,464,669.00	\$ 397,433,411.00	Valor ejecutado(\$)	\$ 109,000.00	\$ 301,810,738.45
			Evaluación	Porcentaje avance Valor avance	-16.78% -95,622,672.55

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO JCB-02-785	Contratista:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
Contrato No:	20000785-01-H4 DE 2020	Contrato No:	20000791-01-H3-2020
Valor Inicial:	\$ 558,849,637.00	Valor total contrato:	\$ 154,462,000.00
Valor actualizado:	\$ 558,849,637.00	Valor actualizado:	\$ 154,462,000.00
Plazo inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020
Plazo actualizado:	HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021	Plazo actualizado:	HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021
Fecha de iniciación:	7-Oct-20	Fecha de iniciación:	7-Oct-20
Fecha de vencimiento:	21-Dec-20	Fecha de vencimiento:	21-Dec-20
Nueva fecha de terminación	6-Mar-21	Nueva fecha de terminación	6-Mar-21

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)

SE CONTINUA CON LA SEGUNDA PASADA DE LA ROSERÍA EN UN 95% DENTRO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN LAS ZONAS DE LA MALLA REPARADAS.

PINTURA

SE CONTINUA CON LA PINTURA EN ZONAS DE SALA DE ESPERA, Y OTRAS OFICINAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.

SE CONTINUA CON LA INSALACION DE LA MADERA EN EL VOR, SE DEJA CONSTANCIA DE LOS DETALLES DE LA MADERA.

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORIA

* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

- * FORMATOS DE CHARLAS
- * FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
- * INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS
- * REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA
- * ENTREGAS DE EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)





SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA




PINTURA





	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSION 1
			PAGINA 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA: 12/27/2020	
Semana No 12	Del : 12/21/2020	AL: 12/27/2020	
Plazo Total 150 días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 días			
porcentaje del tiempo transcurrido(%) 54.00%			

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.





SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento, se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de bioseguridad durante las actividades diarias.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DURANTE LA SEMANA 12 SE CONTINUA CON LA SEGUNDA FASE DE LA PODADAS QUE VA AL 95% EN SU SEGUNDA FASE DE LA PISTA, COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MALLA ESLABONADA EN LA FACE DE ANTICORROCIVO Y PINTURA, SE PINTAN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS ZONAS DE SALA DE ABORDAJE Y OTRAS OFICINAS Y SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CERRRAMIENTO EN EL VOR.

COMPROMISOS

SE HABLA CON EL INGENIERO RESIDENTE RESPECTO A LA RECOLECCIÓN DEL MATERIAL CORTADO POR LAS PODADORAS COMO TAMBIEN LA FUMIGACION DE LAS ZONAS PODADAS Y TENER EN CUENTA QUE SE DEBE PODAR 2 METRSO ALREDEDORES DE LAS MALLAS QUE SERAN VERIFICADOS POR LA INTERVENTORIA.

PERSONAL DE OBRA							
DIRECTOR DE OBRA	0		DIRECTOR DE OBRA INTERV	1			
RESIDENTE DE OBRA	1		RESIDENTE DE OBRA INTERV	1			
INGENIERO AMBIENTAL	0		SST	1			
SST	1						
OPERADOR DE GUADAÑA	5						
SOLDADOR	0						
AYUDANTE DE SOLDADOR	0						
ENCARGADO	1						
OFICAL	1						
AYUDANTE	4						
	13		TOTAL	3			

SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento, se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de bioseguridad durante las actividades diarias.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DURANTE LA SEMANA 12 SE TERMINA LA ROSERIA DENTRO DEL VOR COMO TAMBIEN EL CERRAMIENTO EN MADERA DENTRO DEL VOR, SE CONTINUA CON LA PINTURA DE LA ZONA TIERRA EN VARIAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO Y SE INICIA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERIAS SANITARIAS LLEGANDO ESTA SEMANA A UN 50%.

COMPROMISOS

SE QUEDA CON EL INGENIERO RESIDENTE EL DIA MARTES REALIZAR UN RECORRIDO PARA REVIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN HASTA EL MOMENTO Y REVIZAR ALGUNOS TEMAS DE LOS N.P.

AVANCE FINANCIERO OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 182,558,641.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 90,030,301.00
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		\$ 272,588,942.00

Valor Total Contrato Obra	
\$ 558,849,637.00	
Valor facturado Contrato Obra	
\$ 272,588,942.00	
% Avance facturado Acumulado	
48.78%	

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 48,813,081.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 21,108,777.00
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		\$ 69,921,858.00

Valor Total Contrato interventoria	
\$ 154,462,000.00	
Valor facturado Contrato Interventoria	
\$ 69,921,858.00	
% Avance facturado Acumulado	
45.27%	

OBSERVACIONES		DIRECTORA DE INTERVENTORIA	
		NATALIA AMADOR BAQUIRO	

[illegible]

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.									
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1		SEMANA No 12 (Dic.21 - Dic. 27)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario					
	TORRE DE CONTROL ARMENIA						cantidad	valor	%
1	ROCERIA								
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	557,361.24	\$ 109	1,000.00	\$ 109,000	459,073.00	\$ 50,038,957.00	82%
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	65.00	\$ 48,654			26.00	\$ 1,265,004.00	40%
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2,800.70	\$ 19,650			2,760.00	\$ 54,234,000.00	99%
3	CERRAMIENTOS								
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	3,721.63	\$ 32,828			4,212.00	\$ 138,271,536.00	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.	ML	1,070.76	\$ 24,285			702.00	\$ 17,048,070.00	66%
4	SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	1,000.00	\$ 6,447			-	\$ -	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	1,842.00	\$ 43,326			-	\$ -	0%
5	PAVIMENTOS								
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	-	\$ 243,002			-	\$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	-	\$ 726,484			-	\$ -	0%
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO.	M3	1.00	\$ 5,436,237			-	\$ -	0%
5.4	ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	-	\$ 4,972			-	\$ -	0%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 1,077,961			-	\$ -	0%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 679,702			-	\$ -	0%
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	500.00	\$ 3,363			-	\$ -	0%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	300.00	\$ 4,135			-	\$ -	0%
6	MAMPOSTERIA								
6.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1.50	\$ 31,201			-	\$ -	0%
6.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	120.79	\$ 35,096			-	\$ -	0%
6.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	47.15	\$ 18,102			-	\$ -	0%
6.4	ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	\$ 20,922			20.20	\$ 422,624.00	20%
6.5	ESTUCO Y PINTURA	ML	100.00	\$ 12,023			81.80	\$ 983,481.00	82%
6.6	PINTURA	M2	2,469.51	\$ 13,491			1,015.15	\$ 13,695,389.00	41%
6.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	35.00	\$ 67,225			-	\$ -	0%
6.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	10.00	\$ 42,000			-	\$ -	0%
6.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	500.00	\$ 4,379			-	\$ -	0%
7	PISOS								
7.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 25,151.00			144.00	\$ 3,621,744.00	0%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.									
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1		SEMANA No 12 (Dic.21 - Dic. 27)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario					
7.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	70.00	\$ 89,792			-	\$ -	0%
7.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	-	\$ 169,057			-	\$ -	0%
8	CUBIERTA Y CIELORASO								
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 54,771			-	\$ -	0%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	50.00	\$ 108,981			-	\$ -	0%
9	CARPINTERIA METÁLICA								
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 245,430			-	\$ -	0%
9.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	20.48	\$ 8,703			-	\$ -	0%
9.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	55.95	\$ 13,532			-	\$ -	0%
10	CARPINTERIA MADERA								
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 369,786			-	\$ -	0%
10.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	18.59	\$ 11,381			-	\$ -	0%
10.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	5.36	\$ 27,059			-	\$ -	0%
11	CRISTALERIA								
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	6.00	\$ 325,449			-	\$ -	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	6.00	\$ 40,233			-	\$ -	0%
12	LIMPIEZA PROFUNDA								
12.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	658.00	\$ 6,279.00			427.00	\$ 2,681,133.00	65%
12.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	250.00	\$ 8,538.00			-	\$ -	0%
12.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	250.00	\$ 5,018.00			-	\$ -	0%
12.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16.00	\$ 721,800.00			16.00	\$ 11,548,800.00	100%
12.5	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	250.00	\$ 32,000.00			250.00	\$ 8,000,000.00	100%
13	BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA								
13.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS E HIDRÁULICOS		1.00	\$ 104,738,158.68			-	\$ -	0%

[illegible]

PERSONAL DE OBRA PERIODO DEL INFORME: DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 SEMANA REPORTADA: 12												
NUMERO	NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA	FUNCION	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	SEMANA 12 (DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE)						
						LU	MA	MIE.	JU	VI	SA	DO
						21	22	23	24	25	26	27
1	YEFER CUEVAS MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	JUAN CARLOS BELALCAZAR B.	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
4	HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO	INGENIERO RESIDENTE	CALI	3/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X			
3	KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	9/11/2020		X	X	X	X			
6	FLORENCIO GAMBOA	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
12	OLEICER GARCES	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
18	KEVIN TOVAR	AYUDANTE	BUENAVENTURA	26/11/2020		X	X	X	X			
13	ANGEL ANTONIO GRANJA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
17	ALVARO CRUZ DEVIA	OFICIAL	BUENAVENTURA	9/11/2020		X	X	X	X			
16	JAIME PALACIOS	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
8	JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X			
11	HAMILTON VALENCIA MOSQUERA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X			
21	ARVEY OBREGON	AYUDANTE DE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X			
22	DANIEL CUERO	AYUDANTE DE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X			
14	VICTOR FERNANDO TOVAR	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
23	LUIS MORANTE	AYUDANTE	BUENAVENTURA	28/12/2020								
4	HARYN VALENCIA	AYUDANTE SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
7	WILSON VALENCIA	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
5	BELISARIO RISCOS DELGADO	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R			
9	VENTURA SINISTERRA PARAMENO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R			
10	CESAR ANTINIO DELGADO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
15	HERVIN VALENCIA MURILLO	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
19	CARLOS HURTADO	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R			
20	JOSE SINISTERRA	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R			
PERSONAL INTERVENTORIA												
1	NATALIA AMADOR BAQUIRO	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	NATALIA AMADOR BAQUIRO	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
3	CARMEN HELENA CORTES	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	10/3/2020		X	X	X	X			
4	MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ	INGENIERO RESIDENTE	CHAPARRAL	10/7/2020		X	X	X	X			

REPORTE DE LLUVIAS PERIODO DEL INFORME: lunes, 21-dic.-20 AL domingo, 27-dic.-20 SEMANA REPORTADA: 12								
DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	12/21/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MARTES	12/22/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MIÉRCOLES	12/23/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
JUEVES	12/24/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
VIERNES	12/25/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
SÁBADO	12/26/2020						7:00 AM A 12:00 PM	SECO
DOMINGO	12/27/2020							
<u>OBSERVACIÓN :</u>								

PERIODO DEL INFORME: DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020									
SEMANA REPORTADA: 12									
MAQUINARIA DE OBRA			SEMANA 12 (21 DICIEMBRE AL 27 DICIEMBRE DE 2020)						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MI	JUE.	VI	SA	DO
			21	22	23	24	25	26	27
1	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
2	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
3	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
4	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
5	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
6	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
1	EQUIPO DE SOLDADURA		X	X	X	X			
1	PLANTA DE ENERGIA		X	X	X	X			
1	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X			
2	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X			

OBSERVACIÓN:
X: RETIRADA DE OBRA
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA
V: VARADO
T: TRABAJANDO
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	
Semana No	13	Del :	12/28/2020
		AL:	1/3/2021

Piase Total	150	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	88	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	58.67%	

Nombre del Supervisor :

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

BUENAVENTURA			
Semanal	Acumulado	Semanal	Acumulado
% Programado	3.98%	% Ejecutado	54.90%
Valor programado (\$)	\$ 22.221.468.00	Valor ejecutado(\$)	\$ 3.157.711.06
	\$ 419.654.879.00		\$ 301.810.738.45
		Evaluación	-20.19%
		Porcentaje avance	
		Valor avance	-117.844.140.55

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO JCB-02-785	Contratista:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
Contrato No:	20000785-01-144 DE 2020	Contrato No:	20000791-01-143-2020
Valor inicial:	\$ 558.849.637.00	Valor total contrato:	\$ 154.462.000.00
Valor actualizado:	\$ 558.849.637.00	Valor actualizado:	\$ 154.462.000.00
Piase inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Piase inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020
Piase actualizado:	HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021	Piase actualizado:	HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021
Fecha de iniciación:	7-Oct-20	Fecha de iniciación:	7-Oct-20
Fecha de vencimiento:	21-Dec-20	Fecha de vencimiento:	21-Dec-20
Nueva fecha de terminación	6-Mar-21	Nueva fecha de terminación	6-Mar-21

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROGERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)

PENDIENTE EL ACCESO Y LOS DOS METROS ALREDEDOR AL VOR.

ESTUCCO Y PINTURA

SE CONTINUA CON EL ESTUCCO EN ALGUNAS ZONAS DENTRO DE LAS OFICINAS.

PINTURA

SE CONTINUA CON LA PINTURA EN LADO TERRA EN VARIAS LOCACIONES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.

SE TERMINA EL CERRAMIENTO.

MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN

SE INICIA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LAS BATERIAS SANITARIAS, SE REALIZA LA LIMPIEZA DE 8 (50%)

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORIA

* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS

* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS

* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

* ENTREGAS DE EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROGERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)






ESTUCCO Y PINTURA





PINTURA




	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	
Semana No	13	Del:	12/28/2020
		AL:	1/3/2021

Piase Total	150	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	88	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	58.67%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.





SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento, se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de bioseguridad durante las actividades diarias.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DURANTE LA SEMANA 13 SE CONTINUA CON LA SEGUNDA FASE DE LA PODADAS QUE VA AL 50% EN SU SEGUNDA FASE DEL VOR, COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MALLA ES LABONADA EN LA FACE DE ANTICORROSION Y PINTURA, SE CONTINUA CON LA PINTURA DE LA ZONA TIERRA EN VARIAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO LLEGANDO A UN GRAN AVANCE A PESAR DE LAS FESTIVIDADES Y SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CERRRAMIENTO EN EL VOR.

COMPROMISOS

SE HABLA CON EL INGENIERO RESIDENTE HUGO RESPECTO A LAS COTIZACIONES PARA LOS APUS NUEVOS Y PARA ESTE PERIODO NO SE RELIZA NINGUN TIPO DE OBSERVACION EN OBRA

PERSONAL DE OBRA							
DIRECTOR DE OBRA	0		DIRECTOR DE OBRA INTERV	1			
RESIDENTE DE OBRA	1		RESIDENTE DE OBRA INTERV	1			
INGENIERO AMBIENTAL	0		SST	1			
SST	1						
OPERADOR DE GUADAÑA	5						
SOLDADOR	0						
AYUDANTE DE SOLDADOR	0						
ENCARGADO	1						
OFICAL	1						
AYUDANTE	4						
	13		TOTAL	3			

SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

AVANCE FINANCIERO OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 182,558,641.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 90,030,301.00
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		\$ 272,588,942.00

Valor Total Contrato Obra	
\$ 558,849,637.00	
Valor facturado Contrato Obra	
\$ 272,588,942.00	
% Avance facturado Acumulado	
48.78%	

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 48,813,081.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 21,108,777.00
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		\$ 69,921,858.00

Valor Total Contrato Interventoria	
\$ 154,462,000.00	
Valor facturado Contrato Interventoria	
\$ 69,921,858.00	
% Avance facturado Acumulado	
45.27%	

OBSERVACIONES		DIRECTORA DE INTERVENTORIA	
		NATALIA AMADOR BAQUIRO	

[illegible]

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 13 (Dic-28 - Enero - 3)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial			cantidad	valor	%
TORRE DE CONTROL ARMENIA										
1	ROCERIA									
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	557,361.24	\$ 109	\$ 60,752,375.69	1,000.00	\$ 109,000	460,073.00	\$ 50,147,957.00	83%
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	65.00	\$ 48,654	\$ 3,162,510			26.00	\$ 1,265,004.00	40%
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y/O REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2,800.70	\$ 19,650	\$ 55,033,755			2,760.00	\$ 54,234,000.00	99%
3	CERRAMIENTOS									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	3,721.63	\$ 32,828	\$ 122,173,670			4,212.00	\$ 138,271,536.00	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.	ML	1,070.76	\$ 24,285	\$ 26,003,407			702.00	\$ 17,048,070.00	66%
4	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	1,000.00	\$ 6,447	\$ 6,447,000			-	\$ -	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	1,842.00	\$ 43,326	\$ 79,806,492			-	\$ -	0%
5	PAVIMENTOS									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	-	\$ 243,002	\$ 0			-	\$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	-	\$ 726,484	\$ 0			-	\$ -	0%
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARACHOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO.	M3	1.00	\$ 5,436,237	\$ 5,436,237			-	\$ -	0%
5.4	ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	-	\$ 4,972	\$ 0			-	\$ -	0%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 1,077,961	\$ 0			-	\$ -	0%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 679,702	\$ 0			-	\$ -	0%
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	500.00	\$ 3,363	\$ 1,681,500			-	\$ -	0%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	300.00	\$ 4,135	\$ 1,240,500			-	\$ -	0%
6	MAMPOSTERIA									
6.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1.50	\$ 31,201	\$ 46,802			-	\$ -	0%
6.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	120.79	\$ 35,096	\$ 4,239,246			-	\$ -	0%
6.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 ϕ = 0.04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	47.35	\$ 18,102	\$ 853,509			-	\$ -	0%
6.4	ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	\$ 20,922	\$ 2,092,200	26.00	\$ 543,972	46.20	\$ 966,596.00	46%
6.5	ESTUCO Y PINTURA	ML	100.00	\$ 12,023	\$ 1,202,300			81.80	\$ 983,481.00	82%
6.6	PINTURA	M2	2,469.51	\$ 13,491	\$ 33,316,107	185.66	\$ 2,504,739	1,200.81	\$ 16,200,128.00	49%
6.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	35.00	\$ 67,225	\$ 2,352,875			-	\$ -	0%
6.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	10.00	\$ 42,000	\$ 420,000			-	\$ -	0%
6.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	500.00	\$ 4,379	\$ 2,189,500			-	\$ -	0%
7	PISOS									
7.1	ALISTADO DE PISOS (ϕ = 0.01m a 0.04m- INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 25,151.00	\$ 0			144.00	\$ 3,621,744.00	0%
7.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	70.00	\$ 89,792	\$ 6,285,440			-	\$ -	0%
7.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	-	\$ 169,057	\$ 0			-	\$ -	0%
8	CUBIERTA Y CIELORASO									
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 54,771	\$ 0			-	\$ -	0%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	50.00	\$ 108,981	\$ 5,449,050			-	\$ -	0%
9	CARPINTERIA METÁLICA									
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 245,430	\$ 0			-	\$ -	0%
9.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	20.48	\$ 8,709	\$ 178,237			-	\$ -	0%
9.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	55.95	\$ 13,532	\$ 757,115			-	\$ -	0%
10	CARPINTERIA MADERA									
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 369,786	\$ 0			-	\$ -	0%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 13 (Dic.28 - Enero - 3)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial					
10.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	18.59	\$ 11,381	\$ 211,573			-	\$ -	0%
10.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	5.36	\$ 27,059	\$ 144,928			-	\$ -	0%
11	CRISTALERIA									
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	6.00	\$ 325,449	\$ 1,952,694			-	\$ -	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	6.00	\$ 40,233	\$ 241,398			-	\$ -	0%
12	LIMPIEZA PROFUNDA									
12.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	658.00	\$ 6,279.00	\$ 4,131,582			427.00	\$ 2,681,133.00	65%
12.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	250.00	\$ 8,538.00	\$ 2,134,500			-	\$ -	0%
12.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	250.00	\$ 5,018.00	\$ 1,254,500			-	\$ -	0%
12.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16.00	\$ 721,800.00	\$ 11,548,800			16.00	\$ 11,548,800.00	100%
12.5	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	250.00	\$ 32,000.00	\$ 8,000,000			250.00	\$ 8,000,000.00	100%
13	BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA									
13.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS		1.00	\$ 104,738,158.68	\$ 104,738,159			-	\$ -	0%

**SEMANA REPORTADA: 13**[illegible]

PERSONAL DE OBRA												
PERIODO DEL INFORME: DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 3 DE ENERO DE 2021												
SEMANA REPORTADA: 13												
NUMERO	NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA	FUNCION	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	SEMANA 13 (DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 3 DE ENERO DE 2021)						
						LU	MA	MIE.	JU	VI	SA	DO
						28	29	30	31	1	2	3
1	YEFER CUEVAS MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	JUAN CARLOS BELALCAZAR B.	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
4	HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO	INGENIERO RESIDENTE	CALI	3/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X			
3	KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	9/11/2020		X	X	X	X			
6	FLORENCIO GAMBOA	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
12	OLEICER GARCES	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
18	KEVIN TOVAR	AYUDANTE	BUENAVENTURA	26/11/2020		X	X	X	X			
13	ANGEL ANTONIO GRANJA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
17	ALVARO CRUZ DEVIA	OFICIAL	BUENAVENTURA	9/11/2020		R	R	R	R			
16	JAIME PALACIOS	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
8	JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R			
11	HAMILTON VALENCIA MOSQUERA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R			
21	ARVEY OBREGON	AYUDANTEDE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X			
22	DANIEL CUERO	AYUDANTEDE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X			
14	VICTOR FERNANDO TOVAR	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X			
23	LUIS MORANTE	AYUDANTE	BUENAVENTURA	28/12/2020		X	X	X	X			
4	HARYN VALENCIA	AYUDATE SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
7	WILSON VALENCIA	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
5	BELISARIO RISCOS DELGADO	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R			
9	VENTURA SINISTERRA PARAMENO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R			
10	CESAR ANTINIO DELGADO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
15	HERVIN VALENCIA MURILLO	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R			
19	CARLOS HURTADO	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R			
20	JOSE SINISTERRA	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R			
PERSONAL INTERVENTORÍA												
1	NATALIA AMADOR BAQUIRO	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	NATALIA AMADOR BAQUIRO	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
3	CARMEN HELENA CORTES	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	10/3/2020		X	X	X	X			
4	MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ	INGENIERO RESIDENTE	CHAPARRAL	10/7/2020		X	X	X	X			

REPORTE DE LLUVIAS**PERIODO DEL INFORME:**

lunes, 28-dic.-20

AL

domingo, 03-ene.-21

SEMANA REPORTADA:

13

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	12/21/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MARTES	12/22/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MIÉRCOLES	12/23/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
JUEVES	12/24/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
VIERNES	12/25/2020						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
SÁBADO	12/26/2020						7:00 AM A 12:00 PM	SECO
DOMINGO	12/27/2020							

OBSERVACIÓN :

PERIODO DEL INFORME: DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 3 DE ENERO DE 2021									
SEMANA REPORTADA: 13									
MAQUINARIA DE OBRA									
			SEMANA 12 (21 DICIEMBRE AL 27 DICIEMBRE DE 2020)						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MI	JUE	VI	SA	DO
			28	29	30	31	1	2	3
1	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
2	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
3	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
4	GUADAÑAS		X	X	X	X	X	X	
5	GUADAÑAS		X	X	X	X	X	X	
6	GUADAÑAS		X	X	X	X	X	X	
1	EQUIPO DE SOLDADURA		X	X	X	X			
1	PLANTA DE ENERGIA		X	X	X	X			
1	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X			
2	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X			

OBSERVACIÓN:
X: RETIRADA DE OBRA
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA
V: VARADO
T: TRABAJANDO
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	
Semana No	14	Del :	1/4/2021
		AL:	1/10/2021

Piase Total	150	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	95	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	63.33%	

Nombre del Supervisor :

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AREY LADO TERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AREY LADO TERRA DEL AEROPURTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

BUENAVENTURA			
	Semanal	Acumulado	
% Programado	2.72%	77.82%	% Ejecutado
Valor programado (\$)	\$ 22.221.468.00	\$ 419.654.879.00	Valor ejecutado(\$)
			Porcentaje avance
			Valor avance

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO JCB-02-785	Contratista:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS
Contrato No:	20000785-01-H4 DE 2020	Contrato No:	20000791-01-H3-2020
Valor inicial:	\$ 558.849.637.00	Valor total contrato:	\$ 154.462.000.00
Valor actualizado:	\$ 558.849.637.00	Valor actualizado:	\$ 154.462.000.00
Piase inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020	Piase inicial:	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020
Piase actualizado:	HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021	Piase actualizado:	HASTA EL 6 DE MARZO DE 2021
Fecha de iniciación:	7-Oct-20	Fecha de iniciación:	7-Oct-20
Fecha de vencimiento:	21-Dec-20	Fecha de vencimiento:	21-Dec-20
Nueva fecha de terminación	6-Mar-21	Nueva fecha de terminación	6-Mar-21

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROGERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)

CONTINUA PENDIENTE EL ACCESO Y LOS DOS METROS ALREDEDOR AL VOR

ESTUCCO Y PINTURA

SE CONTINUA CON EL ESTUCCO EN ALGUNAS ZONAS DENTRO DE LAS OFICINAS.

PINTURA

SE CONTINUA CON LA PINTURA EN LADO TERRA EN VARIAS LOCACIONES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.

SE TERMINA EL CERRAMIENTO.

MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN

SE CONTINUA CON LIMPIEZA DE BATERIAS SANITARIAS

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

* SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA INTERVENTORIA

* EL CONTRATISTA YA TIENE IMPLEMENTADO EL 100% DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

* SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA REALIZAR LA ENTREGA DIARIA DE LOS INFORMES DIARIOS DE OBRA DE LOS FORMATOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMANAL

SE SOLICITAN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PERIODICA DE:

* FORMATOS DE CHARLAS

* FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

* INSPECCIÓN A LAS HERRAMIENTAS

* REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

* ENTREGAS DE EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ROGERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACION)






ESTUCCO Y PINTURA






SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.






	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 3



UNIDAD EJECUTORA:		FECHA:	
Semana No	14	Del :	1/4/2021
		AL:	1/10/2021

Pazo Total	150	días
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	95	días
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	63.33%	

MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN





SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se implemento el kit de bioseguridad en el campamento, se toma temperatura y charlas de 5 minutos en obra y tambien la inspeccion constante al porte de los elementos de bioseguridad durante las actividades diarias.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DURANTE LA SEMANA 14 SE TERMINA LA ROSERIA DENTRO DEL VOR COMO TAMBIEN EL CERRAMIENTO EN MADERA DENTRO DEL VOR. SE CONTINUA CON LA PINTURA DE LA ZONA TIERRA EN VARIAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO Y SE NICA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERIAS SANITARIAS.

COMPROMISOS

SE QUEDA CON EL INGENIERO RESIDENTE EL DIA MARTES REALIZAR UN RECORRIDO PARA REVIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN HASTA EL MOMENTO Y REVIZAR ALGUNOS TEMAS DE LOS N.P.

PERSONAL DE OBRA							
DIRECTOR DE OBRA	0		DIRECTOR DE OBRA INTERV	1			
RESIDENTE DE OBRA	1		RESIDENTE DE OBRA INTERV	1			
INGENIERO AMBIENTAL	0		SST	1			
SST	1						
OPERADOR DE GUADAÑA	5						
SOLDADOR	0						
AYUDANTE DE SOLDADOR	0						
ENCARGADO	1						
OFICAL	1						
AYUDANTE	4						
	13		TOTAL	3			

SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

AVANCE FINANCIERO OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 182,558,641.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 90,030,301.00
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		\$ 272,588,942.00

Valor Total Contrato Obra	
\$ 558,849,637.00	
Valor facturado Contrato Obra	
\$ 272,588,942.00	
% Avance facturado Acumulado	
48.78%	

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2020	\$ 48,813,081.00
2	Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2020	\$ 21,108,777.00
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado		\$ 69,921,858.00

Valor Total Contrato interventoria	
\$ 154,462,000.00	
Valor facturado Contrato Interventoria	
\$ 69,921,858.00	
% Avance facturado Acumulado	
45.27%	

OBSERVACIONES		DIRECTORA DE INTERVENTORIA	
		NATALIA AMADOR BAQUIRO	

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 14 (Enero - 4 AL 18)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial			cantidad	valor	%
TORRE DE CONTROL ARMENIA										
1	ROCERIA									
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	557,361.24	\$ 109	\$ 60,752,375.69	2,000.00	\$ 218,000	462,073.00	\$ 50,365,957.00	83%
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	65.00	\$ 48,654	\$ 3,162,510			26.00	\$ 1,265,004.00	40%
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y/O REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2,800.70	\$ 19,650	\$ 55,033,755			2,760.00	\$ 54,234,000.00	99%
3	CERRAMIENTOS									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	3,721.63	\$ 32,828	\$ 122,173,670			4,212.00	\$ 138,271,536.00	100%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.	ML	1,070.76	\$ 24,285	\$ 26,003,407			702.00	\$ 17,048,070.00	66%
4	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	1,000.00	\$ 6,447	\$ 6,447,000			-	\$ -	0%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	1,842.00	\$ 43,326	\$ 79,806,492			-	\$ -	0%
5	PAVIMENTOS									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	-	\$ 243,002	\$ 0			-	\$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	-	\$ 726,484	\$ 0			-	\$ -	0%
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARACHOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO.	M3	1.00	\$ 5,436,237	\$ 5,436,237			-	\$ -	0%
5.4	ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	-	\$ 4,972	\$ 0			-	\$ -	0%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 1,077,961	\$ 0			-	\$ -	0%
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	-	\$ 679,702	\$ 0			-	\$ -	0%
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	500.00	\$ 3,363	\$ 1,681,500			-	\$ -	0%
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	300.00	\$ 4,135	\$ 1,240,500			-	\$ -	0%
6	MAMPOSTERIA									
6.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1.50	\$ 31,201	\$ 46,802			-	\$ -	0%
6.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	120.79	\$ 35,096	\$ 4,239,246			-	\$ -	0%
6.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 ϕ = 0.04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	47.35	\$ 18,102	\$ 853,509			-	\$ -	0%
6.4	ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	\$ 20,922	\$ 2,092,200			46.20	\$ 966,596.00	46%
6.5	ESTUCO Y PINTURA	ML	100.00	\$ 12,023	\$ 1,202,300	1.00	\$ 12,023	82.80	\$ 995,504.00	83%
6.6	PINTURA	M2	2,469.51	\$ 13,491	\$ 33,316,107	116.94	\$ 1,577,638	1,317.75	\$ 17,777,765.00	53%
6.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	35.00	\$ 67,225	\$ 2,352,875			-	\$ -	0%
6.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	10.00	\$ 42,000	\$ 420,000			-	\$ -	0%
6.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	500.00	\$ 4,379	\$ 2,189,500			-	\$ -	0%
7	PISOS									
7.1	ALISTADO DE PISOS (ϕ = 0.01m a 0.04m- INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 25,151.00	\$ 0			144.00	\$ 3,621,744.00	0%
7.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	70.00	\$ 89,792	\$ 6,285,440			-	\$ -	0%
7.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	-	\$ 169,057	\$ 0			-	\$ -	0%
8	CUBIERTA Y CIELORASO									
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	-	\$ 54,771	\$ 0			-	\$ -	0%
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	50.00	\$ 108,981	\$ 5,449,050			-	\$ -	0%
9	CARPINTERIA METÁLICA									
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 245,430	\$ 0			-	\$ -	0%
9.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	20.48	\$ 8,709	\$ 178,237			-	\$ -	0%
9.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	55.95	\$ 13,532	\$ 757,115			-	\$ -	0%
10	CARPINTERIA MADERA									
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	-	\$ 369,786	\$ 0			-	\$ -	0%

REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (POR LOTES), LOTE 1 – REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIREY LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.										
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN No 1			SEMANA No 14 (Enero - 4 AL 18)		ACUMULADO		
Tipo	ACTUACIONES	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial					
10.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	18.59	\$ 11,381	\$ 211,573			-	\$ -	0%
10.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	5.36	\$ 27,059	\$ 144,928			-	\$ -	0%
11	CRISTALERIA									
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	6.00	\$ 325,449	\$ 1,952,694			-	\$ -	0%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	6.00	\$ 40,233	\$ 241,398			-	\$ -	0%
12	LIMPIEZA PROFUNDA									
12.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	658.00	\$ 6,279.00	\$ 4,131,582			427.00	\$ 2,681,133.00	65%
12.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	250.00	\$ 8,538.00	\$ 2,134,500			-	\$ -	0%
12.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	250.00	\$ 5,018.00	\$ 1,254,500			-	\$ -	0%
12.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16.00	\$ 721,800.00	\$ 11,548,800	8.00	\$ 5,774,400.00	24.00	\$ 17,323,200.00	150%
12.5	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	250.00	\$ 32,000.00	\$ 8,000,000			250.00	\$ 8,000,000.00	100%
13	BOLSA DEMONTO AGOTABLE LADO TIERRA									
13.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS		1.00	\$ 104,738,158.68	\$ 104,738,159			-	\$ -	0%



PERIODO DEL INFORME: DEL 4 AL 10 DE ENERO DE 2021

SEMANA REPORTADA: 14[illegible]

PERSONAL DE OBRA PERIODO DEL INFORME: DEL 4 AL 10 DE ENERO DE 2021 SEMANA REPORTADA: 14												
NUMERO	NOMBRE PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA	FUNCION	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	SEMANA 14 (DEL 4 AL 10 DE ENERO DE 2021)						
						LU	MA	MIE.	JU	VI	SA	DO
						4	5	6	7	8	9	10
1	YEFER CUEVAS MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	JUAN CARLOS BELALCAZAR B.	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020								
4	HUGO ALBERTO BETANCOUR OROBIO	INGENIERO RESIDENTE	CALI	3/10/2020	11/14/2020	X	X	X	X	X	X	
3	KAROL ELINANA GONGORA CASTELLAR	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	9/11/2020		X	X	X	X	X	X	
6	FLORENCIO GAMBOA	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
12	OLEICER GARCES	BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
18	KEVIN TOVAR	AYUDANTE	BUENAVENTURA	26/11/2020		X	X	X	X	X	X	
13	ANGEL ANTONIO GRANJA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
17	ALVARO CRUZ DEVIA	OFICIAL	BUENAVENTURA	9/11/2020		R	R	R	R	R	R	
16	JAIME PALACIOS	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
8	JUAN ESTEBAN SINISTERRA MINA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R	R	R	
11	HAMILTON VALENCIA MOSQUERA	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R	R	R	
21	ARVEY OBREGON	AYUDANTEDE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X	X	X	
22	DANIEL CUERO	AYUDANTEDE PINTURA	BUENAVENTURA	2/12/2020		X	X	X	X	X	X	
14	VICTOR FERNANDO TOVAR	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		X	X	X	X	X	X	
23	LUIS MORANTE	AYUDANTE	BUENAVENTURA	28/12/2020		X	X	X	X	X	X	
4	HARYN VALENCIA	AYUDATE SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
7	WILSON VALENCIA	SOLDADOR	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
5	BELISARIO RISCOS DELGADO	ENCARGADO	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R	R	R	
9	VENTURA SINISTERRA PARAMENO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020	11/14/2020	R	R	R	R	R	R	
10	CESAR ANTINIO DELGADO	OPERARIO DE GUADAÑA	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
15	HERVIN VALENCIA MURILLO	AYUDANTE DE LIMPIEZA CERRAMIENTO	BUENAVENTURA	27/10/2020		R	R	R	R	R	R	
19	CARLOS HURTADO	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R	R	R	
20	JOSE SINISTERRA	AYUDANTE DE BRILLADO	BUENAVENTURA	26/11/2020		R	R	R	R	R	R	
PERSONAL INTERVENTORÍA												
1	NATALIA AMADOR BAQUIRO	REPRESENTANTE LEGAL	BOGOTA	10/7/2020								
2	NATALIA AMADOR BAQUIRO	DIRECTOR DE OBRA	BOGOTA	10/7/2020					X	X	X	
3	CARMEN HELENA CORTES	PROFESIONAL SST	BUENAVENTURA	10/3/2020		X	X	X	X	X	X	
4	MARIO ALBERTO CHAGUALA SANCHEZ	INGENIERO RESIDENTE	CHAPARRAL	10/7/2020		X	X	X	X	X	X	

REPORTE DE LLUVIAS**PERIODO DEL INFORME:**

lunes, 04-ene.-21

AL

domingo, 10-ene.-21

SEMANA REPORTADA:

14

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/4/2021						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MARTES	1/5/2021						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
MIÉRCOLES	1/6/2021						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
JUEVES	1/7/2021						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
VIERNES	1/8/2021						7:00 AM A 5:00 PM	SECO
SÁBADO	1/9/2021						7:00 AM A 12:00 PM	SECO
DOMINGO	1/10/2021							

OBSERVACIÓN :

PERIODO DEL INFORME: DEL 4 AL 10 DE ENERO DE 2021									
SEMANA REPORTADA: 14									
MAQUINARIA DE OBRA									
			SEMANA 12 (21 DICIEMBRE AL 27 DICIEMBRE DE 2020)						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MI	JUE	VI	SA	DO
			4	5	6	7	8	9	10
1	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
2	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
3	GUADAÑAS		T	T	T	T	T	T	
4	GUADAÑAS		X	X	X	X	X	X	
5	GUADAÑAS		X	X	X	X	X	X	
6	GUADAÑAS		X	X	X	X	X	X	
1	EQUIPO DE SOLDADURA		X	X	X	X			
1	PLANTA DE ENERGIA		X	X	X	X			
1	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X			
2	BRILLADORA INDUSTRIAL		X	X	X	X			

OBSERVACIÓN:
X: RETIRADA DE OBRA
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA
V: VARADO
T: TRABAJANDO
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA

ANEXO 7. LIBRO O BITÁCORA DE OBRA.

Miércoles 18: No se reportan los equipos disponibles
 como 2 Guadaña, 1 Planta, 1 Pulidora
 y 1 Equipo de Soldadura. y 3 Fumigadoras
 04/11/20
 Carin J. Cat8
 SST Interventor
 Ing. Res. Int.

Jueves 19/Nov/2020

Hora de Inicio: 7 AM Hora terminación: 5 PM

Tiempo muerto (7 AM - 11 AM) → Lluvia.

Desinfección de Personal y equipos, se da charla
 SST (Obra)


- Se adelanta actividades de fumigación y limpieza en Pata de malla Perimetral de aeropuerto
- Se adelanta labor de resaca y pintura en el exterior del gimnasio de los bomberos


Personal de obra

1 Responsable de obra, 1 Responsable SST, 1 encargado que da apoyo a limpieza de malla, 1 Ayudante de limpieza
 3 personas en fumigación y limpieza de material vegetal en Pata de malla estibadora, 2 Soldadores, 1 oficial de resaca y pintura

Equipos

1 Planta eléctrica, 1 Pulidora, 1 Equipo de soldadura
 1 Machete


 Resident SCB


 Ing. Res. Int.

Viernes 20/Nov/2020

Hora de Inicio: 7 AM Hora terminación: 5 PM

Tiempo muerto (7 AM - 10 AM) → Lluvia.

Desinfección de Personal y equipos se da charla

Obra

- Se adelanta actividades de soldadura, aplicación de anticorrosivo. Instalación de alambre de Puer en malla de cerramiento
- Se realiza lavado y rasquetado de zonas en mal estado en el interior del gimnasio de bombas
- Se realiza limpieza de pequeños arbustos (maleza) así como también limpieza en lata de malla de cerramiento (Aeropuerto).


Personas de obra

1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 encargado que se ocupa en limpieza de malla y limpieza de arbustos (Aeropuerto), 1 Ayudante de limpieza, 2 Soldadores, 1 oficial de resaca y Pintura.


Eguipos

1 Pluma eléctrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura, 1 machete.


Residente SCB


Ing Res Int.

Hasta la fecha se han cumplido los protocolos de bioseguridad y los temas SST


SST Residente.


SST Interventor

Sábado 21/Nov/2020

Hora de Inicio: 7AM Hora terminación: 1PM.

- Desinfección de Personas y equipos, se da charla SST (Riesgos Físicos)

Obra

Se adelantan actividades de soldadura en 2 Puntos


cuidos de la malla de cerramiento, Se adelanta labor de estuco y Pintura (tastueado) en el interior del gimnasio de bomberos, Se realiza limpieza de Pata (material vegetal) sobre malla eslabonada


Personal de obra (Aeropuerto)

1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 encargado que da apoyo a limpieza sobre malla, 2 Soldadores, 1 Oficial de resaca y Pintura, y 1 ayudante de resaca y Pintura

Equipo

1 Placa eléctrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldador, 1 machete y 1 Pala


Residente de JCB


Ing. Res. Int.

Lunes 23/Nov/2020

→ Hora de Inicio: 7 Am Hora Terminación: 5 Pm
Desinfección de Personal y equipos, Se da charla SST (Importancia del uso del casco)


Obra
Se adelantan actividades en 2 Parales cuidados de malla de cerramiento, Se adelanta labor de estuco y Pintura (Estuco) en el interior del gimnasio de bomberos, Se realiza limpieza de Pata (material vegetal) sobre malla eslabonada de aeropuerto

Personal de Obra


1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 encargado que da apoyo a limpieza sobre malla, 2 Soldadores y 1 Oficial de resaca y Pintura

Equipo

1 Placa eléctrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldador, 1 machete, 1 Pala



Residente de JCB.



Ing RPS Int.

Martes 24/Nov/2020

Tiempo muerto (7Am - 11Am) → Cluvia.

Hora de Inicio: 7Am

Hora terminación: 5pm

- Desinfección de Personal y equipos, se da Charla SST (Enfermedades respiratorias)

Obra


- Se adelantan actividades en malla de cerramiento, (se hacen mallas y se instala a humbre de PUS), se realiza limpieza en Pata de cerramiento (aerpuerto), se adelanta labor en el gimnasio de aerpuerto (Exterior e Interior)

Personal de obra

Residente de obra, 1 residente SST, 1 Encargado de soldadores, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura y un ayudante para limpiar Pata de cerramiento

Equipo

1 Pluma eléctrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura, 2 machetes, 2 Pulis.



Residente de JCB.



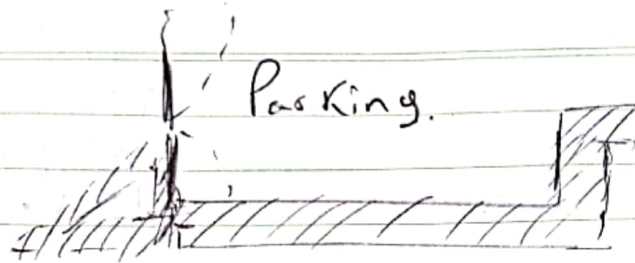
Ing RPS Int.

Martes 24/Nov/2020

En reunión el día de hoy con la Dra Luz Dory (Subadministradora) se solicita el cambio TOTAL del Piso exterior (antideslizante)

Se recomienda tener en cuenta para este tipo de reuniones a la INTERVENTORIA





[Signature]
Presidente JCB

Martes 24/Nov/2020

El Ingeniero Yefer Hernando Cuevas ^(Representante legal JCB) Monsoya realiza visita técnica en instalaciones del aeropuerto Bventura.

[Signature]
Presidente JCB

[Signature]
Ing. Int.

Miércoles 25/Nov/2020

Tiempo (7 AM - 8 AM) - (Avisión) / Yuvia

Desinfección de personal y equipos, se da charla SST (Prevención del covid-19)


- Se adelantan actividades en malla y cerramiento (Soldadura e instalación de alambre de púas)
- Se realiza limpieza en ruta de cerramiento (Aero Puerto)
- Se adelantan labores preliminares para la actividad de instalación de piso en granito pulido (antideslizante)

[Signature]
Personal de obra

1 Presidente de obra, 1 Presidente SST, 1 Encargado, 2 Soldadores, 2 ayudantes limpieza ruta de malla, 1 Oficial de Pintura, 1 ayudante de Pintura

Equipo de obra

1 Planta eléctrica, 1 Pulidora, 1 Equipo de Soldadura, 1 machete, 2 Pulis


Residente de SCB

Jueves 26 / Nov / 2020 (Inicio: 7AM - Terminación: 5PM)
Tiempo (7AM - 8AM) → Unión


Desinfección de Personas y equipos, se da charla SST (Ambiente laboral)
(Obra)

- Se adelantan actividades en malla de cerramiento de Aeropuerto
- Se realiza limpieza en Pata de la malla de cerramiento
- Se adelantan labores Preliminares Para Instalación de Piso antideslizante.
- Se inicia con la actividad de Pulido y bottido de Piso.

Personal de obra: 4 Personas Para Pulido de Pisos

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 Soldadores, 1 encargado, 2 Ayudantes limpiando Pata de cerramiento (Aeropuerto), 1 Oficial de Pintura y un ayudante de Pintura
Equipo de obra

1 Planta eléctrica, 1 Pulidora, 1 Equipo de Soldadura, 3 machetes, 3 Pulis


Residente de SCB.


Ing. Rel. Int.

Vieops 27/Nov/2020

Inicio: 7Am

Terminacion: 5Pm

Tiempo muerto:

Desinfeccion de Personal y equipos, se da charla SST (Consumo de alcohol)

Obra


- Se adelantan actividades en malla de Ceramieto de aeropuerto
- Se realiza limpieza en Pata de malla-cerramiento
- se continua con la actividad de Pulido de Piso y guardasobas


Personal de obra

4 personas en actividad de Pulido de Piso
1 Residente de obra, 1 residente SST,
1 encargado, 2 personas limpiando malla (PATEL)
1 Soldador, 1 Oficial de Pintura y
1 a Pulante de Pintura

Equipo de obra

1 Pluma electrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldar
3 Palas, 3 machetes


Residente JCB.


Ing. R. Int.

Sabado 28/Nov/2020

Inicio: 7Am

Terminacion: 2Pm

Desinfeccion de Personal y equipos, se da charla SST (Identificacion de Peligros)

Obra

- Se adelantan actividades en malla de Ceramieto de aeropuerto
- Se adelanta trabajo de estuco y pintura en gimnasio de bomberos

→ Se realiza limpieza en lata de malla - cerramiento
(Aeropuerto)

→ Se continua con la actividad de Pulido de Pisos
y guardasrobos.

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 4 Personas en
Pulido de PISO, 1 Encargado, 2 Soldadores
2 ayudantes en limpieza de malla,
1 Oficial de Pintura, 1 ayudante de Pintura

Equipo de obra

1 Pluma eléctrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura
2 Palas. 2 Mochetas.

Lunes 30/Nov/2020

[Signature]
Residente SST.

Inicio: 7Am

Terminación: 5Pm.

Desinfección de personal y equipos, se da
charla SST (Incidencias y accidente de trabajo)

Obra


- Se continúan labores de roceria (estab #1 en VOR)
- Se adelantan trabajos de enrosques y desales en VOR
- Se realiza trabajo en malla de cerramiento
(Soldadura, Instalación de alambre de puas, arreglo
de malla maltratada en el VOR)
- Se continua con Pulido de Pisos en
el aeropuerto.
- Se inicia con labor de estuco y Pintura
en Sala y Presala de a bordo de (Aeropuerto).


Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 4 Personas en
Pulido de Pisos, 1 Encargado, 2 Soldadores
2 ayudantes para limpieza de malla
2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de Pintura

Equipo de obra

1 Plomo electricista, 1 Plomista, 1 Equipo de Soldadura, 2 Paños, 2 machetes


J. L. S. B.


Ing. Ros. Int.

Martes 01 / Dic / 2020

Inicio: 7 AM

Terminación 5 PM

Desinfección de personas y equipos, sede
Charla SST (SERIALIZACION)

Obra

- Se adelantan labores de malla de cerramiento (Soldadura, arreglo de malla, elaboración, instalación de alambre de pua en UPR
- Se cortó cantidad nueva de cerramiento en madera pua UPR (290 m)
- Se continuó con labor de esmero y pintura en gimnasio y en sala de abordaje (Derr Puerto)
- Se realizó recorrido para revisar pendientes en roca y limpieza de malla y se a prueba dar inicio a boquería (2do Round)
- Se realizó recorrido Informativo Para Informar al residente por contacto el alcance de los trabajos en lado tierra

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado, 2 Soldadores, 2 oficiales de Pintura, 2 capataces de limpieza

Equipo de obra

3 Juegos o Cuerpos de andamio (con rodachin), 1 Plante electrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura
2 cables 2 machetes


Residente SCS.


Ing. RES Int.

Miercoles 02 / Dic / 2020

Inicio: 7AM

Terminacion: 5PM

Desinfeccion de Personal y equipos, se da charla SST / uso de los EPP.

Obra


- Se adelantan trabajos de malla de cerramiento (Soldadura, arreglo de malla ya laborada, Instalacion de alambre de Pvc en VOR)
- Se continua con trabajos de Estruc y Pintura en Gimnasio y Sala de abordo Jr (Acro Puerto)
- Se Inicia con 2º Round de Racera en
- afueras del aeropuerto debido que aun no aparece el Notam.


Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado, 2 Soldadores, 2 electricos de pintura, 2 apuradores de pintura

Equipo de obra

3 Juegos de andamio (con rodachin), 1 Plante electrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura, 2 cables, 2 machetes


Residente de obra


Ing. RES Int.

Jueves 03/dic/2020

Inicio: 7 AM Terminación: 5 PM
Desinfección de Personal y Equipos, Se da
charla SST (Orden y aseo)

Obras


- Se adelantaron labores en malla de cerramiento en VOR
- Se continúa con labor de estuco y Pintura en gimnasio y sala de abordaje
- Se continúa con labor de Ponería (2do Round)

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado
12 Soldadores, 4 operadores de grúa, 2 oficiales
de Pintura, 2 voluntarios de Pintura, 1 ayudante
de Oficios Varios.

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio con redichine, 1 Plata eléctrica
1 Pulidora, 1 equipo de soldadura


Residente de Obra.


King Int.

Viernes 04/dic/2020

Inicio: 7 AM Terminación: 5 PM
Desinfección de Personal y Equipos, Se da
charla SST (Hábitos de seguridad laboral)

Obras


- Se adelantaron labores en malla de cerramiento en VOR
- Se continúa con labor de estuco y Pintura en gimnasio y sala de abordaje
- Autorizar "Notar" para socorro.


Se continúo con labor de Reresia (2^{da} Rueda)

Personal de obra
1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado,
2 Soldadores, 4 Operadores de guindas, 2 oficiales
de Pintura, 2 ayudantes de Pintura, 1 ayudante
de oficios - Varios

Equipo de obra

3 cuerpo de andamio con 6 chinos, 1 Placa de acero,
1 Pulidora, 1 equipo de soldadura


Residente de SCS.


Ing. Res. Int.

Sabado 05 / Dic / 2020.

Inicio: 7 AM

Terminación: 12 PM.

Desinfección de Personal y equipos, Se da charla
SST (Movimientos Giratorios)

Obra

→ se adelantan labores en malla de cerramiento
en el VOR


→ Se continúa con labor de estuco y Pintura
en gym y sala de espera


→ Se continúa con labor de Reresia (2^{da} Rueda)

→ Se entrega Reporte Informativo de obra

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado,
2 Soldadores, 4 Operadores de guindas, 2 oficiales
de Pintura, 2 ayudantes de Pintura.


Residente de SCS.


Ing. Res. Int.

Lunes 07 / Dic / 2020

Inicio: 7 Am

Terminación: 5 Pm

Desinfección de Personas y cosas de donde
SST (Estrés laboral)

Obra


- Se adelanta trabajo en malla de cerramiento en Obra
- Se continúa con labor de estuco y pintura en gimnasio y sala de espera
- Se continúa con labor de Raster (2do Round)


Personal de obra

1 Residente de Obra, 1 Residente SST,
1 encargado, 2 Soldadores, 5 obreros de pintura
2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de Pintura

Equipo de obra

3 Cuadro de andamio con rodapié, 1 Puma eléctrica
1 Pulidora, 1 Cuadro de soldadura


Residente de SCS.


Ing. Res. Int.

Miércoles 09 / Dic / 2020 (9 / Dic / 2020)

Inicio: 7 Am

Terminación: 5 Pm

Desinfección de Personas y cosas de donde
SST (Riesgo Biológico)

Obras


- Se adelanta Trabajo en malla de cercamiento en Puente del aeropuerto
- Se continúa con labor de estuco y Pintura en Siminacio y Sala de abordaje
- Se continúa con labor de Paredes (2° Puan)

Personal de obra

1 Presidente de obra, 1 Presidente SST, 1 Encargado, 2 ayudantes, 5 operarios de grúa, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de Pintura, 1 ayudante de oficios varios

Equipo de obra

3 cueros de andamio con rodachina, 1 Placa eléctrica, 1 Pulidor, 1 Equipo de soldadura


Presidente de JCB.


Presidente SST.

Jueves 1-10 / dic / 2020

Inicio: 7 Am

Terminación: 5 Pm

Reunión de Personal y equipos, SP de charla SST (Riesgo de Inseguridad)

Obras


- Se continúa con labor de arreglo de Puente en estacionamiento
- Se continúa con labor de estuco y Pintura en Siminacio y Sala de abordaje
- Se avanza con paredes (2° Puan - Aeropuerto)


Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 Encargado,
 12 Soldadores, 6 Operarios de grúa,
 2 Oficiales de pintura, 2 ayudantes de pintura

Equipo de obra

3 Camiones de grúa, 1 Planta eléctrica,
 1 Pulidora, 1 camión de soldadura


 Residente de Obra


 Ing. Res. Int.

Viernes 11 / Dic / 2020

Inicio: 7 AM

Terminación: 5 PM

Desinfección de Personal y equipos de la
 charla (Iluminación)

Obra


- Se realiza recorrida de obra con el admn del aeropuerto en conjunto con la Interventoría
- Se continua con labor de arreglo en Puerta PPI en aeropuerto + Instalación de serpiente
- Se continua con labor de estuco y pintura en sala de abarbose grande
- Se continua con recorric (2^a Round)


Personal de obra

1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 encargado
2 Sold. Jores, 6 Operadores de grúa, 2
oficiales de Pintura, 2 ayudantes de Pintura

Equipo de obra

3 Cierres de andamio, 1 Pluma-electrica,
1 Pulidor, 1 Equipo de soldadura


Residente de OB


Ing RES Int.

Julio 12 / Dic 2020

Inicio: 7 Am

Terminación: 2 Pm

Desinfectación de equipos y Personal, se da
charla SST (Calidad de Vida).

(Obra)

→ Se Inicia cortado derecho en malla estibadora
de var

→ Se continúa con labor de estuco y Pintura
en Sala de abordo de grande


→ Se continúa con vareria (2do Round)

Personal de obra

1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 encargado
2 Soldadores, 6 Operadores de grúa, 2 oficiales de
Pintura, 2 ayudantes de Pintura.

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio, 1 Pluma eléctrica
1 Pulidora, 1 cuerpo de soldadura


Residente SCB.


Ing. Res. Int.

14 / dic / 2020 (Lunes)

Inicio: 7 AM

Terminación: 5 PM

Desinfección de persona y equipos, se da
Charla SST (Herramientas manuales)

Obras

→ Se continúa con labor de mantenimiento en male
estacionado, CONTRA derecho (Voz)

→ Se inicia con labor de estuco y Pintura
en Sala de abastecimiento

→ Se continúa con suciedad (2^a Round)


→ Se realiza Comité Virtual 13:30 PM - 5 PM
Persona de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST,
1 encargado, 2 Soldadores, 6 Operadores de
grúa, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes
de Pintura

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio, 1 Pluma eléctrica
1 Pulidora, 1 equipo de soldadura


Residente SCB.


Ing. Res. Int.

Martes 15/dic/2020.

Inicio: 7 Am Terminación: 5 Pm
Desinfección de Personal y puntos, se da
charla SST (Higiene laboral).

Obra


- Se continúa con la obra de arriamiento de malla eslabonada, lado derecho (VOR).
- Se continúa con la obra de estaca y pintura en su base de abordaje pequeña y se inicia labor por sala de obra (Sotera).
- Se continúa con la obra (2º Round).


Personal de obra

1 Residente de obra, 1 residente SST,
1 Encargado, 2 Soldadores, 6 Operadores de
grúa, 2 oficiales de pintura, 2 ayudantes de
pintura.

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio, 1 Pintor eléctrico,
1 Pulidor, 1 equipo de soldadura.


Residente JCR.


Sing. Res. Int.

Miércoles 16/dic/2020

Inicio: 7 Am Terminación: 5 Pm
Desinfección de Personal y puntos, se da
charla SST (cuidado de los ojos)

Obr


- se continua con mantenimiento de malla estibonada, Costado derecho (VOR)
- se continua con labor de estaca y Pintura por sala de espera - SUTENA
- se continua con roquete en acrobacia (2º Ronda)


Personal de obra

1 Presidente de obra, 1 Presidente SST, 1
Enrregado, 2 Soldadores, 6 Operarios de dep. Lora
2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de
Pintura

Equipo de obra

- 3 cuerpos de andamio, 1 Planteo eléctrico
1 Pulidora, 1 equipo de soldadura


Presidente SCB


Ing. R. S. S. S.

Suevas 17/dic/2020

Tiempo muerto (7 - 10 Am).

Inicio: 7 Am

Desinfección de personal, 4 equipos, se de
Chack SST (hidratación)

Obr

- se continua con mantenimiento de malla estibonada, Costado derecho (VOR)
- se Inicia con labor de cerramiento en madre (VOR)


- se continúa con labor de estudio y pintura por sala de espera - Surcra
- se continúa con guerra (2do Round)
- Se realiza visita a torre de control para revisar cubiertas en general.


Personal de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST, 1 encargado, 2 solidadores, 6 Soldadores de Guadua, 2 oficiales de Pintura, 2 ayudantes de Pintura

Equipo de obra

3 Cuerpos de andamio, 1 Puma Alcatraz, 1 Pulidor, 1 equipo de soldadura


Residente SB


Ing RS Int.

Ultimas 18 / dic / 2020

Tiempo muerto: 11 Am - 7 Pm

Inicio: 7 Am

Terminación: 5 Pm

Desinfección de Personal y Equipos, se le chupa SST (Influencia de la Protección Respiratoria)

Otra

Se continúa con mantenimiento de maquinas de soldadura, costado derecho (VOR)

- se continúa con labor de estudio y pintura (Surcra)
- se continúa con labor de sermiente (medra) - VOR


→ se realiza labor de pintura y pintura en
frontera que contiene el nombre del cerro


→ se continua con malla de volt (mantenimiento) en
lado derecho

→ se continua con 2do. Nivel de pintura
(cerro) y personal de obra en el mismo del
Sueves 17 Dic 2020

Equipo de obra

3 equipos de andamio, 1 plana de Tira, 1
pulidora, 1 equipo de soldadura



Presidente de JCB


Ing. R. Int.

Sabado 19 Dic 2020

Inicio: 7 Am

Recepcion de Personal
Charles SST

 Terminacion 15 Am
Y equipos, se da

Obra

Se continua con mantenimiento de malla eslabon
cortado derecho (VOR)

→ se continua con labor de pintura y pintura en
frontera AZUL

→ se continua con cerramientos en madera-vor

→ se abanza con G. cerro en cerro 2do. (Round)

Personal de obra
1 Presidente de obra 1 Presidente SST, 1 encargado
2 Subencargados 6 Personas en pintura, 2 Oficiales de
Pintura y 2 ayudantes de Pintura
1 Alumno, Cerramientos en madera

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio, 1 Pluma eléctrica, 1 Pulidora, 1 equipo de soldadura

Ing. Pablo Barrios

Residente de SCB.

Lunes 21 / dic / 2020

Inicio: 7 Am, Terminación: 5 Pm
Desinfección de personas y equipos, se da charla SST (

Obra

- Se avanza con labor de estuco y pintura en áreas administrativas
- Se avanza en cerería (2do P. un 1).
- Se avanza con cerramiento en madera - UoP.

Personal de obra

1 Residente SST, 1 Residente de obra,
1 encargado, 6 personas en guarda,
2 oficiales de pintura, 2 ayudantes en pintura,
1 ayudante de cerramiento en madera.

Equipo de obra

3 cuerpos de andamio.

Ing. Pablo Barrios

Residente SCB.

Ing. RESINT.

Mañanas 22 / dic / 2020

Inicio: 7 Am Terminación: 5 Pm
Desinfección de personas y equipos, se da
charla SSTC

Obr

→ Se continúa con labor de estuco y Pintura
en áreas administrativas - Aeropuerto

→ Se avanza en tubería (2do Round)


→ Se avanza con cerramiento en madera (Vol)


Personas de obra

1 Residente de obra, 1 Residente SST
1 Encargado, 6 personas de Guardia
2 oficiales de Pintura, 2 oficiales Ayudantes
de Pintura, 1 ayudante Para cerramiento y madera

Equipo de obra

3 cuerpos de armadura, 2 mch


Residente SSTC


B. Ing. ref. Int.

Viernes 23 / dic / 2020

Inicio: 7 Am Terminación: 5 Pm
Desinfección de personas y equipos, se da
charla SSTC

Obra


- Se continúe con labor de estuco y pintura en áreas administrativas
- Se avanza en Bocetos (2da Round)
- Se avanza con cerramiento en madera (VOR)


Personas de obra

1 Residente, 1 residente SST, 1 encargado 6.
Personas de Guardia, 2 obreros en Pintura
12 ayudantes de Pintura, 1 ayudante para
Cerramiento en madera

Equipos de obra

3 cueros de andamio, 2 machetas


Residente SCB


Ing. Res. Int.

Obra

→ Se continúa con labor de estuco y pintura en áreas administrativas

→ Se avanza en Boceto (2^{da} Roun)


→ Se avanza con cerramiento en madera (UOR)


Personal de obra

1 Residente, 1 residente SST, 1 encargado 6.
Personas de Guadua, 2 oficiales en Pintura
12 ayudantes de Pintura, 1 ayudante para
Cerramiento en madera


Equipos de obra

3 cueros de andamio, 2 machetes


Residente SCB


Eng. Res. Int.

Nota el Contratista trabajo el sábado 19 todo el día
para sacar el medio día del sábado 26 o sea se
retoman actividades el día 28



Jueves 24 / Dic / 2020

Inicia 7 AM.

Terminación 12: M.

Desinfección de personal y equipos, se hace
charla de seguridad y se toman
temperaturas.


- Se continua con la labor de estuco y pintura en la zona tierra.
- Se continua con la roseria en la pista.
- Se avanza con el cerramiento en madera en el VOR.

Personal en obra


1 Residente Civil, 1 SST, 1 Encargado
6 Oper de Guadalupe, 2 Oficiales en
pintura. 2 Ayudantes pintura, 1 Ayudante
en el cerramiento en madera.

Equipos

Guadalupe, 3 secciones de andamio.



Residente TCB



Ing. Res Int.

lunes 28 / Dic / 2020.

Inicio 3:00 AM, fin 17:00 PM.

Se inician actividades con desinfección de personal y equipos.
Toma de temperaturas y charla de seguridad.

- Se continua con la labor de estuco y pintura
- Se continua con la roseria en la pista

- Se avanza con el cerramiento madera en el vor.


Personal en Obra.


1 Ing Residente civil, 1 SST, 1 Encargado
6 op. de Guadalupe, 2 Oficiales en pintura
2 Ayudantes en pintura, 1 Ayudante en
cerramiento del vor.

No se presentan lluvias.

Equipos

8 Guadalupe y 3 Secciones de
andamios.


Residente JCB


Ing Res Int.

Martes 29 / Dic / 2020.

Inicio 7:00 AM Fin 17:00 PM.

Se inician actividades con desinfección
de personal y equipos
Toma de temperaturas y charla de
seguridad.

- Se continua con la labor de estuco
y pintura.

- Se continua con la resena alrededor
de la pista.

- Se avanza con el cerramiento en madera
en el vor.

Personal en Obra.


1 Ing Residente Civil, 1 SST, 1 Encargado


6 Op. de Guadalupe, 2 Oficiales en pintura
2 Ayudantes en pintura, 1 Ayudante
Cerramiento del VOR

No se presentan lluvias.

Equipos

5 Secciones de Andamio y 6 Guadalupe


Residente JCB.


Ing Res Int.

30 miércoles / Dic / 2020.

Inicio 7:00 AM.

Fin 17:00 PM.

Inicio de actividades con desinfección
de personal y equipos.
Toma de temperaturas y charla de
seguridad.


- Se Continúa con la labor de estuco
y pintura. Zona tierra.
- Se Continúa con la rosaría alrededor
de la malla aeropuerto.
- Se continúa con el cerramiento en
madera en el VOR.


Personal en Obra.

1 Ing Res civil, 1 SST, 1 Encargado.
6 Op de Guadalupe, 2 Oficiales de pintura
2 Ayudantes en pintura y 1 Ayudante
Cerramiento en madera de VOR.

Equipos
3. Secciones de Andamio y 6 Guadaños.

No se presentan ~~trabajos~~.


Residente JCB


Ing. Res. Cmi. / Inf.

31 Jueves / Dic / 2020.

Inicio 7:00 AM. Fin 17:00 PM.

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos, toma de temperaturas y charla de seguridad.


- Se continua. con la labor de estuos y pintura en la zona tierra.
- Se continua con la roseria alrededor de la malla del aeropuerto.
- Se continua con el cerramiento en madera en el VOR.


Personal en Obra.

1 Ing. Res. Civil + SST, 1 Encargado.
6 de Guadalupe, 2 oficiales en Pintura.
2 Ayudantes en Pintura y 1 Ayudante
Cerramiento madera VOR.

Equipos
3 Secciones de Andamio y 6 Guadañas

No se presentaron lluvias.


Residente de JCB


Ing Resident.

Lunes 4 / Ene / 21.

Inicio 7:00AM Fin 17:00PM

Se inician actividades con toma de temperaturas, desinfección al personal y equipos.
Charla de seguridad.

- Se inicia la actividad de desinfección de botenas sanitarias con evaluación de materiales necesarios.
- Se continúa con la posesión con 3 guadañas en la zona del VOR.
- Se continúa con la pintura en zona lado tierra.
- Se termina el cerramiento en madera en el VOR total metros lineales 290. actividad al 100%.


Personal en Obra.


1 Ing Civil Residente, 1 SST, 1 Encargado
3 Op de guadaña, 2 Oficial en pintura
2 Ayudantes en desinfección de unidades sanitarias.

Equipos

3 Secciones de andamio y 3 Guadanas

No se presentaron lluvias


Residente de JCB


Ing. Res Int.

Martes 05 / Ene / 21

Inicio 07:00 AM fin 17:00 PM.


Se inician actividades. con toma de temperaturas, desinfección de personal y equipos.


Charlas de seguridad.

- Se continúa con la desinfección de las baterías sanitarias en el acceso a sala de espera.
- Se continúa con la pintura lado tierra.
- Se continúa con la rosería en el vor.

Personal en Obra

1 Ing Res civil, 1 SST, 1 Encargado,
3 Operadores Guadana, 2' oficiales en pintura
2 Ayudantes en desinfección

Equipos
3 Secciones de andamio y 3 Guadanas.

Ingeniero de JCB


Ing. Res Int.

Miércoles 06 / Ene / 21

Inicio 07:00 AM. Fin 17:00 PM.

Inicio de actividades con desinfección de personal y equipos.
Toma de temperaturas y charla de seguridad.


- Se continúa con la desinfección de baterías sanitarias sala de espera.
- Se continúa con la guadañada en el Vor
- Se continúa con el estuco y pintura en todo tierra.

Personal Obra:


1 Ing. Res. Civil, 1 SST, 1 Encargado
3 Oper. de guadaña, 2 oficiales en pintura
2 Ayudantes en desinfección de baterías sanitarias

Equipo

3 Seccionas de Andamio y 3 Guadañas.



Ing. Residente JGB.



Ing. Res. Int.

Jueves 07 / Enero / 21

Inicio de A. 07:00 AM Fin 17:00 PM.

Inicio de actividades con desinfección

ANEXO 8. DESEMBOLSOS ANTICIPO DE OBRA.

Bogotá D.C., 10 de Diciembre de 2020

Señores

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO No. 13532

Como responsable designado/contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación No. 01 a nombre del CONSORCIO JCB-02-785 por valor de \$ 90.400.000.

Así mismo certifico que estos pagos corresponden a los rubros previstos en el plan de utilización/inversión del anticipo.

Atentamente



NATALIA AMADOR/BAQUIRO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 1					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 10/12/2020		
P.A. ANTICIPO CONSORCIO JCB-02-785			PAGADO A : CONSORCIO JCB-02-785		
			N.I.T : 901410705-1		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	Anticipo contrato mano de obra	AMG, Diseños Construcciones y Gerencia de Proyectos	CUENTA DE COBRO 001	23/10/20	\$ 8.900.000,00
2	Anticipo contrato mano de obra	AMG, Diseños Construcciones y Gerencia de Proyectos	CUENTA DE COBRO 002	23/10/20	\$ 1.100.000,00
2	Nómina personal operativo del 26 de octubre al 07 de noviembre de 2020	AMG, Diseños Construcciones y Gerencia de Proyectos	CUENTA DE COBRO 003	05/11/20	\$ 16.500.000,00
2	Nómina personal operativo del 08 al 21 de noviembre de 2020	AMG, Diseños Construcciones y Gerencia de Proyectos	CUENTA DE COBRO 004	21/11/20	\$ 34.000.000,00
2	Nómina personal operativo del 28 de noviembre al 05 de diciembre de 2020	AMG, Diseños Construcciones y Gerencia de Proyectos	CUENTA DE COBRO 006	03/12/20	\$ 29.900.000,00
TOTAL ITEM 2					\$ 90.400.000,00
VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION					\$ 90.400.000,00


 REPRESENTANTE LEGAL


 INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

Bogotá D.C., 10 de Diciembre de 2020

Señores

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO No. 13532

Como responsable designado/contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación No. 02 a nombre de JCB CONSULTORIA SAS por valor de \$ 8.215.200,99.

Así mismo certifico que estos pagos corresponden a los rubros previstos en el plan de utilización/inversión del anticipo.

Atentamente



NATALIA AMADOR BAQUIRO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 2

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.


FECHA : 26/11/2020


P.A. ANTICIPO CONSORCIO JCB-02-785

PAGADO A : JCB CONSULTORIA SAS

N.I.T : 901269311-1

ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	N.I.T : 901269311-1		
			NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	Compra de materiales de construcción	Jackson Whainner Angulo Cuero	4FV-3	09/11/20	\$ 3.215.200,99
1	Compra de materiales de construcción	Jackson Whainner Angulo Cuero	4FV-5	09/12/20	\$ 5.000.000,00
TOTAL ITEM 1					\$ 8.215.200,99
VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION					\$ 8.215.200,99


 REPRESENTANTE LEGAL


 INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los ítems\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

ANEXO 9. ACTA PARCIAL DE OBRA No 2.

<div></div> <div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL</div> <div>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</div>					OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA"					ACTA PARCIAL No. 2			
					AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ CONTRATO No. : 20000785 H4 2020 PLAZO INICIAL: 2 meses y 14 días PLAZO FINAL: VALOR DEL CONTRATO: \$ 558.849.637 FECHA DE INICIACION: 07 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 21 DE DICIEMBRE 2020					CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785 INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S SUPERVISOR: ARQUITECTA ANGELA CONSTANZA INTERV CASTELLANOS FORERO			
ITEMS	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA 1)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 2)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL	
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
1. ROGERIA													
1.1	ROGERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	557,601.13	85.16	47,483,220.85	175,000.00	14,902,343.75	223,073.00	18,996,060.16	398,073.00	33,898,403.91	71.39%	
2. ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	65.00	38,010.94	2,470,710.94	26.00	988,284.38	-	-	26.00	988,284.38	40.00%	
2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2,800.70	15,351.56	42,995,121.09	2,734.00	41,971,171.88	-	-	2,734.00	41,971,171.88	97.62%	
3. CERRAMIENTOS													
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	3,721.63	25,646.88	95,448,179.41	3,264.00	83,711,400.00	334.00	8,566,056.25	3,598.00	92,277,456.25	96.68%	
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS EN MADERA IMPERMEABILIZADA PARA VOR.	ML	1,071	18,972.66	20,315,161.41	-	-	702.00	13,318,804.69	702.00	13,318,804.69	65.56%	
4. SEÑALIZACION Y DEMARCAACION													
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	1,000.00	5,036.72	5,036,718.75	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	1,842.00	33,848.44	62,348,821.88	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5. PAVIMIENTOS													
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	0.00	189,845.31	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0.00	567,565.63	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EZ STREET O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO.	M3	1.00	4,247,060.16	4,247,060.16	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.4	ACERO FIGURADO (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	0.00	3,884.38	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	0.00	842,157.03	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	0.00	531,017.19	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	500.00	2,627.34	1,313,671.88	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	ML	300.00	3,230.47	969,140.63	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
6. MAMPOSTERIA													
6.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1.50	24,375.78	36,563.67	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
6.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	120.79	27,418.75	3,311,910.81	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
6.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	47.15	14,142.19	666,804.14	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
6.4	ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	16,345.31	1,634,531.25	-	-	11.20	183,067.50	11.20	183,067.50	11.20%	
6.5	ESTUCO Y PINTURA	ML	100.00	9,392.97	939,296.88	-	-	72.84	684,183.84	72.84	684,183.84	72.84%	
6.6	PINTURA	M2	2469.5061	10,539.84	26,028,208.43	-	-	1,015.45	10,702,684.34	1,015.45	10,702,684.34	41.12%	
6.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	35.00	52,519.53	1,838,183.59	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
6.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	10.00	32,812.50	328,125.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	
6.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	500.00	3,421.09	1,710,546.88	-	-	-	-	0.00	-	0.00%	



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO
GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA"

AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ

CONTRATO No. : 20000785 H4 2020

PLAZO INICIAL: 2 meses y 14 días

PLAZO FINAL:

VALOR DEL CONTRATO: \$ 558.849.637

FECHA DE INICIACION: 07 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 21 DE DICIEMBRE 2020

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB-02-785


INTERVENTOR: INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES ARG S.A.S


SUPERVISOR: ARQUITECTA ANGELA CONSTANZA
INTERV CASTELLANOS FORERO

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA 1)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 2)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
7. PISOS												
7.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	0.00	19,649.22	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
7.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	70.00	70,150.00	4,910,500.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
7.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	0.00	132,075.78	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
8. CUBIERTA Y CIELO RASO												
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	0.00	42,789.84	-	-	-	-	-	0.00	-	
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	50.00	85,141.41	4,257,070.31	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
9. CARPINTERIA METÁLICA												
9.10	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	0.00	191,742.19	-	-	-	-	-	0.00	-	
9.20	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	20.48	6,799.22	139,248.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
9.30	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	55.95	10,571.88	591,496.41	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
10. CARPINTERIA MADERA												
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	0.00	288,895.31	-	-	-	-	-	0.00	-	
9.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	18.59	8,891.41	165,291.24	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
9.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	5.36	21,139.84	113,225.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
11. CRISTALERIA												
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	6.00	254,257.03	1,525,542.19	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	6.00	31,432.03	188,592.19	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
12. LIMPIEZA PROFUNDA												
12.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	658.00	4,905.47	3,227,798.44	-	-	427.00	2,094,635.16	427.00	2,094,635.16	82.12%
12.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	250.00	6,670.31	1,667,578.13	-	-	-	-	0.00	-	64.89%
12.3	LIMPIEZA DE CAÑALES Y BAJANTES	M	250.00	3,920.31	980,078.13	-	-	-	-	0.00	-	0.00%
12.4	MANTENIMIEMTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16.00	563,906.25	9,022,500.00	-	-	16.00	9,022,500.00	16.00	9,022,500.00	100.00%
12.5	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	250.00	25,000.00	6,250,000.00	-	-	250.00	6,250,000.00	250.00	6,250,000.00	100.00%
COSTO DIRECTO					352,160,898.00		141,573,200		69,817,992		211,391,192	
ADMINISTRACIÓN				21%	73,953,789.00		29,730,372		14,661,778		44,392,150	
IMPREVISTOS				2.0%	7,043,218.00		2,831,464		1,396,360		4,227,824	
UTILIDAD				5.0%	17,608,045.00		7,078,660		3,490,900		10,569,560	
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	3,345,529.00		1,344,945		663,271		2,008,216	
COSTO TOTAL OBRAS					454,111,479.00		182,558,641		90,030,301		272,588,942	
BOLSA DE MONTO AGOTABLE											-	
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS Y SANITARIO.		GB	1	\$	104,738,158	104,738,158.00	-		-		-	
COSTO TOTAL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ					558,849,637.00		182,558,641.00		90,030,301.00		272,588,942.00	48.78%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO					20%	111,769,927.00		111,769,927.00		-		111,769,927.00
VALOR NETO ACTA PARCIAL							70,788,714.00		90,030,301.00		160,819,015.00	

Valor del acta en letras:

NOVENTA MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE


JEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CONSORCIO JCB-02-785
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


NATALIA AMADOR BAQUIRO
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
INVENTORIA
