

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2021

Nº 1

Señor (a):
Luz Nelly Ortiz Moya
Subdirectora Administrativa
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión al Contrato N° 797 de 2021 - Grupo 1 (Cto. de obra 794 de 2021)

Periodo del Informe: Del 18 al 31 de agosto de 2021
Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: INPLAYCO S.A.S.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN

LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 -2021

Fecha de Inicio: 18 de agosto de 2021
Fecha de terminación: 2 de febrero de 2022
Plazo de Ejecución: Cinco (5) meses y quince (15) días
Nombre de Supervisora: CAMILA CORTÉS DAZA

Cargo Supervisora: Subdirectora de Barrios
Dependencia: Subsecretaría de Coordinación Operativa

Valor inicial del contrato	\$
Adición 1	615.594.670,00
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	\$ 615.594.670,00

Prórrogas	Días
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	Días
Suspensión 1	
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI. ☒ NO. ☐

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

El contratista de interventoría ha ejecutado sus obligaciones adecuadamente de acuerdo con los informe semanales No. 1 y 2 presentado a la Entidad vía correo electrónico comprendidos para el periodo del 18 al 29 de agosto de 2021, correspondiente al avance en la fase correspondiente a la etapa de pre construcción para el desarrollo del proyecto.

Para este periodo correspondiente a la etapa de pre construcción, la cual culminará el día 2 de septiembre del presente, el contratista de obra realizó el día 25 de agosto de 2021 las reuniones de socialización de inicio para los 119 beneficiarios del Territorio Habitarte en la localidad de Ciudad Bolívar, a las cuales asistieron un total de 91 beneficiarios. Cabe mencionar que para el presente periodo no se tiene previsto dar inicio a la fase de validación y aperturas de obras, estas empezaran a ejecutarse a partir del 3 de septiembre de 2021.

Durante este periodo los contratistas tanto de obra como el de interventoría, se encuentran organizando la logística y organización de la documentación para dar inicio a las validaciones de obra durante el mes de septiembre en el Territorio Habitarte.

Durante este periodo, el contratista de interventoría radico ante la Entidad bajo radicado 1-2021-33992 las hojas de vida del personal de interventoría, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Entidad, el radicado 1-2021-34297 los documentos para aprobación para el plan de seguimiento al plan de acompañamiento social de obra, los cuales fueron revisados por el área social del equipo de mejoramiento de vivienda de la Entidad y el día 26 de agosto del presente año se realizó una reunión en las instalaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat con el fin de brindar orientaciones y dar claridades respecto a la elaboración de dichos planes tanto por parte del contratista de obra como el contratista de interventoría.

Seguimiento al Capítulo de Protocolos de Bioseguridad

La interventoría hace entrega mediante radicado 1-2021-33991 del 19 de agosto de 2021, la primera versión de los protocolos de Bioseguridad. La Secretaría se encuentra en la validación de los documentos remitidos, a fin de generar una estrategia de trabajo que permita la evidencia real del cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad por parte del Contratista ORIP SAFRICON 2020 (CTO794 DE 2021) con aprobación y validación por parte de la Interventoría INPLAYCO (CTO 797 de 2021).

Una vez validado, el primer alcance del Manual de Protocolos de Bioseguridad remitido por la interventoría. La Secretaría, solicitará comité de seguimiento iniciando septiembre, con el fin darle alcance a la información remitida y con propósito de mejorar y generar una propuesta que sustente el capítulo de Protocolos de Bioseguridad del punto PAC, de los frentes de trabajo, personal y profesionales de obra.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se ha realizado el seguimiento al contrato de acuerdo a las actividades desarrolladas por el contratista de interventoría que dan cumplimiento al objeto y obligaciones contratadas. Se han realizado las respectivas revisiones de la documentación enviada por parte de esta, de igual manera se han realizado visitas de campo en compañía del contratista de obra e interventoría con el fin de conocer los Territorios a intervenir y se realizó el acompañamiento por parte del equipo de mejoramiento de vivienda a las reuniones de socialización de inicio del Territorio Habitarte en la localidad de Ciudad Bolívar realizadas el día 25 de agosto de 2021.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

A la fecha no se han presentado novedades relacionadas con la ejecución del contrato.

6. Recomendaciones y/o Observaciones

A la fecha no se han presentado novedades relacionadas con la ejecución del contrato.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Durante el presente periodo el contratista de interventoría se encuentra en la Etapa de Preconstrucción del proyecto, a lo cual se encuentra en la consecución del personal profesional de interventoría, por consiguiente no se generan pagos ni afiliaciones de personal.

9. Requerimientos (cuando aplique)

A la fecha no se han presentado requerimientos relacionadas con la ejecución del contrato.

10. Garantías

Numero de póliza: 15-44-101247513 - Anexo 0
Entidad emisora: Seguros del Estado
Vigencia desde: 02-08-2021 hasta 24-03-2027

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

La SDHT pagará al INTERVENTOR de la siguiente manera:

El valor del contrato se pagará por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat mediante pagos parciales por avance de obra y previo recibo a satisfacción de los servicios prestados.

• Se pagará de manera proporcional a la facturación de cada contratista de obra relacionado con las actas parciales hasta llegar al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignada por la SDHT. (Solo se tendrá en cuenta las obras terminadas canceladas a cada grupo de obra).

• Un pago final correspondiente al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, entrega a satisfacción del contrato de obra como de la interventoría. El último pago queda supeditado a la entrega del 100% de los expedientes de cada vivienda conforme a la obligación 4.3.30 indicada en el anexo técnico y a la firma de las actas de recibo y liquidación finales del contrato.

11.2 Pagos Realizados

A la fecha no se han efectuado pagos en el presente contrato de interventoría.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

El contratista de interventoría realizó la respectiva revisión y aprobación de la documentación para realizar el desembolso del Anticipo al contratista de obra, el cual fue desembolsado a este último en el mes de agosto de 2021 por un valor de \$1.539.122.994 M/Cte.

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

No Aplica

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

Durante este periodo los contratistas tanto de obra como el de interventoría, se encuentran organizando la logística y organización de la documentación para dar inicio a las validaciones de obra durante el mes de septiembre en el Territorio Habitarte.

Cabe mencionar que para el presente periodo no se tiene previsto dar inicio a la fase de validación y aperturas de obras, estas empezaran a ejecutarse a partir del 3 de septiembre de 2021.

12.2 Novedades de Carácter Técnico


A la fecha no se han presentado novedades relacionadas con la ejecución del contrato.

13. Anexos

Los soportes y evidencias de este informe se anexan en medio físico y magnético.

- Informe semanal de interventoría No. 1 (18 al 22 de agosto de 2021) (En medio magnético).
- Informe semanal de interventoría No. 2 (23 al 29 de agosto de 2021) (En medio magnético).
- Acta de reunión componente social de fecha 26 de agosto de 2021 (En físico)
- Acta recorrido de conocimiento Territorios Jerusalén y habitarte (En físico)
- Acta reuniones de socialización de inicio del Territorio Habitarte en la localidad de Ciudad Bolívar realizadas el día 25 de agosto de 2021. (En físico)
- Radicado 1-2021-33991 del 19/08/2021 "Entrega de protocolos de Biseguridad Interventoria"

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILA CORTÉS PAZA
Cargo	SUBDIRECTORA DE BARRIOS
Dependencia	SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA

Elaboró componente técnico: Edwin Ulloa Caivo - Contratista SB
Elaboró componente social: Viviana Beltrán - Contratista SB
Elaboró componente SISO y Bioseguridad: Lina Sazipa - Contratista SB
Revisó: Stella Acevedo Beltrán - Contratista SB
Aprobó:



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 18	(Mes): 08	(Año): 2021	9:30	11:30

CONVOCADO POR: SDHT Equipo ejecución de Obras Programa M.V.

DIRECCIÓN: Territorio Jerusalén - Habitante. Localidad Ciudad Bolívar

OBJETIVO: (Identificar si la reunión es de análisis territorial y/o de coordinación y/o de seguimiento y/o acuerdo comunitario y/o reuniones comunitarias, los casos que aplique, se debe informar a la etapa que corresponde (Planación, Estudios y Diseños, Ejecución, Seguimiento y Mantenimiento territorial, o tipo de intervención).

Realiza recorrido de reconocimiento territorial con el contratista de obra y la interventoría del CTO.

TEMAS A TRATAR:

Recorrido territorial Barrio Jerusalén - Habitante.

Reunión con el líder Barrio Compartir Manuel Montañez dando respuesta al radicado 1-2021-33593

DESARROLLO: (Cuando la reunión es de un Acuerdo Comunitario, se debe realizar una descripción del acuerdo inicial. Si es un acta de concertación de la intervención, se debe realizar: 1. Descripción técnica para la concertación, 2. Describir y anexar el registro de la intervención).

Se realiza recorrido territorial con los profesionales de los equipos del contratista de Obra y la interventoría del Contrato 199 de 2021. El recorrido se realiza con el fin de identificar en terreno el lugar donde se localiza cada intervención a realizar.

Dando Respuesta a la solicitud Remitida por el Señor Manuel Montañez vía correo electrónico, se realiza una reunión donde se socializa el plano de ubicación de las viviendas y se hace la presentación del equipo de la interventoría, el contratista de Obra y la Secretaría de Habitat del nuevo Contrato que se desarrollará en este sector.

El señor Manuel Montañez líder del Barrio Compartir, expresa su disposición e interés para lo que se requiera durante la



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

ejecución de las obras en el Barrio.

Por otra parte, expresa que existe una incumplimiento respecto a las obras adelantadas por el anterior contratista. Avanza pues se presentaron muchas quejas de los beneficiarios, y se incumplió con temas de pago de exoneración de reunión y oficinas.

A lo anterior el equipo de la SDHT expone que se debe seguir en el conducto formal para atender las quejas puntuales que se hayan podido presentar, aclarando que se encuentra presto a la respuesta y solución de dichas situaciones.

Se hace la crinidad que los nuevos mejoramientos de vivienda a desarrollar en este periodo, serán ejecutados por un nuevo contratista de obra denominado ORIP SAFRICOM.

Valte la pena mencionar que el manoveriente mayor que se presentó con el anterior contratista de obra, estuvo relacionado con el manejo de escombros resultantes de las obras y la disposición que se les dio a estos en vía pública, por lo que se recomienda que sea un tema prioritario a atender en este nuevo contrato.

Culminada la reunión, se logra responder y solucionar la solicitud del Señor Manuel de manera satisfactoria.



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Observaciones y/o conclusiones:

Registro fotográfico (si aplica):



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Manuel Montañez Barón	ITE J. AC. compartir	manmontane 236@hotmail.com	3102345859	
Viviana Beltrán	Prof. Social SDHT.	leidy.beltran@ habitatbogota.gov.co	3102023597	
Edwin Ulloa	SDHT-MU	edwin.ullos @habitat.gov.co	3214942267	
Nolva Benavides Naranjo	Coord Social Sapico	nolvas89@gmail.com	3005556060	
Diana Frade	coord. Social Infayo	marcelita2404@hotmail.com	3143052545	
Jorge Benavides	Director / Sub	jorgebenavides@habitat.gov.co	3102715202	

Anexo: (Listar y realizar una descripción de los anexos. Si se realiza registro audiovisual de la actividad, debe contener el nombre del evento, una descripción y la fecha del registro).

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día): 26	(Mes): 08	(Año): 2021	10:00	12:00

CONVOCADO POR:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRAS - COMPONENTE SOCIAL

DIRECCIÓN: Secretaria Distrital de Hábitat Cl. 52 #13-64

OBJETIVO:

Brindar orientaciones y claridades respecto a la elaboración del Plan de Acompañamiento Social a los profesionales sociales Coordinadores del componente de los equipos de interventoría bajo contratos 797 y 798 de 2021 y contratistas de obra bajo contrato 794 y 795 de 2021.

TEMAS A TRATAR:

Apertura de la reunión
Presentación de las principales observaciones a los documentos remitidos.
Desarrollo de la reunión
Varios

DESARROLLO:

Se realiza la apertura del espacio, dando la bienvenida a los equipos de interventoría y contratistas de obra del contrato 797 y 798 de y 794 y 795 de 2021.

Posteriormente se realiza una retroalimentación de los documentos remitidos por algunos de los equipos; se señala que si bien los documentos se encuentra bien estructurados, y cuentan con un marco referencial robusto, y con un amplio contexto respecto a los principales componentes y fases de ejecución del programa claramente definidas y diferenciadas. Se hace necesario precisar de manera clara y detallada el planteamiento de estrategias de gestión y abordaje social, así como rutas de acción preventivas a posibles escenarios y riesgos que se puedan presentar en la ejecución de las obras.

Por lo que se procede a plantear posibles escenarios que puedan presentarse durante las diferentes etapas del programa, con el ánimo de identificar estrategias para cada caso, a partir de la experiencia en campo de los profesionales. A continuación, se presentan los principales escenarios identificados a través de este ejercicio con el fin de generar las estrategias pertinentes para mitigarlas o resolverlas:

Fase de Validación -verificación

- ✓ Inconvenientes al contacto de la familia para informar inicio de obras y concertar fecha de visita de verificación

Fase de ejecución

- ✓ Cuidado de herramientas
- ✓ Materiales que se ingresan a la vivienda
- ✓ Cambio de personal
- ✓ Obstáculos al ingreso de la vivienda para el inicio y realización de la obra
- ✓ El beneficiario insiste en cambiar las obras definidas por los profesionales técnicos
- ✓ Atención oportuna a las PQRS, se sugiere construir un flujograma con el fin de tener claridad respecto a la ruta de acción para dar respuesta oportuna a las PQRS
- ✓ Inseguridad en el territorio y estrategias de prevención y desarrollo de la ejecución de obras.

Fase de cierre de obras

- ✓ El beneficiario se niega a firmar a satisfacción el cierre de las obras pese a que se cumplió 100%

Se recomienda además de los mencionados el contratista puede añadir y desarrollar en el plan de acompañamiento social, de los posibles escenarios que considera pertinentes a los anteriormente identificados así como el desarrollo de la estrategia social a poner en marcha en cada caso.


Encuanto al tema de historias de vida se recomienda que los videos resultantes esten debidamente subtitulados para facilitar su entendimiento y buscando que se manejen un lenguaje inclusivo y manual de Marca del Distrito. Se sugiere enfatizar las historias de vida en territorios no trabajados anteriormente, con el objetivo de evidenciar el desarrollo del programa en otros territorios.

Observaciones y/o conclusiones:

- ✓ Los documentos de acompañamiento y gestión social serán retroalimentados con las estrategias sociales planteadas para dar solución a posibles escenarios que puedan desenvolverse durante la ejecución de las obras.

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
 Subsecretaría de Coordinación Operativa
 Subdirección de Barrios

Registro fotográfico (si aplica):

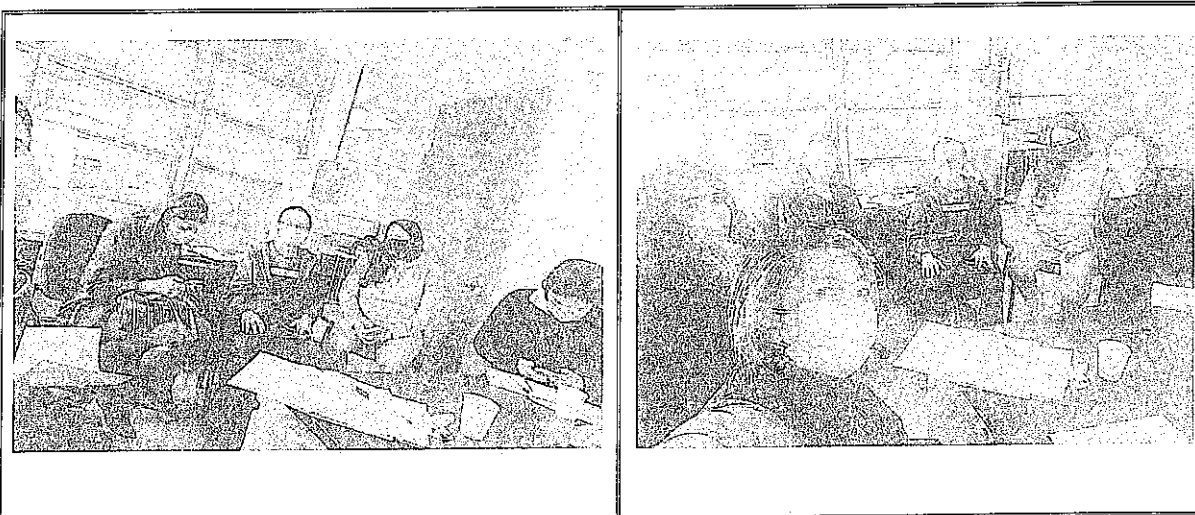

Compromisos:


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Enviar listado de control de llamadas y listado de asistencia a la reunión.	Contratista grupo II Ambientalmente	26-08-21

Firman asistentes: Se anexa listado de asistencia

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA

Anexo: N/A

ELABORÓ: Viviana Beltrán
 REVISÓ: Stella Avevedo
 ABROBÓ: Stella Avevedo



Remun. Comp. de Soc. - Contr. de Obra - Inventario.

26 d'Avr 2024

Time: 10:00 AM

[illegible]

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los réitos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 3577 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.



ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
25	Agosto	2021	8:00 am	1:00 pm

CONVOCADO POR: Contratista de Obra Cto 794 de 2021 ORIP SAFRICON 2020.
Contratista de Interventoría Cto 797 de 2021 INPLAYCO S.A.S
Secretaría Distrital del Hábitat -Mejoramiento de Vivienda

DIRECCIÓN: SALON COMUNAL JUAN PABLO II CALLE 68 B SUR # 18-40 PLAZOLETA DEL SAPO
TPM: Habitarte 2019 Juan Pablo II Compartir Acacias IV

OBJETIVO:

Informar aspectos generales para el desarrollo de la ejecución de las obras de los hogares beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda.

TEMAS A TRATAR:

Desarrollo metodológico agenda.

DESARROLLO:

Se desarrollo reunión de inicio con los Hogares beneficiados en el TPM Habitarte 2019 Juan pablo II – Urbanización Compartir y Acacias IV. los beneficiarios fueron convocados en tres horarios distintos respetando el aforo adecuado, donde se replico la siguiente agenda:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INSUMOS
1. ingreso a los beneficiarios	verificación de datos de los beneficiarios e ingreso al salón.	contratista con apoyo de interventoría	listados recurso humano
2. saludo y bienvenida	presentar a las entidades participantes y a sus integrantes. dar a conocer el objeto del contrato.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
3. desarrollo de la reunión	informar las generalidades y etapas del proyecto.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
4. inquietudes de la comunidad	dar la palabra a los beneficiarios para conocer sus inquietudes y generar respuestas a las mismas.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
5. despedida y entrega de refrigerios	agradecimientos, salida y entrega de refrigerios.	SDHT, contratista e interventoría	recurso humano.

Durante La reunión la SDHT explica de manera puntual los siguientes temas respecto al programa de Mejoramiento de vivienda modalidad habitabilidad:

1. Normativa
2. Objetivo programa de Mejoramiento de vivienda
3. Generalidades Subsidio – Modalidad de habitabilidad
4. Etapas metodológicas desarrollo mejoramiento de vivienda
5. Participantes – presentación (contratista de obra, interventoría)
6. TPM priorizado, mejoramientos a ejecutar, población a beneficiar e inversión
7. Proceso de ejecución
8. Reglamento operativo- obligaciones del Hogar
9. Recomendaciones a tener en cuenta – Valores agregado
10. Espacio de interlocución con hogares (preguntas y respuestas)

Observaciones y/o conclusiones:

Contratista de Obra Cto 794 de 2021 desarrollo convocatoria a reunión de inicio de 119 Hogares de los cuales:

14 hogares fueron notificados por correo certificado y **105 hogares** fueron convocados vía telefónica, logrando una asistencia a la reunión de inicio de **91 beneficiarios** del TPM Habitarte 2019 Juan Pablo II-Acacias IV y Urbanización compartir, distribuidos de la siguiente manera:




Fecha	Hora	Convocados	Asistentes
25 - 08 – 2021 GRUPO 1	8:00 am	40 personas	32 personas
25 - 08 – 2021 GRUPO 2	10:00 am	40 personas	29 personas
25 - 08 – 2021 GRUPO 3	12:00 pm	39 personas	30 personas

Se publica en redes sociales

"Hoy socializamos las etapas de las obras de mejoramiento de vivienda que realizaremos en el sector de Habitarte en Ciudad Bolívar. En total intervendremos 119 viviendas que beneficiarán a 338 ciudadanos, con una inversión de 1.900 millones de pesos"

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
 Subsecretaría de Coordinación Operativa
 Subdirección de Barrios

Registro fotográfico (si aplica):

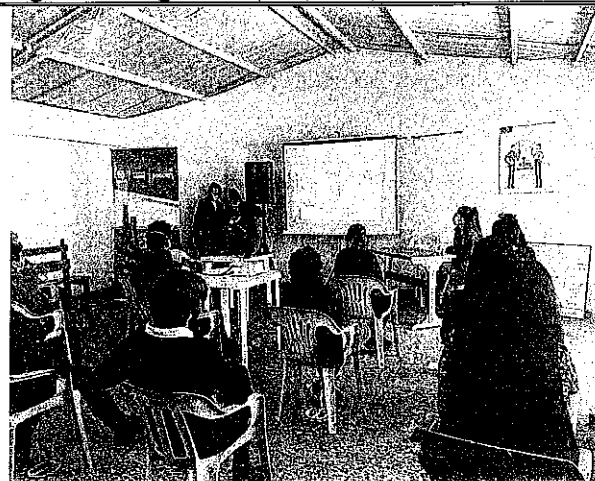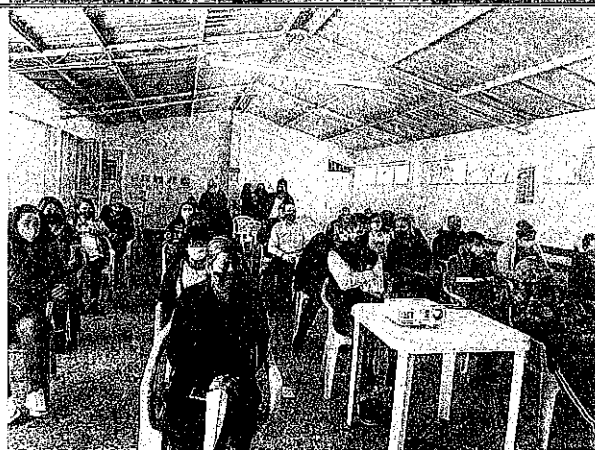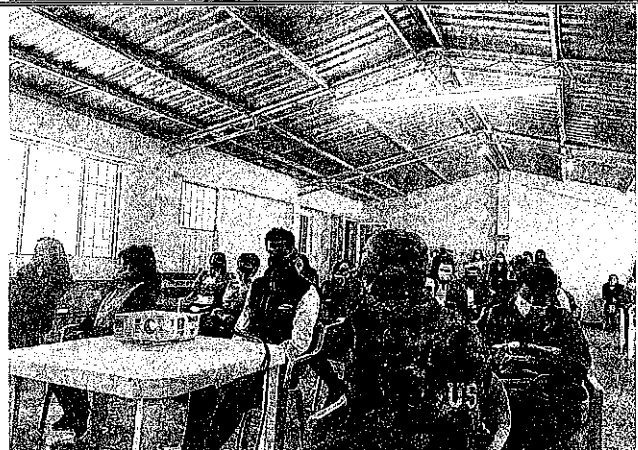



Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Desarrollo etapa de Validación	Contratista de Obra Cto 795 de 2021 Ambientalmente Ingeniería SAS. Contratista de Interventoría Cto 798 de 2021 Construmarcas SAS	De acuerdo con el cronograma Y programación.

InfraSt

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios
--	---

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Edwin Ulloa	Arquitecto Contratista	edwin.ulloa@habitatbogota.gov.co	3214956267	
Viviana Beltrán	Adm. Publica Contratista	leidy.beltran@habitatbogota.gov.co	3102023597	
Ma Isabel Serrano	T. Social Contratista	María.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	
Lina Sazipa	Arquitecta Contratista	Lina.sazipa@habitatbogota.gov.co	3102023597	

Anexo:

ELABORÓ: Viviana Beltrán
REVISÓ: Stella Acevedo
APROBÓ:



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.

1-2021-33994

FECHA: 2021-08-18 08:12 PRO 301881 FOLIO 8: 1
ANEXOS: 43
ASUNTO: Entrega de protocolo de
bioseguridad de Interventoría
DESTINO: Subsecretaría de Coordinación Operativa
TIPO: REMITE INFORMACIÓN
ORIGEN: INPLAYCO



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Bogotá D.C., Agosto 18, 2021

INP- SDHT-G1- 2021- 002
CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021


Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2


ASUNTO: ENTREGA DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORIA

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en cumplimiento de los requisitos contractuales, me permito hacer entrega de la versión inicial del protocolo de Bioseguridad para el contrato de la referencia, realizado por profesional de Seguridad Y salud en el Trabajo, debidamente licenciado por la secretaria de Salud de Bogotá.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente


GONZALO LÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

FOLIOS 43


ROBERT TORRES
CC 79378252 BOGOTA
PROFESIONAL SST
LIC 14985 SSB

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

