

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

DE: Supervisor Contrato	CONTRATO No 301-ARC-DISAN-HONAC-2021
PARA: HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	INFO:
FECHA ELABORACION: 05 de noviembre de 2021 (del 1° al 31 de octubre de 2021)	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LA DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE ENTREPISO Y OBRAS CONEXAS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO Y ARQUITECTONICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1115 (ESM 1115), DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE OBRA DESCRITAS Y ESTABLECIDAS EN EL ENEXO "A" Y EL ANEXO "B".

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

Primera Modificación:

Modificación en tiempo hasta 07 de diciembre de 2021 y cesión económica de ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. a EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE SAS

1.2 Fecha aprobación garantía única: 14-07-2021 18:27

2. VALOR DEL CONTRATO: \$311.925.793,79 (trescientos once millones novecientos veinticinco mil setecientos noventa y tres pesos con 79/100 mcte)

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato + adición: N/A

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1. Resumen Financiero – Diligencia para pagos Prestación de Servicios de Personal

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the importance of the research.

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

Valor total tramitado para pago \$ N/A correspondiente al mes de N/A año N/A
Saldo del contrato \$311.925.793,79
% Ejecución del contrato 18%

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total tramitado para pago							N/A
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato							
% Ejecución del contrato							N/A

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

Luego de la visita, el ingeniero estructural recomienda el reemplazo de la escalera y el cambio de la losa correspondiente al punto fijo del segundo nivel, entrega recomendaciones para la intervención de los muros que intervienen en la zona afectada.

Con fecha 26 de octubre el contratista recibe por parte del diseñador estructural los planos definitivos de los elementos, los cuales se encuentran anexos a este documento.

Se inicia con la revisión de mayores y menores cantidades para proceder a ajustar el cuadro contractual en una futura modificación.

Para la ejecución de las obras el diseñador estructural entrega de manera previa y en mano alzada las recomendaciones y especificaciones para la ejecución de las obras a realizar.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 de diciembre de 2021

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 39921 de fecha 26 de enero 2021 por \$ 320.000. 000.oo de pesos.
CRP No. 54521 de fecha 9 de julio de 2021 por \$311.925.793,79 de pesos.

Póliza No75-40-101041746 expedida por Seguros del Estado


AMPAROS			VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PREDIOS	LABORES	Y	10- 07 -2021	30- 09 -2021	\$181,705,200.00
OPERACIONES					
CONTRATISTAS		Y	10- 07 -2021	30- 09 -2021	\$181,705,200.00
SUBCONTRATISTAS					

Póliza No 5-44-101114285 expedida por Seguros del Estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-07-2021	30-05-2022	\$93,577,738.14
CALIDAD DEL SERVICIO	10- 07 -2021	30- 09 -2021	\$93,577,738.14
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07-07-2021	07-07-2021	\$15,596,289.69
LABORALES ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	\$124,770,317.52

Modificación No.1:

Plazo de ejecución hasta 07 de diciembre de 2021 y sesión económica del contrato de ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. a EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE SAS

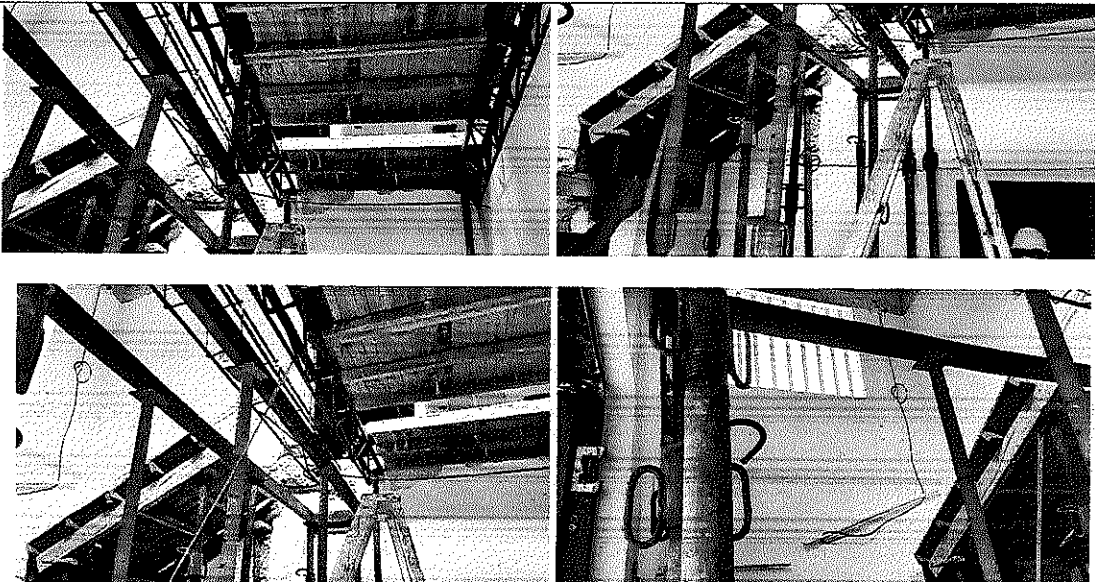

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Se continua el trabajo de ajuste de cantidades para proceder con la modificación contractual correspondiente al anexo técnico de cantidades de obras y especificaciones contractuales.

Se reciben los planos correspondientes a las áreas a intervenir para reparar la estructura intervenida.

Atentamente,


 Supervisor Contrato PD01. Marisabel Méndez Sánchez.
 marisabel.mendez@armada.mil.co

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

2. It is well known that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$$

3. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$


4. It is well known that the function $g(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$$


5. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $h(x)$ defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$


6. It is well known that the function $h(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

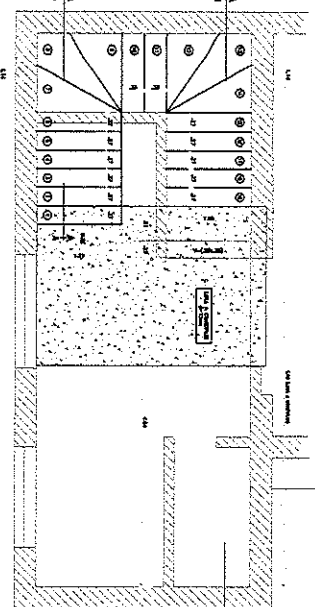


DETALLE VISTA EN PLANTA ESCALERAS.

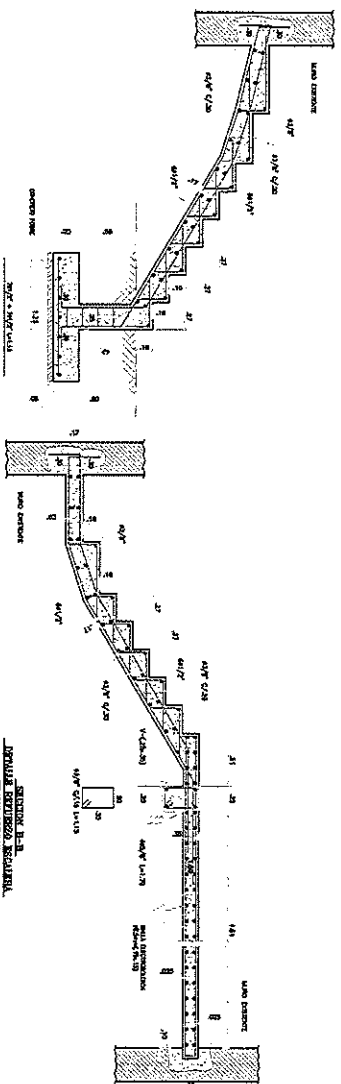


DETALLE VISTA EN PLANTA ESCALERAS.

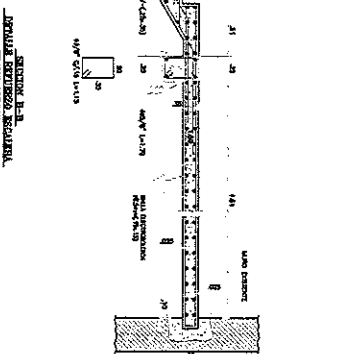


DETALLE VISTA EN PLANTA ESCALERAS.

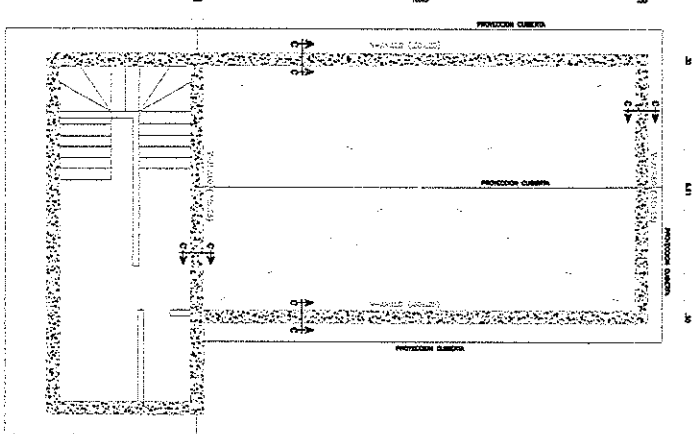

PLANTA ESTRUCTURAL ANILLO CUBIERTA DE DOS AGUAS.

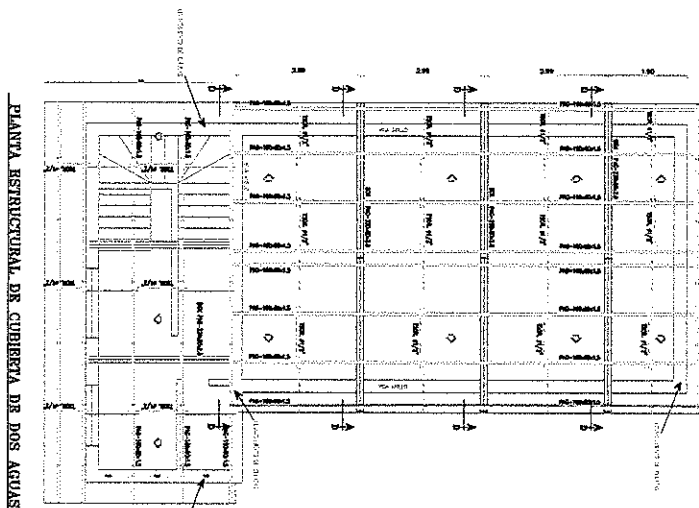

PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA DE DOS AGUAS.

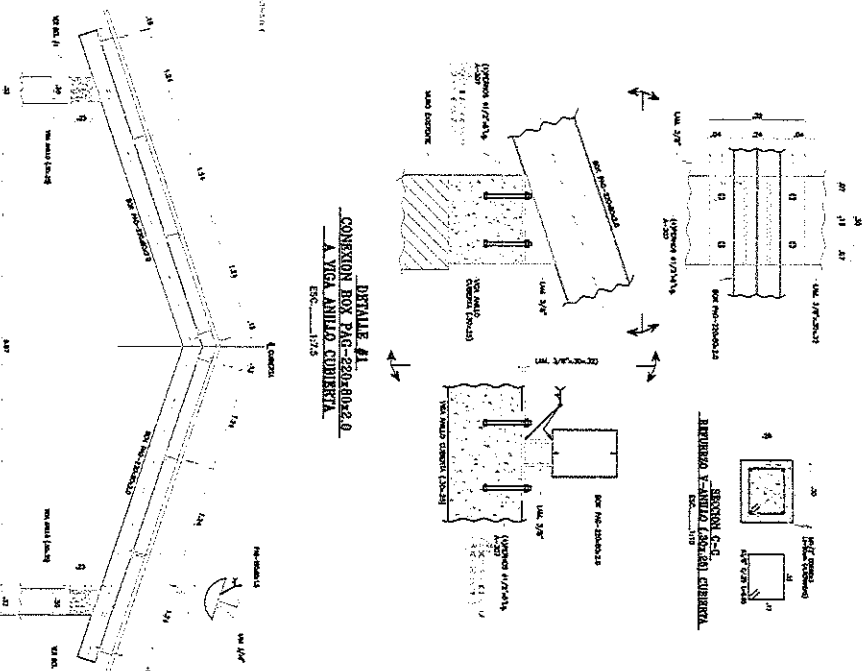

DETALLE A1. CORREION BOX PAG-220-80x2.0 A VIGA ANILLO CUBIERTA.

DETALLE A2. CORREION BOX PAG-220-80x2.0 A VIGA ANILLO CUBIERTA.

NOTAS Y CONSIDERACIONES

1. ESTRUCTURA TIPO: CONCRETO ARMADO.
2. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
3. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
4. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
5. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
6. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
7. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
8. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
9. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
10. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.

1. ESTRUCTURA TIPO: CONCRETO ARMADO.
2. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
3. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
4. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
5. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
6. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
7. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
8. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
9. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.
10. CUBIERTA TIPO: CUBIERTA DE DOS AGUAS.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO ARMADO	1.00	m ³	1.00	1.00
2	ACERO	1.00	kg	1.00	1.00
3	LABOR	1.00	h	1.00	1.00
4	TRANSPORTE	1.00	m ³	1.00	1.00
5	INSTALACION	1.00	m ³	1.00	1.00
6	MANTENIMIENTO	1.00	m ³	1.00	1.00
7	REPARACION	1.00	m ³	1.00	1.00
8	RECONSTRUCCION	1.00	m ³	1.00	1.00
9	RENOVACION	1.00	m ³	1.00	1.00
10	REPLANTACION	1.00	m ³	1.00	1.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO ARMADO	1.00	m ³	1.00	1.00
2	ACERO	1.00	kg	1.00	1.00
3	LABOR	1.00	h	1.00	1.00
4	TRANSPORTE	1.00	m ³	1.00	1.00
5	INSTALACION	1.00	m ³	1.00	1.00
6	MANTENIMIENTO	1.00	m ³	1.00	1.00
7	REPARACION	1.00	m ³	1.00	1.00
8	RECONSTRUCCION	1.00	m ³	1.00	1.00
9	RENOVACION	1.00	m ³	1.00	1.00
10	REPLANTACION	1.00	m ³	1.00	1.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO ARMADO	1.00	m ³	1.00	1.00
2	ACERO	1.00	kg	1.00	1.00
3	LABOR	1.00	h	1.00	1.00
4	TRANSPORTE	1.00	m ³	1.00	1.00
5	INSTALACION	1.00	m ³	1.00	1.00
6	MANTENIMIENTO	1.00	m ³	1.00	1.00
7	REPARACION	1.00	m ³	1.00	1.00
8	RECONSTRUCCION	1.00	m ³	1.00	1.00
9	RENOVACION	1.00	m ³	1.00	1.00
10	REPLANTACION	1.00	m ³	1.00	1.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO ARMADO	1.00	m ³	1.00	1.00
2	ACERO	1.00	kg	1.00	1.00
3	LABOR	1.00	h	1.00	1.00
4	TRANSPORTE	1.00	m ³	1.00	1.00
5	INSTALACION	1.00	m ³	1.00	1.00
6	MANTENIMIENTO	1.00	m ³	1.00	1.00
7	REPARACION	1.00	m ³	1.00	1.00
8	RECONSTRUCCION	1.00	m ³	1.00	1.00
9	RENOVACION	1.00	m ³	1.00	1.00
10	REPLANTACION	1.00	m ³	1.00	1.00

6/1/11

1

2
