

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE), CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA
(FNCE), CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS
ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE), CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	11
Participación en reuniones.....	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización.....	13
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	13
ASPECTOS FINANCIEROS	17
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	17
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	17
Accidentes laborales.....	17
Planillas de seguridad social.....	17



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	"CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE."
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:





Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.



LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE), CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”


Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$1.926.064.556

Localización del proyecto:

En el municipio de Arauca, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 104 familias de las veredas que se relacionan a continuación:

PROYECTO- VEREDA	NO SISFV
CARACOL	71
CINARUCO	9
MAPORILLAL	24
TOTAL SISFV ARAUCA	104

Total beneficiarios Municipio de Arauca

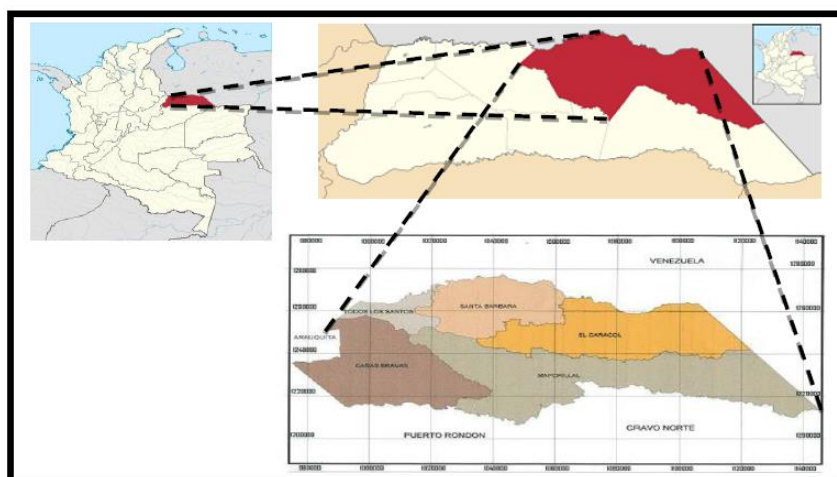



EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de Arauca, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización propuesta para el 29 de junio de 2022, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Completado	% Esperado en FECHA DE ESTADO respecto Línea Base
Proyecto SISFV Arauca 104	90 días	mié. 29/06/22	mar. 8/11/22	0%	1%
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22	0%	2%
Replanteo	19 días	mié. 29/06/22	mié. 27/07/22	0%	8%
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22	0%	100%
Validación de viviendas por vereda	6 días	lun. 11/07/22	lun. 18/07/22	0%	0%
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	6 días	lun. 11/07/22	lun. 18/07/22	0%	0%
E: Informe de Replanteo	0 días	mar. 19/07/22	mar. 19/07/22	0%	0%
H: aprobación de replanteo de parte del cliente	0 días	mié. 27/07/22	mié. 27/07/22	0%	0%
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22	0%	0%
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22	0%	0%
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22	0%	0%
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22	0%	0%
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22	0%	0%
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22	0%	0%
Distribución y Cimentación	14 días	mié. 24/08/22	lun. 12/09/22	0%	0%
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22	0%	0%
Construcción de Dados de Cimentación	10 días	mar. 30/08/22	lun. 12/09/22	0%	0%
Instalación de kits internas	10 días	mar. 30/08/22	lun. 12/09/22	0%	0%
ETAPA 2	10 días	mar. 25/10/22	mar. 8/11/22	0%	0%



Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	mar. 25/10/22	lun. 31/10/22	0%	0%
Montaje de mástil, paneles y gabinete	10 días	mar. 25/10/22	mar. 8/11/22	0%	0%
ETAPA 3	10 días	mar. 25/10/22	mar. 8/11/22	0%	0%
Inspección y pruebas	10 días	mar. 25/10/22	mar. 8/11/22	0%	0%
Capacitación de usuarios	10 días	mar. 25/10/22	mar. 8/11/22	0%	0%

Actualización de pólizas


El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:

1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

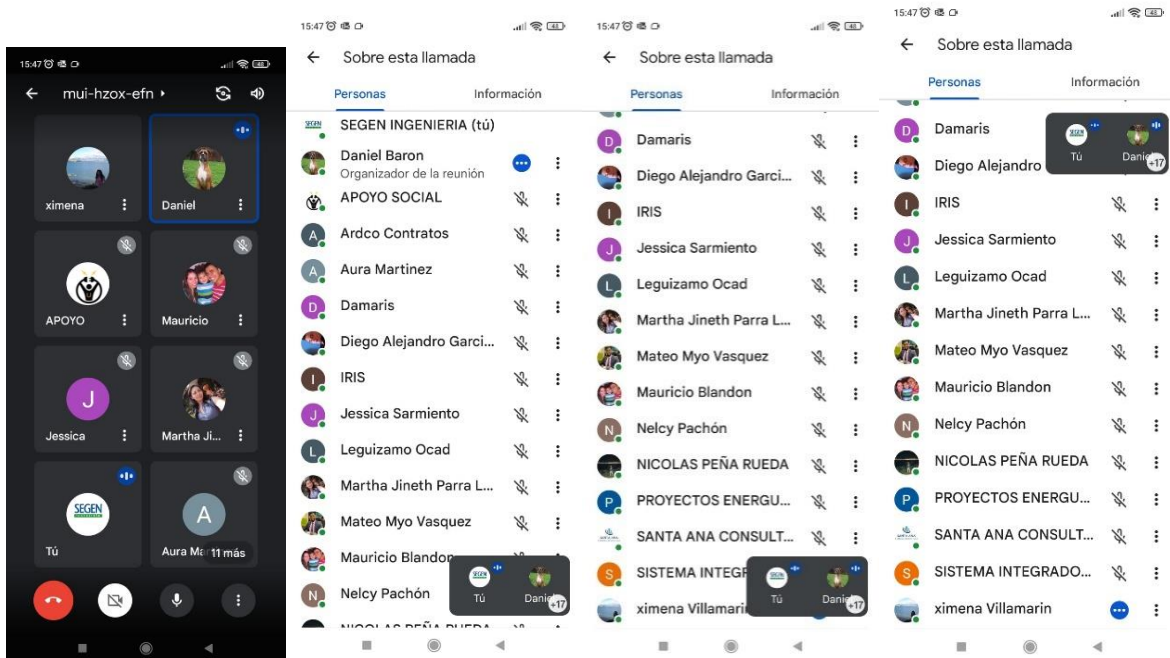

Ejecución de actividades de socialización

El 29 de junio de 2022 se llevó a cabo la socialización de los proyectos 1 y 2 de SSFVI de Arauca y Arauquita, en colegio campestre Arauca. Y se desarrolló con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.

Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización Arauca”.

Registro fotográfico de socialización

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:




ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.



- ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría el día 29 de junio de 2022 en el Municipio de Arauca, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.

- Veedores del Proyecto:



ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Arauca, Departamento del Arauca, a los veintitrés (29) días del mes de junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos: CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE), CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (No. Usuarios beneficiados 104) y CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (No. Usuarios beneficiados 28) con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas beneficiarias del proyecto, Departamento de Arauca, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos:

Continuación Acta Conformación de Veeduría Municipio de Arauca, Departamento de Arauca

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

Vendor (s)



 Consorcio recursos energéticos	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CODIGO: FR-GA-01
		VERSION: 1
		FECHA: 04/08/2021
		PÁGINA 2 DE 2

Felix Enrique Jara Curvajal Pablo Emir Moron Juan Carlos Galvez F. CARLOS E. TOVAR Jose Fernando Castellanos Wilmer Alfonso Nieves Rincon Manuel Eliecer Rincon Esguerra Diego Alberto Farfan Milton Rangel JOSE CASTELLANOS P. ALBA MARCELA CAMAR FREDY CAMPELO Shanny Eduardo Galindo Serranoza	Felix E. JARA C. Pablo Moron Juan Carlos Galvez F. Carlos E. Tovar Jose Fernando Castellanos Wilmer Nieves Manuel Rincon Diego Farfan Milton Rangel Jose Castellanos P. Alba Marcela Camar Fredy Campele Shanny Galindo
---	---

 Consorcio recursos energéticos	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CODIGO: FR-GA-01
		VERSION: 1
		FECHA: 04/08/2021
		PÁGINA 1 DE 2

FIRMA DE ASISTENCIA.	
Nombre Completo	Firma
ETELVINA FRANCO	Etelvina Franco
CRISTIAN ESTIBA	Cristian Estiba
DANIEL FERNANDO POSTELA	Daniel Fernando Postela
Hania Cristina Fernandez (Colmense)	Hania Cristina Fernandez C.
Carly Edwarde Soto	Carly Edwarde Soto
Carolina Fernandez Colmense	Carolina Fernandez
Jose de Jesus Fernandez Colmense	Jose de Jesus Fernandez
Edwin RIVERA FLORES	Edwin Rivera
Thais RIVERA PUEYO	Thais Rivera
Esmeralda Fernandez	Esmeralda Fernandez
Raul Alexander Bravo Cardona	Raul Alexander Bravo Cardona
Jose de Jesus Fernandez	Jose Fernandez
Ana Maria Palacios	Ana Maria Palacios
Jose Antonio Silva	Jose Antonio Silva
Wendy Stoner Mendoza	Wendy Stoner
Nolga Lilianna Gomez JD	Nolga Gomez
Henry David Gomez	Henry Gomez
Manuel Raulo Gomez	Manuel Raulo Gomez
Roberto Sofia Cardenas	Roberto Sofia
Rene Mauricio Bichico	Rene Mauricio
Flora Diaz	Flora Diaz
Padre T. A. G. A.	Padre T. A. G. A.
Francisco Aguilar	Francisco Aguilar
Florencia Moreno Rojas	Florencia Moreno
Carolina Rojas Maitane	Carolina Rojas
Hermes Moreno Patino	Hermes Moreno
Jose Luis Zumbel Carda	Jose Luis Zumbel
ASTORITA S. B. R. E.	ASTORITA S. B. R. E.
Juan Pablo Gomez Quintero	Juan Pablo Gomez
Eden Danilo Silva	Eden Danilo Silva
Hernanda Ocho	Hernanda Ocho



ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – Arauca por medio de la factura No. UTIG-2 por un valor de \$32,610,663.00.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE
CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL
(SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	10
Participación en reuniones.....	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización.....	12
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	13
ASPECTOS FINANCIEROS	17
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	17
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	17
Accidentes laborales.....	17
Planillas de seguridad social.....	17



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:





Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U): Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS: Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.



LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”


Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$530.683.655.

Localización del proyecto:

En el municipio de Arauquita, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 28 familias de las veredas que se relacionan a continuación:

PROYECTO- VEREDA	NO SISFV
CAÑO COLORADO	4
EL PROGRESO	17
LA ARENOSA	2
LA CHIGUIRA	1
LEJANIAS	4
Total SISFV ARAUQUITA	28

Total beneficiarios Municipio de Arauquita

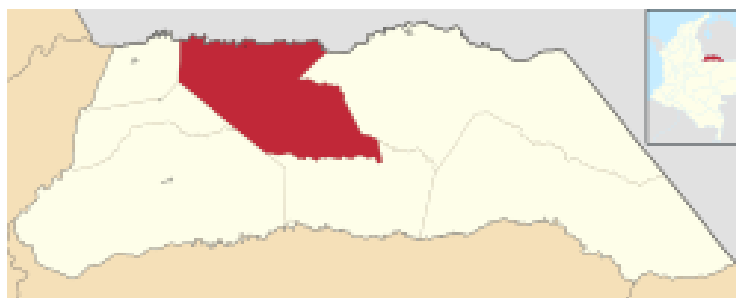



EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de Arauquita, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización propuesta para el 29 de junio de 2022, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV Arauquita 28	91 días	mié. 29/06/22	mié. 9/11/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	13 días	mié. 29/06/22	lun. 18/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
Validación de viviendas por vereda	6 días	jue. 30/06/22	vie. 8/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	6 días	jue. 30/06/22	vie. 8/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	lun. 11/07/22	lun. 11/07/22
H: aprobación de replanteo de parte del cliente	0 días	lun. 18/07/22	lun. 18/07/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	12 días	mié. 31/08/22	jue. 15/09/22
Distribución de kits internas y cimentación	2 días	mié. 31/08/22	jue. 1/09/22
Construcción de Dados de Cimentación	10 días	vie. 2/09/22	jue. 15/09/22
Instalación de kits internas	10 días	vie. 2/09/22	jue. 15/09/22
ETAPA 2	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	2 días	mié. 26/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
ETAPA 3	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
Inspección y pruebas	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
Pruebas Y Puesta en servicio	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	mié. 9/11/22	mié. 9/11/22
Capacitación de usuarios	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	10 días	mié. 26/10/22	mié. 9/11/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	mié. 9/11/22	mié. 9/11/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:




1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

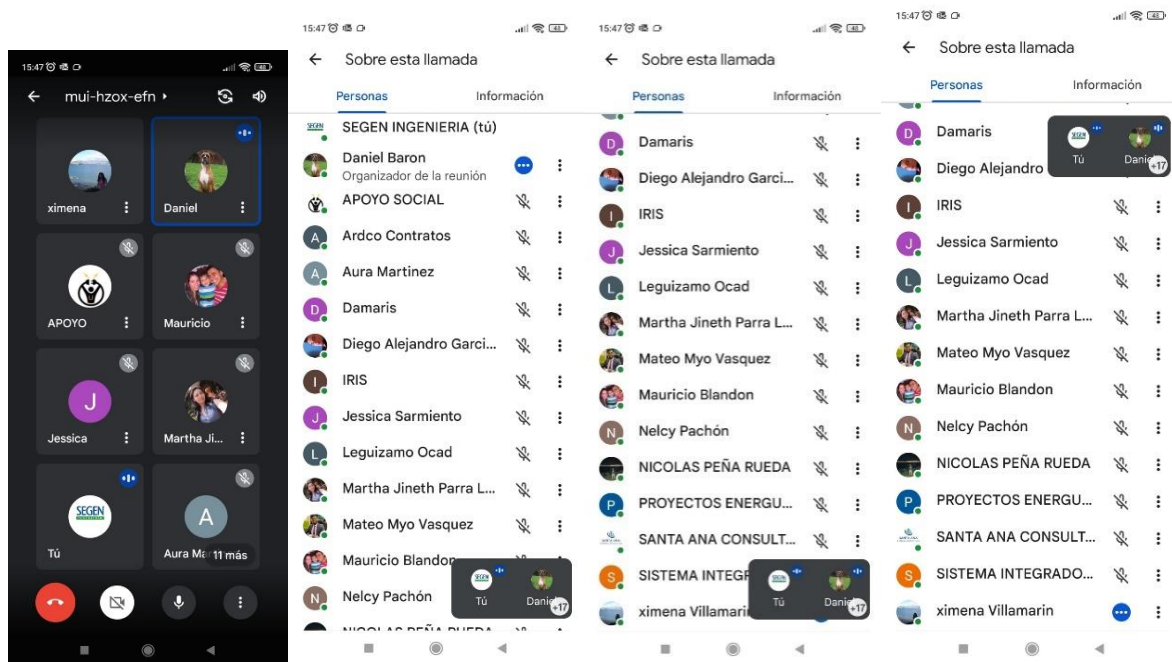



Ejecución de actividades de socialización

El 29 de junio de 2022 se llevó a cabo la socialización de los proyectos 1 y 2 de SSFVI de Arauca y Arauquita, en colegio campestre Arauca. Y se desarrolló con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.

Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización Arauca”.

Registro fotográfico de socialización

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:





ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.
 - ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría el día 29 de junio de 2022 en el Municipio de Arauca, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.
- Veedores del Proyecto:



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA	
---	--	---

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Arauca, Departamento del Arauca, a los veintitrés (29) días del mes de junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos: CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE), CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (No. Usuarios beneficiados 104) y CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA VEINTIOCHO (28) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (No. Usuarios beneficiados 28) con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas beneficiarias del proyecto, Departamento de Arauca, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos:

Continuación Acta Conformación de Veeduría Municipio de Arauca, Departamento de Arauca

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.



ENERGIA GUAVIARE		FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEUDRIA CIUDADANA	ipse
Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	Nº de contacto
Felix E. Jara C.	1.098.6709	Cinacuco	3185215399
Ana Maria Palomino	1.116.778.732	El Miedo	3504568986
Juan José Guevara Pardo	17595894	V. Bogotá	3132961500
Esmeraldo Fernandez	24243040	El Miedo	3122556522

Para constancia se firma en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2022.

Felix E. Jara C.
Veedor (a) 10986709

Veedor (a) 13584210

Daniel Ricardo Colmenarez
Veedor (a)

Veedor (a)

- Listado de asistencia

 Consorcio recursos energéticos	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CODIGO: FR-GA-01
		VERSION: 1
		FECHA: 04/08/2021
		PÁGINA 1 DE 2

FIRMA DE ASISTENCIA.	
Nombre Completo	Firma
Soliver Caba	
RUBEN BLANCO HIDALGO	
ALVARO OSTO	
HIBUEL GARREDO	
Juan Pablo Rodriguez B.	
Juan José Guevara Pinilla	
Pablo Antonio Conaj Ojeda	
Alvaro Garza - Juan Garza	
Imier Noliver Rincon Garcia	
Felix RINCON	
Ever Rincon Garcia	
Victor Rincon	
Camilo Alberto Mentola	
Clara Eliana Lopez Yander	



 Consorcio recursos energéticos	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CODIGO: FR-GA-01
		VERSION: 1
		FECHA: 04/08/2021
		PÁGINA 2 DE 2

Felix Enrique Jara Curvajal Pablo Emir Moron Jordi Celina Galanes F. PAULLO L. TOVAR Jose Fernando Castellanos Wimer Alfonso Nieves Rincon Manuel Eliecer Rincon Esgu Diego Alberto Farfan Milton Rangel JOSÉ CASTELLANOS P. Alba Patricia Camar Frida Campo Shanny Eduardo Galindo Serrano	Felix E. Jara C. Pablo Moron Jordi Celina F. Paullo L. Tovar Jose Fernando C. Wimer Nieves Manuel Rincon Diego Farfan Milton Rangel José Castellanos P. Alba Patricia Camar Frida Campo Shanny Eduardo Galindo Serrano
--	---

sol

 Consorcio recursos energéticos	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CODIGO: FR-GA-01
		VERSION: 1
		FECHA: 04/08/2021
		PÁGINA 1 DE 2

FIRMA DE ASISTENCIA.	
Nombre Completo	Firma
ETELVINA FRANCO	Etelvina Franco
CRISTIAN ESTIBA	Cristian Estiba
DANIS FERNANDO POSTELA	Danis Fernando Postela
Hania Cristina Fernandez (Colmense)	Hania Cristina Fernandez C.
Carly Edwards Soto	Carly Edwards Soto
Carolina Fernandez Colmenares	Carolina Fernandez
Jose de Jesus Fernandez Colmenares	Jose de Jesus Fernandez
Edna Rocio Fierro	Edna Rocio Fierro
Thais Rocio Puerta	Thais Rocio Puerta
Esmeralda Fernandez	Esmeralda Fernandez
Raul Alexander Bravo Cardona	Raul Alexander Bravo Cardona
Jose de Jesus Fernandez	Jose Fernandez
Ana Maria Palacios	Ana Maria Palacios
Jose Antonio Silva	Jose Antonio Silva
Wen Stoner Miranda	Wen Stoner Miranda
Nelis Liliana Gomez	Nelis Liliana Gomez
Henry David Gomez	Henry Gomez
Manuel Antonio Gomez	Manuel Antonio Gomez
Roberto Sofia Cardenas	Roberto Sofia Cardenas
Piero Mauricio Bichico	Piero Mauricio Bichico
Flora Diaz	Flora Diaz
Padre I. T. A. G.	Padre I. T. A. G.
Francisco Aguilar	Francisco Aguilar
Florencia Moreno Rojas	Florencia Moreno Rojas
Carolina Rojas Montoya	Carolina Rojas Montoya
Hermes Moreno Patino	Hermes Moreno Patino
Jose Luis Zumbado Cauda	Jose Luis Zumbado Cauda
ASTORIN S. B. R.	ASTORIN S. B. R.
Juan Pablo Gomez Quintero	Juan Pablo Gomez Quintero
Edna Daniela Cauda	Edna Daniela Cauda
Hernanda Ocho	Hernanda Ocho



ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – Arauquita por medio de la factura No. UTIG-3 por un valor de \$8,182,298.40.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA
INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUILLITA, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL
CENTRO POBLADO DE BARRANQUILLITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUILLITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	9
EJECUCIÓN DE OBRA	9
Seguimiento actividades	9
Actualización de pólizas.....	10
Participación en reuniones.....	11
Aprobación Valla informativo	11
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	12
ASPECTOS FINANCIEROS	12
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	12
Accidentes laborales.....	12
Planillas de seguridad social.....	12



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:



Localización de Arauca



Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.




LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUILLITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”

Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$2.240.538.723

Localización del proyecto:

En el municipio de Miraflores, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 112 familias de la vereda de Barranquillita.

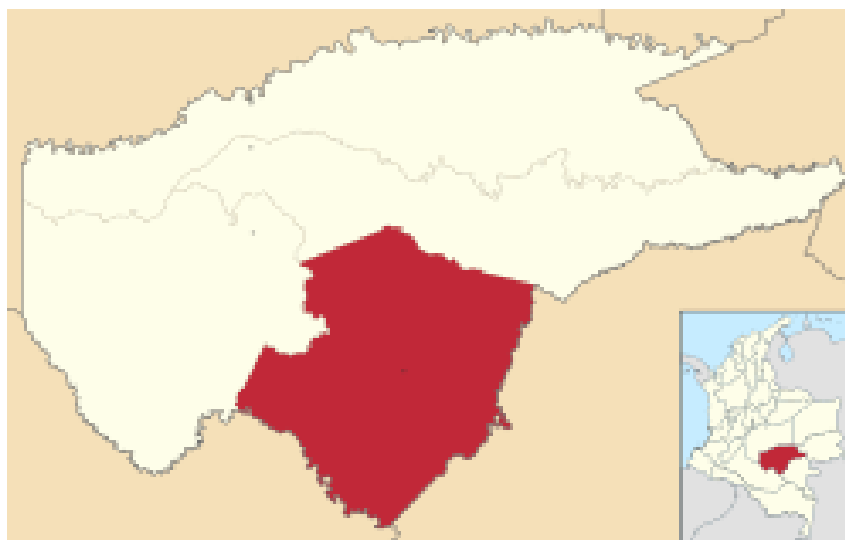

EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de Miraflores, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las



actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización propuesta para el 29 de junio de 2022, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV Barranquilla 112	101 días	mié. 29/06/22	jue. 24/11/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	25 días	mié. 29/06/22	jue. 4/08/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
validación de viviendas por vereda	8 días	vie. 15/07/22	mié. 27/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	8 días	vie. 15/07/22	mié. 27/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	jue. 28/07/22	jue. 28/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	jue. 4/08/22	jue. 4/08/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	28 días	jue. 25/08/22	lun. 3/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	jue. 25/08/22	mié. 31/08/22
Construcción de Dados de Cimentación	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
Instalación de kits internas	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
ETAPA 2	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
ETAPA 3	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
Inspección y pruebas	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
Pruebas Y Puesta en servicio	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	jue. 24/11/22	jue. 24/11/22
Capacitación de usuarios	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	23 días	vie. 21/10/22	jue. 24/11/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	jue. 24/11/22	jue. 24/11/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:


1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.



Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

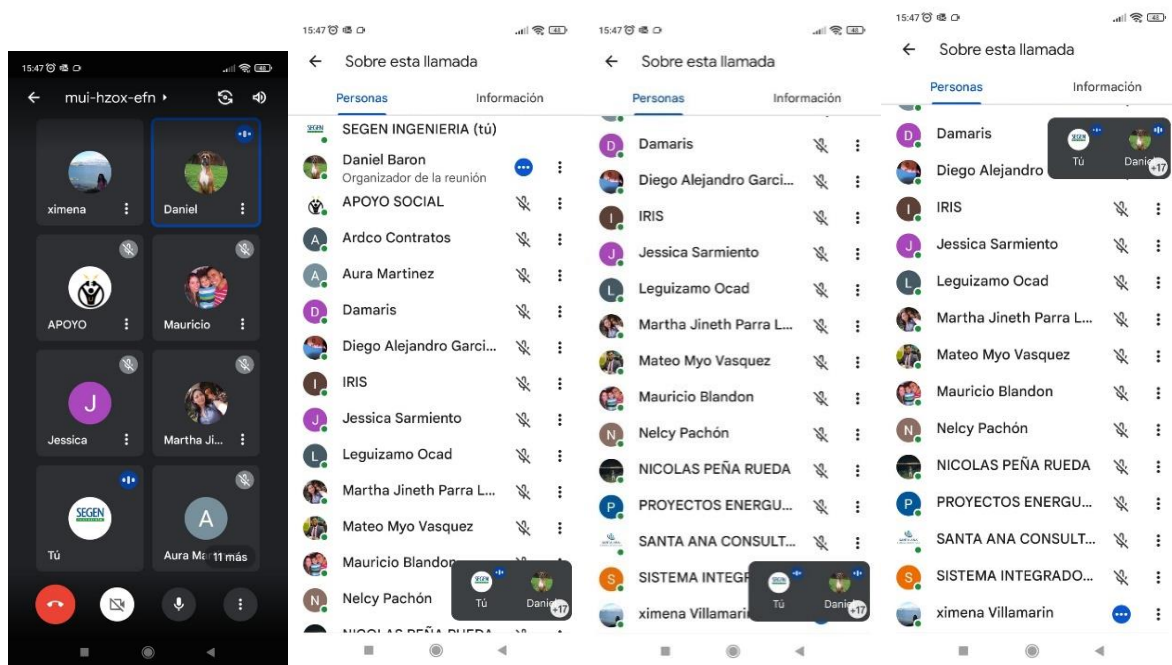

Aprobación Valla informativo



Durante el periodo de este informe se presentó por parte del Contratista el diseño de las vallas informativas con el fin de solicitar la aprobación de estos modelos para todos los proyectos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.

ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – Miraflores (Barranquillita) por medio de la factura No. UTIG-7 por un valor de \$ 30,136,509.00.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.



UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE LAGOS DEL DORADO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL
CENTRO POBLADO DE LAGOS DEL DORADO, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE LAGOS DEL DORADO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	9
EJECUCIÓN DE OBRA	9
Seguimiento actividades	9
Actualización de pólizas.....	10
Participación en reuniones.....	10
Aprobación Valla informativa	11
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	12
ASPECTOS FINANCIEROS	12
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	12
Accidentes laborales.....	13
Planillas de seguridad social.....	13



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:



Localización de Arauca



Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.




LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE LAGOS DEL DORADO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.”

Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$2.040.354.188

Localización del proyecto:

En el municipio de Miraflores, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 98 familias de la vereda de Lagos del Dorado.

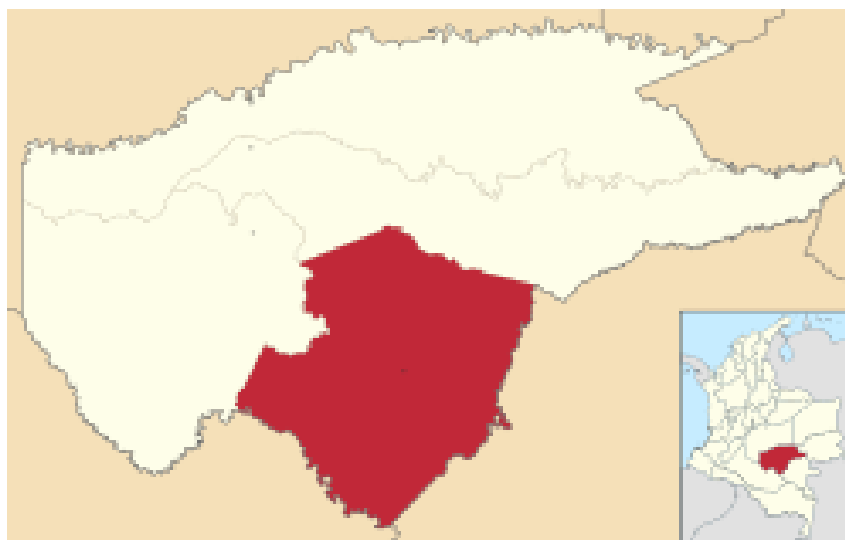

EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de Miraflores, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las



actividades propuestas para el periodo de junio, la socialización del proyecto se llevó a cabo en la primera semana del mes de junio, de acuerdo con lo señalado por parte del Contratista de obra.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV Lagos del Dorado 98	102 días	mié. 29/06/22	vie. 25/11/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	22 días	mié. 29/06/22	lun. 1/08/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
validación de viviendas por vereda	8 días	mar. 12/07/22	vie. 22/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	8 días	mar. 12/07/22	vie. 22/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	lun. 25/07/22	lun. 25/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	lun. 1/08/22	lun. 1/08/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	28 días	jue. 25/08/22	lun. 3/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	jue. 25/08/22	mié. 31/08/22
Construcción de Dados de Cimentación	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
Instalación de kits internas	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
ETAPA 2	24 días	vie. 21/10/22	vie. 25/11/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
ETAPA 3	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Inspección y pruebas	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Pruebas Y Puesta en servicio	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	vie. 25/11/22	vie. 25/11/22
Capacitación de usuarios	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	vie. 25/11/22	vie. 25/11/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:


1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones



Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

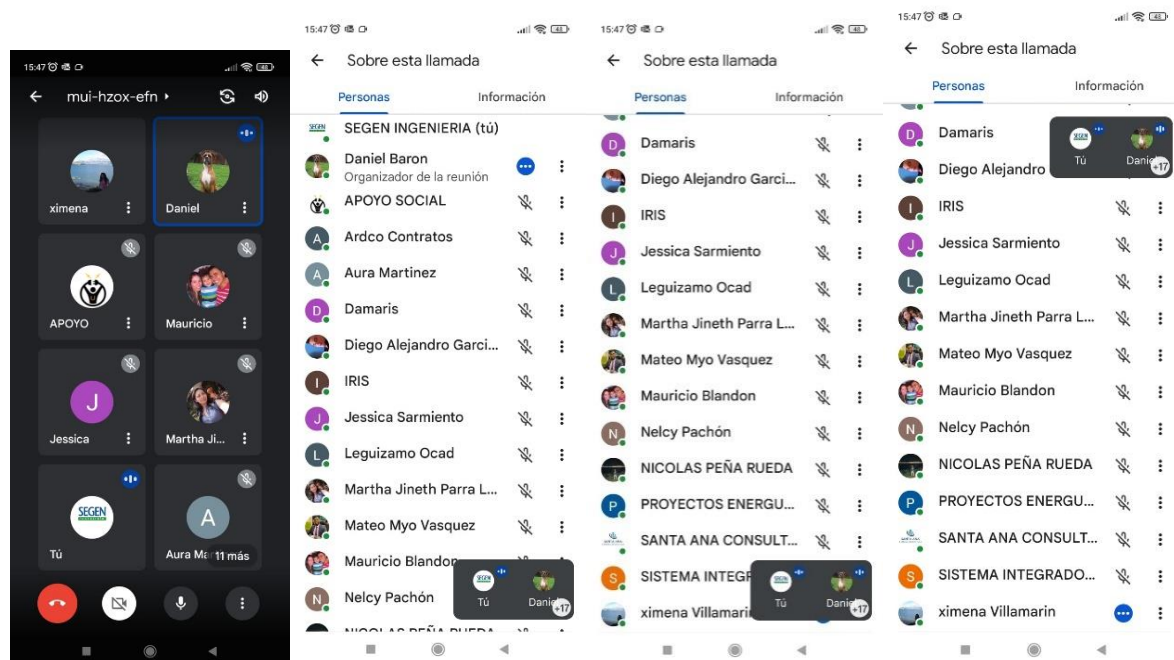

Aprobación Valla informativa

Durante el periodo de este informe se presentó por parte del Contratista de obra el diseño de la vallas informativas con el fin de solicitar la aprobacion de estos modelos para todos los proyectos.



#LaNUEVAENERGÍA

Proyecto: SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE LAGOS DEL DORADO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Contrato Interadministrativo: N° 143 de 2021

Número de beneficiarios: 98

Contratista: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P

Subcontratista: Consorcio Recursos Energéticos

Interventoría: Unión Temporal Interenergía Guaviare

**¡ENERGÍA
QUE NOS
CONECTA!**



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.

ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – Miraflores (Lagos del Dorado) por medio de la factura No. UTIG-8 por un valor de \$65,383,310.40.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras



Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA SESENTA (60) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“CONSTRUCCION PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON
SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL
(SSFVI) PARA SESENTA (60) USUARIOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “CONSTRUCCION PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA SESENTA (60) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.....	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	11
Participación en reuniones.....	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización.....	13
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	14
ASPECTOS FINANCIEROS	18
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	18
Accidentes laborales.....	18
Planillas de seguridad social.....	18



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINTO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:





Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U): Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS: Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.



LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “CONSTRUCCION PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA SESENTA (60) USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN DEPARTAMENTO DE ARAUCA”


Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$1.119.853.805

Localización del proyecto:

En el municipio de Puerto Rondón, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 60 familias de las veredas que se relacionan a continuación:

PROYECTO- VEREDA	NO SISFV
CUMARE	1
EL LETRERO	2
EL PAISAJE	2
EL PROGRESO	31
LA CEIBA	6
LA CORREA	1
LA ESMERALDA	3
LA PALMITA	1
MAPORAL	3
NORMANDIA	10
Total SISFV PUERTO RONDON	60

Total beneficiarios Municipio de Puerto Rondón

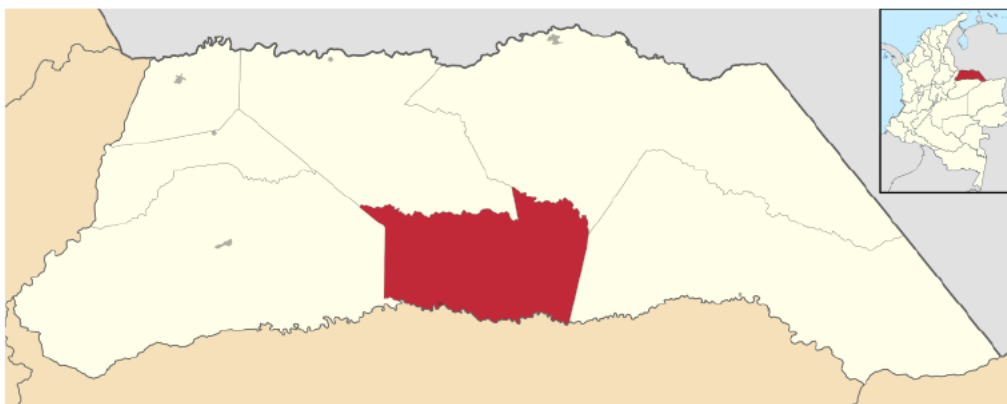

EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de Puerto Rondón, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización propuesta para el 29 de junio de 2022, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV Puerto Rondón 60	103 días	mié. 29/06/22	lun. 28/11/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	13 días	mié. 29/06/22	lun. 18/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
Validación de viviendas por vereda	6 días	jue. 30/06/22	vie. 8/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	6 días	jue. 30/06/22	vie. 8/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	lun. 11/07/22	lun. 11/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	lun. 18/07/22	lun. 18/07/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	25 días	mié. 31/08/22	mar. 4/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	mié. 31/08/22	mar. 6/09/22
Construcción de Dados de Cimentación	20 días	mié. 7/09/22	mar. 4/10/22
Instalación de kits internas	20 días	mié. 7/09/22	mar. 4/10/22
ETAPA 2	25 días	vie. 21/10/22	lun. 28/11/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22



Montaje de mástil, paneles y gabinete	20 días	vie. 28/10/22	lun. 28/11/22
ETAPA 3	20 días	vie. 28/10/22	lun. 28/11/22
Inspección y pruebas	20 días	vie. 28/10/22	lun. 28/11/22
Pruebas Y Puesta en servicio	20 días	vie. 28/10/22	lun. 28/11/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	lun. 28/11/22	lun. 28/11/22
Capacitación de usuarios	20 días	vie. 28/10/22	lun. 28/11/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	20 días	vie. 28/10/22	lun. 28/11/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	lun. 28/11/22	lun. 28/11/22

Actualización de pólizas


El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:

1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

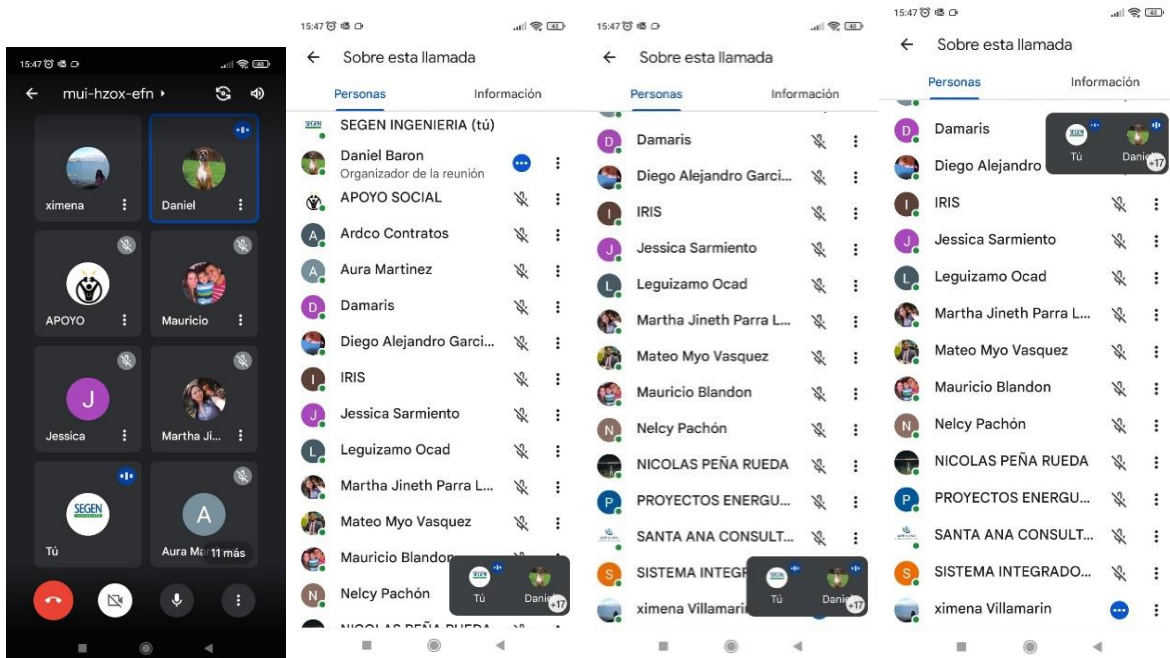

Ejecución de actividades de socialización

El 30 de junio de 2022 se llevó a cabo la socialización del proyecto de Puerto Rondón de SSFVI, en el salón del Concejo municipal. Y se desarrolló con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.

Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización Puerto Rondón”.



Registro fotográfico de socialización


A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:





ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.
 - ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría el día 30 de junio de 2022 en el Municipio de Puerto Rondón, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.
- Veedores del Proyecto:



ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca, a los treinta (30) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada del proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA 60 USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.


Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad del Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto del proyecto: "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA 60 USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

DECIDIMOS



Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca, Pág-2-


SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría ciudadana para el control de las obras a desarrollar en el marco de la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA 60 USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", su campo de acción será en el Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca y tendrá una duración acorde al periodo de Ejecución del contrato con sus respectivas prórrogas si es el caso.

TERCERO: el grupo de control social se compromete a supervisar el desarrollo de las obras y a servir de interlocutor entre la comunidad beneficiaria y la entidad ejecutora del proyecto. Todos sus aportes y actuaciones seguirán los principios que rigen el control social, consagrados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

CUARTO: las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

QUINTO: La comunidad elige democráticamente como veedores(as) a los siguientes ciudadanos(as):

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	Nº de contacto
Julio Alayo G	96722767	P. Asquimbo	3715723453
Cristian Quiroz	109038226	Progreso	3188341135
Juan Henry Perez	1119510812	V. la Ceiba	3112301769
Julio Acosta	171652892	La Cueva	322005578
Ramiro L. Quidá	86080019	La Carra	3209190873



Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca, Pág-3-

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	Nº de contacto

Para constancia se firma en el Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca, a los treinta (30) días del mes de Junio de 2022.

Veedor (a) _____

 Veedor (a) _____

 Veedor (a) _____

 Veedor (a) _____

 Veedor (a) _____

 Veedor (a) _____



- Listado de asistencia

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9		Código	A-GAD-FO-06
			Fecha de Aprobación	14/05/2014
			Versión	1
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Página	Página 1 de 10

Dirigida por: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.		Fecha: 30 de Junio de 2022	Lugar: Salón Concejo Municipal	Hora: 10:00 a.m.
Objeto de la reunión:		Socialización y conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto: "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA 60 USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".		



Ítem	Nombre y Apellido	Vereda	Celular	Firma
1	Luis Medina		3125654341	Luis Medina
2	José Monroy Peraza	La Ceiba	3112307769	José Monroy Peraza
3	Sulio Lora	La Carretera	5222003578	Sulio Lora
4	Edwin Arroyo	La Ceiba	3202099142	Edwin Arroyo
5	Ramiro Luján Ojeda	La Carretera	320919073	Ramiro Luján Ojeda
6	José González Peña	La Ceiba	312 3616334	José González Peña
7	Arturo Herrera	El Paisaje	3108254366	Arturo Herrera
8	Fidel Pérez	El Paisaje	3134953019	Fidel Pérez
9	Edwin Pérez Torro	El Palmar	3133566791	Edwin Pérez Torro
10	Luis Araújo	petacas	3143977997	Luis Araújo
11	Cristian Quiruga	progreso	3188341135	Cristian Quiruga
12	Alexis Beltrán	Normandia	3102188998	Alexis Beltrán
13	Julio Araújo G	P. Asquintas	3175723453	Julio Araújo G










		EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9		Código A-GAD-FO-06
				Fecha de Aprobación 14/05/2014
		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Versión 1
				Página Página 10 de 10

Dirigida por: ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Fecha: 30 de Junio de 2022
	Lugar: Salón Concejo Municipal
	Hora: 10:00 a.m

Objeto de la reunión:	Socialización y conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto: "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SOSTENIBLE CON SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL (SSFVI) PARA 60 USUARIOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
-----------------------	---

Item	Nombre y Apellido	Vereda	Celular	Firma
118	Luis Arbecy Hernández		313 214 7317	
119	Hugo Oslando Niquis		96 191 142	
120	Alder Rivera Romero		312 341 9458	
121				

	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CODIGO: FR-GA-01 VERSION: 1 FECHA: 04/08/2021 PÁGINA 1 DE 2
---	------------------------------	--

FIRMA DE ASISTENCIA.	
Nombre Completo	Firma
Luis Fernando Medina	
Fabian Yanney Perez	
Julio Torres	
Edwin Pineda	
Remberto Luna Cordero Flores	
Jorge Abraham Gonzalez Peña	
Christian Rodolfo Herrera	
Fidel Perez	
Edwin Perez Torres	
Luis Aravia Garcia	
Cristian Quiroga Mateo	
Alexis Balboa Sierra	
Luis Arbecy Hernández	
Hugo Oslando Niquis	
Alder Rivera Romero	



ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – Puerto Rondón por medio de la factura No. UTIG-4 por un valor de \$17,528,861.99.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE
SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115
USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE
utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORÍA DEL PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115
USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE, GUAVIARE”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022



Julio de 2022

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas	10
Participación en reuniones	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización	13
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	14
ASPECTOS FINANCIEROS	20
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20
Incidentes, actos o condiciones inseguras	20
Accidentes laborales	20
Planillas de seguridad social	20



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS	
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	NACIONAL DE SEGUROS



No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
400041086	2	Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUAVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUAVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS

	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:



Localización de Arauca



Localización de Caquetá en Colombia



- ❖ **PROYECTO 1 SISFV ARAUCA:** Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ **PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA:** Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ **PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN:** Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,
- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUÁN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.



- ❖ PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”

Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$2.120.522.741


Localización del proyecto:

En el municipio de San José del Guaviare, se ejecutará la Instalación de sistemas



energéticos a través de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 115 familias de la vereda Arawato.

Total beneficiarios Municipio de San José del Guaviare

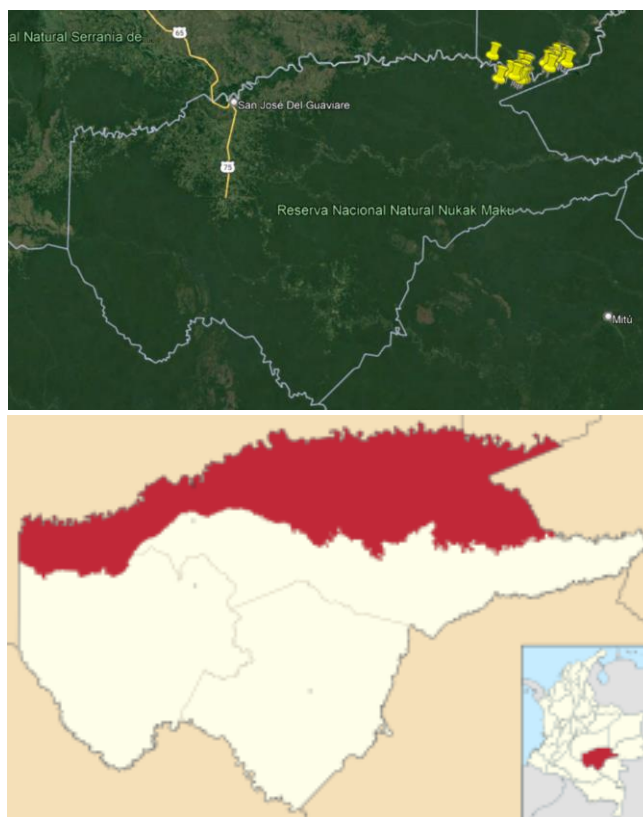

EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de San José del Guaviare, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV San José del Guaviare 115	102 días	mié. 29/06/22	vie. 25/11/22



ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	15 días	mié. 29/06/22	jue. 21/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
validación de viviendas por vereda	8 días	jue. 30/06/22	mar. 12/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	8 días	jue. 30/06/22	mar. 12/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	mar. 12/07/22	mar. 12/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	jue. 21/07/22	jue. 21/07/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	24 días	mié. 31/08/22	lun. 3/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	8 días	mié. 31/08/22	vie. 9/09/22
Construcción de Dados de Cimentación	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
Instalación de kits internas	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
ETAPA 2	24 días	vie. 21/10/22	vie. 25/11/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
ETAPA 3	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Inspección y pruebas	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Pruebas Y Puesta en servicio	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	vie. 25/11/22	vie. 25/11/22
Capacitación de usuarios	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	vie. 25/11/22	vie. 25/11/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:

1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.


Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de



2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

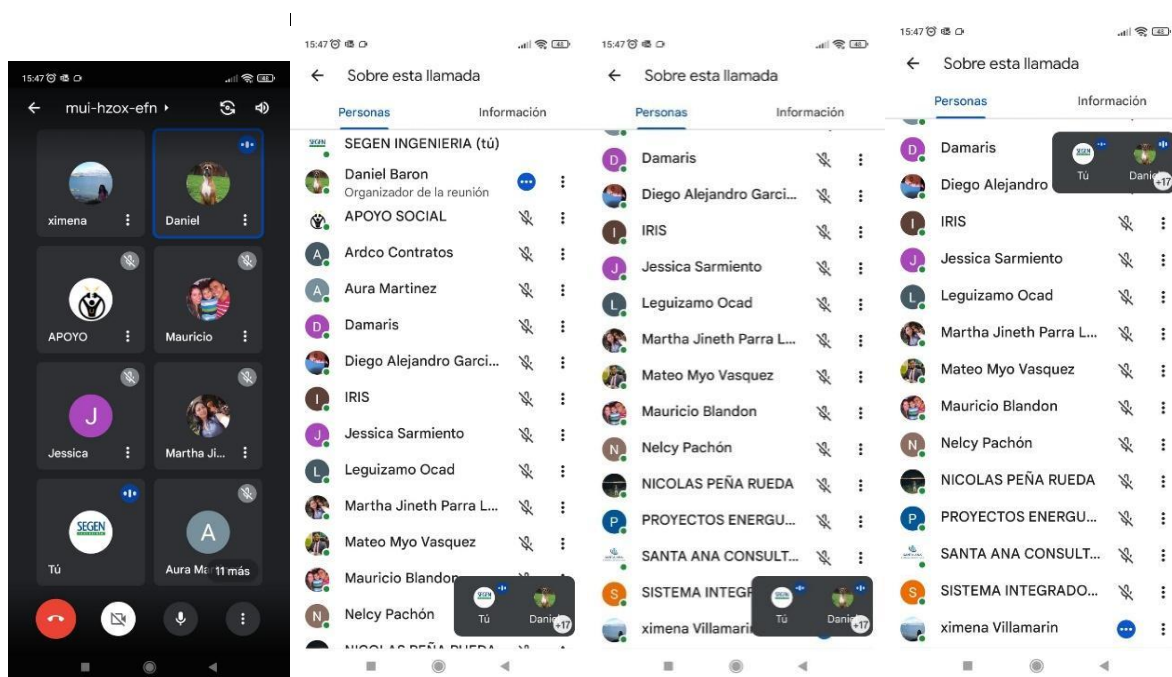

Ejecución de actividades de socialización

El día 24 de junio del año 2022 en la vereda Picalojo perteneciente al municipio de San José del Guaviare siendo las 10 de la mañana se llevó a cabo la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas, dirigida hacia los habitantes de las veredas aledañas a este sector la socialización estuvo dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría; en esta reunión se expusieron todas las etapas con las cuales contará el desarrollo del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener



en cuenta posteriormente se respondieron preguntas y se aclararon dudas, como acto final se conformó la veeduría que tendrá la finalidad hacer seguimiento al proyecto en representación de los habitantes de las distintas veredas.

El domingo 26 de junio del año 2022 en el corregimiento de Boquerón perteneciente al municipio de San José del Guaviare a las 10:30 am se realizó la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas dirigida hacia los presidentes y delegados de las distintas veredas aledañas a este corregimiento, dicha socialización fue dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría en donde se puntualizó las etapas del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta para finalizar se respondieron preguntas y se conformó la veeduría ciudadana la cual será la encargada de vigilar el cumplimiento del proyecto.

Las socializaciones se desarrollaron con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.

Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización San José del Guaviare”.

Registro fotográfico de socialización

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:

- Picalojo:



- Corregimiento de Boquerón





ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.
 - ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría para los proyectos 10, 11, 12 y 13, los días 24 y 26 de junio de 2022 en el Municipio de San José del Guaviare, lo anterior, teniendo en cuenta que los cuatro proyectos se van a desarrollar en el mismo municipio, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.
- Veedores del Proyecto:



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA	
--	--	--

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunicad de las veredas Catalina, Fundación, Lejanías, San Antonio Alto, San Jorge, El Refugio y Caño Pescado del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantara el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare
Pág-2-

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría ciudadana para el control de las obras a desarrollar en el marco de la ejecución de los PROYECTOS "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", GUAVIARE" su campo de acción será en el Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare y tendrá una duración acorde al periodo de Ejecución del contrato con sus respectivas prórrogas si es el caso.

TERCERO: el grupo de control social se compromete a supervisar el desarrollo de las obras y a servir de interlocutor entre la comunidad beneficiaria y la entidad ejecutora del proyecto. Todos sus aportes y actuaciones seguirán los principios que rigen el control social, consagrados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

CUARTO: las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

QUINTO: La comunidad elige democráticamente como veedores(as) a los siguientes ciudadanos(as):

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
Ortiz Torres	1.12428045	P/N	1.12428045



 ENERGUAVIARE	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	 ipse
--	---	--

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
Campo Elias Brindley	96361096	cachicoma	3204991015
Rosendo León Peña	17221415	Mira-Flora	3132689994
Florentino Guerrero	1120561346	Puerto nuevo	3134589552
Wilson Ceballos	97610781	Cachicoma	3160432289
Jagueline Monge	26.427.825	La Esmeralda	3202103617

Para constancia se firma en la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022.

Campo Elias Brindley
Veedor (a) 96361096

Rosendo León P.
Veedor (a) 17221415

Florentino Guerrero
Veedor (a) 1120561346

Wilson Ceballos
Veedor (a) 97610781



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
--	---	--

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas San Luis, Caño Negro, Unión Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, Tomachipán, Arawato, Caño Blanco II, Caño Blanco III, del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".




	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	--	---


Continuación Acta Conformación de Veeduría Corregimiento de Boquerón Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-

EMIRO Basallo	Guayabales	CL 77266 875	CL 305 2134822
Patricia vega	Caño Haku	CC 1120565705	3219417314
Pablo Vargara	Pachivero	3099693	3147186868
Luis Alberto Calle	Guayabales	LG 545228	3219372384

Para constancia se firma en el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022.


Veedor (a) 77266875


Veedor (a) 1120565705


Veedor (a) 1100953536


Veedor (a) 816545228



ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato No. 158 de 2022 Proyecto – San José del Guaviare (115U) por medio de la factura No. UTIG-9 por un valor de \$ 46,200,159.60.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA
281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE, GUAVIARE”**

INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	10
Participación en reuniones.....	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización.....	13
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	14
ASPECTOS FINANCIEROS	20
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	20
Accidentes laborales	20
Planillas de seguridad social.....	20



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:





Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.



LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”


Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$4.959.762.170

Localización del proyecto:

En el municipio de San José del Guaviare, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 281 familias de las veredas que se relacionan a continuación:

NOMBRE VEREDA
Caño Blanco Dos
Caño Blanco Tres
Caño Cuma
La Siberia
La Unión
Las Orquídeas
Caño Danta
Caño Mosco

Total beneficiarios Municipio de San José del Guaviare





EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de San José del Guaviare, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV San José del Guaviare 281	106 días	mié. 29/06/22	jue. 1/12/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	20 días	mié. 29/06/22	jue. 28/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
validación de viviendas por vereda	13 días	jue. 30/06/22	mar. 19/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	13 días	jue. 30/06/22	mar. 19/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	mar. 19/07/22	mar. 19/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	jue. 28/07/22	jue. 28/07/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	6 días	mié. 24/08/22	mié. 31/08/22
Distribución y Cimentación	28 días	jue. 1/09/22	lun. 10/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	10 días	jue. 1/09/22	mié. 14/09/22
Construcción de Dados de Cimentación	27 días	vie. 2/09/22	lun. 10/10/22
Instalación de kits internas	27 días	vie. 2/09/22	lun. 10/10/22
ETAPA 2	28 días	vie. 21/10/22	jue. 1/12/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	27 días	lun. 24/10/22	jue. 1/12/22
ETAPA 3	27 días	lun. 24/10/22	jue. 1/12/22
Inspección y pruebas	27 días	lun. 24/10/22	jue. 1/12/22
Pruebas Y Puesta en servicio	27 días	lun. 24/10/22	jue. 1/12/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	jue. 1/12/22	jue. 1/12/22
Capacitación de usuarios	27 días	lun. 24/10/22	jue. 1/12/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	27 días	lun. 24/10/22	jue. 1/12/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	jue. 1/12/22	jue. 1/12/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:




1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

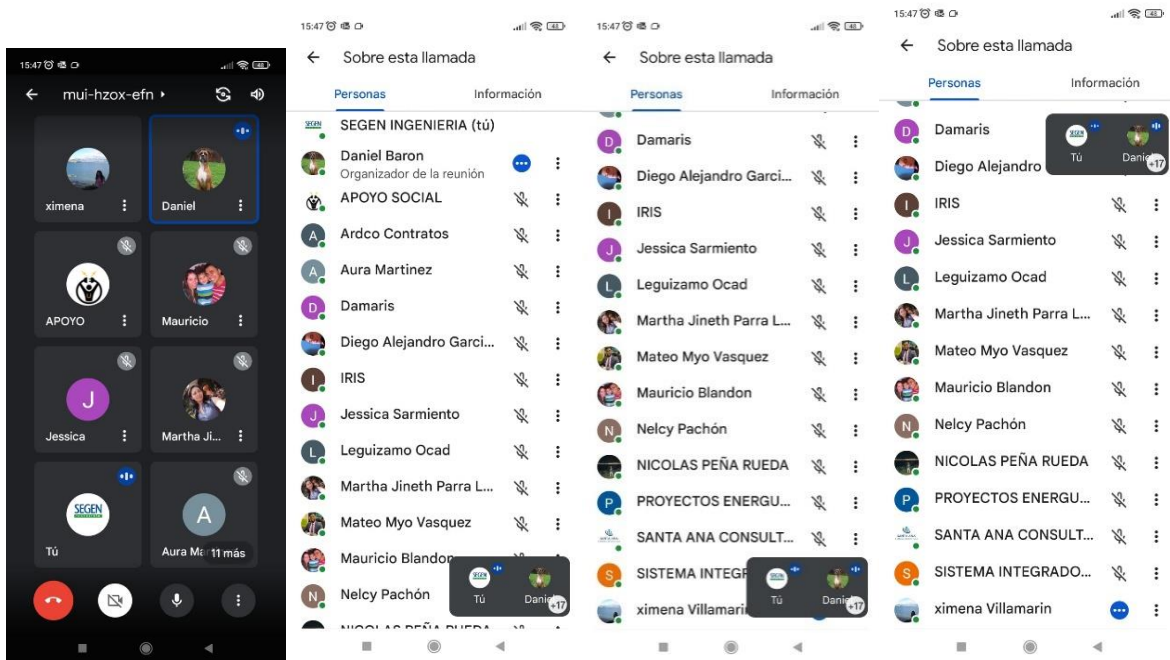



Ejecución de actividades de socialización

El día 24 de junio del año 2022 en la vereda picalojo perteneciente al municipio de San José del Guaviare siendo las 10 de la mañana se llevó a cabo la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas, dirigida hacia los habitantes de las veredas aledañas a este sector la socialización estuvo dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría; en esta reunión se expusieron todas las etapas con las cuales contara el desarrollo del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta posteriormente se respondieron preguntas y se aclararon dudas, como acto final se conformó la veeduría que tendrá la finalidad hacer seguimiento al proyecto en representación de los habitantes de las distintas veredas.

El domingo 26 de junio del año 2022 en el corregimiento de Boquerón perteneciente al municipio de San José del Guaviare a las 10:30 am se realizó la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas dirigida hacia los presidentes y delegados de las distintas veredas aledañas a este corregimiento, dicha socialización fue dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría en donde se puntualizó las etapas del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta para finalizar se respondieron preguntas y se conformó la veeduría ciudadana la cual será la encargada de vigilar el cumplimiento del proyecto.

Las socializaciones se desarrollaron con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.

Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización San José del Guaviare”.

Registro fotográfico de socialización

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:

- Picalojo:



- Corregimiento de Boquerón



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.
 - ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría para los proyectos 10, 11, 12 y 13, los días 24 y 26 de junio de 2022 en el Municipio de San José del Guaviare, lo anterior, teniendo en cuenta que los cuatro proyectos se van a desarrollar en el mismo municipio, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.
- Veedores del Proyecto:



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
--	--	--

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas Catalina, Fundación, Lejanías, San Antonio Alto, San Jorge, El Refugio y Caño Pescado del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare

Pág-2-

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría ciudadana para el control de las obras a desarrollar en el marco de la ejecución de los PROYECTOS "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", GUAVIARE" su campo de acción será en el Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare y tendrá una duración acorde al periodo de Ejecución del contrato con sus respectivas prórrogas si es el caso.

TERCERO: el grupo de control social se compromete a supervisar el desarrollo de las obras y a servir de interlocutor entre la comunidad beneficiaria y la entidad ejecutora del proyecto. Todos sus aportes y actuaciones seguirán los principios que rigen el control social, consagrados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

CUARTO: las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

QUINTO: La comunidad elige democráticamente como veedores(as) a los siguientes ciudadanos(as):

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
<i>Ortiz Tabares</i>	<i>1.12428045</i>	<i>Petal</i>	<i>1.12428045</i>



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
Campo Elias Buitrago	96361096	cachicoma	3204991015
Rosendo León Peña	17221415	Miro-flora	3132689994
Florentino Guerrero	1120561346	Puerto nuevo	3134589552
Wilson Ceballos	97610781	Cachicoma	3160432289
Jagueline Monge	26427825	Esmeralda	3202103617

Para constancia se firma en la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022.

Campo Elias Buitrago
Veedor (a) 96361096

Rosendo León P.
Veedor (a) 17221415

Florentino Guerrero
Veedor (a) 1120561346

Wilson Ceballos
Veedor (a) 97610781



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
--	--	--

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas San Luis, Caño Negro, Unión Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuira, Tomachipán, Arawato, Caño Blanco II, Caño Blanco III, del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".




	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	--	---


Continuación Acta Conformación de Veeduría Corregimiento de Boquerón Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-


EMIRO Basallo	Guayabales	CL 77266 875	CL 305 2134822
Patricia vega	Caño Haku	CC 1120565705	3219417314
Pablo Vargara	Bochivero	3099693	3147186868
Luis Alberto Calle	Guayabales	LG 545228	3219372384

Para constancia se firma en el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022.


Veedor (a) 77266875


Veedor (a) 1120565705


Veedor (a) 1100953536


Veedor (a) 816545228



- Listado de asistencia

ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – San José del Guaviare (281U) por medio de la factura No. UTIG-12 por un valor de \$100,463,294.40.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.



UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE, GUAVIARE."

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA
492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE, GUAVIARE.”**

INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.”

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	11
Participación en reuniones.....	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización.....	13
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	15
ASPECTOS FINANCIEROS	20
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	20
Accidentes laborales	20
Planillas de seguridad social.....	20



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:





Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U): Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS: Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO): Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U): Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.



LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.”


Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$8.822.699.051.

Localización del proyecto:

En el municipio de San José del Guaviare, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 492 familias de las veredas que se relacionan a continuación:

VEREDAS
Caño Negro
Cachicamo Alto
Catalina
El Baranco Ceiba
El Barranco Colorado
El Refugio
Los Alpes
Mesa de La Lindosa
Mocuirá
Puerto Flores
San Jorge
San Luis
Unión Buenos Aires
Caño Pescado
Caño Mosco

Total beneficiarios Municipio de San José del Guaviare

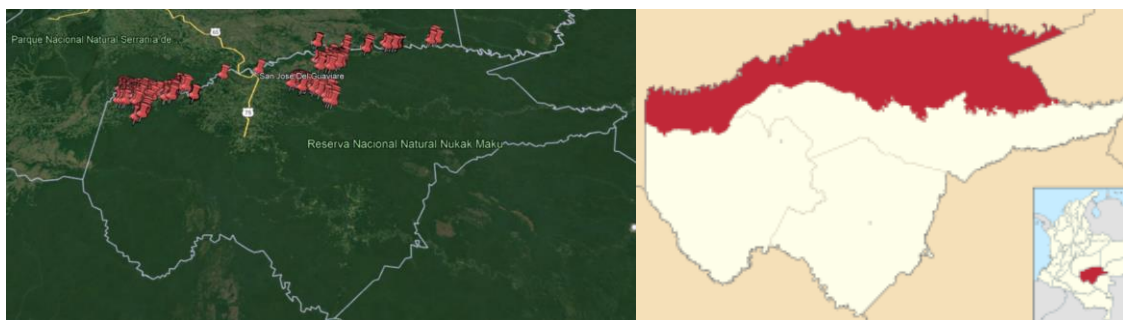

EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de San José del Guaviare, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV San José del Guaviare 492	107 días	mié. 29/06/22	vie. 2/12/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	28 días	mié. 29/06/22	mar. 9/08/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
validación de viviendas por vereda	20 días	jue. 30/06/22	vie. 29/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	20 días	jue. 30/06/22	vie. 29/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	lun. 1/08/22	lun. 1/08/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	mar. 9/08/22	mar. 9/08/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	10 días	mié. 24/08/22	mar. 6/09/22
Distribución y Cimentación	31 días	mié. 7/09/22	jue. 20/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	mié. 7/09/22	mar. 13/09/22
Construcción de Dados de Cimentación	30 días	jue. 8/09/22	jue. 20/10/22
Instalación de kits internas	30 días	jue. 8/09/22	jue. 20/10/22
ETAPA 2	29 días	vie. 21/10/22	vie. 2/12/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	28 días	lun. 24/10/22	vie. 2/12/22
ETAPA 3	28 días	lun. 24/10/22	vie. 2/12/22
Inspección y pruebas	28 días	lun. 24/10/22	vie. 2/12/22



Pruebas Y Puesta en servicio	28 días	lun. 24/10/22	vie. 2/12/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	vie. 2/12/22	vie. 2/12/22
Capacitación de usuarios	28 días	lun. 24/10/22	vie. 2/12/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	28 días	lun. 24/10/22	vie. 2/12/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	vie. 2/12/22	vie. 2/12/22

Actualización de pólizas


El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:

1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

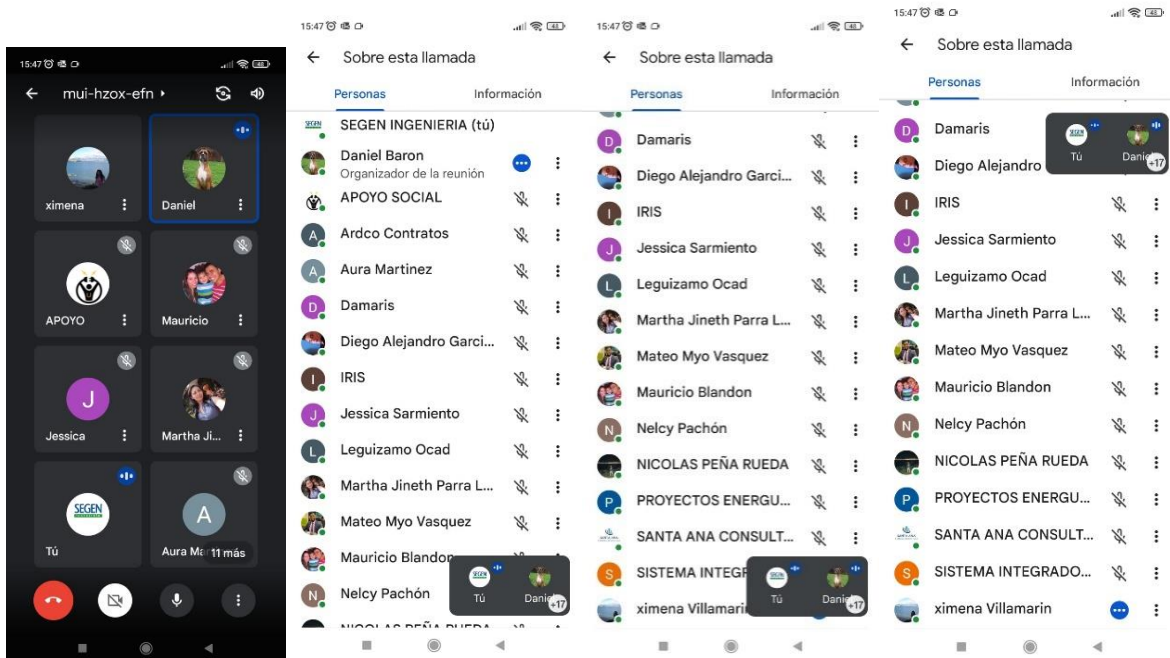

Ejecución de actividades de socialización

El día 24 de junio del año 2022 en la vereda picalojo perteneciente al municipio de San José del Guaviare siendo las 10 de la mañana se llevó a cabo la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas, dirigida hacia los habitantes de las veredas aledañas a este sector la socialización estuvo dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría; en esta reunión se expusieron todas las etapas con las cuales contara el desarrollo del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta posteriormente se respondieron preguntas y se aclararon dudas, como acto final se conformó la veeduría que tendrá la finalidad hacer seguimiento al proyecto en representación de los habitantes de las distintas veredas.

El domingo 26 de junio del año 2022 en el corregimiento de Boquerón perteneciente al municipio de San José del Guaviare a las 10:30 am se realizó la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas dirigida hacia los presidentes y delegados de las distintas veredas aledañas a este corregimiento, dicha socialización fue dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría en donde se



puntualizó las etapas del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta para finalizar se respondieron preguntas y se conformó la veeduría ciudadana la cual será la encargada de vigilar el cumplimiento del proyecto.

Las socializaciones se desarrollaron con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.

Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización San José del Guaviare”.

Registro fotográfico de socialización

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:

- Picalojo:





- Corregimiento de Boquerón





ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.
 - ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría para los proyectos 10, 11, 12 y 13, los días 24 y 26 de junio de 2022 en el Municipio de San José del Guaviare, lo anterior, teniendo en cuenta que los cuatro proyectos se van a desarrollar en el mismo municipio, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.
- Veedores del Proyecto:

	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	--	--

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas Catalina, Fundación, Lejanías, San Antonio Alto, San Jorge, El Refugio y Caño Pescado del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare

Pág-2-

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría ciudadana para el control de las obras a desarrollar en el marco de la ejecución de los PROYECTOS "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", GUAVIARE" su campo de acción será en el Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare y tendrá una duración acorde al periodo de Ejecución del contrato con sus respectivas prórrogas si es el caso.

TERCERO: el grupo de control social se compromete a supervisar el desarrollo de las obras y a servir de interlocutor entre la comunidad beneficiaria y la entidad ejecutora del proyecto. Todos sus aportes y actuaciones seguirán los principios que rigen el control social, consagrados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

CUARTO: las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

QUINTO: La comunidad elige democráticamente como veedores(as) a los siguientes ciudadanos(as):

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
<i>Ortiz Tabares</i>	<i>1.12428045</i>	<i>Petal</i>	<i>1.12428045</i>



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
Campo Elias Buitrago	96361096	cachicoma	3204991015
Rosendo León Peña	17221415	Miro-flora	3132689994
Florentino Guerrero	1120561346	Puerto nuevo	3134589552
Wilson Ceballos	97610781	Cachicoma	3160432289
Jagueline Monge	26427825	Esmeralda	3202103617

Para constancia se firma en la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022.

Campo Elias Buitrago
Veedor (a) 96361096

Rosendo León P.
Veedor (a) 17221415

Florentino Guerrero
Veedor (a) 1120561346

Wilson Ceballos
Veedor (a) 97610781



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	---	---

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas San Luis, Caño Negro, Unión Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuira, Tomachipán, Arawato, Caño Blanco II, Caño Blanco III, del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".




	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	--	---


Continuación Acta Conformación de Veeduría Corregimiento de Boquerón Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-


EMIRO Basallo	Guayabales	CL 77266 875	CL 305 2134822
Patricia vega	Caño Haku	CC 1120565705	3219417314
Pablo Vargara	Bochivero	3099693	3147186868
Luis Alberto Calle	Guayabales	LG 545228	3219372384

Para constancia se firma en el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022.


Veedor (a) 77266875


Veedor (a) 1120565705


Veedor (a) 1100953536


Veedor (a) 816545228



ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – San José del Guaviare (492U) por medio de la factura No. UTIG-10 por un valor de \$ 174,156,325.80.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA 229 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ."

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA
229 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 229 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	11
Participación en reuniones.....	11
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	12
ASPECTOS FINANCIEROS	12
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	13
Accidentes laborales.....	13
Planillas de seguridad social.....	13



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:



Localización de Arauca



Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.



LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 229 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ”

Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$3.974.245.739

Localización del proyecto:

En el municipio de San Vicente del Caguán, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 229 familias de las veredas que se relacionan a continuación:

ITEM	VEREDA	CANTIDAD
1	CAMPO BELLO	17
2	CHORRERA	1
3	EL EDEN DEL TIGRE	56
4	EL LIMONAR	13
5	EL PROGRESO	13
6	EL VENADO	17
7	GIBRALTAR	1
8	HONDURAS	1
9	LA GRANADA	14
10	LAS MORRAS	1
11	LAS PERLAS	22
12	LAS VEGAS BAJO PATO	1
13	LOS NARANJOS	9
14	LUCITANIA	6
15	LUZ CHIQUITA MEDIA	4
16	LUZ GRANDE	3
17	MEDIO AVANCE	14
18	PALMICHALES 2	7



19	PRIMAVERA DE LOSADA	29
TOTAL		229

Total beneficiarios Municipio de San Vicente del Caguán



EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de San Vicente del Caguán para 229 usuarios, durante este periodo se organizó y programó la socialización inicial del proyecto para el 4 y 7 de julio de 2022, teniendo en cuenta que esta actividad se encontraba programada para el periodo del presente informe, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV San Vicente 229	108 días	mié. 29/06/22	lun. 5/12/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	18 días	mié. 29/06/22	mar. 26/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
Validación de viviendas por vereda	11 días	jue. 30/06/22	vie. 15/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	11 días	jue. 30/06/22	vie. 15/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	lun. 18/07/22	lun. 18/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	mar. 26/07/22	mar. 26/07/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22



H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	30 días	mié. 24/08/22	mar. 4/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Construcción de Dados de Cimentación	25 días	mié. 31/08/22	mar. 4/10/22
Instalación de kits internas	25 días	mié. 31/08/22	mar. 4/10/22
ETAPA 2	30 días	vie. 21/10/22	lun. 5/12/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	25 días	vie. 28/10/22	lun. 5/12/22
ETAPA 3	25 días	vie. 28/10/22	lun. 5/12/22
Inspección y pruebas	25 días	vie. 28/10/22	lun. 5/12/22
Pruebas Y Puesta en servicio	25 días	vie. 28/10/22	lun. 5/12/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	lun. 5/12/22	lun. 5/12/22
Capacitación de usuarios	25 días	vie. 28/10/22	lun. 5/12/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	25 días	vie. 28/10/22	lun. 5/12/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	lun. 5/12/22	lun. 5/12/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:

1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.


Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.



- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

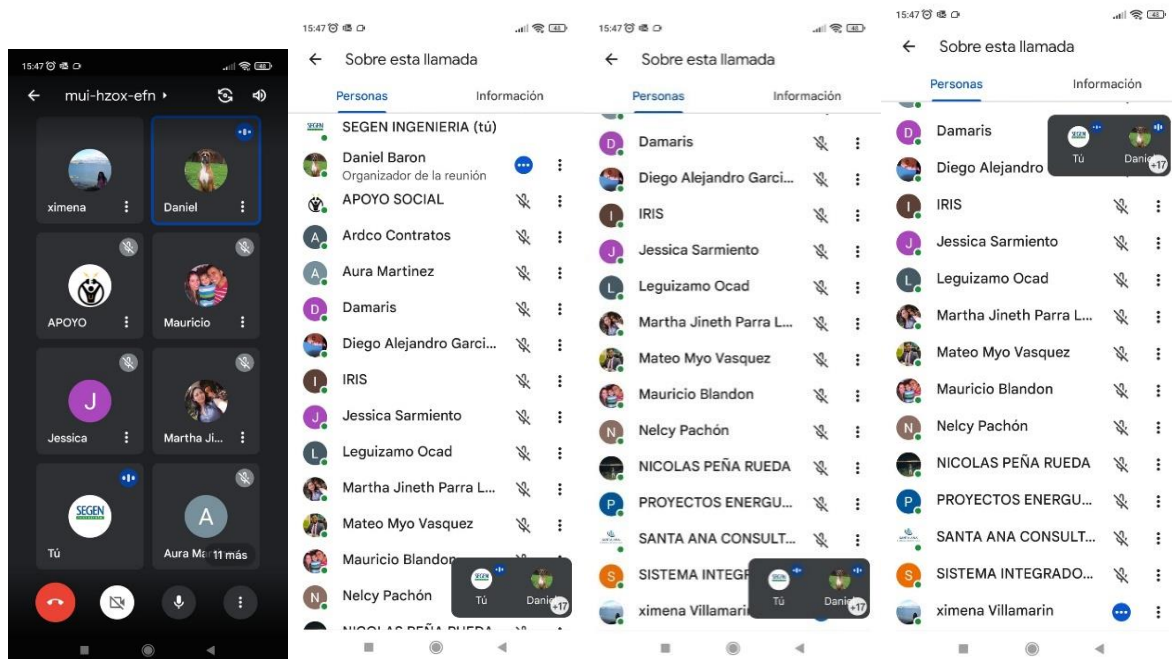

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.

ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – San Vicente del Caguán (229 U) por medio de la factura No. UTIG-5 por un valor de \$77,929,818.60.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

**UNIÓN TEMPORAL
INTERENERGÍA GUAVIARE**



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA MICROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE GUACAMAYAS".

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“REHABILITACIÓN DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
GUACAMAYAS”**

INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “REHABILITACIÓN DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GUACAMAYAS”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	3
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	9
EJECUCIÓN DE OBRA	9
Seguimiento actividades	9
Actualización de pólizas.....	10
Participación en reuniones.....	10
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	11
ASPECTOS FINANCIEROS	11
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	12
Accidentes laborales.....	12
Planillas de seguridad social.....	12

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA



Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	"CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE."
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022



FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022
----------------------	-------------------------

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:



Localización de Arauca



Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.




LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “REHABILITACIÓN DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GUACAMAYAS”

Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$1.592.892.915

Localización del proyecto:

En el municipio de San Vicente del Caguán, se ejecutará la rehabilitación de la microcentral hidroeléctrica de Guacamayas, que beneficiarán a 221 familias.

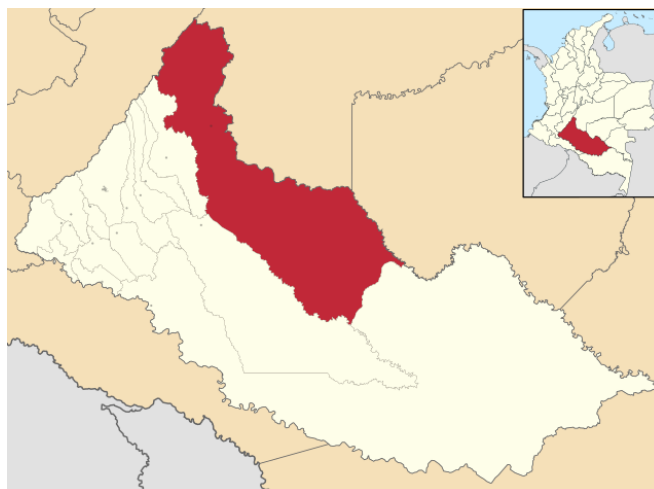

EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de San Vicente del Caguán para 221 usuarios, durante este periodo se organizó y programó la socialización inicial del proyecto para el 4 y 7 de julio de 2022, teniendo en cuenta que esta actividad se encontraba programada para el periodo del presente informe, tal como se puede apreciar a continuación:



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto PCH Guacamayas 221	107 días	mié. 29/06/22	vie. 2/12/22
ETAPA 1	107 días	mié. 29/06/22	vie. 2/12/22
Trabajos Preliminares (Replanteo)	17 días	mié. 29/06/22	lun. 25/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	10 días	jue. 30/06/22	jue. 14/07/22
Descapote y limpieza	15 días	jue. 30/06/22	vie. 22/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	jue. 14/07/22	jue. 14/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	lun. 25/07/22	lun. 25/07/22
Bodega Local	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de materiales Civil	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
Obra Civil	70 días	mié. 24/08/22	vie. 2/12/22
Estructura de Captación	70 días	mié. 24/08/22	vie. 2/12/22
Desarenador 1	30 días	mié. 24/08/22	mar. 4/10/22
Desarenador 2	40 días	mié. 24/08/22	mié. 19/10/22
Canal de Conducción	60 días	mié. 7/09/22	vie. 2/12/22
Vertedero Lateral	60 días	mié. 7/09/22	vie. 2/12/22
Tanque de Carga	40 días	mié. 5/10/22	vie. 2/12/22
Demoliciones	30 días	mié. 5/10/22	vie. 18/11/22
Casa de Máquinas	40 días	mié. 24/08/22	mié. 19/10/22
Obra Eléctrica & Mecánica	90 días	mar. 26/07/22	vie. 2/12/22
Reparación de turbina tipo Francis 50kW	90 días	mar. 26/07/22	vie. 2/12/22
Generador	90 días	mar. 26/07/22	vie. 2/12/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:


1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:



- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

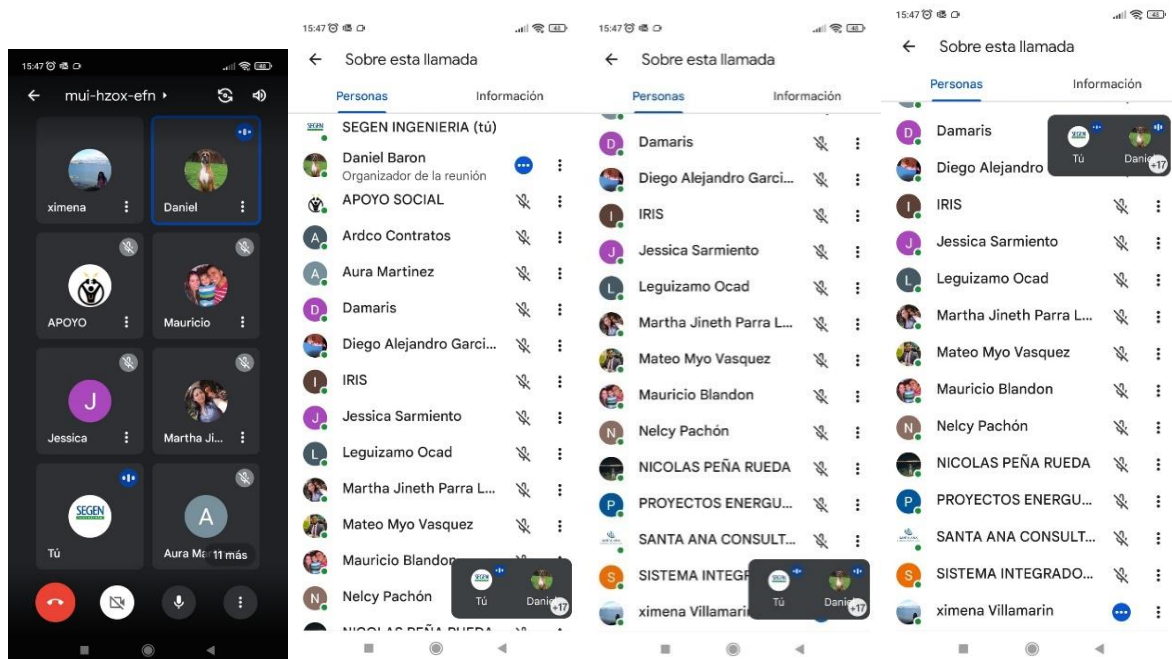

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.

ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – PCH GUACAMAYAS por medio de la factura No. UTIG-6 por un valor de \$ 25,133,743.21.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE



CONTRATO DE CONSULTORÍA

Número 158 de 2022

INTERVENTORIA DEL PROYECTO: “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPAN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE

utinterenergia.guaviare@gmail.com



**CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 158 DE 2022**

INTERVENTORIA DEL PROYECTO:

**“SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL
CENTRO POBLADO DE TOMACHIPAN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”**

**INTERVENTOR
UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE**



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
Correspondiente al mes de junio de 2022

Julio de 2022



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 en el marco del Contrato No. 158 de 2022 cuyo objeto contractual es “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.” suscrito entre La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare – Energuaviare S.A. E.S.P. y la Unión Temporal Interenergía Guaviare para la interventoría del proyecto “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPAN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.

Dentro de las funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 155 de 2022, cuyo objeto contractual es “CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”, esta interventoría realiza las actividades de control, exigencia, colaboración y prevención desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, jurídico, ambiental y social.

Dentro del periodo de este informe se han realizado las actividades principalmente administrativas y se dio inicio el proceso de socializaciones iniciales del proyecto de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista de obra, el Consorcio Recursos Energéticos.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
Cuadro de información general del contrato	4
Garantías y vigencia Contrato de Obra.....	4
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5
Cuadro de información general del contrato de interventoría	5
Garantías y vigencia Interventoría	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO	6
LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	9
EJECUCIÓN DE OBRA	10
Seguimiento actividades	10
Actualización de pólizas.....	10
Participación en reuniones.....	11
Ejecución de actividades de socialización	12
Registro fotográfico de socialización.....	13
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	14
ASPECTOS FINANCIEROS	20
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20
Incidentes, actos o condiciones inseguras.....	20
Accidentes laborales	20
Planillas de seguridad social.....	20



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro de información general del contrato

CONTRATO:	No. 155
CONTRATANTE:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ENERGUAVIARE S.A E.S.P.
OBJETO DEL PROYECTO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTE EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS-SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE.”
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTÍSIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$30.927.601.725,75)
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETA Y GUAVIARE
TIPO DE PROYECTO:	FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	DIDIER ESNEYDER VILLAMIL RIOS

Garantías y vigencia Contrato de Obra

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		NACIONAL DE SEGUROS				
No. DE PÓLIZA	ANEXO / ENDOSO	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		VIGENTE
				DESDE	HASTA	
		Cumplimiento del contrato	\$ 6.185.520.345,20	06/06/2022	06/04/2023	SÍ



400041086	2	Pago anticipado	\$ 9.278.280.517,80	06/06/2022	06/04/2023	SÍ
		Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 1.546.380.086,30	06/06/2022	07/12/2025	SÍ
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2027	SÍ
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.092.760.172,60	07/12/2022	07/12/2023	SÍ
400041085	2	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.546.380.086,00	06/06/2022	06/01/2023	SÍ

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cuadro de información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	Contrato No. 158 DE 2022
CONTRATANTE	EMPRESA DE ENERGIA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ENERGUVIARE SA ESP NIT 822.004680-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERENERGIA GUAVIARE NIT 901.597.103-0 R.L. MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VARELA
SUPERVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO	HERNANDO ANTONIO HINCAPIE Supervisor ENERGUVIARE S.A ESP
OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS CONSISTENTES EN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ Y GUAVIARE.
VALOR DEL CONTRATO	\$2,019,568,948.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES



FECHA DE INICIO	06 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022

Garantías y vigencia Interventoría

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.
N° DE LA POLIZA	BCH – 100019518 – ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICION	07 DE JUNIO DE 2022
POLIZA:	CUMPLIMIENTO

ACTUALIZACION DE POLIZA			
GARANTIA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	06/06/2022	06/04/2023	\$403.893.789, 60
PAGO ANTICIPO	06/06/2022	06/04/2023	\$ 605.840.684,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2022	07/12/2025	\$100.973.447,40
CALIDAD DEL SERVICIO	07/12/2022	07/12/2027	\$403.893.789,60

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en los Departamento de Arauca, Caquetá y Guaviare con alcance en los siguientes municipios y veredas:





Localización de Caquetá en Colombia



Localización de Guaviare en Colombia

- ❖ PROYECTO 1 SISFV ARAUCA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauca, veredas Caracol, Cinaruco y Maporillal.
- ❖ PROYECTO 2 SISFV ARAUQUITA: Departamento de Arauca: Municipio de Arauquita, veredas El Progreso, La Arenosa, Caño Colorado y Lejanías.
- ❖ PROYECTO 3 SISFV PUERTO RONDÓN: Departamento de Arauca: Municipio de Puerto Rondón, veredas El progreso, Normandía, Palmita, Cumare, El Paisaje, Correa, La Ceiba, Maporal, El Letrero,



- ❖ **PROYECTO 5 SISFV SAN VICENTE DEL CAGUAN (229 U):** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, veredas Lucitania, Palmichales 2, El Progreso, Luz Chiquita Media, La Granada, Las Vegas Bajo Pato, Gibraltar, Medio Avance, Campo Bello, Las Morras, las Penas, Chorreras, Honduras, El Venado, Luz Grande, El Edén del Tigre, El Limonar, Los Naranjos, Primavera de Losada, Campo Bello.
- ❖ **PROYECTO 7 PCH GUACAMAYAS:** Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, Inspección de Policía de Guacamayas.
- ❖ **PROYECTO 8 SISFV Miraflores (Barranquillita):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Barranquillita.
- ❖ **PROYECTO 9 SISFV MIRAFLORES (LAGOS DEL DORADO):** Departamento del Guaviare, Municipio de Miraflores, vereda Lagos del Dorado.
- ❖ **PROYECTO 10 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (115 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Arawato.
- ❖ **PROYECTO 11 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (492 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas: catalina, Cachicamo Alto, San Jorge, Los Alpes, El Refugio, San Luis, caño Negro, Unión de Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuirá, caño Pescado, Caño Mosco, Mesa de la Lindosa, Puerto Flores.
- ❖ **PROYECTO 12 SISFY SAN JOSE DEL GUAVIARE (TOMACHIPAN):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, vereda Tomachipan.
- ❖ **PROYECTO 13 SISFV SAN JOSE DEL GUAVIARE (281 U):** Departamento del Guaviare, Municipio de San José del Guaviare, veredas Caño Blanco Tres, caño Cumare, Caño Mosco, Caño Blanco Dos, Caño Danta, La Unión, Siberia, Las Orquídeas.




LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre proyecto: “SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPAN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.”

Presupuesto del proyecto (Obra + Interventoría + Administración):
\$1.880.725.825

Localización del proyecto:

En el municipio de San José del Guaviare, se ejecutará la Instalación de sistemas energéticos a través de Soluciones Individuales solares Fotovoltaicas, que beneficiarán a 90 familias en la vereda Tomachipán.

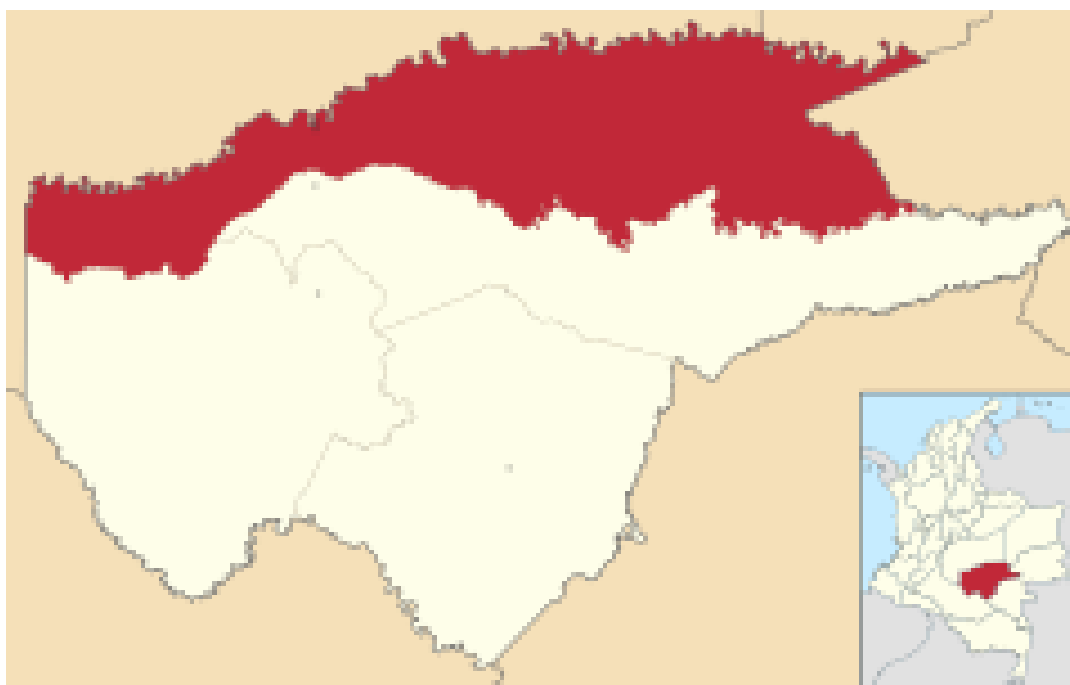



EJECUCIÓN DE OBRA

Seguimiento actividades

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por el contratista de obra, para el proyecto de San José del Guaviare, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo de junio, que en este caso corresponde a la visita de socialización, tal como se puede apreciar a continuación:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto SISFV Tomachipán 90	102 días	mié. 29/06/22	vie. 25/11/22
ETAPA 1	78 días	mié. 29/06/22	jue. 20/10/22
Replanteo	15 días	mié. 29/06/22	jue. 21/07/22
Visita de socialización	1 día	mié. 29/06/22	mié. 29/06/22
validación de viviendas por vereda	8 días	jue. 30/06/22	mar. 12/07/22
Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	8 días	jue. 30/06/22	mar. 12/07/22
E: Informe de Replanteo	0 días	mar. 12/07/22	mar. 12/07/22
H: Aprobación de replanteo por parte del cliente	0 días	jue. 21/07/22	jue. 21/07/22
Bodega Local	41 días	mar. 23/08/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de materiales eléctricos	0 días	mar. 23/08/22	mar. 23/08/22
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié. 12/10/22	mié. 12/10/22
H: Recibo de gabinetes	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
H: Recibo de mástil	0 días	jue. 20/10/22	jue. 20/10/22
Armado de kits internas	5 días	mié. 24/08/22	mar. 30/08/22
Distribución y Cimentación	24 días	mié. 31/08/22	lun. 3/10/22
Distribución de kits internas y cimentación	5 días	mié. 31/08/22	mar. 6/09/22
Construcción de Dados de Cimentación	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
Instalación de kits internas	23 días	jue. 1/09/22	lun. 3/10/22
ETAPA 2	24 días	vie. 21/10/22	vie. 25/11/22
Distribución de gabinetes, paneles, baterías y mástil	5 días	vie. 21/10/22	jue. 27/10/22
Montaje de mástil, paneles y gabinete	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
ETAPA 3	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Inspección y pruebas	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Pruebas Y Puesta en servicio	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
E: Protocolo de pruebas	0 días	vie. 25/11/22	vie. 25/11/22
Capacitación de usuarios	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	23 días	lun. 24/10/22	vie. 25/11/22
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	vie. 25/11/22	vie. 25/11/22

Actualización de pólizas

El 07 de junio de 2022 se remitió la actualización de pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 158, a través del comunicado UTIG-AD-012-2022. En el cual se anexan los siguientes soportes:




1. Original de la póliza de Cumplimiento BCH-100019518 Anexo 2.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BCH-100003432 Anexo 2.
3. Soporte de pago de las pólizas citadas.

Participación en reuniones

Se llevó a cabo reunión con el Contratante el día 16 de junio de 2022, en desarrollo de los contratos 155 de 2022 correspondiente a las obras que se ejecutarán para 11 proyectos a cargo del CONSORCIO RECURSOS ENERGÉTICOS y el 158 de 2022 encargado de la interventoría realizada por la UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA GUAVIARE, en la cual se definió lo siguiente:

- Fecha de entrega de los informes mensuales de actividades para el contrato de obra e interventoría.
- Especificaciones y características de los equipos a instalar en cada uno de los proyectos.
- Seguimiento de los contratos a través de reuniones periódicas.

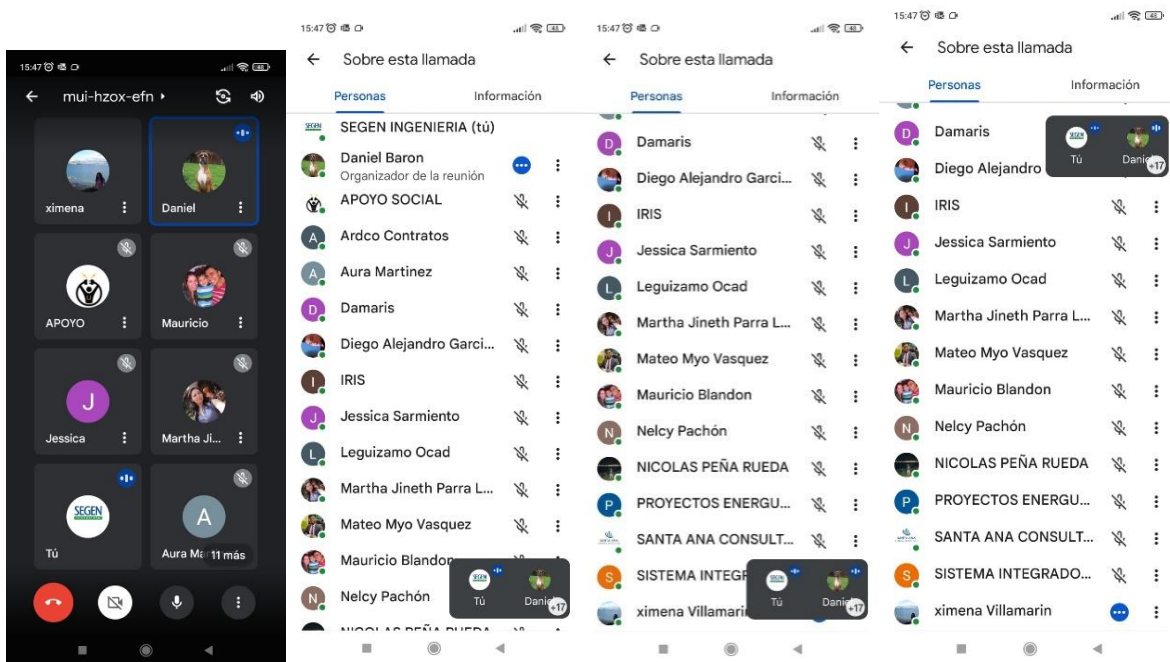



Ejecución de actividades de socialización

El día 24 de junio del año 2022 en la vereda Picalojo perteneciente al municipio de San José del Guaviare siendo las 10 de la mañana se llevó a cabo la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas, dirigida hacia los habitantes de las veredas aledañas a este sector la socialización estuvo dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría; en esta reunión se expusieron todas las etapas con las cuales contara el desarrollo del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta posteriormente se respondieron preguntas y se aclararon dudas, como acto final se conformó la veeduría que tendrá la finalidad hacer seguimiento al proyecto en representación de los habitantes de las distintas veredas.

El domingo 26 de junio del año 2022 en el corregimiento de Boquerón perteneciente al municipio de San José del Guaviare a las 10:30 am se realizó la socialización del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas dirigida hacia los presidentes y delegados de las distintas veredas aledañas a este corregimiento, dicha socialización fue dirigida por el Consorcio Recursos Energéticos con acompañamiento de delegados de Energuaviare e Interventoría en donde se puntualizó las etapas del proyecto, por medio de una presentación audiovisual se mostró el sistema fotovoltaico su funcionamiento, mantenimiento y demás aspectos a tener en cuenta para finalizar se respondieron preguntas y se conformó la veeduría ciudadana la cual será la encargada de vigilar el cumplimiento del proyecto.

Las socializaciones se desarrollaron con el siguiente orden del día:

1. Saludo y presentación
2. Alcance y presentación del proyecto
3. ¿Qué entregamos?
4. Cronograma de trabajo
5. Beneficios y limitaciones del sistema
6. Uso correcto de la solución fotovoltaica (electrodomésticos permitidos y tiempo de uso de cada uno).
7. Responsable de la Administración, Operación y Mantenimiento – AOM del sistema fotovoltaico instalado.



Lo anterior, se puede evidenciar en el anexo denominado “Acta de socialización San José del Guaviare”.

Registro fotográfico de socialización

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido por el equipo de interventoría en el desarrollo de la socialización:

- Picalojo:



- Corregimiento de Boquerón



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- i. Se encuentran vigentes las pólizas de cumplimiento, predios laborales y obligaciones para los contratos de obra e interventoría, tal como se presentó en el apartado de generalidades.
 - ii. Se realizó la socialización del proyecto y conformación de la veeduría para los proyectos 10, 11, 12 y 13, los días 24 y 26 de junio de 2022 en el Municipio de San José del Guaviare, lo anterior, teniendo en cuenta que los cuatro proyectos se van a desarrollar en el mismo municipio, a continuación se adjunta el listado de veedores y el listado de asistencia a la socialización.
- Veedores del Proyecto:



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
--	--	--

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas Catalina, Fundación, Lejanías, San Antonio Alto, San Jorge, El Refugio y Caño Pescado del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare

Pág-2-

DECIDIMOS

PRIMERO: Elegir democráticamente a las veedoras y veedores que ejerzan control y vigilancia sobre las obras a desarrollar, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará "Veeduría ciudadana para el control de las obras a desarrollar en el marco de la ejecución de los PROYECTOS "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" E "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", GUAVIARE" su campo de acción será en el Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare y tendrá una duración acorde al periodo de Ejecución del contrato con sus respectivas prórrogas si es el caso.

TERCERO: el grupo de control social se compromete a supervisar el desarrollo de las obras y a servir de interlocutor entre la comunidad beneficiaria y la entidad ejecutora del proyecto. Todos sus aportes y actuaciones seguirán los principios que rigen el control social, consagrados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la concertación y el diálogo.

CUARTO: las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

QUINTO: La comunidad elige democráticamente como veedores(as) a los siguientes ciudadanos(as):

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
<i>Ortiz Tabares</i>	<i>1.12428045</i>	<i>Petal</i>	<i>1.12428045</i>



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	---	---

Continuación Acta Conformación de Veeduría Ciudadana vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-

Nombres y Apellidos	Cédula	Vereda	N° de contacto
Campo Elias Buitrago	96361096	cachicoma	3204991015
Rosendo León Peña	17221415	Miro-flora	3132689994
Florentino Guerrero	1120561346	Puerto nuevo	3134589552
Wilson Ceballos	97610781	Cachicoma	3160432289
Jagueline Monge	26427825	Esmeralda	3202103617

Para constancia se firma en la vereda Picalojo, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2022.

Campo Elias Buitrago
Veedor (a) 96361096

Florentino Guerrero
Veedor (a) 1120561346

Rosendo León P.
Veedor (a) 17221415

Wilson Ceballos
Veedor (a) 97610781



	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	---	---

ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022, se reunió la comunidad beneficiada de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", con el objeto de conformar la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015.

CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia les reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad el compromiso por su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

Que la prestación del servicio de energía eléctrica es fundamental para asegurar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos.

Que la comunidad de las veredas San Luis, Caño Negro, Unión Buenos Aires, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuira, Tomachipán, Arawato, Caño Blanco II, Caño Blanco III, del Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, bajo los principios de voluntariedad y gratuidad, ha decidido conformar una veeduría ciudadana, la cual adelantará el ejercicio de control social a los trabajos a desarrollar objeto de los proyectos: "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 115 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 492 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE", "SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOLAR FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL PARA EL CENTRO POBLADO DE TOMACHIPÁN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE" Y "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 281 USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE".




	FORMATO ACTA CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA	
---	--	---


Continuación Acta Conformación de Veeduría Corregimiento de Boquerón Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare Pág-3-


EMIRO Basallo	Guayabales	CL 77266 875	CL 305 2134822
Patricia vega	Caño Haku	CC 1120565705	3219417314
Pablo Vargard	Bochivero	3099693	3147186868
Luis Alberto Calle	Guayabales	LG 545228	3219372384

Para constancia se firma en el Corregimiento del Boquerón, Municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, a los veintitrés (26) días del mes de Junio de 2022.


Veedor (a) 77266875


Veedor (a) 1120565705


Veedor (a) 1100953536


Veedor (a) 816545228



ASPECTOS FINANCIEROS

Se inició el trámite de la facturación del primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del Contrato Nol. 158 de 2022 Proyecto – San José del Guaviare (Tomachipán) por medio de la factura No. UTIG-11 por un valor de \$28,145,700.00

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incidentes, actos o condiciones inseguras

Durante la ejecución de las actividades y para el presente informe, no se recibieron reportes de condiciones o actos inseguros. Del mismo modo se presentaron cero (0) incidentes laborales.

Accidentes laborales

Para la fecha del presente informe, no se presentaron accidentes de tipo laboral, se acaba el mes con cero casos positivos o sospechosos para CoVid-19.

Planillas de seguridad social

Se adjuntan como anexos a este informe las respectivas planillas de seguridad social del personal que se encuentra vinculado al proyecto durante el periodo de este informe.
