

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Comité de seguimiento semanal 5, semana del 13 de febrero al 19 de febrero de 2023; 2022-2025		
FECHA 23/02/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Magda Fabiola Rojas Ramírez	TPD
Camilo Ardila	TPD
Juliana Cristina Arévalo	SDM-SS
Felipe Saenz Barrero	TPD
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM-DIT
Laura Catalina Henao Corredor	SDM-DIT
Alfredo Ardila	TPD
Sandro Castañeda Villegas	TPD

2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de generalidades del contrato 2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila 3. Recomendaciones y conclusiones 4. Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>1. Presentación de generalidades del contrato</p> <p>El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 2025 de 2022 • Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. • Acta de inicio del 16 de enero de 2023 • Duración: 10 meses <p>2. Informe de seguimiento de avance semanal</p> <p>El director del proyecto informa que se entregó la versión 2 atendiendo las observaciones realizadas por la supervisión del contrato de los tramos: 5_6 Calle 84 sur entre carrera 14 y carrera 9A, 4_12 Avenida carrera 10 entre calle 35A sur y calle 37 sur, 2_73 Calle 59 con TV 1A, 18_6 Carrera 9A entre calle 48B Bis B sur y carrera 51 y 19_20 Carrera 17A entre calle 81F Bis sur y Acceso a GEM.</p> <p>También se informa que se recibió aprobación del informe de la etapa 1 de los tramos 11_16 Calle 170 entre Carrera 90 y carrera 92; y 3_32 Avenida Circunvalar entre calle 30 y calle 30B.</p> <p>El avance logrado en la ejecución del contrato durante la semana, en el cual se hizo énfasis en la entrega de los informes correspondientes a etapa 1 en versión 2 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20 y la aprobación de los informes</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0


TEMA	Comité de seguimiento semanal 5, semana del 13 de febrero al 19 de febrero de 2023; 2022-2025		
FECHA	23/02/2023	HORA	07:00
		LUGAR Virtual	: https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

correspondientes a etapa 1 de los tramos 11_16 y 3_32.

Se presenta el avance por metas

 <p>Etapa 1 Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 5</p> <p>Aprobados: 2</p>	 <p>Etapa 2 Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 0</p>	 <p>Etapa 3 Diseño de sistemas de contención vehicular</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 0</p>	 <p>Etapa 4 Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 0</p>
--	--	--	---

Total tramos en proceso: 7

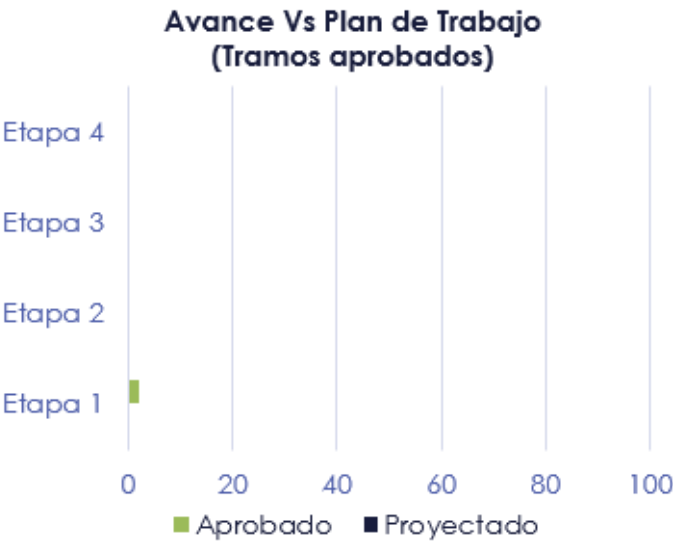

Avance ejecución financiera

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité de seguimiento semanal 5, semana del 13 de febrero al 19 de febrero de 2023; 2022-2025	
FECHA 23/02/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



3. Recomendaciones y conclusiones

- Se logró la aprobación de la etapa 1 de los tramos 11_6 y 3_32
- Se presentó la V2 de los dos tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20
- Se espera la aprobación de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20 para iniciar etapa 2.

4. Temas de la SDM

Se reitera que de ser necesaria una mesa de trabajo la supervisión está presta a realizarla.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A	N/A	N/A

APROBADO


JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
 SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025


CAMILO ARDILA
 DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
