

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 1 de 136

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISION No 2

**CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 452 DE 2022**

**OBJETO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 452 - 2022
“INTERVENTORIA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER - LOTE 1”**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO:

PERIODO DESDE EL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023

ING. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO

SUPERVISOR

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 2 de 136

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
3	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
4	CONTRATO DE OBRA	6
4.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	6
5	LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS	7
6	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN	8
6.1	ACTIVIDADES TÉCNICAS	8
6.1.1	ALVAREZ.	8
6.1.2	SAN ALONSO.	8
6.1.3	MEJORAS PUBLICAS.	9
6.1.4	ESPERANZA III.	9
6.1.5	LA AURORA.	10
6.1.6	BUENOS AIRES	11
6.1.7	BOLIVAR	11
6.1.8	GARCIA ROVIRA	12
6.2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12
6.3	ACTIVIDADES AMBIENTALES	13
6.4	ACTIVIDADES FINANCIERA	13
7	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	15
8	ANEXOS	16

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 3 de 136

1 INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de Bucaramanga ha desarrollado un proyecto que contempla el mantenimiento y mejoramiento de las vías de la ciudad de Bucaramanga, reemplazando el pavimento dañado por un nuevo pavimento que cumpla con los estándares de calidad INVIAS. El proyecto **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1, objeto de la INTERVENTORÍA** se localiza en la zona urbana del municipio de Bucaramanga.

El trabajo de mantenimiento incluirá el parcheo y el reemplazo continuo de mezcla MDC-19 en las vías de la Ciudad de los Municipios I, II, II, IV, XIII, XIV y XV que se han deteriorado debido al daño, ya que estos caminos han llegado en gran medida al final de su vida útil, estas condiciones deben ser reparadas para garantizar la seguridad, la comodidad y la seguridad de los usuarios. Además del alcance del contrato, contempla actividades de mejoramiento de la red vial en caso de ser necesario, y su obra incluirá intervenciones para cambiar la capa granular y la capa asfáltica según sea necesario. Los barrios objeto de este contrato de obra pública son: Barrio de Granada, Barrio de San Francisco, Barrio de Giraldo, Barrio de Alarcón, Barrio de Antonia Santos y Barrio de Mejoramiento Público. Asimismo, de acuerdo con el presupuesto de participación, se realizarán obras de mejoramiento vial en las siguientes zonas: Barrio Altos del Progreso, Barrio Esperanza III, Barrio Álvarez, Barrio la Aurora, Barrio Buena Vista, Barrio Buenos Aires, Barrio Miraflores y Barrio Venado de Oro.

La interventoría realiza la supervisión Técnica, Financiera, Legal, Administrativa, Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, a fin de cumplir con el objeto contractual del contrato de obra No. 405 del 2022. Tiene la labor de cumplir una función natural o jurídica, para controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto, las condiciones y los términos y las especificaciones del contrato de obra.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 4 de 136

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de interventoría de obra pública de infraestructura del transporte No. 452 DE 2022 cuyo OBJETO es: **“INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1”**, tiene como objetivo general ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 405 de 2022, donde el interventor verifica el cumplimiento de las condiciones pactadas y está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1”**.

El Contrato de obra fue adjudicado mediante el proceso de licitación pública SI-SI-LP-017-2022, con un valor inicial de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS \$ 7.542.347.806).

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 5 de 136

3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la tabla No. 1 se muestra la información general del contrato de Interventoría al Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial Urbana del Municipio de Bucaramanga, Santander.

CONTRATO No.:	452 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
VALOR INICIAL:	\$ 1.785.020.081,00 MCTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL + ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	NUEVE (09) MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO PROVENZA
NIT:	901.667.932-0
SUPERVISOR:	ING. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA, SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA No. 1 Información general del contrato de Interventoría.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 6 de 136

4 CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la tabla No. 2 se muestra la información general del contrato de obra Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial Urbana del Municipio de Bucaramanga, Santander.

PROCESO LICITATORIO No.	SI-SI-LP-017-2022
CONTRATO DE OBRA No.:	405 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1
VALOR INICIAL:	\$ 7.542.347.806 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR INICIAL + ADICIONAL	N/A
VALOR ANTICIPO INICIAL + ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO AM
NIT CONTRATISTA:	901.663.044-7
INTERVENTOR:	CONSORCIO PROVENZA
SUPERVISOR:	ING. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
ANTICIPO (30%)	N/A
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA, SANTANDER.
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TABLA No. 2 Información general del contrato de obra

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 7 de 136

5 LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS

En la tabla No. 3 se presentan los barrios que se intervinieron en el periodo

Nº	BARRIO
1	ALVAREZ
2	SAN ALONSO
3	MEJORAS PUBLICAS
4	ESPERANZA III
5	LA AURORA
6	BUENOS AIRES
7	BOLIVAR
8	GARCÍA ROVIRA

TABLA No. 3 Barrios intervenidos

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 8 de 136

6 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

6.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan las actividades técnicas supervisadas en este periodo, las cuales fueron discriminadas de la siguiente forma:

6.1.1 ALVAREZ.

Se realizaron las siguientes actividades con un área de intervención de 560 M2

- Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).

6.1.2 SAN ALONSO.

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 554,99 M2:

- Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Fresado en pavimento asfáltico
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo).
- Demarcación, señalización, desvíos y manejo de trafico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.
- Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 9 de 136

- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo). Volumen de MDC -19: 49,49 M3
- Concreto clase f (140 kg/cm² ó 2000psi)
- Concreto hidráulico de fraguado rápido mr 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico
- Acero de refuerzo fy 4200 mpa

6.1.3 MEJORAS PUBLICAS.

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 327,43 m²:

- Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40.
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo). Volumen de MDC (bacheo) -19: 36,78 M3
- Demarcación, señalización, desvíos y manejo de trafico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

6.1.4 ESPERANZA III.

Se realizaron las siguientes actividades en el canal de escorrentía:

- Demolición de estructuras
- Canal abierto de aguas lluvias sección libre 1.0x1.0 m, en concreto reforzado clase c (280 kg/cm² ó 4000 psi) e=0.15 m

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 10 de 136

6.1.5 LA AURORA.

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 122,89 m2:

- Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Fresado en pavimento asfáltico
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo).
- Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.
- Fresado en pavimento asfáltico.
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40.
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo). Volumen de MDC -19: 13,25 M3

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 11 de 136

6.1.6 BUENOS AIRES

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 297,015 m2 en el participativo y 196,43 m2 en el área de bacheo:

- Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40.
- Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido MR 43 (FAST TRACK): 46,68 M3
- Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.
- Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40.
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo). Volumen de MDC -19: 19,68 M3

6.1.7 BOLIVAR

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 1303,32 M2:

- Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición).
- Fresado en pavimento asfáltico
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40.
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 (bacheo). Volumen de MDC (bacheo) -19. 1 101,96

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 12 de 136

- Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

6.1.8 GARCIA ROVIRA

Se realizaron las siguientes actividades complementarias:

- Reparación sumidero transversal l= 9m (incluye demolición, anclajes, acero de refuerzo y concreto mr 43 fast track e instalación de rejillas existentes)
- Instalación de rejilla para sumidero tráfico liviano 90x50x5

6.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se verifica la disponibilidad de recurso humano con las exigencias técnicas planteadas por el contrato, adicionalmente verificado el recurso logístico de la interventoría como son vehículo tipo camioneta, motocicletas para el transporte de los inspectores entre los diferentes frentes de obra.
- Se hace seguimiento al personal de Interventoría del personal mínimo requerido, como director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspectores de interventoría, profesional HSEQ, profesional social y personal de topografía, con respecto a los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, cumpliendo con las exigencias técnicas planteadas por el contrato.
- Se verifica informes semanales de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de interventoría.
- Se atiende por parte del interventor las órdenes e instrucciones que el MUNICIPIO le imparte por conducto del supervisor designado para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión del contrato de obra por el MUNICIPIO.
- Se hace seguimiento mediante comités de obra semanales del avance de las actividades llevando un registro del estado inicial, durante la ejecución de las obras, para un mejor control.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 13 de 136

- Se verifica que la interventoría lleve el libro Bitácora, el cual debe estar al día. Se acuerda que dicho libro se llevará por inspector de interventoría en cada frente de obra.

6.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES

En materia de Gestión Ambiental las actividades del contratista durante el periodo del informe fueron:

- Manejo de Vegetación.
- Manejo Integral de Residuos Sólidos y Residuos de Construcción y Demolición.
- Manejo de Instalaciones Temporales.
- Manejo de vertimientos y estructuras Hidráulicas.
- Manejo de Materiales de Construcción.

6.4 ACTIVIDADES FINANCIERA

- La interventoría realizó la respectiva revisión de la documentación exigida para el desembolso del anticipo de obra. Sin embargo el contratista presentó oficio al municipio de Bucaramanga renunciando a ello.
- Se ha solicitado a la Interventoría mantener el apoyo al debido control del presupuesto de actividades.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 14 de 136

En la tabla No. 4 se muestra el resumen financiero contrato de interventoría no 452 del 2022:

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.785.020.081	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$176.708.847	9,90%
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 190.858.126	(EN TRAMITE)
SALDO POR PAGAR A LA FECHA	\$1.608.311.834	(ver nota)

TABLA No. 4 Información financiera del contrato de Interventoría

*NOTA: Acta interventoría N° 2 en trámite.

En la tabla No. 5 se presenta el resumen financiero contrato de obra no 405 del 2022:

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$7.542.347.806	N/A
VALOR ANTICIPO TOTAL (30%)	N/A	30%
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$624.177.426	8,28
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 506.225.854	6,71%
SALDO POR PAGAR A LA FECHA	\$ 6.411.944.525	85,01%

TABLA No. 5 Información financiera del contrato de obra

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 15 de 136

7 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- A la fecha se ha ejecutado el 14,99% equivalente a \$ 1.130.403.103

Las comunas que se han intervenido son:

- En la comuna 13 se ha invertido \$4.910.843,48 en presupuesto participativo en vía del barrio Álvarez, un resalto parabólico en el barrio San Alonso y se realizaron bacheos en los barrios San Alonso, Mejoras públicas, La Aurora y Bolívar dando una inversión de \$ 295.756.011,50
- En la comuna 2, barrio Esperanza III, hay ejecutado \$112.670.120,60 de presupuesto participativo.
- En la comuna 14, barrio Buenos Aires se trabajó en el presupuesto participativo se invirtió \$53.918.498,08. También se invirtieron \$26.455.967,91 en trabajos de bacheo en el mismo barrio.
- En la comuna 15 se realizó trabajos de reemplazo y mejoramiento de rejillas de sumidero con una inversión de \$11.000.700,63
- A la fecha de cierre del presente informe contratista no cumplió con el programa de inversión y el programa de obra, evidenciando un atraso del 4,39% que equivale a \$ 331.109.068,68
- Mediante memorandos técnicos se aprobaron los alcances estructurales de las actividades de pavimentación de las intervenciones con presupuesto participativos del Calle 15 entre carreras 56 y 57 del Barrio Buenos Aires y la carrera 39 del Barrio Álvarez.
- Dentro del alcance del contratista, Consorcio AM, se le solicito intervenir de forma inmediata las vías principales.
- En el periodo anterior mediante oficio CAM-GG-2.4-0027-23 contratista renuncia voluntariamente al anticipo del 30% del valor del contrato 405 de 2022
- Igualmente surgió la necesidad del Contratista CONSORCIO AM elevara la solicitud de gestión de aprobación de mayores cantidades de obra ante la Interventoría, por lo tanto, se aprobaron las mayores cantidades de obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. Estas mayores cantidades de obra se ajustaron a los ítems y precios que para cada uno de ellos, se encontraban previstos en la oferta, por lo que se firma en acta de Modificación No.1 el 14 de marzo del 2023.
- Al aprobar el PMT el día 17 de febrero de 2023 queda en manos de los especialistas en tránsito la regulación de este en los diferentes frentes de obra adicionalmente se deben realizar comités de seguimientos mensual.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 16 de 136

8 ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SECTOR BARRIO ALVAREZ– COMUNA 13

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
 <p>viernes, 03 marzo 2023 7°7'30.318"N - 73°6'31.422"W Cl. 35 #38 25, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>viernes, 03 marzo 2023 7°7'30.48"N - 73°6'31.026"W Cl. 35 #38 25, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (03 de marzo de 2023)	

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
 <p>viernes, 03 marzo 2023 7°7'32.064"N - 73°6'31.794"W Cra. 39 #3457, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>viernes, 03 marzo 2023 7°7'33.436"N - 73°6'32.49"W Cra. 39 #34 13, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Levantamiento topográfico (03 de marzo de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 17 de 136</p>

<p>BARRIO ALVAREZ</p>  <p>viernes, 03 marzo 2023 7°7'30.852"N - 73°6'31.356"W Cra. 39 #3490, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	<p>Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35</p>  <p>sábado, 04 marzo 2023 7°7'30.876"N - 73°6'31.164"W Cra. 39 #3495, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
<p>Descripción: aplicación de asfalto (03 de marzo de 2023)</p>	
<p>BARRIO ALVAREZ</p>  <p>sábado, 04 marzo 2023 7°7'30.798"N - 73°6'31.5"W Cra. 39 #3490, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	<p>Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35</p>  <p>5 mar. 2023 4:44:34 p. m. 7°7'31.95"N - 73°6'31.242"W 3472 Carrera 39 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>
<p>Descripción: Terminación de la aplicación de capa asfáltica (04 de marzo de 2023)</p>	<p>Descripción: estado final pasadas 12 horas (06 de marzo de 2023)</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 18 de 136</p>

<p>BARRIO ALVAREZ</p>	<p>Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35</p>
 <p>9 mar. 2023 4:31:20 p.m. 7°30.642'N 73°6'31.146'W 34 97 Carrera 38 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>	 <p>9 mar. 2023 4:31:07 p.m. 7°30.768'N 73°6'31.182'W 34 97 Carrera 38 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>
<p>Descripción: Recorrido y demarcación (09 de marzo de 2023)</p>	<p>Descripción: Recorrido y demarcación (09 de marzo de 2023)</p>

<p>BARRIO ALVAREZ</p>	<p>Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35</p>
 <p>10 mar. 2023 5:10:51 p.m. 7°30.444'N 73°6'31.770'W #38 25 Calle 38 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>	 <p>13 mar. 2023 8:33:55 a.m. 7°30.528'N 73°6'31.026'W #38 25 Calle 35 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>
<p>Descripción: Recorrido y demarcación (09 de marzo de 2023)</p>	<p>Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (13 de marzo de 2023)</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 19 de 136

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
 <p>13 mar. 2023 9:46:36 a. m. 7°7'34.494"N - 73°6'32.07"W 34A - 29 Carrera 37 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>	 <p>13 mar. 2023 2:25:13 p. m. 7°7'30.816"N - 73°6'31.308"W 3495 Carrera 39 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>
Descripción: Reposición de tubería por parte del acueducto metropolitano (13 de marzo de 2023)	Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (13 de marzo de 2023)

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
 <p>13 mar. 2023 2:14:08 p. m. 7°7'31.944"N - 73°6'31.476"W 3469 Carrera 39 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>	 <p>13 mar. 2023 5:02:58 p. m. 7°7'31.392"N - 73°6'31.536"W 34 81 Carrera 39 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio Alvarez</p>
Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (13 de marzo de 2023)	Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (13 de marzo de 2023)

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 20 de 136

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
	
Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (13 de marzo de 2023)	Descripción: Demolición de carpeta asfáltica (14 de marzo de 2023)

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
	
Descripción: Levantamiento topográfico (15 de marzo de 2023)	Descripción: Demolición carpeta asfáltica (15 de marzo de 2023)

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 21 de 136

BARRIO ALVAREZ	Dirección: Cra 39 entre Cll 34 y 35
	
Descripción: Reposición de tubería por parte del acueducto metropolitano (15 de marzo de 2023)	Descripción: Demolición carpeta asfáltica (15 de marzo de 2023)

SECTOR BARRIO SAN FRANCISCO– COMUNA 3

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #17-65 y Cll 14 #26-24
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)
BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 15 #18-24 y Cra 19 #15-30

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 22 de 136

	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023) BARRIO SAN FRANCISCO	
Dirección: Cra 18 #18-13 y Cra 18 #17-65	
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 23 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 14 #26-24 y Cll 15 #18-54
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 12:00 7°7'59.28"N - 73°7'39.924"W Barrio San Francisco Calle 14 #26-24 Caja #96</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:57 7°7'57.546"N - 73°7'37.884"W Barrio San Francisco Calle 15 #18-54 Caja #97</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 19 #15-0 y Cra 18 #18-13
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:47 7°7'55.788"N - 73°7'36.942"W Barrio San Francisco Cra 19 #15-30 Caja #94</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:07 7°7'47.31"N - 73°7'35.442"W Barrio San Francisco Cra 18 #18-13 Caja #112</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 24 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #16-71
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: BLV SANTANDER #18-28
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 25 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: BLV SANTANDER #18-78
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 22 con Cll 18
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 26 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: BLV Santander #20-06 y Cra 23 #19-28
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #20-11 y Cra 18 #21-64
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 27 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 23 #19-38 y Cra 23 #19-14
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:08 7°7'49.032"N - 73°7'16.794"W Barrio San Francisco Cra 23 #19-38 Caja #39</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:15 7°7'47.166"N - 73°7'22.734"W Barrio San Francisco Cra 23 #19-14 Caja #42</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 22 #16-20 y Cra 18 #20-15
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:28 7°7'34.6"N - 73°7'41.052"W Barrio San Francisco Calle 22 #16-20 Caja #43</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:32 7°7'40.614"N - 73°7'37.374"W Barrio San Francisco Cra 18 #20-15 Caja #44</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 28 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: calle 38 #32-62 y calle 32 con 31
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:33 7°7'41.034"N -73°7'37.146"W Barrio San Francisco Cra 18 #20-11 Caja #45</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:37 7°7'46.420"N -73°7'36.72"W Barrio San Francisco Cra 18 #21-64 Caja #46</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 35 #32-101 y calle 33 #38-17
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:42 7°7'42"N -73°7'34.47"W Barrio San Francisco Cra 19 #19-42 Caja #47</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:52 7°7'45.864"N -73°7'33.996"W Barrio San Francisco Cra 20 #19-27 Caja #48</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 29 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #19-35 y Cra 20 #19-60
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:53 7°7'45.474"N - 73°7'33.492"W Barrio San Francisco Cra 20 #19-35 Caja #50</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:56 7°7'43.782"N - 73°7'31.272"W Barrio San Francisco Cra 20 #19-60 Caja #51</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #18-09 y Cra 20 #20-00
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 10:47 7°7'48.282"N - 73°7'32.484"W Barrio San Francisco Cra 20 #18-09 Caja #48</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:00 7°7'42.144"N - 73°7'30.858"W Barrio San Francisco Cra 20 #20-00 Caja #53</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 30 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #20-42 y Cra 20 #19-68
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #20-77 y Cra 20 #21-07
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 31 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #21-21 y Cra 20 #20-72
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:11 7°7'39.12"N 73°7'30.378"W Barrio San Francisco Cra 20 #21-21 Caja #58</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:04 7°7'40.38"N 73°7'30.918"W Barrio San Francisco Cra 20 #20-72 Caja #55</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 21 #21-78 y Cra 21 #21-22
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:22 7°7'37.794"N 73°7'25.773"W Barrio San Francisco Cra 21 #21-78 Caja #59</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:26 7°7'37.488"N 73°7'26.628"W Barrio San Francisco Cra 21 con calle 21-22 Caja #55</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 32 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #21-21 y Cra 21 #20-13
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:31 7°7'58.892"N 73°7'30.066"W Barrio San Francisco Cra 20 #21-21 Caja #68</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:31 7°7'42.414"N 73°7'27.996"W Barrio San Francisco Cra 21 #20-13 Caja #90</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 21 #20-13 y Cra 21 #21-02
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:33 7°7'43.122"N 73°7'27.942"W Barrio San Francisco Cra 21 #20-13 Caja #60</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 11:35 7°7'43.374"N 73°7'28.428"W Barrio San Francisco Cra 21 #21-02 Caja #66</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 33 de 136</p>

<p>BARRIO SAN FRANCISCO</p>	<p>Dirección: Calle 34a #43-27 y Calle 34 #43-22</p>
	
<p>Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO SAN FRANCISCO</p>	<p>Dirección: CALLE 36 CON CARRERA 35 DESDE EL PR 0+000 AL PR 0+68,58</p>
	
<p>Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 34 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección:
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Calle 34 #43-22 y Cra 43 #33a-89
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 35 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 44 #34-13 y Calle 34a #43-11
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 13:56 7°7'46.758"N - 73°7'24.60"W Barrio San Francisco Cra 22 # 21-77 Caja #66</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:08 7°7'38.982"N - 73°7'35.466"W Barrio San Francisco Calle 21 #18-40 Caja #69</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 43 #33a-89 y calle 34 #43-22
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:14 7°7'42.92"N - 73°7'31.022"W Barrio San Francisco Calle 20 #20-15 Caja #70</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:24 7°7'47.142"N - 73°7'24.886"W Barrio San Francisco Calle 19 #22-02 Caja #72</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 36 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: CII 19#22-02 y CII 19 #22-42
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:25 7°7'47.046"N -73°7'25.41"W Barrio San Francisco Calle 19 #22-02 Caja #72</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:22 7°7'47.388"N -73°7'24.102"W Barrio San Francisco Calle 19 #22-42 Caja #71</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: CII 19 #19-30 y CII 19 #19-30
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:37 7°7'45.192"N -73°7'33.66"W Barrio San Francisco Calle 19 #19-30 Caja #74</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:37 7°7'45.426"N -73°7'33.984"W Barrio San Francisco Calle 19 #19-30 Caja #74</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 37 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 18 #20-21 y Cll 19 #21-20
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:43 7°7'49.146"N - 73°17'30.99"W Barrio San Francisco Calle 18 #20-21 Caja #75</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:33 7°7'46.026"N - 73°17'30.36"W Barrio San Francisco Calle 19 entre cra 21-20 Caja #73</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 18 con Cra 21 BLV Bolívar y Cll 18 #25-26
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 14:55 7°7'49.842"N - 73°17'28.026"W Barrio San Francisco Calle 18 con Cra 21 y Boulevard Bolívar Caja #76</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:00 7°7'52.026"N - 73°17'17.154"W Barrio San Francisco Calle 18 con Cra 25-26 Caja #77</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 38 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 18 con Cra 21 y BLV Bolívar y Cll 18 #25-26
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 18 #25-26
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 39 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: CII 20 #24-27
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:11 7°7'45.906"N -73°7'17.598"W Barrio San Francisco Calle 20 #24-27 Caja #78</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:11 7°7'45.984"N -73°7'15.93"W Barrio San Francisco Calle 20 #24-27 Caja #78</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: CII 18 #25-26 y CII 19 #23-24
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:01 7°7'51.996"N -73°7'16.23"W Barrio San Francisco Calle 18 con cra 25-26 Caja #77</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:21 7°7'48.186"N -73°7'20.79"W Barrio San Francisco Calle 19 #23-24 Caja #80</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 40 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 19 #23-34 y Cra 22 #16-12
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:22 7°7'49.21"N - 73°7'26.82"W Barrio San Francisco Calle 19 #23-34 Caja #80</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:49 7°7'55.038"N - 73°7'27.342"W Barrio San Francisco Cra 22 # 16-12 Caja #87</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 19 #23-54 y Cra 22 #17-49
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:21 7°7'48.042"N - 73°7'20.268"W Barrio San Francisco Calle 19 #23-54 Caja #79</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:53 7°7'51.054"N - 73°7'27.326"W Barrio San Francisco Cra 22 # 17-49 Caja #82</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 41 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 22 #17-49 y Cra 28 SENA
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 15:59 7°7'50.868"N - 73°7'26.418"W Barrio San Francisco Cra 22 # 17-49 Caja #82</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 16:07 7°8'0.474"N - 73°7'9.672"W Barrio San Francisco Cra 28 - Sena Caja #83</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: CRA 28 Sena y Cra 22 #17-49
 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 16:02 7°8'0.27"N - 73°7'9.684"W Barrio San Francisco Cra 28 - Sena Caja #83</p>	 <p>miércoles, 15 de febrero de 2023 16:53 7°7'51.084"N - 73°7'26.874"W Barrio San Francisco Cra 22 # 17-49 Caja #82</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 42 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 28 SENA y Cra 20 #16-39
	
Descripción Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 20 #17-72 y Cra 19 #18-16
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 43 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 19 #17-78 y Cra 19 #17-66
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #16-71 y Cra 19 #17-26
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 44 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 19 #17-04 y Cll 17 #18-68
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:30 7°7'50.868"N -73°7'36.084"W Barrio San Francisco Cra 19 #17-04 Caja #91</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:38 7°7'51.131"N -73°7'36.226"W Barrio San Francisco Calle 17 #18-68 Caja #92</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 19 #17-26 y Cra 19 #15-30
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:28 7°7'50.611"N -73°7'37.692"W Barrio San Francisco Cra 19 #17-26 Caja #90</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:47 7°7'55.788"N -73°7'36.942"W Barrio San Francisco Cra 19 #15-30 Caja #94</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 45 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 19 #15-60 y Cll 15 #18-62
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:43 7°7'55.512"N -73°7'37.782"W Barrio San Francisco Cra 19 #15-60 Caja #93</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:55 7°7'56.232"N -73°7'37.53"W Barrio San Francisco Calle 15 #18-62 Caja #96</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 15 #18-54 y Cra 19 #15-16
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:57 7°7'57.546"N -73°7'37.884"W Barrio San Francisco Calle 15 #18-54 Caja #97</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 11:49 7°7'56.574"N -73°7'39.138"W Barrio San Francisco Cra 19 #15-16 Caja #95</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 46 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 14 #14-41 y Cra 18 #15-65
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 12:05 7°7'57.774"N - 73°7'39.966"W Barrio San Francisco Calle 14 #14-41 Caja #99</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 12:16 7°7'54.402"N - 73°7'40.002"W Barrio San Francisco Cra 18 #15-65 Caja #102</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #15-65 y Cra 18 con Cll 15 intersección
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 12:16 7°7'54.552"N - 73°7'39.864"W Barrio San Francisco Cra 18 #15-65 Caja #102</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 12:07 7°7'56.85"N - 73°7'40.134"W Barrio San Francisco Cra 18 con calle 15 - Intersección Caja #100</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 47 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #16-65 y Cra 18 #17-09
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #17-01 y Cra 18 #17-65
	
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 48 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #17-46 y Cra 18 #17-09
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:00 7°7'47.25"N 73°7'39.912"W Barrio San Francisco Cra 18 #17-46 Caja #108</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 12:30 7°7'49.374"N 73°7'38.784"W Barrio San Francisco Cra 18 #17-09 Caja #108</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #17-53 y Cra 18 #17-29
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:02 7°7'47.244"N 73°7'39.66"W Barrio San Francisco Cra 18 #17-53 Caja #109</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:03 7°7'47.016"N 73°7'40.782"W Barrio San Francisco Cra 18 #17-29 Caja #110</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 49 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #17-46 y Cra 18 #18-13
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:07 7°7'47.418"N 73°7'37.344"W Barrio San Francisco Cra 18 #17-46 Caja #108</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:07 7°7'47.31"N 73°7'38.442"W Barrio San Francisco Cra 18 #18-13 Caja #112</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #18-27 y Cra 18 #18-49
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:09 7°7'46.734"N 73°7'38.348"W Barrio San Francisco Cra 18 #18-27 Caja #113</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:12 7°7'45.942"N 73°7'37.992"W Barrio San Francisco Cra 18 #18-49 Caja #114</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 50 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 #17-03 y Cll 19 #18-40
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:04 7°7'46.938"N - 73°7'41.214"W Barrio San Francisco Cra 18 #17-03 Caja #111</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:20 7°7'45.078"N - 73°7'36.108"W Barrio San Francisco Calle 19 #18-40 Caja #118</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 18 con Cll 19 y Cll 18 #19-22
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:17 7°7'44.532"N - 73°7'38.022"W Barrio San Francisco Cra 18 con calle 19 Caja #115</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:25 7°7'43.962"N - 73°7'37.956"W Barrio San Francisco Calle 18 #19-22 Caja #118</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 51 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 18 #19-31 y Cll 18 #19-22
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:30 7°7'42.636"N - 73°7'37.74"W Barrio San Francisco Calle 18 #19-31 Caja #119</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:24 7°7'44.572"N - 73°7'37.062"W Barrio San Francisco Calle 18 #19-22 Caja #117</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 17 #20-13 y Cra 17 con Cll 17
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:37 7°7'40.398"N - 73°7'40.23"W Barrio San Francisco Cra 17 #20-13 Caja #121</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:39 7°7'40.864"N - 73°7'40.306"W Barrio San Francisco Cra 17 con Calle 17 Caja #122</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 52 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 17 #20-54 y Cra 17 #19-64
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:34 7°7'38.784"N 73°7'39.954"W Barrio San Francisco cra 17 #20-54 Caja #120</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:59 7°7'41.424"N 73°7'40.374"W Barrio San Francisco cra 17 #19-64 Caja #124</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 17 #19-50 y Cra 17 #19-40
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:00 7°7'42.006"N 73°7'40.512"W Barrio San Francisco cra 17 #19-50 Caja #125</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:02 7°7'42.564"N 73°7'40.554"W Barrio San Francisco cra 17 #19-40 Caja #126</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 53 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 17 #16-56 y Cra 17 #18-02
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 14:57 7°7'45.992"N - 73°7'40.992"W Barrio San Francisco calle 17 #16-56 Caja #123</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:07 7°7'46.884"N - 73°7'41.568"W Barrio San Francisco cra 17 #18-02 Caja #127</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 17 #17-74 y Cra 17 #17-78
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:09 7°7'47.508"N - 73°7'41.664"W Barrio San Francisco cra 17 #17-74 Caja #129</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:08 7°7'47.154"N - 73°7'41.718"W Barrio San Francisco cra 17 #17-78 Caja #128</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 54 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 17 #16-02 y Cll 16 #16-14
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:15 7°7'52.638"N -73°7'42.798"W Barrio San Francisco cra 17 #16-02 Caja #130</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:22 7°7'52.536"N -73°7'44.916"W Barrio San Francisco calle 16 #16-14 Caja #133</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 16 #16-39 y Cra 17 #14-68
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:18 7°7'52.83"N -73°7'44.094"W Barrio San Francisco calle 16 #16-39 Caja #132</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:31 7°7'57.114"N -73°7'43.494"W Barrio San Francisco cra 17 #14-68 Caja #136</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 55 de 136

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cll 15 #16-11 y Cll 15 #16-11
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:42 7°7'55.686"N - 73°7'44.526"W Barrio San Francisco calle 15#16-11 Caja #138</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:42 7°7'55.752"N - 73°7'44.724"W Barrio San Francisco calle 15#16-11 Caja #138</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN FRANCISCO	Dirección: Cra 17 entre Cll 14 y 15 y Cll 15 #16-11
 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:35 7°7'57.564"N - 73°7'43.488"W Barrio San Francisco cra 17 entre calles 14 y 15 Caja #137</p>	 <p>jueves, 16 de febrero de 2023 15:43 7°7'55.83"N - 73°7'45.228"W Barrio San Francisco calle 15#16-11 Caja #138</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (16 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 56 de 136

SECTOR BARRIO SAN ALONSO– COMUNA 13

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #17-31 y Cll 17 #30-07
	
Descripción: Fresado y aplicación de emulsión asfáltica (21 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #17-41 y Cra 32A #18-56
	
Descripción: Fresado y aplicación de emulsión asfáltica y aplicación de carpeta asfáltica (21 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 57 de 136</p>

<p>BARRIO SAN ALONSO</p>	<p>Dirección: Cra 32a #18-56 y Cra 30 #18-04</p>
 <p>21/02/2023 4:36:36 p. m. 7°7'55,674 N -73°7'1,824 W Cra. 32a #1856, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 5:09:56 p. m. 7°7'54,012 N -73°7'1,92 W Cra. 30 #18-04 SEGUNDO PISO, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>
<p>Descripción: Fresado y aplicación de carpeta asfáltica (21 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO SAN ALONSO</p>	<p>Dirección: Cra 30 #18-34 y Cra 30 #17-70</p>
 <p>21/02/2023 5:45:23 p. m. 7°7'53,862 N -73°7'2,977 W Cra. 30 #18-34, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 6:15:28 p. m. 7°7'54,93 N -73°7'2,97 W Cra. 30 #17-70, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>
<p>Descripción: Fresado y aplicación de carpeta asfáltica (21 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 58 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #16-24 y Cra #17-48
 <p>21/02/2023 8:59:57 a. m. Swiss grid E: 8991150 N: 931857 Cra. 30 #16-24, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 9:37:01 a. m. Swiss grid E: 8991254 N: 931739 Cra. 30 #17-48, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>
Descripción: Señalización del PMT para inicios de trabajos (21 de febrero 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #16-76 y Cl 17 #30-08
 <p>21/02/2023 9:38:39 a. m. Swiss grid E: 8991197 N: 931793 Cra. 30 #16-76, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 9:47:47 a. m. Swiss grid E: 8991207 N: 931793 Cl. 17 #30-08, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>
Descripción: Fresado (21 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 59 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 29 entre Cll 30 y 31
	
Descripción: Corte de carpeta asfáltica existente (24 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 29 entre Cll 30 y 31
	
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 60 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 29 entre Cll 30 y 31
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7° 34.254' N - 73° 7' 3.709' W cra 29 entre calle 30 y calle 31 caja 28</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7° 35.136' N - 73° 7' 4.32' W cra 29 entre calle 30 y calle 31 caja 26A</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #18-55
 <p>21/02/2023 11:14:30 a. m. Swiss grid E: 8991333 N: 931630 Cra. 30 #1855, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 4:56:35 p. m. 7° 52.856' N - 73° 7' 1.956' W Cra. 30 #18-44, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. san alonso</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #8 (21 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 61 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #16-76
 <p>21/02/2023 9:12:18 a. m. Swiss and E: 8991134 N: 931748 Cra. 30 #16-76 Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza Barrio San Alonso</p>	 <p>21/02/2023 1:58:43 p. m. 77°57'74" N - 73°72'36" W C. 17 #3097 Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza Barrio San Alonso</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #1 (21 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #16-76
 <p>21/02/2023 2:35:53 p. m. 77°57'268" N - 73°72'4956" W Cra. 30 #16-76 Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza Barrio San Alonso</p>	 <p>21/02/2023 4:46:18 p. m. 77°57'572" N - 73°72'874" W C. 17 #3097 Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza Barrio San Alonso</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #1 (21 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 62 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #17-32
 <p>21/02/2023 9:24:12 a.m. Swiss grid E-8991234 N-931757 Cra. 30 #17-32, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 4:47:28 p. m. 7°7'56,832 N -73°7'3,228"W Cra. 30 #17-41, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #2 (21 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #17-48
 <p>21/02/2023 9:26:53 a.m. Swiss grid E-8991262 N-931750 Cra. 30 #17-48, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 4:48:14 p. m. 7°7'56,394 N -73°7'3,15"W Cra. 30 #17-48, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #3 (21 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 63 de 136</p>

<p>BARRIO SAN ALONSO</p>	<p>Dirección: Cra 30 #17-56</p>
 <p>21/02/2023 9:35:37 a. m. Swiss grid E: 8991268 N: 931726 Cra. 30 #17-56, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 4:49:09 p. m. 7°7'55,326"N - 73°7'3,222"W Cra. 30 #17-61, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>
<p>Descripción: Antes y después de intervención caja #4 (21 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO SAN ALONSO</p>	<p>Dirección: Cra 30 #18-04</p>
 <p>21/02/2023 4:50:30 p. m. 7°7'54,708"N - 73°7'2,892"W Cra. 30 #18-04, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>	 <p>21/02/2023 6:48:36 p. m. 7°7'54,702"N - 73°7'3,036"W Cra. 30 #18-4, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. san alonso</p>
<p>Descripción: Antes y después de intervención caja #6 (21 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 64 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #18-37
 <p>21/02/2023 11:15:00 a. m. Swiss grid E: 8991322 N: 931657 Cra. 30 #18-37, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: san alonso</p>	 <p>21/02/2023 4:36:36 p. m. 7°7'55,674 N -73°7'1,824 W Cra. 32a #1856, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: san alonso</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #7 (21 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #19-23
 <p>23/02/2023 7:49:46 a. m. 7°7'50,574 N -73°7'1,854 W Cra. 30 #1923, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>23/02/2023 3:44:10 p. m. 7°7'50,412 N -73°7'2,015 W Cra. 30 #19-38, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #9 (23 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 65 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #19-53
	
Descripción: Antes y después de intervención caja #9 (23 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #19-44
	
Descripción: Antes y después de intervención caja #10 (23 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 66 de 136

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #19-56
 <p>23/02/2023 7:52:20 a. m. 7°7'49,278 N -73°7'1,752 W Cra. 30 #19-56, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza barrio Mejoras públicas</p>	 <p>23/02/2023 3:43:08 p. m. 7°7'48,544 N -73°7'1,731 W Cra. 30 #19-56, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza barrio Mejoras públicas</p>
Descripción: Antes y después de intervención caja #11 (23 de febrero de 2023)	

BARRIO SAN ALONSO	Dirección: Cra 30 #19-59
	
Descripción: Antes y después reductor de velocidad (15 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 67 de 136

SECTOR BARRIO ALBANIA– COMUNA 14

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 #23-06 y Cra 50 #26-57
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°8'0.612"N - 73°6'19.224"W Barrio Albania cra 50 #23-06 caja 2</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'58.021"N - 73°6'18.865"W Barrio Albania cra 50 #26-57 caja 6</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 colegio Oriente y Cra 50 #26-51
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°8'1.892"N - 73°6'19.512"W Barrio Albania cra 50 - Colegio del Oriente caja 1</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'58.458"N - 73°6'18.966"W Barrio Albania cra 50 #26-51 caja 4</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 68 de 136

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 #26-57 y Cra 50 #27-09
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'58.021"N - 73°6'18.865"W Barrio Albania cra 50 #26-57 caja 5</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'56.88"N - 73°6'19.974"W Barrio Albania cra 50 #27-09 caja 6</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 #26-43 y sobre muro
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'58.521"N - 73°6'18.74"W Barrio Albania cra 50 #26-43 caja 3</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'51.596"N - 73°6'19.961"W Barrio Albania Sobre muro caja 7</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 69 de 136

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cr 50 #29-02 y Cra 50 #29-13
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'51.624"N -73°6'20.094"W Barrio Albania Cra 50 #29-02 caja 8</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'51.474"N -73°6'20.796"W Barrio Albania Cra 50 #29-13 caja 9</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 #29-39 y sobre muro
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'50.476"N -73°6'20.286"W Barrio Albania Cra 50 #29-39 caja 10</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'54.906"N -73°6'19.206"W Barrio Albania Sobre muro caja 7</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 70 de 136

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 #31-50 y Cra 50 #31-78
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'45.768"N - 73°6'20.652"W Barrio Albania Cra 50 #31-50 caja 12</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'44.626"N - 73°6'20.27"W Barrio Albania Cra 50 #31-78 caja 13</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

BARRIO ALBANIA	Dirección: Cra 50 #49-73 y Cra 50 #31-25
 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'44.183"N - 73°6'21.093"W Barrio Albania Cra 50 #49-73 caja 14</p>	 <p>viernes, 24 de febrero de 2023 7°7'46.632"N - 73°6'20.832"W Barrio Albania Cra 50 #31-25 caja 11</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (24 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 71 de 136

SECTOR BARRIO GARCIA ROVIRA– COMUNA 15

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
	
Descripción: Trabajos en rejillas de sumidero (20 de febrero de 2023)	

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
	
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 72 de 136</p>

<p>BARRIO GARCIA ROVIRA</p>	<p>Dirección: Cra 13con Cll 33</p>
 <p> lunes, 20 de febrero de 2023 11:39 7°7'10.56"N -73°7'43.98"W Cra 13 calle 33 </p>	 <p> martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.476"N -73°7'43.95"W Cra 13 calle 33 </p>
<p>Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO GARCIA ROVIRA</p>	<p>Dirección: Cra 13con Cll 33</p>
 <p> martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.566"N -73°7'44.136"W Cra 13 calle 33 </p>	 <p> martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.422"N -73°7'43.59"W Cra 13 calle 33 </p>
<p>Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 73 de 136

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
	
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
	
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 74 de 136

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
 <p>martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.476"N -73°7'43.95"W Cra 13 calle 33</p>	 <p>martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.566"N -73°7'44.136"W Cra 13 calle 33</p>
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
 <p>martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.092"N -73°7'44.01"W Cra 13 calle 33</p>	 <p>martes, 21 de febrero de 2023 7°7'10.422"N -73°7'43.59"W Cra 13 calle 33</p>
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 75 de 136</p>

<p>BARRIO GARCIA ROVIRA</p>	<p>Dirección: Cra 13con Cll 33</p>
	
<p>Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO GARCIA ROVIRA</p>	<p>Dirección: Cra 13con Cll 33</p>
	
<p>Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 76 de 136

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
	
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

BARRIO GARCIA ROVIRA	Dirección: Cra 13con Cll 33
	
Descripción: Intervención sumidero (27 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 77 de 136

SECTOR BARRIO BUENOS AIRES– COMUNA 14

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>martes, 07 marzo 2023 7°56'23.2"N 73°6'5.51"W Cl. 14 #5648, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>martes, 07 marzo 2023 7°56'57.18"N 73°6'6.57"W Cra. 56 #14.52, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Remoción de carpeta asfáltica existente (07 de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>martes, 07 marzo 2023 7°56'8.32"N 73°6'6.24"W Cl. 14 #50.148, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>martes, 07 marzo 2023 7°56'7.36"N 73°6'7.08"W Cl. 14 #50.148, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Remoción de carpeta asfáltica existente (07 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 78 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>martes, 07 marzo 2023 7°7'56.094"N - 73°6'4.812"W a. 57 #15 09, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>martes, 07 marzo 2023 7°7'56.64"N - 73°6'5.916"W a. 57 #1531, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Colocación de señalización (07de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>martes, 07 marzo 2023 7°7'56.268"N - 73°6'4.92"W a. 57 #15 09, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>martes, 07 marzo 2023 7°7'57.006"N - 73°6'6.548"W Cl. 14 #5615, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: levantamiento topográfico y remoción de carpeta asfáltica (07 de marzo de 2023)	

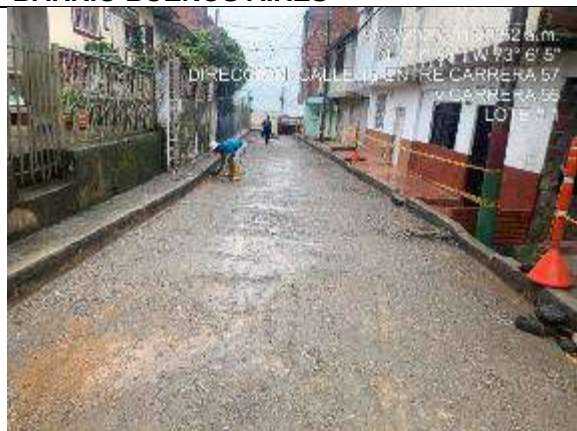
 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 79 de 136</p>

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
	
<p>Descripción: Recolección de escombros (08 de marzo de 2023)</p>	

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
	
<p>Descripción: Remoción de carpeta asfáltica (08 de marzo de 2023)</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 80 de 136</p>

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
	
<p>Descripción: Compactación de subbase (09 de marzo de 2023)</p>	

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
	
<p>Descripción: Compactación de subbase (09 de marzo de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 81 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
	
Descripción: Llegada de acero para su instalación (09 de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
	
Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (09 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 82 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p> jueves, 09 marzo 2023 7° 54' 52" N - 73° 6' 5.004" W Cl. 14 #50148, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> jueves, 09 marzo 2023 7° 57' 11" N - 73° 6' 5.294" W Cl. 14 #5615, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (09 de marzo 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p> jueves, 09 marzo 2023 7° 55' 32" N - 73° 6' 5.088" W Cl. 14 #5648, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> jueves, 09 marzo 2023 7° 55' 46" N - 73° 6' 4.88" W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (09 de marzo 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 83 de 136</p>

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'57.534"N -73°6'5.874"W Cra 56 #14 52, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.736"N -73°6'6.202"W Cra 56 #50 148, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
<p>Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (10 de marzo 2023)</p>	

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.208"N -73°6'4.818"W Cra 57 #15 09, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.736"N -73°6'6.192"W Cra 56 #56 15, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
<p>Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (10 de marzo 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 84 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.742"N - 73°6'5.472"W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.604"N - 73°6'5.742"W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Inicio de vaciado de concreto (10 de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.688"N - 73°6'5.502"W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>viernes, 10 marzo 2023 7°7'56.916"N - 73°6'6.282"W Cl. 14 #5617, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Inicio de vaciado de concreto (10 de marzo de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 85 de 136</p>

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
 <p>Lunes, 13 marzo 2023 7°56'582"N - 73°6'084"W Cl. 14 #56-13, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>Lunes, 13 marzo 2023 7°56'582"N - 73°6'084"W Cl. 14 #56-17, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
<p>Descripción: Vaciado de concreto (13 de marzo de 2023)</p>	

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
 <p>Lunes, 13 marzo 2023 7°56'582"N - 73°6'084"W Cl. 14 #56-18, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>Lunes, 13 marzo 2023 7°56'584"N - 73°6'526"W Cl. 14 #56-13, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
<p>Descripción: Vaciado de concreto (13 de marzo de 2023)</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 86 de 136</p>

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
 <p> Lunes, 13 marzo 2023 7°7'56.658"N -73°6'5.562"W Cl. 14 #5621, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> Lunes, 13 marzo 2023 7°7'56.082"N -73°6'5.49"W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
<p>Descripción: Vaciado de concreto (13 de marzo de 2023)</p>	

<p>BARRIO BUENOS AIRES</p>	<p>Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57</p>
 <p> Lunes, 13 marzo 2023 7°7'56.61"N -73°6'5.658"W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> Lunes, 13 marzo 2023 7°7'56.925"N -73°6'5.06"W Cl. 14 #5617, Comuna 14 Morronico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
<p>Descripción: Vaciado de concreto y macro texturizado (13 de marzo de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 87 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p> Jueves, 15 marzo 2023 7°7'56.88"N - 73°6'5.928"W Cl. 14 #56-21, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> Jueves, 15 marzo 2023 7°7'56.88"N - 73°6'5.928"W Cl. 14 #56-21, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
Descripción: Vaciado de concreto y macro texturizado (13 de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p> Jueves, 15 marzo 2023 7°7'56.88"N - 73°6'5.928"W Cl. 14 #56-21, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> martes, 14 marzo 2023 7°7'56.502"N - 73°6'4.998"W Cl. 14 #56-13, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
Descripción: Vaciado de concreto y macro texturizado (14 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 88 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p> martes, 14 marzo 2023 7°7'56.58"N - 73°6'5.112"W a. 57 #15 12, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> martes, 14 marzo 2023 7°7'56.58"N - 73°6'5.097"W Cl. 14 #5643, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (14 de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p> martes, 14 marzo 2023 7°7'56.322"N - 73°6'4.608"W a. 57 #15 09, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>	 <p> martes, 14 marzo 2023 7°7'56.04"N - 73°6'4.642"W a. 57 #15 12, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA </p>
Descripción: Vaciado de concreto (14 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 89 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°7'56.148"N - 73°6'4.74"W a. 57 #15 12, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°7'56.112"N - 73°6'4.704"W a. 57 #15 09, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Instalación de acero de refuerzo y transferencia (15 de marzo de 2023)	

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°7'56.322"N - 73°6'4.548"W a. 57 #15 09, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°7'56.208"N - 73°6'4.668"W a. 57 #15 09, Comuna 14 Morrorico, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Inicio de vaciado de concreto (15 de marzo de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 90 de 136

BARRIO BUENOS AIRES	Dirección: Calle 15 entre Cra 56 y 57
	
Descripción: vaciado de concreto (15 de marzo de 2023)	

SECTOR BARRIO ESPERANZA III – COMUNA 2

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Inspección del canal de escorrentía (25 de febrero de 2023)	
BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 91 de 136



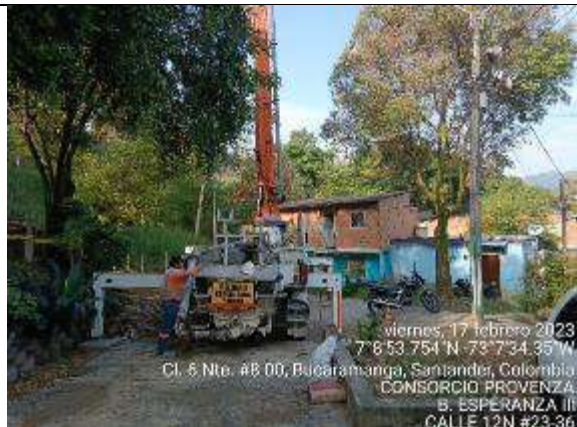
Descripción: Inspección del canal de escorrentía (25 de febrero de 2023)



Descripción: Equipos utilizados para el canal de escorrentía (25 de febrero de 2023)

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 92 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Remoción de material orgánico en canal de escorrentía (26 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Remoción de material orgánico en canal de escorrentía (26 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 93 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Retroescavadora para remoción de material orgánico (26 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Remoción de material orgánico en canal de escorrentía (26 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 94 de 136</p>

<p>BARRIO ESPERANZA III</p>	<p>Dirección: Calle 12 con Cra 23</p>
 <p>sábado, 18 febrero 2023 7° 53' 802" N 73° 7' 34" 572" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>	 <p>sábado, 18 febrero 2023 7° 53' 802" N 73° 7' 34" 572" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>
<p>Descripción: Remoción de material organico en canal de escorrentía (26 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO ESPERANZA III</p>	<p>Dirección: Calle 12 con Cra 23</p>
 <p>sábado, 18 febrero 2023 7° 53' 802" N 73° 7' 34" 572" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>	 <p>sábado, 18 febrero 2023 7° 53' 802" N 73° 7' 34" 572" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>
<p>Descripción: Demolición y excavación para conformación de cuneta nueva (27 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 95 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Demolición y excavación para conformación de cuneta nueva (27 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Demolición y excavación para conformación de cuneta nueva (27 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 96 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Demolición y excavación para conformación de cuneta nueva (27 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Demolición y excavación para conformación de cuneta nueva (27 de febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 97 de 136</p>

<p>BARRIO ESPERANZA III</p>	<p>Dirección: Calle 12 con Cra 23</p>
	
<p>Descripción: Demolición y excavación para conformación de cuneta nueva (27 de febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO ESPERANZA III</p>	<p>Dirección: Calle 12 con Cra 23</p>
	
<p>Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 98 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 99 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 100 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 101 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 102 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 103 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 104 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 105 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 106 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
 <p>sábado, 25 febrero 2023 7°8'54.282" N -73°7'35.472" W CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>	 <p>martes, 28 febrero 2023 7°8'53.76" N -73°7'36.12" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
 <p>martes, 28 febrero 2023 7°8'54.09" N -73°7'36.348" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>	 <p>martes, 28 febrero 2023 7°8'54.144" N -73°7'36.336" W Cl. 12 #23-36, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA B. ESPERANZA III CALLE 12N #23-36</p>
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 107 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 108 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 109 de 136

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

BARRIO ESPERANZA III	Dirección: Calle 12 con Cra 23
	
Descripción: Excavación para conformación de canal y remoción de escombros (28 de febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 110 de 136

SECTOR BARRIO MEJORAS PUBLICAS – COMUNA 13

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: ClI 32 #27-71 y Cra 28 #31-69
 <p>20/02/2023 1:24:37 p.m. Swiss grid E:4992041 N:931166 Cl. 32 #27-71, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza barrio: mejoras publicas</p>	 <p>20/02/2023 1:20:35 p.m. Swiss grid E:4992055 N:931176 Cra. 28 #31-69, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza barrio: mejoras publicas</p>
Descripción: Inicio corte para intervención (20 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: ClI 32 #27-63
 <p>22/02/2023 1:39:27 p.m. 7°7'29,916 N -73°7'3,702 W Cl. 32 #27-63, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>22/02/2023 1:39:37 p.m. 7°7'29,976 N -73°7'3,618 W Cl. 32 #27-63, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza barrio: Mejoras publicas</p>
Descripción: Demolición e instalación de material asfáltico (20 de Febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 111 de 136</p>

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Calle 32 #27-63 y Cll 32 #28-05</p>
 <p>22/02/2023 1:40:27 p. m. 7°7'30,156" N - 73°7'3,006" W Cl. 32 #27-63, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>22/02/2023 1:55:03 p. m. 7°7'31,152" N - 73°7'4,996" W Cl. 32 #28/05, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>
<p>Descripción: Demolición de carpeta existente (22 de Febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Calle 32 #27-71 y Cll 32 #27-43</p>
 <p>22/02/2023 4:40:03 p. m. 7°7'29,624" N - 73°7'3,888" W Cl. 32 #27-71, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>22/02/2023 4:58:24 a. m. 7°7'29,706" N - 73°7'3,384" W Cl. 32 #27-43, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>
<p>Descripción: Riego de Imprimación (22 de Febrero de 2023)</p>	

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Calle 32 #27-71 y Cll 32 #27-63</p>
 <p>22/02/2023 9:44:26 a. m. 7°7'30,285" N - 73°7'2,568" W Cl. 32 #27-71, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>22/02/2023 8:55:22 a. m. 7°7'29,855" N - 73°7'3,394" W Cl. 32 #27-63, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio: Mejoras publicas</p>
<p>Descripción: Demolición y compactación (22 de Febrero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 112 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #27-69 y Cll 32 #27-69
 <p>22/02/2023 11:21:14 a. m. 7°7'30,511" N -73°7'1,167" W Cll. 32 #27-69, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>22/02/2023 11:21:36 a. m. 7°7'29,916" N -73°7'2,748" W Cll. 32 #27-69, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza barrio: Mejoras publicas</p>
Descripción: Riego de imprimación (22 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #19-38 y Cra 30 #21-23
 <p>23/02/2023 1:38:31 p. m. 7°7'50,226" N -73°7'1,356" W Cra. 30 #19-38, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza barrio: Mejoras publicas</p>	 <p>jueves, 23 de febrero de 2023 7°7'45,371" N -73°7'1,303" W Cra 30 #21-23 caja 12</p>
Descripción: Fresado (23 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 113 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #21-23 y Cra 30 #19-67
	
Descripción: Fresado y aplicación de material asfáltico (23 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #19-38 y Cra 30 #19-25
	
Descripción: Fresado y aplicación de material asfáltico (23 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 114 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #19-60 y Cra 30 #18-72
 <p>23/02/2023 8:11:17 a. m. 7°7'51,264" N -73°72,34"W Cra. 30 #calle 19-60, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza. barrio. Mejoras publicas</p>	 <p>23/02/2023 8:07:43 a. m. 7°7'51,18" N -73°73,858"W Cra. 30 #18-72, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza. barrio. Mejoras publicas</p>
Descripción: Instalación de señalización (23 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #19-25
 <p>23/02/2023 8:24:32 a. m. 7°7'50,634" N -73°72,07"W Cra. 30 #1925, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza. barrio. Mejoras publicas</p>	 <p>23/02/2023 8:24:42 a. m. 7°7'50,532" N -73°72,16"W Cra. 30 #1925, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza. barrio. Mejoras publicas</p>
Descripción: Inicio de fresado (23 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 115 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #19-60
	
Descripción: Visita señor Alcalde a los frentes de obra (23 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #19-60 y Cra 30 entre Clls 19 y 20
	
Descripción: Fresado (23 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 entre Cll 19 y 20
	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 116 de 136

Descripción: Fresado (23 de Febrero de 2023)

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cra 30 #21-23
	
Descripción: Recorrido y demarcaciones (23 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #27-69
	
Descripción: Intervención de la caja #5 (22 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 117 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #27-63
 <p>22/02/2023 7:59:47 a. m. 2772 Calle 32 Mejoras Públicas Bucaramanga Santander</p>	 <p>22/02/2023 7:07:06 p. m. 7°7'30,348" N -73°7'2,982" W Cl. 32 #27-63, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. Mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención de la caja #6 (22 de Febrero de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #27-63
 <p>22/02/2023 8:00:10 a. m. 27-80 Calle 32 Mejoras Públicas Bucaramanga Santander</p>	 <p>22/02/2023 7:07:22 p. m. 7°7'30,372" N -73°7'2,754" W Cl. 32 #27-63, Bucaramanga, Santander, Colombia Consorcio Provenza, barrio. Mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención de la caja #7 (22 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 118 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #27-71
 <p>22/02/2023 8:02:22 a. m. 28/05 Calle 32 Bucaramanga Santander</p>	 <p>22/02/2023 7:07:44 p. m. 7°7'30.744" N -73°7'2.142" W Cl. 32 #27-71, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. Mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención de la caja #8 (22 de Febrero de 2023))	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #28-05
 <p>22/02/2023 3:07:17 p. m. 7°7'31.344" N -73°7'1.812" W Cra: 28 #31-69, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. Mejoras publicas</p>	 <p>22/02/2023 7:08:15 p. m. 7°7'31.278" N -73°7'1.98" W Cl. 32 #28/05, Bucaramanga, Santander, Colombia Consortio Provenza, barrio. Mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención de la caja #9 (22 de Febrero de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 119 de 136</p>

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Cll 32 #31-28</p>
	
<p>Descripción: Intervención de la caja #12 (14 de Marzo de 2023)</p>	

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Cll 32 #31-64</p>
	
<p>Descripción: Intervención de la caja #11 (14 de Marzo de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 120 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #31-15
 <p>14 mar. 2023 11:26:30 a. m. 7°7'35.22"N - 73°6'53.76"W 31-05 Calle 32 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>14 mar. 2023 1:56:36 p. m. 7°7'35.73"N - 73°6'53.346"W 31-15 Calle 32 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
Descripción: Demolición carpeta asfáltica existente (14 de marzo de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #31-54
 <p>14 mar. 2023 6:09:38 p. m. 7°7'36.444"N - 73°6'50.85"W 3154 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>14 mar. 2023 6:09:32 p. m. 7°7'36.36"N - 73°6'50.982"W 3154 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
Descripción: Demolición de carpeta asfáltica existente (14 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 121 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #31-54
 <p>14 mar. 2023 6:07:56 p. m. 7°7'36.15"N - 73°6'51.81"W 3154 Calle 32 Mejoras Públicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>15 mar. 2023 9:31:36 a. m. 7°7'35.13"N - 73°6'53.622"W 30.70 Calle 32 Mejoras Públicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención caja #12 (15 de marzo de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #32-64
 <p>15 mar. 2023 9:27:48 a. m. 7°7'37.368"N - 73°6'48.702"W 32.64 Calle 32 Mejoras Públicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>15 mar. 2023 1:29:31 p. m. 7°7'35.52"N - 73°6'53.538"W 31.15 Calle 32 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
Descripción: señalización e intervención (15 de marzo de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 122 de 136

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #52-32
 <p>15 mar. 2023 1:44:22 p. m. 7°7'37.162"N - 73°6'49.194"W 32-62 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>15 mar. 2023 2:52:07 p. m. 7°7'35.632"N - 73°6'51.582"W 32-62 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención caja #12 (15 de marzo de 2023)	

BARRIO MEJORAS PUBLICAS	Dirección: Cll 32 #32-64
 <p>15 mar. 2023 4:34:25 p. m. 7°7'37.314"N - 73°6'49.152"W 32-64 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>15 mar. 2023 4:04:00 p. m. 7°7'37.494"N - 73°6'48.93"W 32-64 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
Descripción: Intervención caja #13 (15 de marzo de 2023)	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 123 de 136</p>

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Cll 32 #32-52</p>
 <p>15.mar. 2023 5:01:26 p. m. 7°7'37.662"N -73°6'49.104"W 32-52 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>15.mar. 2023 6:38:23 p. m. 7°7'37.56"N -73°6'49.272"W #32-106 Calle 32 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
<p>Descripción: Recorrido y demarcaciones (24 de Enero de 2023)</p>	

<p>BARRIO MEJORAS PUBLICAS</p>	<p>Dirección: Cll 32 #32-64</p>
 <p>15.mar. 2023 6:34:22 p. m. 7°7'37.878"N -73°6'48.504"W 3264 Calle 32 Mejoras Publicas Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>	 <p>15.mar. 2023 6:28:35 p. m. 7°7'37.854"N -73°6'49.385"W #32-106 Calle 32 Bucaramanga Santander consorcio provenza barrio mejoras publicas</p>
<p>Descripción: Recorrido y demarcaciones (24 de Enero de 2023)</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 124 de 136

SECTOR BARRIO GRANADA – COMUNA 4

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #25-26 y Cra 12 con Cll 21
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:52 7°7'27.266"N-73°7'55.116"W Barrio Granada Cra 11 con calle 25-26 Caja #64</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:01 7°7'33.804"N-73°7'54.402"W Barrio Granada Cra 12 con calle 21 Caja #65</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 12 con Cll 28 y Cra 11 #23-15
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:25 7°7'21.216"N-73°7'50.346"W Barrio Granada Cra 12 con calle 28 Caja #53</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:28 7°7'27.444"N-73°7'55.992"W Barrio Granada Cra 11 #23-15 Caja #63</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 125 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 25 #13-44 y Cra 13 #24-77
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:10 7°7'26.592"N - 73°7'47.622"W Barrio Granada Calle 25 #13-44 Caja #46</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:17 7°7'23.982"N - 73°7'49.242"W Barrio Granada Cra 13 #24-77 Caja #49</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 24 #13-14 y Cra 13 #24-02
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:12 7°7'26.442"N - 73°7'49.032"W Barrio Granada Calle 24 #13-14 Caja #17</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:14 7°7'25.956"N - 73°7'49.674"W Barrio Granada Cra 13 #24-02 Caja #43</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 126 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 25 #13-44 y Cra 13 con Cll 16
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:10 7°7'26.592"N -73°7'47.622"W Barrio Granada Calle 25 #13-44 Caja #46</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:19 7°7'23.712"N -73°7'49.326"W Barrio Granada Cra 13 con calle 16 Caja #50</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 13 #24-77 y Cll 28 #12-15
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:17 7°7'23.976"N -73°7'49.224"W Barrio Granada Cra 13 #24-77 Caja #19</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:26 7°7'20.712"N -73°7'50.838"W Barrio Granada Calle 28 #12-15 Caja #52</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 127 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 26 #12-11 y Cra 12 #23-72
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:33 7°7'22.606"N - 73°7'52.092"W Barrio Granada Calle 26 entre cra 12-11 Caja #54</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:39 7°7'26.118"N - 73°7'52.794"W Barrio Granada Cra 12 #23-72 Caja #54</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 12 con Cll 28 y Cra 12 con Cll 23
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:25 7°7'21.216"N - 73°7'50.346"W Barrio Granada Cra 12 con calle 28 Caja #54</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 10:48 7°7'28.518"N - 73°7'53.31"W Barrio Granada Cra 12 #23 Caja #54</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 128 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 23 #11-58 y Cra 12 #23-33
	
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 23 #11-38 y Cll 23 #11-42
	
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 129 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #21-22 y Cra 12 con Cll 21
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:16 7°7'32.16"N-73°7'58.994"W Barrio Granada Cra 11 entre calle 21-22 Caja #65</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:01 7°7'33.804"N-73°7'54.402"W Barrio Granada Cra 12 con calle 21 Caja #67</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #23-15 y Cll 23 con Cra 11
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:26 7°7'27.504"N-73°7'56.956"W Barrio Granada Cra 11 #23-15 Caja #65</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:27 7°7'28.35"N-73°7'55.704"W Barrio Granada Calle 23 con Cra 11 Caja #67</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 130 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #24-26 y Cra 11 con ClI 24
	
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #25-26 y Cra 11 #25-36
	
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 131 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 con ClI 27 y Cra 11 #24-44
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:54 7°7'20.988"N - 73°7'54.612"W Barrio Granada Cra 11 con calle 27 Caja #73</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:47 7°7'23.46"N - 73°7'55.158"W Barrio Granada Cra 11 con calle 24-44 Caja #68</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #27-28 y Cra 11 #10-27
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 12:00 7°7'19.98"N - 73°7'54.42"W Barrio Granada Cra 11 #27-28 Caja #73</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 12:04 7°7'19.128"N - 73°7'54.456"W Barrio Granada Cra 11 #10-27 Caja #74</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 132 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 11 #28-30 y Cll 27 #10-11
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 12:05 7°7'18.18"N -73°7'54"W Barrio Granada Cra 11 428-30 Caja #75</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 11:55 7°7'20.898"N -73°7'54.648"W Barrio Granada Calle 27 entre carreras 10-11 Caja #72</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 28 #10-35 y Cll 27 con Cra 20
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:23 7°7'18.036"N -73°7'55.264"W Barrio Granada Calle 28 #10-35 Caja #77</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:29 7°7'19.812"N -73°7'57.222"W Barrio Granada Calle 27 cra 20 Caja #78</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 133 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 28 #10-62 y Cll 25 con Cra 10
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:20 7°7'18.594"N -73°7'55.038"W Barrio Granada Calle 28 #10-62 Caja #74</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:35 7°7'22.842"N -73°7'58.428"W Barrio Granada Calle 25 cara 10 Caja #75</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 10 con Cll 10 y Cra 10 #23-06
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:39 7°7'24.348"N -73°7'58.482"W Barrio Granada Cra 10 con calle 10 Caja #81</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:42 7°7'26.868"N -73°7'59.046"W Barrio Granada Cra 10 #23-06 Caja #82</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 134 de 136

BARRIO GRANADA	Dirección: Cll 25 #10-14 y Cra 10 con Cll 23
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:36 7°7'22.73473"N - 73°7'57.864"W Barrio Granada Calle 25 #10-14 Caja #80</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:46 7°7'21.72"N - 73°7'59.064"W Barrio Granada Cra 10 con calle 23 Caja #84</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

BARRIO GRANADA	Dirección: Cra 10 #22-63 y Cll 23 #10-14
 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:48 7°7'26.302"N - 73°7'58.98"W Barrio Granada Cra 10 #22-63 Caja #85</p>	 <p>viernes, 17 de febrero de 2023 14:44 7°7'27.708"N - 73°7'58.332"W Barrio Granada Calle 23 #10-14 Caja #83</p>
Descripción: Recorrido y demarcación (17 de Febrero de 2023)	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 135 de 136

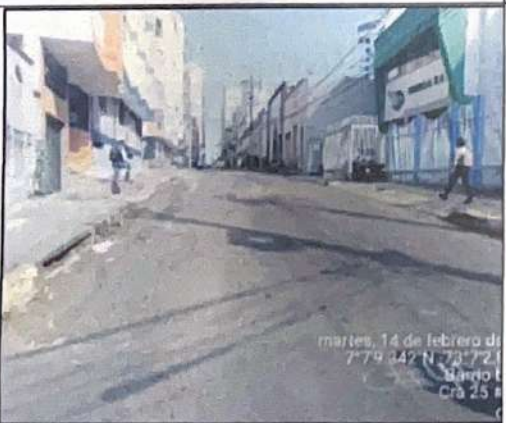
SECTOR BARRIO BOLIVAR – COMUNA 15


BARRIO CENTRO	Dirección: Cll 45 con Cra 21
 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°6'59.225"N - 73°7'11.514"W Cra 21, Cl. 45 #esquina, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°6'59.178"N - 73°7'11.496"W Cl. 45 #21.1, Bolívar, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Señalización para inicio de trabajos (15 de marzo de 2023)	

BARRIO CENTRO	Dirección: Cll 45 con Cra 22
 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°7'0.51"N - 73°7'9.252"W Cra. 22 #41-65, Bolívar, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>miércoles, 15 marzo 2023 7°6'59.688"N - 73°7'11.556"W Cra. 22 #4532, Nuevo Sotomayor, Bucaramanga, Santander, Colombia CONSORCIO PROVENZA</p>
Descripción: Señalización para inicio de trabajos e inicio de fresado (15 de marzo de 2023)	

 Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 136 de 136

BARRIO BOLIVAR	
 jue, marzo 16, 2023 01:40a. 7°7'1"N -73°7'8" Lote 2 caja397carrera 22con calle #1	 jue, marzo 16, 2023 07:25a. 7°7'1"N -73°7'
Dirección: CRA 22 CON CALLE 45 ORIENTE - OCCIDENTE	

BARRIO BOLIVAR	
 martes, 14 de febrero de 7°7'9"42"N -73°7'21" Cra 25 #	 18 mar 2023 4:58:08 a. m. 7°7'9"N -73°7'2"W 342' N Cl. 40 #2469, Bolivar, Bucaramanga, Santander, Colombia Altitud: 1013.0m Velocidad: 0.0km/h caj #47 #Bga
Dirección: CRA 25 #39-13	


Ing. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO *ANC*
 Supervisor contrato de interventoría
 Profesional Especializado.
 Secretaría de Infraestructura

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 1 de 75

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISION No 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 452 DE 2022

**OBJETO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 452 - 2022
“INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER – LOTE 2”**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO:

PERIODO DESDE EL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023

**ING. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
SUPERVISOR**

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 2 de 75

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
3.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
3.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
4.	CONTRATO DE OBRA	6
4.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	6
4.2.	LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS	7
5.	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA ENTRE EL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023. Visitas periódicas y comités de obra	7
6.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	16
7.	ACTIVIDADES AMBIENTALES	17
8.	ACTIVIDADES FINANCIERA	17
9.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	18
10.	ANEXOS	20

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 3 de 75

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto **INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2**, objeto de la **INTERVENTORÍA** se localiza en la zona urbana del municipio de Bucaramanga.

La interventoría realiza la supervisión Técnica, Financiera, Legal, Administrativa, Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, a fin de cumplir con el objeto contractual del contrato de obra No. 406 del 2022. Tiene la labor de cumplir una función natural o jurídica, para controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto, las condiciones y los términos y las especificaciones del contrato de obra.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 4 de 75

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de interventoría de obra pública de infraestructura del transporte No. 452 DE 2022 cuyo OBJETO es: **“INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”**, tiene como objetivo general ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra No. 406 de 2022, donde el interventor verifica el cumplimiento de las condiciones pactadas y está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado **“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”- LOTE 2.**

El Contrato de obra fue adjudicado mediante el proceso de licitación pública SI-SI-LP-017-2022, con un valor inicial de SIETE MIL SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS (\$ 7.007.204.406,00).

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 5 de 75

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.:	452 DEL 30 DE DICIEMBRE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 1.785.020.081,00 MCTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL + ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	NUEVE (09) MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO PROVENZA
NIT:	901.667.932-0
SUPERVISOR:	ING. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA, SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 6 de 75

4. CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

PROCESO LICITATORIO No.	SI-SI-LP-017-2022
CONTRATO DE OBRA No.:	406 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2
VALOR INICIAL:	\$ 7.007.204.406,00 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR INICIAL + ADICIONAL	\$ 7.007.204.406,00
VALOR ANTICIPO INICIAL + ADICIONAL	\$2.102.161.321,80
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS PA-PEI
NIT CONTRATISTA:	901.664.680-6
INTERVENTOR:	CONSORCIO PROVENZA
SUPERVISOR:	ING. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
ANTICIPO (30%)	\$2.102.161.321,80
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA, SANTANDER.
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 7 de 75

4.2. LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS

Nº	BARRIO
1	LA CONCORDIA
2	LA VICTORIA
3	C. REAL DE MINAS
4	CABECERA DEL LLANO
5	BOLARQUI
6	LAS MERCEDES
7	CONUCOS
8	EL TEJAR
9	MUTIS
10	LA GRAN LADERA (PARTICIPATIVO)

5. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA ENTRE EL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023. Visitas periódicas y comités de obra

Comuna 6, La concordia barrio: La Concordia.

Se realizaron las siguientes actividades de fresado con un área de intervención de 2164,24 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 1,93 m³.

Base granular para bacheo clase B. Volumen de base: 1,93m³

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 8 de 75

Fresado en pavimento asfáltico. Volumen de fresado: 166,16m³

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 2164,24 m².

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo). Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 166,16 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

Obras complementarias

Suministro tapa núcleo para pozo de inspección en concreto: 1 Unidad

Renivelación de corona pozos de inspección alcantarillado y/o cajas de inspección servicios públicos: 1 Unidad

Barrio: La Victoria

Calle 67 #18-31 Parroquia (POMPEYANO) - LA VICTORIA

Área intervenida reductor de velocidad tipo pompeyano: 45,50m²

Demolición de pavimentos rígidos. Volumen de demolición: 0,06m³

Corte de pavimento rígido y/o articulado. Longitud de corte: 5,40ml

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 9,79 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 2,13m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 16,12m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 1009,45 kg

Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo iii (60x60cm). Cantidad 4 unidades.

Calle 67 #11-29 Col.Gimnasio superior - LA VICTORIA – POMPEYANO

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 9 de 75

Área intervenida reductor de velocidad tipo pompeyano: 45,90m²

Demolición de pavimentos rígidos. Volumen de demolición: 0,33m³

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 8,77 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 0,44m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 16,41m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 998,12 kg

Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo iii (60x60cm). Cantidad 4 unidades.

Calle 68 #18-29 col. Aurelio Martínez Mutis Sede C - LA VICTORIA – POMPEYANO

Área intervenida reductor de velocidad tipo pompeyano: 17,32m² (Modulo 1)

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 2,40 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 0,17m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 4,78m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 366,98 kg

Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retro reflectiva tipo III (60x60cm). Cantidad 4 unidades.

Calle 65 No. 18-29 frente al colegio Santa Maria Goretti - POMPEYANO

Área intervenida reductor de velocidad tipo pompeyano: 22,75m² (Modulo 1)

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 10 de 75

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 4,07 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 0,22m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 7,19m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 480,43 kg

Comuna 7, Ciudadela Real de Minas: Barrio Ciudadela Real de Minas

Avda Búcaros No 2-108 Laureles (PARABÓLICO) - REAL DE MINAS

Área intervenida reductor de velocidad tipo parabólico: 28,52m² (finalizado)

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 5,66 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 0,36m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 7,56m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 505,36 kg

Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo iii (60x60cm). Cantidad 2 unidades.

Comuna 12, Cabecera del Llano: Barrio Cabecera del Llano

Se realizaron las siguientes actividades de fresado con un área de intervención de 970,09 m²

Fresado en pavimento asfáltico. Volumen de fresado: 70,93m³

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 970,09 m².

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 11 de 75

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo).
Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 70,93 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

Obras complementarias

Suministro tapa núcleo para pozo de inspección en concreto: 1 Unidad

Renivelación de corona pozos de inspección alcantarillado y/o cajas de inspección servicios públicos: 1 Unidad

Barrio: Bolarqui

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 373,59 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 4,99 m³. BACHEO

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 38,92 m³. ASFALTO

Base granular clase B. Volumen base: 0,94 m³

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales. Volumen: 4,06 m³

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 373,59 m².

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo).
Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 38,92 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 12 de 75

Barrio: Las Mercedes

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 807,60 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 103,09 m³.

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 807,60 m².

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo). Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 103,09 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

Se realizaron las siguientes actividades de fresado con un área de intervención de 1282,38 m²

Fresado en pavimento asfáltico. Volumen de fresado: 101,36 m³

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 1282,38 m².

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo). Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 101,36 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

Barrio: Conucos

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 80,79 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 9,84 m³.

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 80,79 m².

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 13 de 75

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo).
Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 9,84 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

Comuna 16, Lagos del Cacique: Barrio El Tejar

Se realizaron las siguientes actividades de parcheo con un área de intervención de 65,04 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 8,78 m³.

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 65,04 m².

Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (bacheo).
Volumen de MDC -19: Volumen de mezcla 8,78 m³

Demarcación, señalización, desvíos y manejo de tráfico de los frentes en cumplimiento del PMT específico y general.

Comuna 17, Mutis: Barrio Mutis

Calle 55 con cra 5w - PARABÓLICO – MUTIS

Área intervenida reductor de velocidad tipo parabólico: 21,38 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 3,60 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 0,26 m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 5,02 m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 377,50 kg

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 14 de 75

Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo iii (60x60cm). Cantidad 2 unidades.

Calle 60 #8w-92 conjunto residencial Fundadores - MUTIS – PARABÓLICO

Área intervenida reductor de velocidad tipo parabólico: 38,88 m²

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de capas asfálticas y de las subyacentes. (incluye transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación: 6,61 m³.

Concreto clase F (140 kg/cm² ó 2000 Psi). Volumen de concreto: 0,48 m³

Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano) y resalto vehicular parabólico. Volumen de concreto: 9,21 m³

Acero de refuerzo fy (420 Mpa ó 4200 kg/cm² ó 60.000 Psi). Peso acero 684,92 kg

Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo iii (60x60cm). Cantidad 4 unidades.

VIAS PARTICIPATIVAS

LA GRAN LADERA – calle 67 entre cras 16W y 17W:

De acuerdo a la solicitud de la administración municipal se atendió el requerimiento de la realización de la vía de presupuestos participativos, La Gran Ladera – Calle 67 entre cras 16 W y 17 W, perteneciente a la comuna 17 Mutis. El especialista del contratista de obra Obras PA-PEI; ing. David Santos Montero, dio el concepto basado en los ensayos realizados a las muestras obtenidas in situ, obteniendo un diseño de estructura de pavimento con 15 cms de base granular clase B y 8 cms de carpeta asfáltica MDC-19, el cual fue aprobado por el especialista de la interventoría; Ing. Norberto Rivero. Durante la ejecución se realizaron actividades de excavación, instalación de base granular y instalación de mezcla asfáltica MDC-19 y instalación de bordillos.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 15 de 75

Rodadura MDC-19 (CAN₆₀₋₇₀+PA PG 64-22)	8 cms (Riego Imprimación)
Base Granular Clase B (BG-25 o 38) CBR>=95% (>=98%PM)	15 cms
Subrasante CBR>=11% (Min. 95%PM)	

Figura 1. Alternativa Definitiva Pavimento Flexible (Barrio Gran Ladera)
Fuente: Elaboración propia

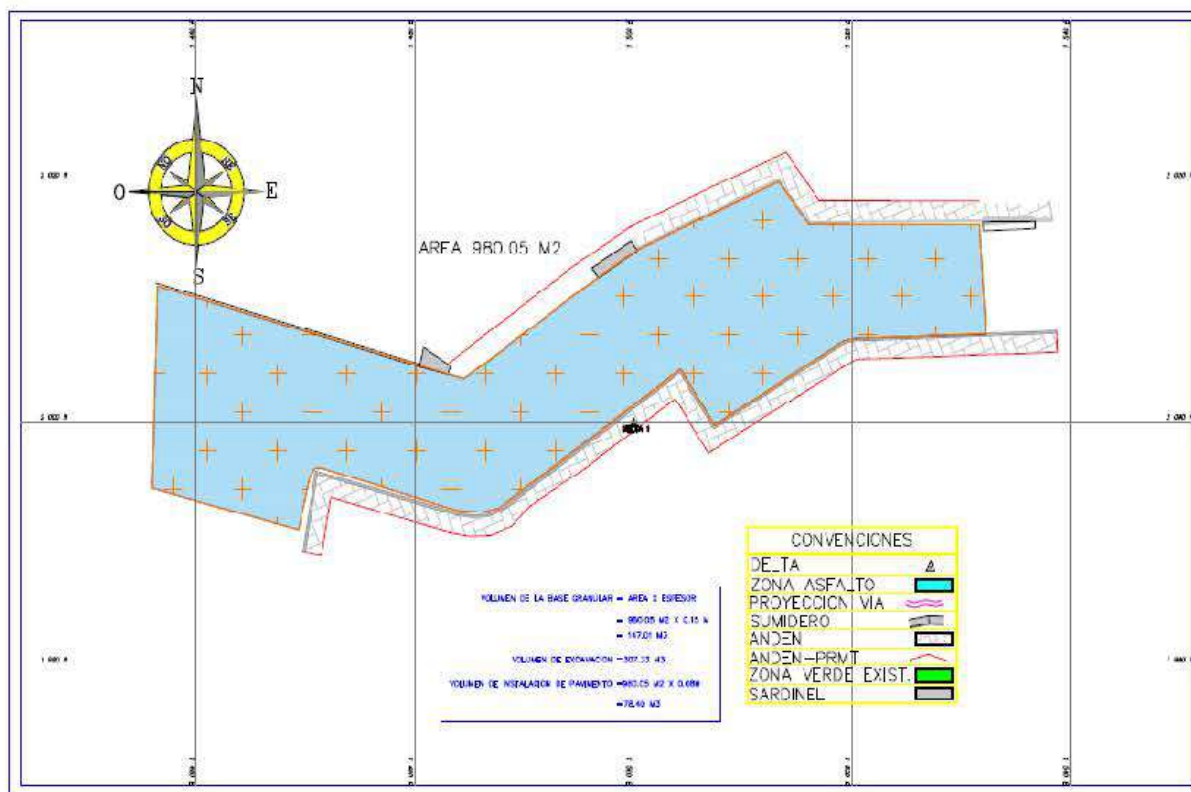


Figura 2. Levantamiento topográfico Sector La Gran Ladera con las áreas de volúmenes de excavación, base granular y asfalto.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 16 de 75

Comuna 17, Mutis: Barrio La Gran Ladera (participativa vía nueva)

- Demolición de pavimentos rígidos. Volumen de demolición: 2,04 m³
- Excavaciones varias en material común en seco (incluye cargue transporte y derechos de disposición). Volumen de excavación (área total del pavimento y bordillos): 307,33 m³
- Base granular clase B. Volumen de base: 147,01 m³
- Conformación de calzada existente. Área de calzada: 980,05 m²
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40. Área intervenida: 980,05 m².
- Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19. Volumen de mezcla: 78,40 m³
- Sardinell recto prefabricado en concreto UC-S10 (0,20x0,50x0,80) (incluye mejoramiento de piso y mortero de pega). Longitud: 55,80 ml

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se verifica la disponibilidad de recurso humano con las exigencias técnicas planteadas por el contrato, adicionalmente verificado el recurso logístico de la interventoría como son vehículo tipo camioneta, motocicletas para el transporte de los inspectores entre los diferentes frentes de obra.
- Se hace seguimiento al personal de Interventoría del personal mínimo requerido, como director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspectores de interventoría, profesional HSEQ, profesional social y personal de topografía, con respecto a los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, cumpliendo con las exigencias técnicas planteadas por el contrato.
- Se verifica informes semanales de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de interventoría.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 17 de 75

- Se atiende por parte del interventor las órdenes e instrucciones que el MUNICIPIO le imparte por conducto del supervisor designado para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión del contrato de obra por el MUNICIPIO.
- Se hace seguimiento mediante comités de obra semanales del avance de las actividades llevando un registro del estado inicial, durante la ejecución de las obras, para un mejor control.
- Se verifica que la interventoría lleve el libro Bitácora, el cual debe estar al día. Se acuerda que dicho libro se llevará por inspector de interventoría en cada frente de obra.

7. ACTIVIDADES AMBIENTALES

En materia de Gestión Ambiental las actividades del contratista durante el periodo del informe fueron:

- Manejo de Vegetación.
- Manejo Integral de Residuos Sólidos y Residuos de Construcción y Demolición.
- Manejo de Materiales de Construcción.

8. ACTIVIDADES FINANCIERA

- La interventoría se encuentra revisando la respectiva validación y revisión de la documentación exigida para el desembolso del anticipo de obra, garantizando de esta forma el cumplimiento de estos por parte del contratista de Obra.
- Se ha solicitado a la Interventoría mantener el apoyo en el debido control del presupuesto de actividades.

 Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 18 de 75

Cuadro De Resumen Financiero Contrato De Interventoría No 452 del 2022:

DESCRIPCION	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.785.020.081	
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 176.708.247	\$ 159.037.422,30
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 190.858.126	En tramite
SALDO POR PAGAR A LA FECHA	\$ 1.608.311.834	VER NOTA

NOTA: El acta de interventoría N°2 se encuentra en trámite.

Cuadro De Resumen Financiero Contrato De obra No 406 del 2022:

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 7.007.204.406,00	\$ 651.173.276
VALOR ANTICIPO TOTAL (30%)	\$2.102.161.321,80	\$ 570.410.491,8
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 651.173.276	9,69%
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 965.613.272	14,36%
SALDO POR PAGAR A LA FECHA	\$ 5.390.417.858	75,95%

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Durante el periodo se registró un avance ejecutado de 24,91% contra un avance programado de 18,52% para un adelanto 6,39 %.
- La interventoría recibió carta PA-PEI-0079-23 del 15 de febrero de 2023 del contratista Consorcio Obras PA-PEI subsanando las observaciones realizadas por la interventoría, excepto las observaciones de la maquinaria, ya La interventoría envió carta CP-23-054 del 20 de febrero de 2023 a la administración municipal con asunto: Solicitud de aclaración de equipo mínimo de obra. Debido a que la relación de equipos del compresor y de compactador colocada en los pliegos de condiciones, no existen. Por tal motivo se le solicitó a la administración aclarar ese error, para así poder seguir con el proceso de aprobación de la maquinaria del contratista.

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 19 de 75

- Para el periodo presente se ejecutó un 15,23% del PMT correspondiente a un valor de \$ 19.430.653,00 para un valor ejecutado acumulado de 24,91% correspondiente \$ 31.789.774,00, dicho saldo ejecutado para el presente periodo no se cobra en el anexo parcial, dado que, no se cuenta con la valla informativa exigida en el anexo j. Lineamientos de Gestión Social, lo anterior por decisión de interventoría.
- El porcentaje realmente ejecutado por el contratista en el presente periodo es del 15,23%, en la presente acta se refleja un porcentaje de ejecución del 14,36% debido a que la actividad 2,04 no se tuvo en cuenta para pago en el presente periodo debido a que el contratista no subsanó la documentación solicitada por interventoría para la disposición de los RCD's.
- Durante el presente periodo la supervisión mediante el grupo de Whatsapp llamado "Alcaldía red vial – lote 2", ha suministrado el listado de las vías que por solicitud de PQR, acciones judiciales y comunidad el contratista de obra Consorcio obras PA-PEI debe atender así mismo los inventarios en sectores donde la supervisión lo requiera.
- La interventoría y el contratista de obra Consorcio Obras PA-PEI han recibido por parte de la administración municipal el orden de ejecución y tipo de intervención de las vías suministradas por el grupo de WhatsApp "Alcaldía red vial – lote 2".
- La interventoría ha realizado el respectivo seguimiento a las ejecuciones solicitadas por la administración municipal en los frentes de parcheo; Las Mercedes, conucos y CC Cacique y fresado en los sectores Concordia, Sotomayor y la construcción del reductor de velocidad tipo Pompeyano y Circular en los sectores de La Victoria y Mutis, así como también el frente de los separadores en plaza mayor, Ciudadela Real de Minas.
- Se le ha reiterado al contratista de obra Consorcio Obras PA-PEI, tanto en comités como en cartas enviadas por correo electrónico el cumplimiento de los exigido en los pliegos de condiciones, como lo es la colocación de los seis (6) frentes de obra activos.
- Durante el mes se solicitó al contratista de obra, colocar el equipo necesario de iluminación para los trabajos nocturnos. Así como las revisiones preoperacionales de la maquinaria en obra (fresadora, volquetas, vibro compactador etc.)
- Los especialistas de pavimentos han estado en visitas de obra acordando las diferentes demarcaciones de las áreas a intervenir.
- En algunos sectores donde se está desarrollando el mantenimiento tipo parcheo se han encontrado espesores de gran tamaño debido a sobre carpetas existentes.
- En la implementación del PMT, la interventoría ha realizado el seguimiento respectivo.
- Durante el periodo la interventoría realizó observaciones de mejora en los procesos ambientales, de SST y Bioseguridad al Subcontratista, las cuales fueron atendidas y solucionadas en el transcurso del mismo periodo.

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 20 de 75</p>

10. ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SECTOR LA CONCORDIA – COMUNA 06

LA CONCORDIA

<p>Barrio: La Concordia</p>	
<p>Dirección: CL 56 ENTRE CARRERA 21 Y 22</p>	<p>Caja 440</p>
 <p>8/3/2023 21:23:34 7°6'32.142"N - 73°6'58.92"W Bucaramanga CL 56 entre CR 21 y 22</p>	 <p>9/3/2023 01:37:04 7°6'31.998"N - 73°6'58.944"W Bucaramanga CL 56 entre CR 21 y 22 caja 440</p>
<p>Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento</p>	
 <p>9/3/2023 03:16:45 7°6'31.59"N - 73°6'59.112"W Bucaramanga CL 56 entre CR 21 y 22 caja 440</p>	 <p>9/3/2023 05:31:12 7°6'31.746"N - 73°6'58.836"W Bucaramanga CL 56 entre CR 21 y 22 caja 440</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 21 de 75

<p>Barrio: La Concordia</p>	
<p>Dirección: CL 56 ENTRE CARRERA 21 Y 22</p>	<p>Caja 441</p>
 <p>9 mar. 2023 9:39:02 p. m. 7°6'31.953"N -73°6'58.786"W Lote 2 , Bucaramanga Calle 56 entre 21y 22</p>	 <p>9 mar. 2023 9:39:02 p. m. 7°6'31.953"N -73°6'58.786"W Lote 2 , Bucaramanga Calle 56 entre 21y 22</p>
<p>Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento</p>	
 <p>10/3/2023 01:53:13 7°6'31.302"N -73°6'58.83"W Bucaramanga CL 56 entre CR 21 y 22 caja 441</p>	 <p>10/3/2023 04:12:34 7°6'31.542"N -73°6'58.992"W Bucaramanga CL 56 entre CR 21 y 22 caja 441</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 22 de 75</p>

<p>Barrio: La Concordia</p>	
<p>Dirección: AVENIDA LA ROSITA CON CARRERA 21</p>	<p>Caja 08</p>
 <p>10/3/2023 21:39:42 7°6'55.884"N -73°7'9.72"W Bucaramanga avenida la Rosita con CR 21 caja #8 la concordia</p>	 <p>10/3/2023 23:01:30 7°6'55.458"N -73°7'10.26"W Bucaramanga avenida la Rosita con CR 21 caja #8 la concordia</p>
<p>Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento</p>	
 <p>11/3/2023 00:06:26 7°6'55.686"N -73°7'9.948"W Bucaramanga avenida la Rosita con CR 21 caja #8 la concordia</p>	 <p>11/3/2023 00:06:26 7°6'55.686"N -73°7'9.948"W Bucaramanga avenida la Rosita con CR 21 caja #8 la concordia</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 23 de 75</p>

<p>Barrio: La Concordia</p>	
<p>Dirección: AVENIDA LA ROSITA CON CARRERA 21</p>	<p>Caja 10</p>
 <p>10/3/2023 21:42:00 7°6'54.804"N -73°7'9.69"W Bucaramanga avenida la Rosita con CR 21 caja #10 la concordia</p>	
<p>Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento</p>	
 <p>11/3/2023 05:22:26 7°6'55.422"N -73°7'9.054"W Bucaramanga avenida la Rosita con CR 21 caja #10 la concordia</p>	 <p>sábado, 11 de marzo de 2023 7°6'55"N -73°7'10"W #CJ 10 / AV ROSITA CON CRA 21 #Lote2/ Consorcio PA-PEI/ Bga</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento</p>	



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 24 de 75

Barrio: La Concordia

Dirección: AV. ROSITA ENTRE K20 Y 21

Caja 384



Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento



Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 25 de 75

Barrio: La Concordia

Dirección: AV. ROSITA ENTRE K20 Y 21

Caja 384.1



10/03/2023 10:17:12 a. m.
7°6'55"N - 73°7'11"W
Cj 384.1/ Av Rosita k20 a 21
#BGA #Lote2



7°6'55"N - 73°7'11"W
Cj 384.1/ Av Rosita k20 a 21
#Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga
vie, mar 10/ 2023 16:43p. m.

Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento



7°6'54"N - 73°7'11"W
Cj 384.1/ Av Rosita k20 a 21
#Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga
vie, mar 10, 2023 19:12p. m.



7°6'55"N - 73°7'11"W
Cj 384.1/ Av Rosita k20 a 21
#Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga
Lun, mar 13, 2023 12:06p. m.

Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento

Barrio: La Concordia

Dirección: AV. ROSITA ENTRE K20 Y 21

Caja 383



Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento



Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 27 de 75</p>

<p>Barrio: La Concordia</p>	
<p>Dirección: AV. ROSITA ENTRE K20 Y 21</p>	<p>Caja 384,2</p>
 <p>384.2 lun, marzo 13, 2023 11:39a. m. 7°6'54"N -73°7'12" W Lote 2 caja384.2 av la rosita con 21 #Bga</p>	 <p>7°6'53"N -73°7'12"W Cj 384.2 / Av Rosita k20 a 21 #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga lun., mar. 13, 2023 18:47p. m.</p>
<p>Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento</p>	
 <p>7°6'54"N -73°7'12"W Cj 384.2 / Av Rosita k20 a 21 #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga lun., mar. 13, 2023 20:01p. m.</p>	 <p>lun, marzo 13, 2023 08:32p. m. 7°6'54"N -73°7'12"W Lote 2 caja3834.2av la rosita con 21 #Bga</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento</p>	



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 28 de 75

Barrio: La Concordia

Dirección: CR 21 CON CL 45

Caja 393



Descripción: Demarcación caja y fresado de pavimento



Descripción: Riego de imprimación CRL-40 e instalación de pavimento

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 29 de 75</p>


LA VICTORIA

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: CALLE 67 # 18-31 Parroquia Nuestra señora de las victorias</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>	<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 2</p>
	
<p>Descripción: Armado de acero modulo 2</p>	<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 1</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 30 de 75</p>

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: CALLE 67 # 18-31 Parroquia Nuestra señora de las victorias</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 2</p>	<p>Descripción: Reductor terminado</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 31 de 75


<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: CALLE 67 # 18-31 Parroquia Nuestra señora de las victorias</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Señalización horizontal</p>	

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: Calle 67 No. 11 - 29 Col. Gimnasio Superior</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 1</p>	<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 32 de 75

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: Calle 67 No. 11 - 29 Col. Gimnasio Superior</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 1</p>	<p>Descripción: Reductor terminado</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 33 de 75

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: Calle 67 No. 11 - 29 Col. Gimnasio Superior</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Señalización horizontal</p>	

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: Calle 68 No. 18-29 frente al Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 1</p>	<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 34 de 75</p>

<p>Barrio: La Victoria</p>	
<p>Dirección: Calle 65 No. 18-29 frente al colegio Santa Maria Goretti</p>	<p>Tipo reductor: Pompeyano</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible</p>	<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>
	
<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 1</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 35 de 75</p>

SECTOR CIUDELA REAL DE MINAS– COMUNA 07

<p>Barrio: Ciudadela Real de Minas</p>	
<p>Dirección: Avda Bucaros No 2-108 Laureles</p>	<p>Tipo reductor: Parabólico</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 1</p>	<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 2</p>	<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 1</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 36 de 75</p>

<p>Barrio: Ciudadela Real de Minas</p>	
<p>Dirección: Avda Bucaros No 2-108 Laureles</p>	<p>Tipo reductor: Parabólico</p>
	
<p>Descripción: Reductor terminado</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señalización horizontal</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 37 de 75</p>

SECTOR CABECERA DEL LLANO – COMUNA 12

CABECERA DEL LLANO

<p>Barrio: Cabecera del Llano</p>	
<p>Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS</p>	<p>Caja: 326 A2, 326</p>
	
<p>Descripción: Demarcación caja</p>	
	
<p>Descripción: fresado y Riego de Imprimación CRL-40</p>	
	
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 38 de 75</p>

<p>Barrio: Cabecera del Llano</p>	
<p>Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS</p>	<p>Caja: 327</p>
 <p>7°6'43"N - 73°6'25"W C# 327 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mar., feb. 21, 2023 21:33p. m.</p>	 <p>7°6'43"N - 73°6'24"W C# 327 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 00:19a. m.</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, fresado y Riego de Imprimación CRL-40</p>	
 <p>7°6'43"N - 73°6'25"W C# 327 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 01:22a. m.</p>	 <p>7°6'43"N - 73°6'24"W C# 327 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 03:30a. m.</p>
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

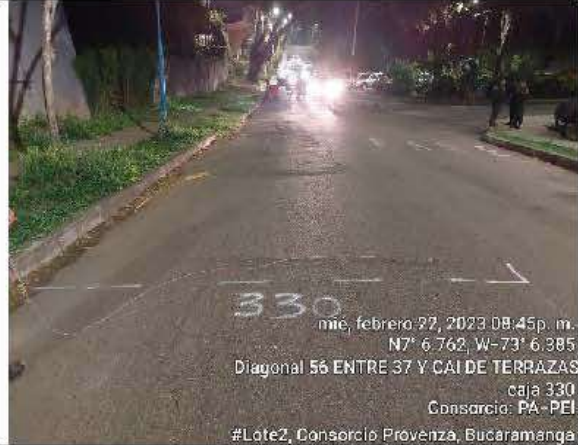
 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 39 de 75</p>

<p>Barrio: Cabecera del Llano</p>	
<p>Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS</p>	<p>Caja: 328</p>
 <p>7°6'45"N - 73°6'24"W Cj# 328 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 21, 2023 21:40p. m.</p>	 <p>7°6'45"N - 73°6'23"W Cj# 328 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 01:08a. m.</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, fresado y Riego de Imprimación CRL-40</p>	
 <p>7°6'45"N - 73°6'24"W Cj# 328 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 02:19a. m.</p>	 <p>7°6'45"N - 73°6'24"W Cj# 328 / Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 03:25a. m.</p>
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 40 de 75</p>

<p>Barrio: Cabecera del Llano</p>	
<p>Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS</p>	<p>Caja 329</p>
 <p>mié, febrero 22, 2023 08:46p. m. N7° 6'747, W-73° 6'393 Diagonal 56 ENTRE 37 Y CAI DE TERRAZAS caja 330 Consortio: PA-PEI #Lote2, Consorcio Provenza, Bucaramanga</p>	 <p>7°6'45"N - 73°6'24"W Cj# 329/ Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga mié., feb. 22, 2023 23:59p. m.</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, fresado y Riego de Imprimación CRL-40</p>	
 <p>7°58'N - 73°9'15" W Cj# 329/ Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga jue., feb. 23, 2023 01:20a. m.</p>	 <p>7°6'45"N - 73°6'23"W Cj# 329/ Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga jue., feb. 23, 2023 02:39a. m.</p>
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 41 de 75</p>

<p>Barrio: Cabecera del Llano</p>	
<p>Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS</p>	<p>Caja 330</p>
 <p>mié, febrero 22, 2023 08:45p. m. N7° 6' 762, W-73° 6' 385 Diagonal 56 ENTRE 37 Y CAI DE TERRAZAS caja 330 Consortio: PA-PEI #Lote2, Consorcio Provenza, Bucaramanga</p>	 <p>7°6'46"N -73°6'23"W C/ 330/ Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga jue, feb. 23, 2023 01:42a. m</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, fresado y Riego de Imprimación CRL-40</p>	
 <p>7°6'13"N -73°6'35"W C/ 330/ Dg56, k37 a CAI Terraza #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga jue, feb. 23, 2023 03:10a. m.</p>	 <p>jue, febrero 23, 2023 04:12a. m. 7°6'46"N -73°6'23"W Lote2/cj 330 / c56 k37 -41 #Bga</p>
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

Barrio: Cabecera del Llano

Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS

Caja 331



Descripción: Demarcación caja, fresado y Riego de Imprimación CRL-40



Descripción: Instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 43 de 75

Barrio: Cabecera del Llano

Dirección: DG 56, CR 37 hasta CAI TERRAZAS

Caja 332



Descripción: Demarcación caja, fresado



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y Instalación de pavimento MDC-19

BOLARQUI

Barrio: Bolarqui

Dirección: CR 29 CON CL 55A

Caja 181,1



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y Instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 45 de 75

Barrio: Bolarqui

Dirección: Cra 29 # 55 - 68

Caja 181,2



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y Instalación de pavimento MDC-19

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 46 de 75</p>

<p>Barrio: Bolarqui</p>	
<p>Dirección: Cra 29 # 55 - 68</p>	<p>Caja 181,3 a1</p>
 <p>22/2/2023 10:33:19 7°6'36.408"N -73°6'45.144"W Bucaramanga CR 29 #55A-36 caja 181.3</p>	 <p>23/2/2023 10:31:21 7°6'36.258"N -73°6'45.21"W Bucaramanga CR 29 #55A-36 caja 181.3 área 1</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, excavación</p>	
 <p>23/2/2023 10:57:05 7°6'36.906"N -73°6'45.348"W Bucaramanga CR 29 #55A-36 caja 181.3 área 1</p>	 <p>23/2/2023 14:19:20 7°6'36.948"N -73°6'44.826"W Bucaramanga CR 29 #55A-36 caja 181.3 área 1</p>
<p>Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y Instalación de pavimento MDC-19</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 47 de 75</p>

<p>Barrio: Bolarqui</p>	
<p>Dirección: Cra 29 # 55 - 68</p>	<p>Caja 181,3 a2 y a3</p>
 <p>22/2/2023 10:32:05 7°6'35.448"N - 73°6'44.31"W Bucaramanga CR 29 #55A-56 caja 181.3</p>	 <p>24/2/2023 10:36:09 7°6'35.353"N - 73°6'44.19"W Bucaramanga CR 29 #55a-36 caja 181.3 área 2 y 3</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, excavación</p>	
 <p>24/2/2023 12:02:55 7°6'35.094"N - 73°6'44.424"W Bucaramanga CR 29 #55a-56 caja 181.3 área 2 y 3</p>	 <p>24/2/2023 15:35:37 7°6'35.484"N - 73°6'44.292"W Bucaramanga CR 29 #55a-56 caja 181.3 área 2 y 3</p>
<p>Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y Instalación de pavimento MDC-19</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 48 de 75</p>

LAS MERCEDES

<p>Barrio: Las Mercedes</p> <p>Dirección: Cra 29 # 55 - 68</p>	
 <p>7°6'31"N -73°6'45"W Cj#167/ c58 # 28-35 B. Mercedes #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga lun., mar. 6, 2023 08:21a. m.</p>	<p>Caja 167</p>  <p>7°6'31"N -73°6'46"W Cj#167/ c58 # 28-35 B. Mercedes #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga lun., mar. 6, 2023 12:03p. m.</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, excavación y riego de Imprimación CRL-40</p>	
 <p>7°6'31"N -73°6'46"W Cj#167/ c58 # 28-35 B. Mercedes #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga lun., mar. 6, 2023 16:42p. m.</p>	 <p>7°6'31"N -73°6'46"W Cj#167/ c58 # 28-35 B. Mercedes #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga lun., mar. 6, 2023 17:06p. m.</p>
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

Barrio: Las Mercedes

Dirección: CL 58 k28-26

Caja 167,1



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 50 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: CL 58 k29-06

Caja 167,2



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 51 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: CL 58 k29-15

Caja 167,3



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 52 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: c58 k30 Intersección

Caja 167,4



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 53 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: c58 k30 Intersección

Caja 167,5



Descripción: Demarcación caja, excavación



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 54 de 75</p>

<p>Barrio: Las Mercedes</p>	
<p>Dirección: CL 58 ENTRE CARRERA 27 Y 28 costado derecho</p>	<p>Caja 162</p>
 <p>6/3/2023 21:00:38 7°6'30.024"N - 73°6'50.466"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 nuevo sotomayor</p>	 <p>7/3/2023 01:30:03 7°6'29.706"N - 73°6'50.13"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, fresado</p>	
 <p>7/3/2023 01:45:08 7°6'29.34"N - 73°6'51.03"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>	 <p>7/3/2023 23:54:12 7°6'30.222"N - 73°6'50.208"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>
<p>Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 55 de 75</p>

<p>Barrio: Las Mercedes</p>	
<p>Dirección: CL 58 ENTRE CARRERA 27 Y 28 costado izquierdo</p>	<p>Caja 162</p>
 <p>7/3/2023 20:39:16 7°6'29.922"N -73°6'50.604"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>	 <p>7/3/2023 23:54:07 7°6'30.246"N -73°6'50.015"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>
<p>Descripción: Demarcación caja, fresado</p>	
 <p>8/3/2023 00:32:38 7°6'29.514"N -73°6'50.742"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>	 <p>8/3/2023 03:02:59 7°6'29.712"N -73°6'50.508"W Bucaramanga CL 58 entre CR 27 y 28 caja 162 Mercedes</p>
<p>Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19</p>	



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 56 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: K30 entre C58 y 56 costado izquierdo

Caja 235



Descripción: Demarcación caja, fresado



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 57 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: K30 entre C58 y 56 costado derecho

Caja 235



Descripción: Demarcación caja, fresado



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 y instalación de pavimento MDC-19



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 58 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: K30 entre C58 y 56 costado derecho

Caja 168



Descripción: Demarcación caja, excavación y riego de Imprimación CRL-40



Descripción: Instalación de pavimento MDC-19

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 59 de 75</p>

<p>Barrio: Las Mercedes</p>	
<p>Dirección: CR 30 #58-50</p>	<p>Caja 168.1</p>
	
<p>Descripción: Demarcación caja, excavación.</p>	
	
<p>Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 e instalación de pavimento MDC-19</p>	



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA

Código: F-GDI-5000-238,37-091

Versión 1.0

Página 60 de 75

Barrio: Las Mercedes

Dirección: CR 30 #58-50

Caja 168.2



Descripción: Demarcación caja, excavación.



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 e instalación de pavimento MDC-19

Barrio: Las Mercedes

Dirección: CRA 30 #62-13

Caja 168.3



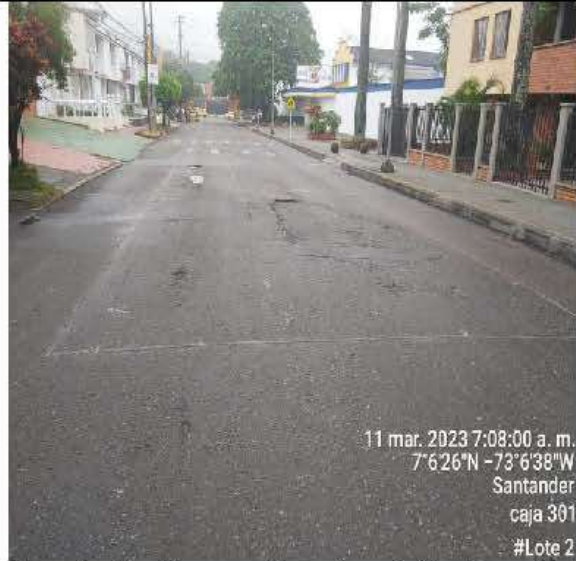
Descripción: Demarcación caja, excavación.



Descripción: Riego de Imprimación CRL-40 e instalación de pavimento MDC-19

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 62 de 75</p>

CONUCOS

<p>Barrio: Conucos</p>	
<p>Dirección: Calle 63 entre carrera 32 a 33</p>	<p>Caja 301</p>
 <p>11 mar. 2023 7:08:00 a. m. 7°6'26"N -73°6'38"W Santander caja 301 #Lote 2</p>	 <p>7°6'26"N -73°6'38"W Caja 301/ c63 k32 a 33 #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga sáb, mar. 11, 2023 10:02a. m.</p>
<p>Descripción: Excavación y demolición de pavimento</p>	
 <p>11 mar. 2023 3:23:21 p. m. 7°6'26"N -73°6'38"W Santander caja 301 #Calle 63 entre cra 32 y 33 #Lote 2</p>	 <p>11 mar. 2023 4:59:57 p. m. 7°6'26"N -73°6'38"W Santander caja 301 #Calle 63 entre cra 32 y 33 #Lote 2</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL -40 e instalación de pavimento MDC-19.</p>	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 63 de 75</p>

<p>Barrio: Conucos</p>	
<p>Dirección: Calle 63 entre carrera 32 a 33</p>	<p>Caja 302</p>
 <p>11 mar. 2023 7:08:32 a. m. 7°6'26"N - 73°6'37"W Santander caja 302 #Lote 2</p>	 <p>7°6'26"N - 73°6'37"W Caja 302/ c63 k32 a 33 #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga sáb, mar 11, 2023 10:03a. m.</p>
<p>Descripción: Excavación y demolición de pavimento</p>	
 <p>7°6'26"N - 73°6'37"W Caja 302/ c63 k32 a 33 #Lote 2/ Consorcio Provenza/ Bga sáb, mar 11, 2023 11:36a. m.</p>	 <p>11 mar. 2023 3:55:19 p. m. 7°6'27"N - 73°6'37"W Santander caja 302 #Calle 63 entre cra 32 y 33 #Lote 2</p>
<p>Descripción: Riego de imprimación CRL -40 e instalación de pavimento MDC-19</p>	

Barrio: Conucos

Dirección: Calle 63 entre carrera 32 a 33

Caja 303



Descripción: Excavación, demolición de pavimento y riego de imprimación CRL -40



Descripción: Instalación de pavimento MDC-19

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 65 de 75</p>

SECTOR LA CONCORDIA – COMUNA 16
LAGOS DEL CACIQUE

<p>Barrio: El Tejar</p>	
<p>Dirección: Calle 93 CC. cacique esquina</p>	<p>Caja 398</p>
	
<p>Descripción: Excavación, demolición de pavimento y riego de imprimación CRL -40</p>	
	
<p>Descripción: Instalación de pavimento MDC-19</p>	

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 66 de 75

SECTOR LA CONCORDIA – COMUNA 17

MUTIS

LA GRAN LADERA

Barrio: La Gran Ladera

Dirección: calle 67 entre Cra 15W y Cra 17W



Descripción: Replanteo y Excavación



Descripción: Chequeo de niveles con mira y nivel topográfico a la sub rasante

Barrio: La Gran Ladera

Dirección: calle 67 entre Cra 15W y Cra 17W



Descripción: Instalación de base granula clase B



Descripción: Céreo de base granular con ayuda de nivel topográfico

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 68 de 75</p>

Barrio: La Gran Ladera

Dirección: calle 67 entre Cra 15W y Cra 17W



Descripción: Toma de densidades por parte del contratista



Descripción: Demolición bordillo existente y excavación faltante para instalación de sardinel



Descripción: Instalación sardinel.

	INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 69 de 75

Barrio: La Gran Ladera

Dirección: calle 67 entre Cra 15W y Cra 17W



Descripción: Riego de imprimación CRL-40



Descripción: Instalación de pavimento MDC-19

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 70 de 75</p>

MUTIS

<p>Barrio: Mutis</p>	
<p>Dirección: Calle 55 con cra 5w</p>	<p>Tipo reductor: Parabólico</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible</p>	<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>
	
<p>Descripción: Armado de acero modulo 2</p>	<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 1</p>
	
<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 2</p>	<p>Descripción: Reductor terminado</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 71 de 75</p>

<p>Barrio: Mutis</p>	
<p>Dirección: Calle 55 con cra 5w</p>	<p>Tipo reductor: Parabólico</p>
	
<p>Descripción: Pintura de reductor</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señalización horizontal</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 72 de 75</p>

<p>Barrio: Mutis</p>	
<p>Dirección: Calle 60 #8w-92 conjunto residencial Fundadores sentido NE-SW</p>	<p>Tipo reductor: Parabólico</p>
	
<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 1</p>	<p>Descripción: Excavación de pavimento flexible modulo 1</p>
	
<p>Descripción: Armado de acero modulo 1</p>	<p>Descripción: Armado de acero modulo 2</p>
	
<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 2</p>	<p>Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 2</p>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	<p>Código: F-GDI-5000-238,37-091</p>
		<p>Versión 1.0</p>
		<p>Página 73 de 75</p>

<p>Barrio: Mutis</p>	
<p>Dirección: Calle 60 #8w-92 conjunto residencial Fundadores sentido NE-SW</p>	<p>Tipo reductor: Parabólico</p>
	
<p>Descripción: Pintura de reductor</p>	<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>
	
<p>Descripción: Señal de tránsito vertical</p>	<p>Descripción: Señalización horizontal</p>

Barrio: Mutis

**Dirección: Calle 60 #8w-92 conjunto
residencial Fundadores sentido SW-NE**

Tipo reductor: Parabólico



Descripción: Armado de acero modulo 1

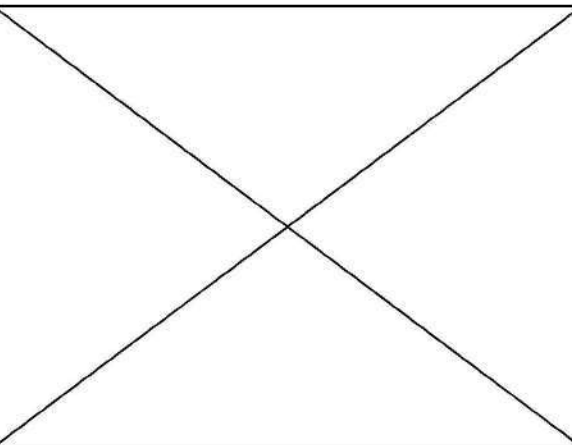
Descripción: Armado de acero modulo 2



Descripción: Fundida concreto MR-41 modulo 1

Descripción: Reductor terminado

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA</p>	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 75 de 75

Barrio: Mutis	
Dirección: Calle 60 #8w-92 conjunto residencial Fundadores sentido SW-NE	Tipo reductor: Parabólico
	
Descripción: Señal de tránsito vertical	
	
Descripción: Señalización horizontal	


Ing. JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
 Supervisor contrato de Interventoría
 Profesional Especializado.
 Secretaría de Infraestructura
