

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022

CONTRATO No.	GN2683-2022
MODIFICATORIO No.	01 del 05 de diciembre de 2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800.103.923-8 Representante Legal JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO S.A.S BIC NIT. 900400097-5 Representante Legal JOHNNY WALTER TOVAR TRUJILLO CC. 1.085.244.016
DIRECCIÓN	Carrera 8 A # 16 -53 LC1 Pasto, Nariño
CORREO	gerencia@solamnar.com
OBJETO DEL CONTRATO:	"RECEPCIONAR Y TRANSFORMAR 44 TONELADAS DE PLÁSTICO, RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA DESPLASTIFICATE, E INSTALAR LOS ECOPARQUES Y ENTREGA DE ECOBANCAS ELABORADOS EN MATERIAL RECICLABLE PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, MUNICIPIOS Y/O PERSONAS QUE CUMPLAN CON LAS CANTIDADES ACORDADAS".
VALOR DEL CONTRATO GN2683-2022:	El valor del contrato es de: ochenta y tres millones doscientos noventa mil (\$83,290,000) m/cte., incluido IVA si aplica
VALOR DEL MODIFICATORIO 01:	El valor del MODIFICATORIO es de: un millón seiscientos noventa y ocho mil trescientos treinta y tres (\$1,698,333) m/cte., incluido IVA si aplica

En cumplimiento del contrato GN2683-2022, se presenta el siguiente informe bimensual de actividades con la descripción de los avances correspondientes al mes de abril de 2023 y mayo de 2023.

Avance de actividades:

- Ítem 1. Para la actividad relacionada con recoger en Pasto a domicilio los residuos plásticos, durante las fechas indicadas se han realizado las siguientes rutas de recolección durante el mes de abril y mayo:

No	Fecha	Municipio	Recorrido
1.	3 de abril de 2023	Pasto	Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte -
2.	3 de abril de 2023	Pasto	Potreriillo – San Juan Bosco – Las Lunas
3.	12 de abril de 2023	Pasto	San Ignacio - Potreriillo
4.	14 de abril de 2023	Pasto	Potreriillo - Tamasagra
5.	22 de abril de 2023	Pasto	San Ignacio - Potreriillo

Jair Tovar
Jefe de Producción
Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022

6.	8 de mayo de 2023	Pasto	Potreriillo – San Juan Bosco – Las Lunas
7.	8 de mayo de 2023	Pasto	Capusigra - San Ignacio – Carrera 23 - Avenida Colombia
8.	17 de mayo de 2023	Pasto	Potreriillo - Tamasagra
9.	20 de mayo de 2023	Pasto	Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte -
10.	23 de mayo de 2023	Pasto	Potreriillo – Carrera 21A – Carrera 23 -

- Ítem 2. Para la actividad relacionada con la recepción de 44 toneladas de plástico reciclado, durante el mes de abril de 2023 y mayo de 2023, se ha logrado la recepción de 10124.35 KG de material tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Municipio	Cantidad (Kg)
Ancuya	128.2
Córdoba	581.7
Cumbal	7.3
Imúes	849
La Cruz	249.7
La Unión	334.4
Mallama	1390
Pasto	5719.35
Ricaurte	194.4
San Bernardo	104.4
Tumaco	556.3
Túquerres	9.6
Total	10124.35


- Ítem 3. Para la actividad relacionada con transformar 40 toneladas de plástico recepcionado en 10 eco parques pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones establecidas, a la fecha del presente informe se ha ejecutada al 80% esta actividad, teniendo 8 eco parques pre ensamblados listos para instalación.

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022



Jair Tovar
Jefe de Producción
Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022

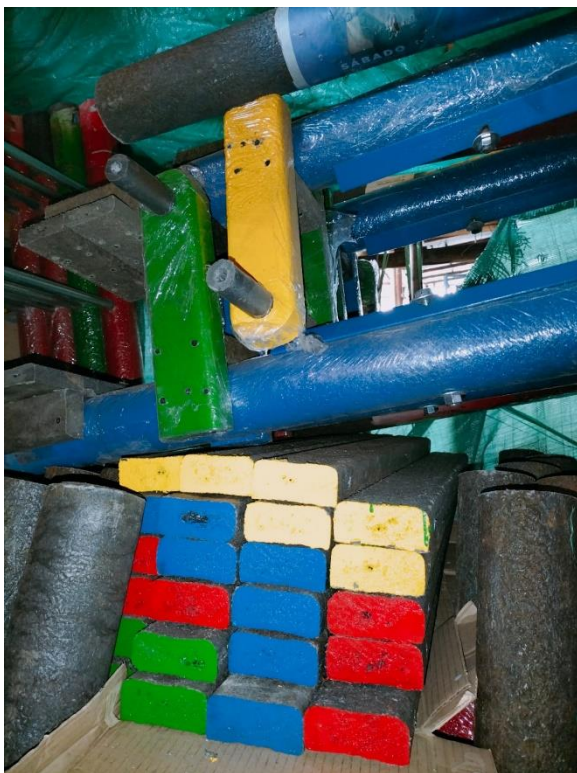

Jair Tovar
Jefe de Producción
Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022

- Ítem 4. Para la actividad relacionada con transformar 4 toneladas de plástico recepcionado en 8 bancas, de conformidad a las especificaciones establecidas. A la fecha del presente informe se ha ejecutado al 50% esta actividad, teniendo 4 bancas ensambladas listas para ser entregadas.



- Ítem 5. En relación a la actividad de elaborar manual de uso para entregar a los beneficiarios de productos elaborados en material reciclable, se encuentra pendiente por realizar para las primeras semanas del mes de junio 2023.
- Ítem 6 al ítem 13. Para las actividades relacionadas con la instalación de ecoparques en los municipios de Santa Bárbara, La Tola, Mosquera, Ancuya, Pasto, Taminango, Guachucal, y Mallama, se encuentran pendientes para el próximo mes, teniendo en cuenta que se necesita la aprobación y autorización del Departamento de Nariño para iniciar con las instalaciones en las fechas que el Departamento señale.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El presente objeto contractual se ejecutó con las condiciones técnicas establecidas.
2. El anticipo del 30% recibido, se manejó adecuadamente dándole el uso específico correspondiente a las actividades a desarrollar en el Contrato GN-2683-2022
3. Se ha realizado 27 recorridos en la ciudad de Pasto, para recoger los residuos plásticos que recolecten las personas articuladas a la campaña Desplastificate.
4. Se maneja un control detallado sobre las cantidades de plástico recibido
5. La empresa cuenta con una bodega de almacenamiento en la Carrera 8a No. 16 – 53 LC1, Barrio Potrerillo, de la ciudad de Pasto con el espacio suficiente para albergar los residuos plásticos recibidos y así mismo, para el cargue y descargue de estos.
6. Se han recepcionado en bodega hasta la fecha 34.20 toneladas de plástico reciclado entregado por vinculados a la campaña Desplastificate, de las cuales se han transformado 34 toneladas.
7. Se ha garantizado el cargue y descargue dentro de las instalaciones de la bodega que permita el almacenamiento de los residuos plásticos recibidos, con el cabal cumplimiento de los requisitos de funcionamiento que la norma exige.
8. La empresa cuenta con la maquinaria necesaria e idónea para la transformación del plástico, según los diferentes productos que se entregaran: Molino, Aglutinadora, compactadora, Extrusora, moldes, Herramientas de labor.
9. Se han transformado 32 toneladas de plástico recepcionado en 8 ecoparques, pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.
10. Se han transformado 2 toneladas de plástico recepcionado en 4 ecobancas, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.

Jair Tovar

Jefe de Producción

Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC

11. Hasta el momento debido a que no se han entregado productos terminados, pues todos se encuentran recepcionados en bodega, no ha existido comunicaciones de inconformidad por piezas defectuosas o por daño; sin embargo, la empresa se compromete a reemplazar a sus expensas y sin costo alguno todos los elementos que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación o no cumplan con las condiciones técnicas exigidas por el Departamento, en un tiempo no mayor a tres (03) días calendario, contados a partir de la comunicación de inconformidad.
12. Respecto a la obligación de realizar la instalación de los ecoparques en los municipios de: El Charco, Santa Barbara, La Tola, Mosquera, Ancuya (vereda Macas Cruz), Pasto, Taminango (Remolino), Guachucal y Mallama, se espera las fechas que el Departamento establezca para iniciar con las instalaciones.
13. Respecto a la obligación de realizar la entrega de las ecobancas a los municipios beneficiarios de Pasto, Ricaurte y Guaitarilla en la bodega ubicada en la ciudad de Pasto, donde cada beneficiario deberá recogerlas, se espera las fechas que el Departamento establezca para iniciar con la entrega.
14. El manual de uso se encuentra pendiente para el mes de junio 2023, garantizando la entrega del manual de uso a los beneficiarios de los ecoparques y ecobancas elaborados al momento de la instalación o entrega de los productos,
15. Por parte de la empresa se ha asistido a los comités técnicos, mesas de trabajo y reuniones programados por el supervisor de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
16. Se han entregado de manera bimensual los informes de avance de ejecución del contrato. Quedando pendiente la entrega del informe final cuando se hayan ejecutado todas las actividades del contrato. Dichos informes cuentan con los aspectos financieros, administrativos, técnicos, del proyecto.
17. Soluciones Ambientales de Nariño entiende su obligación de reserva y confidencialidad sobre la información y documentación en la ejecución del contrato No. GN2683-2022, y ha cumplido con dicha confidencialidad y reserva.
18. Soluciones Ambientales de Nariño Entregó a la GOBERNACIÓN DE NARIÑO, una vez perfeccionado el contrato, la garantía única y demás documentos requeridos para la legalización del contrato y su ejecución, cumpliendo al 100% este requerimiento.
19. Con esto se cumple tanto con las obligaciones específicas y las obligaciones generales estipuladas en el contrato No. GN2683-2022.

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACEPTACION DE OFERTA No. GN2683-2022		
Valor contrato GN2683-2022	Departamento de Nariño	\$ 83,290,000
Modificadorio 01 del 5 de diciembre 2022	Departamento de Nariño	\$ 1,698,333
	TOTAL, CONTRATO	\$ 84,988,333

RECURSOS A PAGAR POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	
CONCEPTO	VALOR
Anticipo del 30% (recibido el 17 abril 2023)	\$25,496,499.90
Saldo pendiente de desembolso de acuerdo a entrega de productos	\$59,491,833.01
Recursos desembolsados a 31 mayo 2023	\$25,496,499.90
Valor solicitado en pago parcial 72% ya ejecutado, menos anticipo del 30%	35,695,099.86

VALOR EJECUTADO			
CONCEPTO	CANT.	V. UNIT	TOTAL
Recorridos a domicilio en la ciudad de pasto para recoger residuos Plásticos a 31 mayo	27	19,666.67	531,000.09
Recepción de toneladas de plástico reciclado a 31 de mayo de 2023.	34,2	49,000	1,675,800
Transformar 40 toneladas de plástico recepcionado en 10 ecoparques preensamblados, de conformidad a las especificaciones establecidas en el anexo 5 (cantidad ecoparques transformados)	8	7,191,666.67	57,533,333.33
Transformar 4 toneladas de plástico recepcionado en 8 bancas, de conformidad a las especificaciones establecidas en el anexo 5 (cantidad bancas transformadas)	4	281,666.67	1,126,666.67
TOTAL, EJECUTADO			60,866,800.09

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
INFORME BIMENSUAL No 3
CONTRATO No. GN2683-2022

Transformación del material repcionado	Cantidad toneladas utilizadas para elaboración	Cantidad productos elaborados
Toneladas utilizadas en ecoparques	32	8
Toneladas utilizadas en bancas	2	4
Cantidad de plástico transformado	34	

En recepción se encuentran 203 kg de plástico reciclado que se recolectó en los recorridos realizados, quedando pendiente para la fabricación de los demás entregables.

Con lo anterior se muestran los avances en la ejecución de actividades, afirmando además que de momento no se han presentado dificultades en la ejecución.

Atentamente



JOHNNY TOVAR TRUJILLO
Representante legal
CEL.3172240504
Email: ventas@solamnar.com
