

CONTRATO DE OBRA

Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación Informe:	20 de Marzo de 2023.	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
---------------------------------------	------------------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARMADO DE FORMALETA TANQUE



LLENOS ZAPATAS

ACTIVIDADES A REALIZAR




- | |
|-------------------------------------|
| 1. LLENOS ZAPATAS |
| 2. ARMADO DE FORMALETA MUROS TANQUE |

RESUMEN GENERAL

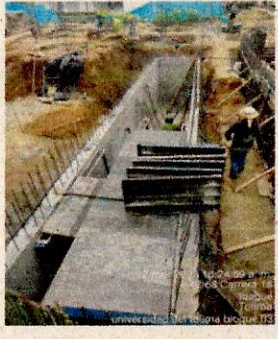



- | RESUMEN GENERAL | |
|---|--|
| * 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES | |
| * CONTINUA ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDIR MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | |
| * LLENOS DE ZAPATAS EJES 11 Y 12 | |

John D. Smith

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

 ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Arquitectura Sostenible</small>	Formato		21/03/2023
	INFORME DIARIO		
			Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022		
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.:	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	21 de Marzo de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div> APLICACION DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y ARMADO DE TANQUE.</div> <div> LLENOS ZAPATAS EJES 11 Y EXCAVACIONES ZAPATAS EJE A</div> <div></div> <div></div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. ARMADOS ESTRUCTURAS TANQUES			
2. ARMADO DE ZAPATAS EJE A			
3. LLENOS ZAPATAS			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* CONTINUA ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDIR MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE			
* LLENOS DE ZAPATAS EJES 11 Y 12			
* EXCAVACIONES ZAPATAS EJE A			
* ARMADO DE ESTRUCTURAS ZAPATAS EJE A			
<div> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)</div>			

213

 Consultoría & Construcciones S.A.S. <small>REGISTRADA EN COLOMBIA</small>	Formato	22/03/2023
	INFORME DIARIO	
	Página 1 de 1	
CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	22 de Marzo de 2023.	
Fecha de vencimiento informe:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div>VACIADO DE CONCRETOS MURO TANQUE</div> <div>FORMALETA TAPA TANQUE RCI</div> <div>CONCRETO CICLOPEO Y EXCAVACIONES ZAPATAS EJE A</div>		
ACTIVIDADES A REALIZAR		
1. VACIADO DE CONCRETO MUROS TANQUE		
2. VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO		
3. FORMALETA TAPA TANQUE RCI		
RESUMEN GENERAL		
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES		
* SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOS MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
* SE ENCOFRA FORMALETA PARA AMARRE DE ESTRUCTURA DE TAPA PARA EL TANQUE RCI		
* SE INICIA TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE SUELOS EN CONCRETO CICLOPEO Y RAJON.		
<div> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)</div>		

218

	Formato	23/03/2023
	INFORME DIARIO	Página 1 de 1


CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación informe:	23 de Marzo de 2023.	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
---------------------------------------	------------------------------


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
		
ARMADO DE ESTRUCTURA TANQUE Y SOLADOS ZAPATAS	ARMADO DE ZAPATAS	CONCRETO CICLOPEO Y EXCAVACIONES. ZAPATAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA TAPAS TANQUES
2. SOLADOS Y ESTRUCTURAS DE ZAPATAS
3. EXCAVACIONES ZAPATAS Y CONCRETOS


RESUMEN GENERAL
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* SE REALIZA VACIADO DE SOLADOS PARA ZAPATAS Y PANTALLAS EN EL 9 AL EJE 11
* SE CONTINUA FORMALETA PARA AMARRE DE ESTRUCTURA DE TAPA PARA EL TANQUE RCI
* SE CONTINUA TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE SUELOS EN CONCRETO CICLOPEO Y RAJON.

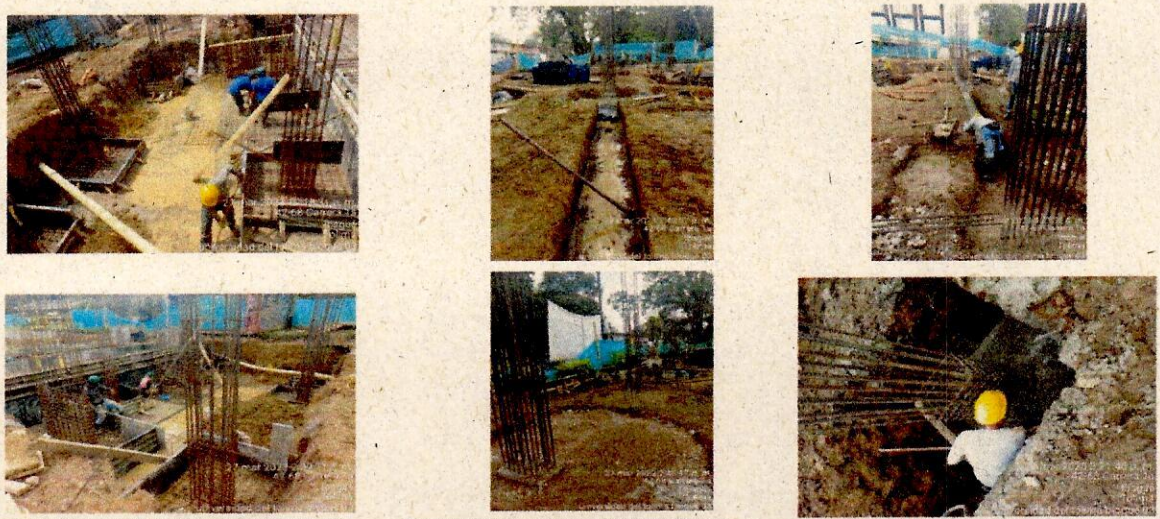


ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
 R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
 C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)

289

Formato		24/03/2023
ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S		INFORME DIARIO Pagina 1 de 1
CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de iniciación informe:	24 de Marzo de 2023	
Fecha de vencimiento informe:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		
LLENOS ZAPATAS Y EXCAVACIONES PARA VIGAS		ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA TAPAS TANQUES Y ZAPATAS
ACTIVIDADES A REALIZAR		
1. ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA TAPAS TANQUES		
2. SOLADOS Y ESTRUCTURAS DE ZAPATAS		
3. EXCAVACIONES ZAPATAS Y CONCRETOS		
RESUMEN GENERAL		
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES		
* SE CONTINUA CON ESTRUCTURA DE ZAPATAS Y PANTALLAS DEL EJE 9 AL 11		
* SE CONTINUA FORMALETA PARA AMARRE DE ESTRUCTURA DE TAPA PARA EL TANQUE RCI Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
* SE CONTINUA TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE SUELOS EN CONCRETO CICLOPEO Y RAJON. EN EL EJE A Y ZAPATAS		
<div></div> <div>ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)</div>		

220

Formato		25/03/2023
		INFORME DIARIO
Consultorias & Construcciones S.A.S		Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA		
Interventoría	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Inicio:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Inicio:	25 de Marzo de 2023	
Fecha de veni		
ARQUITECTO DIRECTOR DE DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div>		
<div>MARCACION Y MONTAJE DE PUENTES</div> <div>ADECUACION ALMACEN DE OBRA</div>		
ACTIVIDADES A REALIZAR		
1. ARMADO DE ESCOTILLA PARA TAPAS TANQUES		
2. LLENOS DE ZAPATAS		
3. EXCAVACIONES ZAPATAS Y CONCRETOS		
RESUMEN GENERAL		
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES		
* SE CONTINUA TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE SUELOS EN CONCRETO CICLOPEO Y RAJON. EN EL EJE A Y ZAPATAS		
* SOLADOS ZAPATAS EJE 7		
* LLENOS ZAAPTAS EJE A		
<div></div> <div>ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)</div>		

		Formato	27/03/2023
Consultorias & Construcciones S.A.S		INFORME DIARIO	Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Inicio	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Inicio	27 de Marzo de 2023		
Fecha de ven			
ARQUITECTO DIRECTOR DE: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FIGURACION ACEROS DE REFUERZO A ZAPATAS Y PANTALLAS RAMPAS		LLENOS EN SUB BASE ZAPATAS Y EXCAVACIONES VIGAS DE CIMENTACION	
		VACIADO CONCRETO ZAPATAS EJE A Y SOLADOS VIGAS DE CIMENTACION	
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. ARMADO DE ACEROS CIMENTACION			
2. LLENOS ZAPATAS			
3. CONCRETOS ZAPATAS			
4. EXCAVACIONES			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* ARMADO Y ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE ZAPATAS Y PANTALLAS RAMPA DE LOS EJES 8-9-10-11			
* LLENOS ZAPATAS EJE A Y EXCAVACION PARA VIGAS EJE D			
* CONCRETO ZAPATA EJE A			
			
ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)			



222

Formato		28/03/2023
ARQDILAM		
INFORME DIARIO		Página 1 de 1
Consultorias & Construcciones S.A.S.		
CONTRATO DE OBRA		
Interventoría	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE - TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Inic	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Inic	28 DE MARZO DE 2023	
Fecha de ven		
ARQUITECTO DIRECTOR DE: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
		
CONCRETOS TAPAS DE TANQUES	CONCRETOS CIMENTACION ZAPATAS Y PANTALLAS RAMPAS	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION
ACTIVIDADES A REALIZAR		
1. CONCRETOS CIMENTACION		
RESUMEN GENERAL		
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES		
* CONCRETOS DE ZAPATAS Y PANTALLAS RAMPA DE LOS EJES 8-9-10-11		
* VACIADO CONCRETO VIGAS EJE D		
* CONCRETO TAPAS TANQUES RCI Y ALMACENAMIENTO		
ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)		



223


 Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Arquitectura Escapulario</small>	Formato		13/03/2023
	INFORME DIARIO		
			Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGÓ UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	13 de Marzo de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div></div>			
<div><div>FORMALETA DE PLACAS DE TANQUES</div><div>EXCAVACION MANUAL ZAPATAS Y ARMADO DE ESTRUCTURAS DE COLUMNAS</div></div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. EXCAVACION MANUAL ZAPATAS			
2. ENCOFRADO DE TANQUES PLACAS			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* FORMALETA Y AJUSTE A PLACAS DE LOS TANQUES RCI Y ALMACENAMIENTO			
* EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EJE 11 Y 12			
			
ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)			

224


 Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Reportadora Profesional</small>	Formato		14/03/2023
	INFORME DIARIO		
			Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.		OBJETO
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022		REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.:	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	14 de Marzo de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div></div> <div><div>VACIADO DE CONCRETOS PLACAS TANQUES</div><div>ZAPATAS EJES 11</div></div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. VACIADO DE CONCRETO PLACAS TANQUES			
DESENCOFRADO DE ZAPATAS EJES 11 -12			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* VACIADO DE PLACAS DE LOS TANQUES RCI Y ALMACENAMIENTO.			
* DESENCOFRADO Y LLENOS DE ZAPATAS EN ELOS EJES 11-12- 12"			
<div> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)</div>			

225


 ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Asesoría y Ejecución</small>	Formato		15/03/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
	CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	15 de Marzo de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> ENCOFRADO Y ARAMADO DE FORMALETA PARA MUROS TANQUES Y EXCAVACIONES ZAPATAS EJE 11 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> FORMALETA VIGAS DE CIMENTACION EJE 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> FIGURACION DE ACERO ZÁPATAS Y LLENOS DE EL ZAPTAS EJE 12 </div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. ARAMADO DE ESTRUCTURAS DE TANQUES			
2. ARMADO DE FORMALETA PARA VACIADO DE VIGAS DE CIMENTACION.			
3. EXCAVACION MANUAL ZAPATAS.			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* ARMADO DE ESTRUCTURA PARA FORMALETA DE MUROS DEL TANQUE RCI			
* ARMADO DE ESTRUCTURA COLUMNAS EJES 12 Y 12"			
* EXCAVACION MANUAL ZAPATAS EJE 11			
 ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)			

 Consultoría y Construcciones S.A.S.	Formato		16/03/2023
	INFORME DIARIO		
			Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.		OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022		REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE - TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Inicial:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Inicial:	16 de Marzo de 2023		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div></div>			
<div><div>ARMADO DE MUROS TANQUE RC</div><div>VACIADO DE CONCRETOS VIGAS DE CIMENTACION</div><div>EXCAVACION MANUAL ZAPATAS EJE A</div></div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. ARAMADO DE ESTRCTURAS DE TANQUES			
2. VACIADO DE VIGAS DE CIMENTACION.			
3. EXCAVACION MANUAL ZAPATAS.			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* CONTINUA ARMADO DE MUROS TANQUE RC			
* VACIADO DE VIGAS DE COEMNTACION EJE 3			
* EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EJE A			
<div> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)</div>			

227

 ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S	Formato		17/03/2023
	INFORME DIARIO		
			Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT.		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Inicio informe:	17 de Marzo de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CONCRETO MUROS TANQUE RCI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DESENCOFRADO DE FORMALETA VIGAS DE CIMENTACION.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">LLENOS ZAPATAS</div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1 VACIADO DE CONCRETOS MUROS TANQUE RCI			
2, DESENCOFRADO VIGAS			
3, LLENOS ZAPATAS			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE MUROS TANQUE RCI			
* DESENCOFRADO DE FORMALETA VIGAS DE CIMENTACION DEL EJE 3			
* LLENOS DE ZAPATAS DEL EJE 12			
* SOLADOS PARA VIGAS EJES 11-12-12"			
 ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)			

228

	Formato		18/03/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	18 DE MARZO DE 2023		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">COLUMNAS EJES 3 Y 4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">DESMONTE DE FORMALETA MUROS RCI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">LLENOS Y SOLADOS ZAPATAS Y VIGAS</div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. AMARRES COLUMNAS			
2. DESENCOFRE DE MUROS TANQUE			
3. LLENOS Y SOLADOS.			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* SE DESENCOPRA FORMALETA DE MUROS TANQUE RCI			
* LLENOS ZAPATAS Y NIVELACION DE VIGAS. EJES 11-12-12"			
<div style="text-align: right;">  ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota) </div>			

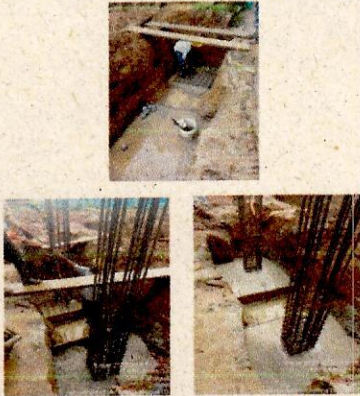
 <small>Consultorias & Construcciones S.A.S.</small>	Formato:	7/03/2023
	INFORME DIARIO	
Pagina 1 de 1		
CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Inicio informe:	07 DE MARZO DE 2023	
Fecha de vencimiento informe:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SOLADOS DE LIMPIEZA TANQUES Y</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CONCRETOS PEDESTALES</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">VACIADO DE PEDESTALES</div> </div>		
ACTIVIDADES A REALIZAR		
1. VACIADO DE ZAPATAS Y PEDESTALES		
2. VACIADO DE SOLADOS TANQUES		
RESUMEN GENERAL		
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES		
* VACIADO DE PEDESTALES ZAPATAS EJE 3 Y 4 EJE D		
* SOLADOS TANQUES		
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)</small> </div>		

232

 Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Asesoría Técnica</small>	Formato	9/03/2023
	INFORME DIARIO	Página 1 de 1


CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación Informe:	16 de Febrero de 2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
---------------------------------------	------------------------------


REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
ARMADO DE ESTRUCTURA DE PISO Y DE MUROS TANQUE RCI	ARMADO VIGAS Y COLUMNAS	ARMADO Y VACIADO DE ZAPATAS

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. ARAMADO DE VIGAS DE CIMENTACION
2. ARAMADO DE ESTRUCTURA TANQUE RCI
3. ARMADO DE COLUMNAS. EJES 3 Y 4

RESUMEN GENERAL
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA ARMADOS DE ESTRUCTURAS DE TANQUES
* ARMADO DE ESTRUCTURA DE ACEROS DE VIGA DE CIMENTACION Y AMARRES ARRANQUES DE COLUMNAS. EJES 3 Y 4
* ZAPATAS DE EL EJE 12


ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)

233


 Consultoría y Construcciones S.A.S.	Formato		10/03/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE - TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación Informe:	10 de Marzo de 2023		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div></div>			
<div><div>ARMADO DE ESTRUCTURA TANQUE RCI</div><div>VACIADO DE PEDESTALES ZAPATAS EJE 12 .</div></div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
2. ARAMADO DE ESTRUCTURA TANQUE RCI			
3. CONTINUA ARMADO DE COLUMNAS. EJES 3 Y 4			
3. PEDESTALES ZAPATAS EJE 12			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* CONTINUA ARAMADOS DE ESTRUCTURAS DE TANQUES			
* ARMADO DE ESTRUCTURA DE ACEROS DE VIGA DE CIMENTACION Y AMARRES ARRANQUES DE COLUMNAS. EJES 3 Y 4			
* PEDESTALES DE EL EJE 12			
<div> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)</div>			

235

	Formato	1/03/2023
	INFORME DIARIO	Página 1 de 1


CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación Informe:	01 de Marzo de 2023	
Fecha de vencimiento informe:		

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
---------------------------------------	------------------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
VACIADO DE ZAPATAS Y PEDESTALES	EXCAVACIONES PARA ZAPATAS Y VACIADO DE PEDESTALES



ACTIVIDADES A REALIZAR
1. VACIADO DE ZAPATAS Y PEDESTALES

RESUMEN GENERAL
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* EXCAVACION DE AREA PARA ZAPATAS EN EL EJE 4
* VACIADO DE PEDESTALES Y ZAPATAS DEL EJE 3





ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
 R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
 C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

236

 Consultorias & Construcciones S.A.S.	Formato		2/03/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGÓ UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de iniciación informe:	02 de Marzo de 2023		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>DESENCOJFRADO Y REMATES DE ZAPTATAS Y</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>VACIADO DE ALISTADOS ZAPTATAS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EXCAVACIONES PARA ZAPTATAS.</p> </div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. VACIADO DE ZAPTATAS Y PEDESTALES			
2. VACIADO DE SOLADOS DE LIMPIEZA			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* EXCAVACION DE AREA PARA ZAPTATAS EN EL EJE 4			
* VACIADO DE PEDESTALES Y ZAPTATAS DEL EJE 3			
<div style="text-align: right;">  <p> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá) </p> </div>			

237

 Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Asesoría y Ejecución</small>	Formato	3/03/2023
	INFORME DIARIO	Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT	
Contrato No.	2111 DE 2022	
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06	
Plazo Inicial:	365 días	
Plazo Final:	365 días	
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022	
Fecha de Iniciación Informe:	03 de Marzo de 2023	
Fecha de vencimiento informe:		
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div></div>		
LLENOS DE ZAPATAS EJE 3	ARMADO Y VACIADOS DE ZAPATAS EJE 4	EXCAVACION PARA TANQUES
ACTIVIDADES A REALIZAR		
1. VACIADO DE ZAPATAS Y PEDESTALES		
2. VACIADO DE SOLADOS DE LIMPIEZA		
3. EXCAVACIONES MECANICAS		
RESUMEN GENERAL		
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES		
* CONTINUA VACIADOS DE ZAPATAS DEL EJE 3 Y 4		
* ARAMADOS DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PARA ZAPATAS DEL EJE E		
* EXCAVACION MECANICA A NIVEL DE PISOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO. Y RCI		
<div> ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)</div>		

238

	Formato	4/03/2023
	INFORME DIARIO	Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA	
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT
Contrato No.	2111 DE 2022
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06
Plazo Inicial:	365 días
Plazo Final:	365 días
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022
Fecha de Iniciación informe:	04 de marzo de 2023
Fecha de vencimiento informe:	


OBJETO
REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.

ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: **DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY**

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
VACIADO DE ZAPATAS	EXCAVACION MECANICA FOSOS TANQUES	LLENOS <ZAPATAS EJE 3

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. VACIADO DE ZAPATAS Y PEDESTALES
2. VACIADO DE SOLADOS DE LIMPIEZA
3. EXCAVACIONES MECANICAS

RESUMEN GENERAL
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* CONTINUA VACIADOS DE ZAPATAS DEL EJE 3 Y 4
* ARAMADOS DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PARA ZAPATAS DEL EJE E
* EXCAVACION MECANICA A NIVEL DE PISOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO, Y RCI
* LLENOS DE ZAPATAS.



ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)
