

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6**CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CO1.PCCNTR.4155718**

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).

PERIODO: DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023



INFORME MENSUAL No.6 Página 1		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.6

PERIODO: DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718
CONSORCIO TIG

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).”

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645
CONSORCIO MIA GP

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS



INFORME MENSUAL No.6 Página 2	 CONSORCIO TIG	CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS
1	Documento Inicial

PRESENTÓ	APROBÓ
	
ING. JOHN ROCHA RESIDENTE DE OBRA	ING. EDISON RICARDO DUARTE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CODIGO	FECHA
TIG-FO-001	19-07-2023



INFORME MENSUAL No.6 Página 3		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	6
1.1.1. Localización y ubicación de territorios	6
1.1.2. Asignación de sedes.....	7
2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO	8
2.1. Información sedes primera etapa	8
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL.....	10
3.1. Información del contrato de interventoría	11
3.2. Información del contrato de obra.....	11
3.3 Relación de Correspondencia	12
3.4 Actividades de reunión	12
3.5 Informes Semanales.....	13
4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO	14
4.1 Avance físico	14
4.2 Estado de ejecución de los frentes.....	14
4.3 Control de hitos	16
4.4 Avance financiero	17
5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL	19
5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra.....	19
5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría	19
5. CONCLUSIONES	20
2. ANEXOS.....	21
ANEXO 1. INFORME BÁSICO.....	21
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO.....	21
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista.....	21
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia	21
Anexo 1.1.3. Actas de reunión.....	21
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría	21
ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO	21



INFORME MENSUAL No.6 Página 4		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

ANEXO 1.3. INFORME SST	21
ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL	21



INFORME MENSUAL No.6 Página 5		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las metas definidas en el plan de desarrollo **“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C**”, programa línea estratégica: 4 -inclusión educativa para la equidad, proyecto estratégico: ambientes de aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervención de obra pública mediante actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la ejecución de obras menores, se hace necesario contratar una interventoría especializada dada la diversidad de actividades, frentes de trabajo y áreas técnicas involucradas en el desarrollo del mismo, situación para las que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el respectivo seguimiento al proyecto en mención.

Para el grupo No. 8 se asignan 17 sedes a intervenir en mejoramientos que se encuentran en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de los cuales, se tiene un diagnóstico inicial por parte de la secretaría de educación y a medida que se realicen las visitas con los contratistas de obra e interventoría, se va a hacer la priorización respectiva de las actividades para cada sede. Posterior a la delimitación de este alcance, se suscribió una adición de recursos para el contrato de obra, donde el mismo se amplió a 8 sedes más, completando así un total de 25 unidades.

El presente informe mensual No.6, comprende la recopilación de la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.4077645 durante el periodo del 20 de junio de 2023 al 19 de julio de 2023.



INFORME MENSUAL No.6 Página 6		CO1.PCCNTR.4155718
		TIG-FO-001
		Versión 01

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente contrato de interventoría No. C01.PCCNTR.2749287 tiene por objeto: ***“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).”***

Para el reconocimiento total del proyecto, se ha realizado en conjunto de todas las partes interesadas (SED, contratista, interventoría y personal administrativo de las sedes escolares), una serie de recorridos para identificación de necesidades prioritarias en atenciones integrales de adecuaciones y mejoramientos en: cubiertas, batería de baños, carpintería metálica, acabados generales, canchas deportivas y zonas exteriores.

1.1.1. Localización y ubicación de territorios

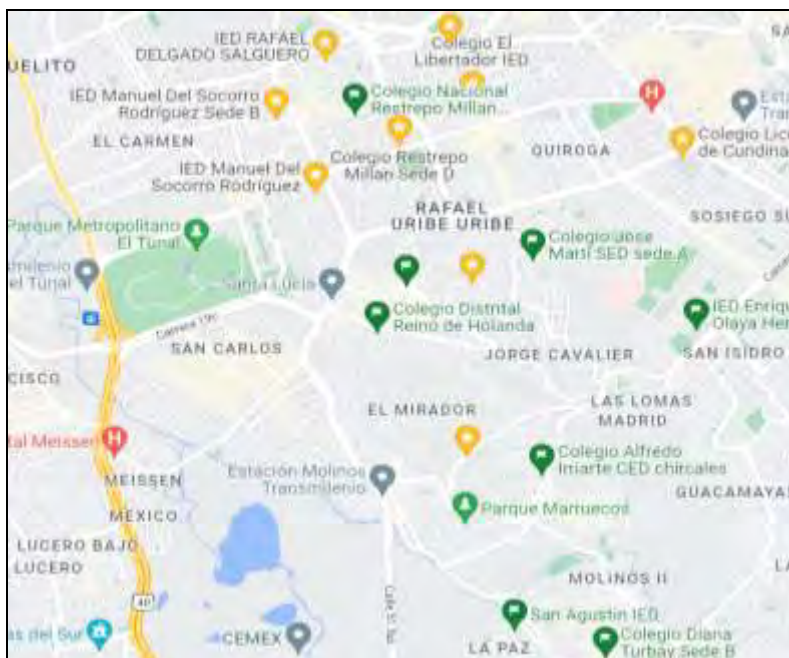


Imagen 1. Localización de las 17 sedes del grupo 8.

Fuente. Google Maps



INFORME MENSUAL No.6 Página 7		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

Las 17 sedes del grupo 8 se encuentran ubicadas dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe; esto, conforme al alcance inicial del contrato de obra, así como las 8 adicionales asignadas a través de la suscripción del otrosí No.1.

1.1.2. Asignación de sedes

Adjudicación de contrato de interventoría No C01.PCCNTR.2749287 y adjudicación de contrato de obra No. No. CO1.PCCNTR.4077645 de territorio oriente ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, del Grupo No 8. Se hará intervención a 17 sedes que serán abarcadas inicialmente por etapas, según la programación de obra.

Grupo	Sedes	Localidad
8	17	Rafael Uribe Uribe

Por otra parte, y con base en la adición No.1 de recursos realizada al contrato de obra, se incluyeron 8 sedes adicionales, así:

Grupo	Sedes adicionales	Localidad
8	8	Rafael Uribe Uribe



2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO

En esta etapa preliminar se realizó la visita de los primeros ocho (8) colegios asignados. Seguidamente y a medida que se coordinó entre la SED y los rectores, se fueron visitando las demás sedes, permitiendo que a hoy se tengan en ejecución quince (15) de las veinticinco (25) sedes.

2.1. Información sedes primera etapa

En relación al primer alcance de ejecución, tenemos las siguientes sedes dentro del grupo 8, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	B
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	A
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	B
COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	B
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	B
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	C
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	B
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	A
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	B
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	d
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	A
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	C



INFORME MENSUAL No.6 Página 9		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

La programación general del contrato de obra que incluye el valor actualizado con la adición de recursos, ya fue suministrada por parte del CONSORCIO MIA GP y para el presente periodo se también involucra dentro del análisis financiero del proyecto.

Ahora y con ocasión de la adición No.1 de recursos al contrato de obra, se incluyeron las siguientes sedes, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	B
COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR (IED)	
COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS (IED)	
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	B
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	A
COLEGIO SANTA LUCÍA CAMFAM (IED)	



INFORME MENSUAL No.6 Página 10		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL

Territorio oriente: Grupo No. 8

Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 – Consorcio TIG

El presupuesto para la presente contratación de interventoría asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 878.587.938) incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 371.557.799).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 1.250.145.727).

Territorio oriente: Grupo No 8

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 - CONSORCIO MIA GP

En contrato de obra se asigna una suma de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 11.941.262.150) incluido A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 5.050.000.000).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a DIECISÉISMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 16.991.262.150).



INFORME MENSUAL No.6 Página 11		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

3.1. Información del contrato de interventoría

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.4155718
CONTRATISTA:	CONSORCIO TIG
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL:	\$ 878.587.938
VALOR ADICIONES:	\$ 371.557.799
VALOR ACTUALIZADO (Incluido adiciones):	\$ 1.250.145.727
PLAZO TRANSCURRIDO:	SEIS (6) MESES + DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO

3.2. Información del contrato de obra

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL:	\$11.941.262.150



INFORME MENSUAL No.6 Página 12		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR ADICIONES:	\$ 5.050.000.000
VALOR ACTUALIZADO (Incluido adiciones):	\$ 16.991.262.150
PLAZO TRANSCURRIDO:	SEIS (6) MESES CALENDARIO

3.3 Relación de Correspondencia

Para el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 se presenta en el Anexo 1.1.2. El listado relacionando la correspondencia entre contratista e interventoría.

3.4 Actividades de reunión

A la fecha se han ejecutado actas de reunión como soporte del control realizado por esta interventoría para lo cual se adjuntan copia de estos documentos en el Anexo 1.1.3

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	ELABORADO POR	DESCRIPCIÓN
21/06/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Inspección por emergencia en IED Gustavo Restrepo sede A
22/06/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Seguimiento de la ejecución de la IED Fe y Alegría
23/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité semanal de seguimiento técnico
04/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Seguimiento de la ejecución de la IED Fe y Alegría
06/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité semanal de seguimiento técnico
10/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Fijación de compromisos en la IED Reino de Holanda sede A
10/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Compromiso entrega de salones IED Rafael Delgado Salguero
11/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión presupuestos IED Fe y Alegría
11/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión inicial de los APU's
13/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión alcance serigrafía Jose Martí
13/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Emergencia en IED Liceo Femenino
14/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité semanal de seguimiento técnico
17/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Reunión de seguimiento en la SED
18/07/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Emergencia en la IED Clemencia de Caycedo



INFORME MENSUAL No.6 Página 13		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

3.5 Informes Semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el momento de corte del presente informe mensual, los cuales se adjuntan en el anexo 1.1.5.

Is No.	Fecha de inicio	Fecha de corte
23	19/06/2023	25/06/2023
24	26/06/2023	02/07/2023
25	03/07/2022	09/07/2023
26	10/07/2023	16/07/2023



INFORME MENSUAL No.6 Página 14		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

4.1 Avance físico

Durante el presente periodo se presenta un avance físico programado de 45,27% (según reprogramación) y ejecutado de 31,21% del valor total del contrato, dando con ello una variación negativa de 14,05%. Cabe resaltar que estos porcentajes son generados sobre el valor total del contrato, incluyendo la respectiva adición No.1 de recursos y partiendo del análisis realizado sobre la reprogramación recientemente allegada por parte del contratista de obra y avalada por esta interventoría. En reunión llevada a cabo el 17 de julio de 2023, se expuso ante la SED la causa del atraso, concluyendo en que la programación se debe actualizar, descartando los rubros que no se van a ejecutar y que ya están causados a la fecha.

4.2 Estado de ejecución de los frentes

Los frentes en los que se ejecutaron actividades durante el presente periodo mensual, se relacionan a continuación, así como un recuento de las obras llevadas a cabo:

Colegio José Martí: Se continúa con el desmonte de la cubierta existente, adecuación de la estructura metálica e instalación de la nueva teja en las áreas habilitadas por el colegio. El frente avanza sin mayor contratiempo, pero el rendimiento de la instalación de la cubierta por parte del contratista de obra no es el esperado. Se instaló la cubierta en zona del comedor, con cual se debió tener el mayor de los cuidados, teniendo en cuenta que se trabajó por la parte de encima, para evitar afectar el cielo raso existente. A este último se le realizarán unos ajustes locativos, ya que se encuentra en regulares condiciones en algunos espacios. También se adelantaron actividades en la zona de serigrafía, donde se construyeron los espacios internos con muros livianos, se realizó mantenimiento a las puertas, redes eléctricas, iluminación, entre otros.

Colegio Restrepo Millán sede C: Se está a la espera de la definición del procedimiento a seguir por parte de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta que esa inestabilidad del talud no puede ser catalogada como una emergencia y su intervención debe involucrar unos estudios y diseños previos y de paso se debe evaluar la disponibilidad del recurso, lo cual no haría parte de este alcance contractual.

Colegio San Agustín sede A: Se completa la totalidad de la reposición de la cubierta del tercer piso, incluyendo la instalación de la estructura metálica, pintura de la existente, redes eléctricas, entre otros. Se finalizan las actividades en las baterías del tercer piso, con observaciones en proceso de atención. El segundo piso de las baterías se encuentra enchapadas, a la espera de la instalación de mesones, divisiones, entre otros. También se avanza en la cubierta de la zona de la biblioteca, a la cual se deja toda reemplazada.



INFORME MENSUAL No.6 Página 15		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

Colegio Diana Turbay: Ya contando con los lineamientos de intervención dados por la SED, el contratista lleva un ritmo lento de trabajo, principalmente por la frecuencia interrumpida de suministro de materiales. Se avanzó en la instalación de la cubierta del bloque No.3, en la instalación del piso en tableta de granito del segundo piso del bloque No.1 y en parte de la estructura del pórtico del edificio No.2 donde están ubicadas las baterías sanitarias.

Colegio Enrique Olaya Herrera: Se inicia con el proceso de reposición de la cubierta del bloque A de la IED. Para esta actividad se realiza la instalación de la platina metálica, de donde se fijan los tornillos autoperforantes. Se continúan las actividades en las baterías sanitarias, donde se identifica daños en push, en válvulas, en aparatos sanitarios, entre otros, pero se ejecuta solo el alcance acordado en un principio.

Colegio Alfredo Iriarte: Se continúa con el proceso de instalación del enchape en la zona de las baterías sanitarias, bajo las instrucciones impartidas por parte de la SED, el primer nivel. Se instalan las divisiones en acero inoxidable del segundo nivel, pero por problemas relacionados con los accesorios que van desde el push hasta el sanitario, no ha sido posible habilitar los baños del segundo y del tercer nivel. Las divisiones del primer piso no se han instalado a la fecha del presente corte y los orinales del tercer piso presentan taponamiento en su tubería de desagüe y a la fecha se encuentran afectando el segundo piso, por filtraciones de esas aguas residuales.

Colegio Reino de Holanda: Se procede con la intervención de los salones 305, 306, 307 y 308, con el mismo alcance de los entregados a la fecha. El 16 de junio de 2023 se inició con las intervenciones en las baterías del primer y tercer piso y el 09 de julio de 2023 no fueron entregadas como se tenía previsto, ya que el contratista no fue oportuno con su ejecución. A la fecha aún se continúa con observaciones en el tercer nivel y con obras inconclusas en el primer nivel. Sobre las cubiertas de la zona de zona de circulación, las mismas fueron reemplazadas, así como la estructura de soporte y quedaron operativas.

Colegio Liceo Femenino: Se continua con los acabados en estuco, se continua con la instalación de enchape en el piso, se inicia la instalación de cielo raso PVC. El ritmo de trabajo de este frente es muy bajo y se han realizado llamados de atención precisamente por el escaso avance. Se construyeron los mesones con los respectivos puntos de gas, los muros divisorios del cuarto de almacenamiento en cada área y las redes eléctricas con su debida iluminación.

Colegio Santa Lucía CAFAM: Sólo hasta el 14 de junio de 2023 fue posible realizar recorrido en esta sede con el fin de definir el alcance restante de este frente y desde esa fecha se realizó la impermeabilización que estaba pendiente, así como los resanes y la pintura en los muros de esa área. Está pendiente la definición de unas puertas que deben ser reemplazadas, porque requieren un sistema antipánico, pero el APU aún está en proceso de revisión por parte de la SED.



INFORME MENSUAL No.6 Página 16		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

Colegio Restrepo Millán sede B: Se realiza la aplicación de la pintura en los muros, se retoca el interior del bloque 2, incluyendo el salón de sistemas que se encuentra en el piso No.2 y se procede con la entrega de esta área al colegio. Durante la ubicación del mobiliario en este bloque, la IED realizó un daño en el piso existente, lo cual deberá corregir ellos mismos. En lo que respecta al bloque No.1, el mismo ya está próximo a la entrega, para que sea intervenido por la firma contratista de obra.

Colegio Fe y Alegría Palermo Sur: Se continúa con el acondicionamiento de la estructura metálica de los bloques inferiores para la instalación de la cubierta de los salones de artes, de sistemas, laboratorios y administrativos. Seguidamente se continúa con la demolición del piso del área de circulación y se disponen los RCD. En esta sede se están realizando las gestiones para poder solicitar unas conexiones domiciliarias nuevas para la red hidráulica, sanitaria y aguas lluvias. Con respecto a las redes eléctricas, se independizará del tablero que comparte actualmente con el jardín y se construirán las redes internas nuevas. El ritmo no el esperado y por ende se evidencian atrasos en la ejecución de actividades.

Colegio Alexander Fleming sede B: Se realiza la maniobra de conexión de la nueva red en polipropileno y se funde el área de la placa que estaba pendiente por vaciar. Se realizan las media cañas en el canal que conforma el cárcamo, se pintan los muros según colores requeridos por la rectora, se le realiza mantenimiento a las canchas. Queda pendiente la demarcación de la cancha y la corrección de la filtración que existe en el salón de profesores.

Colegio Manuel del Socorro sede A: Teniendo en cuenta que ya se había demolido la placa de lo existente, se realiza la instalación de la subbase tipo B400 y se compacta debidamente. Seguidamente se procede con el vaciado de las placas de 12cm de espesor, que conformarán la plataforma de las canchas existentes antes de la intervención. Este mismo procedimiento se lleva a cabo en la zona de juego de los niños.

Colegio Rafael Delgado Salguero sede A: Se procede la intervención con la reposición de cubierta en el salón múltiple. En este mismo espacio se repara un muro que presenta una dilatación pronunciada con grapas, malla y pañete. Se intervienen también unos salones que se encuentran al fondo en la IED y donde dos (2) de ellos involucran piso en tableta de granito.

Colegio Marruecos y Molinos sede A: En este espacio se inicia con el retiro del manto y la demolición del alistado de piso existente. Seguidamente se inicia con el proceso de aplicación de mortero para garantizar debidamente las pendientes hacia los desagües, lo cual obligó a modular los espacios intervenidos en toda la placa. Esta labor se llevó a cabo en la placa de mayor nivel, así como en la de menor nivel.

4.3 Control de hitos

Con base en la programación presentada por parte del contratista de obra y verificando el estado de los frentes en obra, se cuenta con la siguiente información al respecto:



2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	29/07/2023		No iniciado
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	29/07/2023	26/06/2023	33
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	29/07/2023		No iniciado
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	27/02/2023	27/02/2023	0
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	29/07/2023	12/06/2023	47
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL	29/07/2023		No iniciado
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	29/07/2023	22/05/2023	68
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	29/07/2023		No iniciado
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	29/07/2023		No iniciado
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR	28/04/2023	28/04/2023	0
19	COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS	29/07/2023		No iniciado
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	29/07/2023		No iniciado
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	29/07/2023	25/05/2023	65
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	3/04/2023	3/04/2023	0
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	29/07/2023		No iniciado
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	29/07/2023		No iniciado
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	29/07/2023		No iniciado

Cabe resaltar que estas fechas de inicio fueron tomadas de la reprogramación enviada por parte del contratista de obra y avalada por parte de la interventoría.

4.4 Avance financiero

Durante el presente periodo se presenta un avance financiero programado de \$ 7.691.335.347,55 (SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 0.55 M/CTE) y ejecutado de \$ 5.303.720.335,66 (CINCO MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 0.66 M/CTE).

Periodo	Acumulado Mensual	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
MES 6	\$ 7.691.335.347,55	\$ 5.303.720.335,66





Fuente. Informe semanal de interventoría No.26



5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL

5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de obra con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES					
Acta No	Fecha	Valor Total	Amortización anticipo	Valor pagado	% pagado acumulado
No.1	19/02/2023	\$ 203.058.871	\$ 0.00	\$ 203.058.871	1,61%
No.2	19/03/2023	\$ 1.278.337.626	\$ 0.00	\$ 1.278.337.626	10,71%
No.3	19/04/2023	\$ 704.473.264	\$ 0.00	\$ 704.473.264	12,86%
No.4	19/05/2023	\$ 810.966.333	\$ 0.00	\$ 810.966.333	17,63%
No.5	19/06/2023	\$ 1.256.728.708	\$ 0.00	\$ 1.256.728.708	25,03%

5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de interventoría con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES				
Acta No	Fecha	Valor Total	% pagado	Concepto
No.1	19/02/2023	\$ 14.189.195	1,61%	Avance contrato de obra
No.2	19/03/2023	\$ 89.351.980	10,71%	Avance contrato de obra
No.3	19/04/2023	\$ 57.187.615	12,86%	Avance contrato de obra
No.4	19/05/2023	\$ 59.667.498	17,63%	Avance contrato de obra
No.5	19/06/2023	\$ 92.385.769	25,03%	Avance contrato de obra



INFORME MENSUAL No.6 Página 20		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

5. CONCLUSIONES

- Se continúa llevando a cabo en campo la toma de medidas para organización de los presupuestos, lo cual permita realizar una delimitación adecuada de los alcances, conforme a los montos agotables que están asignados de manera estimativa para cada frente y bajo las indicaciones de la SED. Esta labor se ha venido exponiendo con la SED, buscando dirimir las dualidades que puedan existir.
- El contratista de obra continúa sin venir correspondiendo de manera diligente con la gestión administrativa que le corresponde, ya que presenta demoras en la entrega de fichas, presupuestos y cronogramas. Esto ha traído consigo una serie de llamados de atención en comités de seguimiento y mediante comunicados, los cuales tampoco han causado el efecto esperado.
- Han venido surgiendo unas nuevas actividades no previstas (de la 9 en adelante), de las cuales se han venido proponiendo los APU's no previstos con sus debidos soportes, los cuales ya fueron remitidos en su totalidad a la Entidad Contratante para su revisión y concepto, pero de las cuales aún no se cuenta con respuesta alguna.
- El contratista de obra cuenta con un número importante de llamados de atención, que a la fecha lo pueden hacer acreedor a un posible incumplimiento. De continuar con la dinámica, se solicitará a la Entidad que inicie el proceso legal en su contra.
- Se han realizado llamados de atención relacionados con la entrega de los espacios según compromisos, pero los mismos tampoco han dado el resultado esperado.
- En reunión llevada a cabo en las instalaciones de la SED el 17 de julio de 2023, se convino con la supervisión que el contratista de obra presentara un plan de contingencia, ajustando el cronograma a las cifras más reales, pero a la fecha el mismo no a sido allegado para revisión.



INFORME MENSUAL No.6 Página 21		CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

2. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME BÁSICO

ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO

Anexo 1.1.1. Control de personal contratista

Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia

Anexo 1.1.3. Actas de reunión

Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría

Anexo 1.1.5. Informes semanales

Anexo 1.1.6. Pólizas Contrato de obra

Anexo 1.1.7. Pólizas Contrato de interventoría

ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO

Anexo 1.2.1. Soportes control de calidad

Anexo 1.2.2 Bitácora de obra

Anexo 1.2.3 Registro fotográfico

ANEXO 1.3. INFORME SST

ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL



INFORME MENSUAL No.6 Página 22	 CONSORCIO TIG	CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

ANEXO 1. INFORME BASICO



INFORME MENSUAL No.6 Página 23	 CONSORCIO TIG	CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

ANEXO 1.1 INFORME ADMINISTRATIVO



INFORME MENSUAL No.6 Página 24	 CONSORCIO TIG	CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

Anexo 1.1.1. Control de personal de contratista





CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

6

Periodo

20/06/2023

al

19/07/2023

FECHA

19

7

2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS

PERSONAL QUE ASISTE

PERSONAL QUE NO ASISTE

PERSONAL RETIRADO

PERSONAL INGRESADO

X

N

R

IN

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE			20-may-23										HASTA										19-jun-23										
DIA			20	21	22	23	24	28	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERFIL			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	V	S	D	L
Director de obra			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Residentes de obra			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Asesor Estructural				X	X	X	X																										
Asesor Ambiental						X	X						X						X	X						X	X			X		X	
Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo			X			X	X						X	X					X	X	X					X	X			X		X	
Asesor en Redes Eléctricas																																	
Asesor Hidrosanitario																																	
Profesional de costos					X	X						X	X					X	X	X				X	X				X				
Inspectores de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X		X
Maestro de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X		X

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

20 de junio de 2023

al

19 de julio de 2023

FRENTE DE OBRA:

Colegio Fe y Alegría

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V		S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	
Maestro de obra		1	0	1	0	1		1	0	1	1	0		0		0	0	0	0	1	0		1	0	1	0	0	0		0	0	0	
Oficial de obra		0	0	1	1	1		1	1	1	1	0		0		0	0	0	1	2	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
Ayudante de obra		5	5	4	4	4		4	4	5	5	4		4		3	3	2	4	4	5		3	3	3	2	4	3		3	4	5	
Electricista		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Plomero		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Operador de maquinaria (constante)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Soldador		2	3	0	2	0		2	1	2	2	0		0		0	2	2	2	2	2		1	3	3	3	2	2		1	2	2	
Carpinteros		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Especialista en redes eléctricas		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Especialista en estructuras		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Asesor ambiental		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
SST		0	1	0	0	0		0	0	1	0	0		0		0	0	0	0	1	0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	
Residente de obra relativo		0	1	0	0	0		0	0	1	0	0		0		0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	

FIRMA:

NOMBRE: Arif M. Alejandro Angarita G.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: Edison Ricardo Duarte Diaz
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO

OBRA
CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

20 de junio de 2023

al

19 de julio de 2023.

FRENTE DE OBRA:

Colegio San Agustín.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V		S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	
Maestro de obra		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1		1	1	1	1	1	1		0	0	0	
Oficial de obra		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2		1	1	2	
Ayudante de obra		4	5	4	3	6		6	7	6	4	5		3		0	3	5	3	3	2		0	2	2	1	1	1		2	0	0	
Electricista		0	0	1	0	2		2	2	0	2	0		0		0	3	0	0	0	0		0	1	2	0	0	0		0	0	0	
Plomero		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
Operador de maquinaria (constante)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
Soldador		0	0	0	0	1		1	1	1	0	0		0		0	0	0	0	0	4		0	0	0	6	6	4		5	4	4	
Carpinteros		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
Especialista en redes eléctricas		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
Especialista en estructuras		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
Asesor ambiental		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0		0	0	0		
SST		0	0	1	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0		0	0	0		
Residente de obra (Rotativo)		0	1	1	1	1		1	0	0	0	0		1		0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	0	0		

FIRMA:

Arg. Alejandro Angaita G.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

20 de junio 2023

al

19 de julio 2023

FRENTE DE OBRA:

Colegio Diana Turbay

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	
Maestro de obra		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Oficial de obra		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2		3	1	1
Ayudante de obra		4	4	4	4	4		2	2	2	2	2	2		2		0	2	2	2	2	2		4	3	3	4	4	4		3	4	4
Electricista		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Plomero		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Operador de maquinaria (constante)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Soldador		1	1	1	1	0		0	0	0	0	1	1		1		0	1	0	0	0	0		2	0	0	0	0	0		0	1	0
Carpinteros		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Especialista en redes eléctricas		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Especialista en estructuras		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Asesor ambiental		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
SST		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Residente de obra Rotativo		1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		0		0	0	1	0	0	1		0	1	0	0	0	0		1	0	0

FIRMA:

NOMBRE: A.T. M. Alejandra Angarita G.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

PERIODO

Periodo

20 de junio 2023

al

19 de julio 2023

FRENTE DE OBRA:

Colegio José Martí

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V			S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI
Maestro de obra		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	0		1	1	0	0	1	1		0	0	0
Oficial de obra		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1		0	1	1	1	2	2		2	2	1	1	1	1		1	1	1
Ayudante de obra		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2			2		0	2	2	2	2	2		1	1	2	2	2	2		4	4	4
Electricista		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Plomero		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Operador de maquinaria (constante)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Soldador		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	1	2	1	1		0	0	0
Carpinteros		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Especialista en redes eléctricas		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Especialista en estructuras		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Especialista en redes hidrosanitarias		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Asesor ambiental		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
SST		0	0	0	1	0		1	0	0	0	0			0		0	0	1	0	1	0		1	0	1	0	0	0		0	0	0
Residente de obra relativo		0	0	0	1			1	0	0	0	0			0		0	0	1	0	1	0		1	0	1	0	0		0	0	0	

FIRMA:

NOMBRE: Alexandra Argandoña G.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PERSONAL
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO
OBRA
NUMERO DE CONTRATO
CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA
CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA
CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL
Periodo
20 de Junio
al
19 de Julio
FRENTE DE OBRA:
Santa Lucia cafam
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra																																	
Oficial de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1							
Ayudante de obra			3	3	3	3	3		3	3	3	2	2		2		2	1	1						2	1							
Electricista																																	
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)																																	
Soldador																																	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																																	
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	
																																	</

FIRMA:
NOMBRE:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**CONSORCIO TIG****CONTROL DE PERSONAL****GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS****ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.****Secretaría
Educación****TIPO DE CONTRATO**

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

10 Junio

al

1a de Julio

FRENTE DE OBRA:

Manuel de Socorro Sede A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL			M	M	J	J	S	O	L	M	M	J	J		5	O	L	M	M	J	J	S	O	L	M	M	J	J	S	O	L	M	M
Maestro de obra																										1	1	1	1		1		
Oficial de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	2	2	2		2	2	1
Ayudante de obra					2	2	2		3	3	3	3	3		3		3	3	3	3	4	4		2	3	3	5	5	3		3	3	3
Electricista															1		1	1	1							1		1					
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)					1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1							
Soldador																																	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																																	
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	

FIRMA:

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

20 de Junio

al

19 de Julio

FRENTE DE OBRA:

Alexander Fleming Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL																																
DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1			1	1		1		1	1				1	1		1	1	1	
Oficial de obra									1	1	1	1				1	1			1	1		1			1	1					
Ayudante de obra																																
Electricista		2	2	2	2	2		2	1	2	1	1																				
Plomero																																
Operador de maquinaria (constante)																									2					1	1	1
Soldador																																
Carpinteros																																
Especialista en redes eléctricas								2	2	2	2	2						2														
Especialista en estructuras																																
Especialista en redes hidrosanitarias																																
Asesor ambiental																										2						
Pintores de cancha																																

FIRMA:

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

PERIODO

Periodo

20 de Junio

al

19 de Julio

FRENTE DE OBRA:

Enrique Olaya Herrera

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL			M	M	J	J	S	D	L	M	M	J	V		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra			1												1		1	1	1	1	1	1											
Oficial de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1		1	1	1
Ayudante de obra			7	7	7	7	7		7	7	7	7	6		9		9	9	9	9	9	9			3	1	1	1	1		2	2	2
Electricista												1	1										3										
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)																																	
Soldador																										1	1	1			1	1	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																				2	2			2	2	2							
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	

FIRMA:

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

20 de Junio

al

19 de Julio

FRENTE DE OBRA:

Liceo Femenino

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL			M	M	J	J	S	D	L	M	M	J	V		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra			1												1		1	1	2	1	1	1	*	1	1	2	2	2	2		2	2	2
Oficial de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		2	2	2	
Ayudante de obra			4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4		5	5	5	5	5	5	2	2	4	4	4	4		3	4	4	
Electricista					1	1			2	2	2	2	2				2			2	2	2		2	2	2					1	1	
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)																																	
Soldador																																	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																																	
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	
Graniteros																																	2

FIRMA:

NOMBRE:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PERSONAL
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO
OBRA
NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

6

Periodo

20 de Junio

al

19 de Julio

FRENTE DE OBRA:

Restrepo Milán Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PERSONAL			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M		
Maestro de obra			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			
Oficial de obra			4	4	4	4	4		3	2	3	3	3	2		2	2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1			2	1	2
Ayudante de obra																		2	2	2	2								2		2	1	2	
Electricista																																		
Plomero																																		
Operador de maquinaria (constante)																																		
Soldador																																		
Carpinteros																																		
Especialista en redes eléctricas																2	2	2	2	2	2	2		2		2								
Especialista en estructuras																																		
Especialista en redes hidrosanitarias																																		
Asesor ambiental																																		

FIRMA:
NOMBRE:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

19 Junio

al

20 Julio

FRENTE DE OBRA:

IED Alfredo Inarte

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PERSONAL		L	F	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	F	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra																																		
Oficial de obra		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3		3	3	1	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2			1	1
Ayudante de obra		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	3	3	3	3	5	2			2	2	2	2	1					
Electricista																																		
Plomero																								1	1	1	1	1						
Operador de maquinaria (constante)																																		
Soldador																																		
Carpinteros																																		
Especialista en redes eléctricas																																		
Especialista en estructuras																																		
Especialista en redes hidrosanitarias																																		
Asesor ambiental																																		
																													</					

FIRMA:

NOMBRE: Juan R.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

19 de Junio al

al

20 de Julio

FRENTE DE OBRA:

IED El Libertador Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
Maestro de obra																		1 M	1 (M)	1 (S)													
Oficial de obra									2 (U)	2 (M)	2 (M)	3 (J)	2 (V)		2 (S)	2 (D)	2 (L)	1 M	1 (M)	1 (S)	1 (V)	1	2	1	1	1	1						
Ayudante de obra									1 (U)	1 (M)	2 (M)	2 (J)			2 (S)	2 (D)	2 (L)	5 M	5 (M)	4 (J)	3 (V)	3		2	1	1	1						
Electricista																					2			1									
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)																																	
Soldador																																	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																																	
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	

FIRMA:

Jhs R.

NOMBRE: Jhs R.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

Edison Ricardo Duarte Diaz

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

TIPO DE CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO

OBRA
CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

19 de Junio

al

20 Julio

FRENTE DE OBRA:

IED Rafael Delgado Salguero

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		L	F	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra																																	
Oficial de obra		1	1	1	1	1	1		3	2	2	2	3		2	—	2	2	2	—	4	2	1	5	1	1	1	2	2	—	2	1	1
Ayudante de obra		1	1	1	1	1	1		2	3	3	3	2		3	—	1	—	3	2	3	1	—	1	1	2	2	1	—	—	1	1	1
Electricista																							3				1						
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)																																	
Soldador																																	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																																	
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	

FIRMA:

NOMBRE: Jhon R.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTROL DE PERSONAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

OBRA

NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.4077645

OBJETO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA

CONSORCIO MIA GP

INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL

Periodo

19 Junio

al

20 Julio

FRENTE DE OBRA:

IED Reino De Holanda

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL		L	F	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra																					1	1											
Oficial de obra		2	2	2	2	2	2		3	3	3	3	3		3	3	4	4	4	8	10	11	13	2	4	2	3	2	2		2	2	2
Ayudante de obra		3	3	3	3	3	3		2	2	2	2	2		2	2	2	3	3	2	4	9	9		1	1	1	1	1		1	1	1
Electricista																					3	2											
Plomero																																	
Operador de maquinaria (constante)																					2	2	2										
Soldador																																	
Carpinteros																																	
Especialista en redes eléctricas																																	
Especialista en estructuras																																	
Especialista en redes hidrosanitarias																																	
Asesor ambiental																																	

FIRMA:

Jhon K

NOMBRE: Jhon Racha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

Edison Ricardo Duarte Diaz

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PERSONAL
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
Secretaría
Educación
TIPO DE CONTRATO
OBRA
NUMERO DE CONTRATO
CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO

*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

CONTRATISTA
CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA
CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL
Periodo
19 Junio
al
20 Julio
FRENTE DE OBRA:
IED Manabess y Mdinos
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

	DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PERSONAL		F	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V		S	D	L	F	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Maestro de obra										1	1	1	1		1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	
Oficial de obra		2	2	2	2	2	2		2	1	1	1	1		1			1	2	1	1	1		1	1	3	3	3	3		2	2	4	
Ayudante de obra		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2			3	4	3	3	3		3	3	3	3	2	2		3	3	3	
Electricista																															1			
Plomero																																		
Operador de maquinaria (constante)																																		
Soldador																																		
Carpinteros																																		
Especialista en redes eléctricas																																		
Especialista en estructuras																																		
Especialista en redes hidrosanitarias																																		
Asesor ambiental																																		

FIRMA:
NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL No.6 Página 25	 CONSORCIO TIG	CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

Anexo 1.1.2. Relación Correspondencia



INFORME MENSUAL No.6 Página 26	 CONSORCIO TIG	CO1.PCCNTR.4155718
		<i>TIG-FO-001</i>
		Versión 01

Relación Salidas





FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
19/06/2023	TIG-MEM-250	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.22	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
20/06/2023	TIG-MEM-251	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
20/06/2023	TIG-MEM-252	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_182 - DISEÑO REFUERZO ESTRUCTURAL COLEGIO REFAEL DELGADO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
20/06/2023	TIG-MEM-253	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_184 - INFORME DE RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
20/06/2023	TIG-MEM-254	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5 PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
21/06/2023	TIG-MEM-255	SOLICITUD DOCUMENTACION DE PERSONAL PARA INGRESO A OBRA PARA EL COLEGIO RESTREPO MILLAN	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
22/06/2023	TIG-MEM-256	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
22/06/2023	TIG-MEM-257	TIG-MEM-257-RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_179 - INFORME PRELIMINAR DISEÑO RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO - FE Y ALEGRÍA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
25/06/2023	N/A	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_191	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
26/06/2023	TIG-MEM-258	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_188 - INFORME PRELIMINAR DISEÑO SANITARIO - BATERIAS SANITARIAS - FE Y ALEGRÍA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
26/06/2023	TIG-MEM-259	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 5	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
26/06/2023	TIG-MEM-260	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.23	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
27/06/2023	N/A	RESPUESTA OFICIO ENVÍO APUS OBRAS NO PREVISTAS DESDE 09 HASTA 202023_RUU_MGP_192	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
28/06/2023	TIG-MEM-261	TIG-MEM-261-RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.5	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
28/06/2023	TIG-MEM-262	REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS DEL NP-09 AL NP-21 AVALADOS	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
28/06/2023	TIG-MEM-263	ESTADO DE EJECUCIÓN BATERÍAS COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
28/06/2023	TIG-MEM-264	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
03/07/2023	TIG-MEM-265	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.24	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
04/07/2023	N/A	RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_197	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
04/07/2023	TIG-MEM-266	NOTIFICACIÓN VERBAL POR PARTE DE LA SED EN RELACIÓN A CIERTAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
04/07/2023	TIG-MEM-267	SOLICITUD DE DESGLOSE DE ÍTEMS CONTRACTUALES SEGÚN OFERTA ECONÓMICA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
04/07/2023	TIG-MEM-268	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
06/07/2023	TIG-MEM-269	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente

06/07/2023	TIG-MEM-270	TIG-MEM-270-RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_193 - INFORME PRELIMINAR DISEÑO RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
06/07/2023	TIG-MEM-271	PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN INCUMPLIMIENTO A SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5 PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
10/07/2023	TIG-MEM-272	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
10/07/2023	TIG-MEM-273	APROBACION DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS ALFREDO IRIARTE, REINO DE HOLANDA, MANUEL DEL SOCORRO, JOSE MARTI, ENRIQUE OLAYA, EL LIBERTADOR, RAFAEL DELGADO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
11/07/2023	TIG-MEM-274	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.25	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
11/07/2023	TIG-MEM-275	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_205 - DISEÑO ELECTRICO BLOQUES 11 12 13 Y 14 COLEGIO FE Y ALEGRIA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
12/07/2023	TIG-MEM-276	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_202 - Solicitud de suspensión del contrato CO1.PCCNTR.4077645 de 2022	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
13/07/2023	TIG-MEM-277	APROBACION DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS MARRUECOS Y MOLINOS, ALEXANDER FLEMING, LICEO FEMENINO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
17/07/2023	TIG-MEM-278	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.26	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
17/07/2023	TIG-MEM-279	RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_188 - Respuesta a comunicado TIG-MEM-243	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Bogotá, D.C, junio 19 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.22


Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.22, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.22:** 12/06/2023 al 18/06/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com






		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA	19/06/2023			PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	RAFAEL URIBE URIBE								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022				CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645			
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES				PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023				FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
PRÓRROGA :	N/A				PRORROGA 1:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023			
PLAZO ACTUALIZADO:	364				PLAZO ACTUALIZADO:	333			
PLAZO TRANSCURRIDO:	166	EQUIVALE AL	46%		PLAZO TRANSCURRIDO:	149	EQUIVALE AL	45%	
VALOR INICIAL :	\$	878.587.938,00			VALOR INICIAL :	\$	11.941.262.150,00		
VALOR ADICION(ES):	\$	371.557.789,00			VALOR ADICION(ES):	\$	5.050.000.000,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$	1.250.145.727,00			VALOR ACTUALIZADO:	\$	16.991.262.150,00		
VALOR PAGADO:	\$	-			VALOR PAGADO:	\$	-		
VALOR POR PAGAR:	\$	1.250.145.727,00			VALOR POR PAGAR:	\$	16.991.262.150,00		
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ				INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.									
2. CONTROL DE HITOS.									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO				FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO		
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)				20/01/2023	20/01/2023	0		
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE				21/01/2023	6/05/2023	-105		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES				21/01/2023	3/03/2023	-41		
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II				21/01/2023	10/02/2023	-20		
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA				21/01/2023	21/02/2023	-31		
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA				21/01/2023	15/02/2023	-25		
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA				21/01/2023	21/02/2023	-31		
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA				21/01/2023	15/02/2023	-25		
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN				21/01/2023	10/02/2023	-20		
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR				29/07/2023		No iniciado		
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO				29/07/2023		No iniciado		
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO				29/07/2023		No iniciado		
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO				27/02/2023	27/02/2023	0		
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ				29/07/2023	12/06/2023	47		
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL				29/07/2023		No iniciado		
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ				29/07/2023		No iniciado		
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL				29/07/2023		No iniciado		
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO				29/07/2023		No iniciado		
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR				28/04/2023	28/04/2023	0		
19	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS				29/07/2023		No iniciado		
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A				29/07/2023		No iniciado		
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM				3/04/2023	3/04/2023	0		
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A				29/07/2023		No iniciado		
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
30	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo transcurrido del proyecto en días					149	DÍAS			
3. EJECUCIÓN POR FRENTES									
No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE			
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	\$ 354.706.368,00	\$ 77.402.667,00	21,82%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN			
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	\$ 298.698.658,00	\$ 126.440.275,36	42,33%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN			
3	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	\$ 561.308.317,00	\$ -	0,00%		NO HA INICIADO			



		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		19/06/2023			PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED		VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE		ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		\$ 825.556.509,00	\$ 155.023.064,84	18,78%	18/09/2023		EN EJECUCIÓN		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		\$ 516.187.772,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		\$ 924.714.131,00	\$ 253.693.899,89	27,43%	29/07/2023		EN EJECUCIÓN		
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		\$ 1.438.352.552,00	\$ 621.542.132,15	43,21%	18/08/2023		EN EJECUCIÓN		
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		\$ 332.100.486,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		\$ 408.412.332,00	\$ 144.063.859,48	35,27%	31/07/2023		EN EJECUCIÓN		
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ		\$ 852.757.422,00	\$ 37.273.417,00	4,37%			EN EJECUCIÓN		
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL		\$ 227.195.808,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ		\$ 671.327.930,00	\$ 77.287.932,00	11,51%			EN EJECUCIÓN		
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		\$ 1.069.620.410,00	\$ 301.733.983,09	28,21%	16/09/2023		EN EJECUCIÓN		
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		\$ 688.067.369,00	\$ 480.317.924,70	69,81%	12/07/2023		EN EJECUCIÓN		
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		\$ 498.001.754,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		\$ 1.381.489.250,00	\$ 563.118.865,25	40,76%	26/08/2023		EN EJECUCIÓN		
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		\$ 457.831.172,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		\$ 304.703.052,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		\$ 656.544.890,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		\$ 339.352.709,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		\$ 2.027.739.816,00	\$ 335.226.965,75	16,53%	28/11/2023		EN EJECUCIÓN		
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS		\$ 455.893.410,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		\$ 335.852.053,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		\$ 502.836.423,00	\$ 42.348.901,00	8,42%			EN EJECUCIÓN		
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		\$ 427.077.647,00	\$ 190.465.293,79	44,60%	16/06/2023		EN EJECUCIÓN		
26	EMERGENCIAS		\$ 862.485.928,00	\$ 113.635.741,07	13,18%	19/12/2023		EN EJECUCIÓN		
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL										
No.	NOMBRE DE LA IED		PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS			PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA				
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		Se continua con la fundida de placas, se inicia con la fundida del carcamo y con la estructura de la pergola.			PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (3) personas Equipo: Un (1) mixer y herramienta menor				
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		Continúa con acabados de pintura, Inicia actividad de corte de regatas para instalación de bajantes			PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios y herramienta menor				

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		19/06/2023			PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED		PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS				PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA			
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		Se continúa con el proceso de instalación de estructura metálica en el edificio #3 a mano derecha, en el segundo piso. Se continua el proceso de acondicionamiento para construcción de la estructura en la zona de las baterías sanitarias, y encorizado en edificio #3.No se evidencia suficiente avance.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor			
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		Se continua con la demolicion de placas, se inicia con la excavación, se desmonta el cielo raso de los baños de niñas primer piso y el desmonte de las puertas de los baños.				PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: Siete (8) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor			
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		Se instalo la cubierta en zona de serigrafia, desmonte del cielo raso y divisiones existentes e instalación de caballete.El 6 de junio se realizo la entrega del bloque de sistemas,artes y medios de comunicación.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor			
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		Se continua con los acabados en estuco, se continua con la intalacion de enchape en el piso, se inicia la instalacion de cielo raso pvc.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (5) personas Equipo: Herramienta menor			
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ		Se inicia actividades de cerramiento y demolicion de placa en el parque infantil, se hace actividades de cerramiento en la cancha multiple				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (5) personas Equipo: Herramienta menor			
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ		Continúa instalación y pintura de canal de alta capacidad, continúa con el proceso de aplicación de pintura en esmalte sobre cerchas existente, continúa actividad de instalación de teja tipo sandwich.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor			
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		Inicia actividad de demolición de muros, enchape y pisos en el baño de las niñas. Inicia la actividad de pintura sobre muros en las aulas, continúan actividades de filos y estuco.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor			
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		Se continua con acabados de pintura de muros y estructura de cubierta, se instala las luminarias del pasillo y las de las aulas, se instalaan las puertas principales.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura			
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		Se continua la intervención de la biblioteca (Pintura en esmalte en cerchas metálicas existentes), instalación de estructura metálica en salones y cubierta, e inicio de demolición de enchapes en baños de segundo piso.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor			
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		Se continua con la demolición de afinado de pisos en aulas de segundo nivel, excavación manual en cárcamo existente, demolición de placa existente y retiro de sobranes, se cuenta con cubierta y estructura metálica en sitio para iniciar la intervención en bloque E.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor			
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		Inicia el suministro de mortero impermeabilizado y endurecido con refuerzo de microfibra para la terraza. Continua con la actividad de retiro de manto asfáltico y la demolición de alistedo.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor			
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		Se realiza reunion de manera presencial con la SED y la rectora donde se reanudan actividades a partir de 20/06/2023. Esto estaba supeditado a la definición del alcance por parte de la SED.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor			
26	EMERGENCIAS		Se tiene previsto atender una emergencia en la IED Gustavo Restrepo sede A, la cual se revisará la semana entrante en compañía de la SED.							
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA										
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 5.027.108.566,70		29,59%		-8,88%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.				\$ 3.518.890.391,27		20,71%			

FECHA	19/06/2023				PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023																																							
<div><div>Curva S - Grupo 8 SED</div><table><caption>Datos estimados del Gráfico de Curva S - Grupo 8 SED</caption><tr><th>Día</th><th>Programado (%)</th><th>Ejecutado (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>0,000%</td><td>0,000%</td></tr><tr><td>5</td><td>1,000%</td><td>0,000%</td></tr><tr><td>10</td><td>8,000%</td><td>12,000%</td></tr><tr><td>15</td><td>22,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>20</td><td>32,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>22</td><td>38,000%</td><td>20,000%</td></tr><tr><td>25</td><td>45,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>30</td><td>58,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>35</td><td>68,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>40</td><td>80,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>45</td><td>92,000%</td><td>18,000%</td></tr><tr><td>47</td><td>98,000%</td><td>18,000%</td></tr></table></div>											Día	Programado (%)	Ejecutado (%)	1	0,000%	0,000%	5	1,000%	0,000%	10	8,000%	12,000%	15	22,000%	18,000%	20	32,000%	18,000%	22	38,000%	20,000%	25	45,000%	18,000%	30	58,000%	18,000%	35	68,000%	18,000%	40	80,000%	18,000%	45	92,000%	18,000%	47	98,000%	18,000%
Día	Programado (%)	Ejecutado (%)																																															
1	0,000%	0,000%																																															
5	1,000%	0,000%																																															
10	8,000%	12,000%																																															
15	22,000%	18,000%																																															
20	32,000%	18,000%																																															
22	38,000%	20,000%																																															
25	45,000%	18,000%																																															
30	58,000%	18,000%																																															
35	68,000%	18,000%																																															
40	80,000%	18,000%																																															
45	92,000%	18,000%																																															
47	98,000%	18,000%																																															
6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS																																																	
<p>El contratista de obra no ha venido correspondiendo de manera diligente con la ejecución de las actividades en los distintos frentes y es por eso que el avance no aumenta representativamente, porque estamos a la espera de que entregue actividades culminadas al 100%, ya que la gran mayoría las está dejando sólo con avances.</p> <p>No se evidencia que el contratista de obra esté realizando inversiones representativas al proyecto, por lo cual, esto viene afectando de manera directa la dinámica de ejecución que a hoy se ve reflejado en un atraso de 8,88%, que es imputable única y exclusivamente al CONSORCIO MIA GP. Esto va ligado a la falta de vinculación de personal que es necesario para el aumento de la ejecución, pero si el material no sería estratégicamente procedente.</p>																																																	
7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA																																																	
ACTIVIDAD						RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA																																									
IED Fe y Alegría - Envío de propuesta de implantación de la estructura metálica de los bloques E y D						Contratista de obra		20/06/2023 (En proceso)																																									
IED San Agustín sede A - Respuesta sobre el concepto estructural de la estructura metálica del bloque de biblioteca						Contratista de interventoria		16/06/2023 (Cumplido el 15/06/23)																																									
IED Alfredo Iriarte - Definición sobre el cambio de los push						Contratista de interventoria		20/06/2023 (Cumplido el 17/06/23)																																									
IED Santa Lucía CAFAM - Reinicio de actividades según alcance recientemente definido por la SED						Contratista de obra		20/06/2023 (En proceso)																																									
IED Restrepo Millán sede B - Exposición a la rectora del plan de trabajo						Contratista de obra Contratista de interventoria		16/06/2023 (Cumplido el 16/06/23)																																									
IED Enrique Olaya - Definición de la intervención de la cubierta						Contratista de interventoria		21/06/2023 (En proceso)																																									
IED Alexander Fleming sede B - Inicio de reemplazo de la tubería de succión por polipropileno						Contratista de obra		20/06/2023 (En proceso)																																									
IED Reino de Holanda sede A - Esquema de la reja contraimpacto y el resultado de su análisis						Contratista de obra		20/06/2023 (En proceso)																																									
IED Manuel del Socorro sede A - Inicio de actividades relacionadas con la demolición de la placa del patio central						Contratista de obra		19/06/2023 (Cumplido el 17/06/23)																																									
8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES																																																	
* Reposición de push, Mesones en granito, Marcos metálicos para lámparas, Muro doble en fibrocemento con estructura particular.																																																	
9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR																																																	
Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:																																																	
<p>Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.</p> <p>Colegio Bravo Pérez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.</p> <p>Al contratista de obra se le continúa reconociendo avances teóricos por suministros de materiales en obra, no obstante el avance materializado no es el esperado, ya que se siguen evidenciando atrasos. Esto, a pesar de realizar el análisis sobre la programación actualizada, la cual involucró el 100% de los frentes a ejecutar.</p>																																																	

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública				
FECHA		19/06/2023			PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO										
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL			REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE									
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES									
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II									
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA									
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA									

FECHA		19/06/2023	PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO							
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	 						
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	 						
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA							
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA							

FECHA		19/06/2023		PERIODO No.	22	DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN								
21	COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR								
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A								
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM								


FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Directora de Interventora
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, D.C, junio 20 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS FE Y ALEGRÍA, RAFAEL IRIARTE, REINDO DE HOLANDA, MANUEL DEL SOCORRO.

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.


No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Edgar Riaño	79304802	Ayudante	Fe y Alegría
2	Nelson García	79697171	Ayudante	Fe y Alegría
3	Yohan Rincon	7085677	Ayudante	Rafael Iriarte



4	Darlin Mejia	1019008681	Ayudante	Rafael Iriarte
5	German Gaona	79919700	Ayudante	Manuel del Socorro
6	Julio García	104931882	Ayudante	Rafael Iriarte
7	Rubén Jiménez	5378110	Ayudante	Rafael Iriarte
8	Willi Rondón	2934698	Ayudante	Rafael Iriarte
10	Wilinton Rodriguez	80047727	Ayudante	Reino Holanda
11	Ronin Prato	1004365555	Ayudante	Manuel del Socorro
12	William Bernal	80115979	Conductor	Manuel del Socorro
13	Diego Parra	79812922	Conductor	Manuel del Socorro

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE

Director de interventoría

CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Dalia Minerva Ambiental CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.919.700
GAONA CASTANEDA

APELLIDOS
GERMAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1979
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-MAR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDECE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALFONSO SANCHEZ TORRES



A-1500150-0019-4507-M-0079919700-20091108 .001780B-58A 2 1120345061

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565744-0	TECNISERVICIOS RCR S.A.S.		CRA. 13 #32-51 TORRE 3 OF. 901	3003482	tecniserviciosrcrsas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	MOBIL	MOBIL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-06	2023-05	E	16/06/2023	68632995	TOTAL A PAGAR
					\$360.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	3	700	0	186.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	80.800				80.800	3	300	81.100			808	81.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	3	200	46.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.600
Pensión	1	185.600	186.300
Riesgos Laborales	1	80.800	81.100
CCF	1	46.400	46.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	360.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565744-0	TECNISERVICIOS RCR S.A.S.		CRA. 13 #32-51 TORRE 3 OF. 901	3003482	tecniserviciosrcrsas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	MOBIL	MOBIL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-06	2023-05	E	16/06/2023	68632995	\$360.600


DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79919700	GAONA CASTAÑEDA GERMAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0		0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14805270163



(415)7707212489984(8020) 000001480527016 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 6 5 7 4 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECNISERVICIOS RCR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TECNISERVICIOS RCR S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 13 32 51 TO 3 OF 901

42. Correo electrónico

tecniserviciosrcrsas@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 3 4 8 2

45. Teléfono 2

3 2 1 2 3 9 5 4 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 1 1 1

2 0 1 2 1 0 0 3

4 2 9 0

2 0 1 2 1 0 0 3

4 3 1 1

7 7 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 01 - 11 / 14 : 43: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre CASALLAS TAUTIVA NATALIA ROCIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14805270163



(415)7707212489984(8020) 000001480527016 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 6 5 7 4 4 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 2 1 0 0 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 2 1 0 2 7

77. No. Matrícula mercantil

0 2 2 6 8 9 0 3

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14805270163



(415)7707212489984(8020) 000001480527016 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 6 5 7 4 4 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 0 5 8 5 2 3 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASALLAS	105. Segundo apellido TAUTIVA	106. Primer nombre NATALIA
107. Otros nombres ROCIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 3 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 2 6 2 6 0 1 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASALLAS	105. Segundo apellido TAUTIVA	106. Primer nombre EDWIN
107. Otros nombres RICARDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23027994435E2

7 DE ENERO DE 2023 HORA 12:46:31

AA23027994

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : TECNISERVICIOS RCR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TECNISERVICIOS RCR S.A.S.

N.I.T. : 900565744 0 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02268903 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 3,476,588,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 13 NO 32-51 TORRE 3 OFC 921

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@TECNISERVICIOSRCRSAS.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 13 NO 32-51 TORRE 3 OFC 921

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : TECNISERVICIOSRCRSAS@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01676700 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA TECNISERVICIOS RCR SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA O TECNISERVICIOS RCR S.A.S..

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
003 2017/06/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/06/30 02238610

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SACIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL 1) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES INDUSTRIALES, RESIDENCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 2) PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES. 3) MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MONTAJES DE EQUIPOS. 4) ASESORÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN LAS AÉREAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN. 5) SERVICIOS COMA MANTENIMIENTO Y ACABADOS EN GENERAL RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 6) ALQUILER DE MAQUINARA 7) OBRAS CIVILES DE ESTACIONES DE SERVICIO, Y MONTAJES PARA PLANTAS DE HIDROCARBUROS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4311 (DEMOLICIÓN)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

OTRAS ACTIVIDADES:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$140,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 14,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$70,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 7,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$70,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 7,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN POR LOS SOCIOS TITULARES DE LAS ACCIONES. EL GERENTE TENDRÁ UN PERÍODO INDEFINIDO. LOS SODAS TITULARES DE ACCIONES PODRÁN DESIGNAR UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE MARZO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01815288 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

CASALLAS TAUTIVA NATALIA ROCIO

C.C. 000001030585235

SUPLENTE DEL GERENTE

CASALLAS TAUTIVA EDWIN RICARDO

C.C. 000001026260140

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23027994435E2

7 DE ENERO DE 2023 HORA 12:46:31

AA23027994

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON PLENAS FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATAS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. LOS CUALES NO ESTARÁN REGIDOS POR NINGUNA CUANTÍA PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS VALORES ÚNICAMENTE SE REQUERIRÁN LAS FIRMAS DEL GERENTE.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 6 DE NOVIEMBRE DE 2012
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE ABRIL DE
2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$3,230,983,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 7,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 20 de Diciembre de 2,022

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

No. de Identificación	79919700
Nombre	: GERMAN GAONA CASTAÑEDA
Empresa/Contratante	: TECNISERVICIOS RCR SAS
Identificación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	900565744
Fecha de Afiliación a CCF	: 2013/03/18
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2013/02/05
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

La presente certificación se expide con destino a y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidiomonetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación Familiar y la carta de radicación emitida por Transacciones en Línea, firmada directamente por el trabajador.

Atentamente.

GESTIÓN DE VINCULADOS

Elaboró: TRANSACCIONES EN LÍNEA



FOR-PSA-0111



TECNISERVICIOS RCR S.A.S.
Nit.900.565.744 – 0

CERTIFICA:

IDONEIDAD OPERACIÓN RETRO EXCAVADORA HITACHI 60.

Como propietarios de la máquina HITACHI EX60-5 Certificamos al **SR. GERMAN GAONA CASTAÑEDA** identificado con documento de identidad No. 79.919.700 de la ciudad de Bogotá; como idóneo para la operación de ella con seis (10) años de experiencia en el cargo con Nuestra Compañía.

Se expide a solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022 año en curso.

Atentamente,

NATALIA ROCIO CASALLAS TAUTIVA
GERENTE
TECNISERVICIOS RCR SAS.



TECNISERVICIOS RCR S.A.S.
Nit.900.565.744 – 0

CERTIFICA:

MANTENIMIENTO RETRO EXCAVADORA HITACHI 60.

Como propietarios de la máquina HITACHI EX60-5 Certificamos que se ha realizado el RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO el 28 de Diciembre del 2022 al equipo de nuestra Compañía , y se le seguirá haciendo cada 250 horas laboradas .

Se expide a solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022 año en curso.

Atentamente,

NATALIA ROCIO CASALLAS TAUTIVA
GERENTE
TECNISERVICIOS RCR SAS.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **GERMAN GAONA CASTAÑEDA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79919700**, se encuentra afiliado/a desde **30/09/2005** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de enero de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): GERMAN GAONA CASTAÑEDA identificado con Cédula Ciudadanía No. 79919700, de la empresa TECNISERVICIOS RCR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TECNISERVICIOS RCR S.A.S. está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 24/07/2021 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301011288060.

Dada en Bogotá, a los 17 días del mes de enero de 2023

Cordialmente


GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



CRONOGRAMA MANTENIMIENTO HITACHI 60
MAQUINARIA PESADA TECNISERVICIOS RCR SAS

NITA 900565744-0

FILTROS Y ACEITES HORA	250	500	750	1000	1500	3000
FILTRO DE ACEITE	✓					
FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓					
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	✓					
FILTRO DE AIRE (INTERNO Y EXTERNO)	✓					
FILTRO DEL SISTEMA HIDRÁULICO		✓				
ACEITE MOTOR	✓					
ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO			✓			
ACEITE MOTORES DE TRASLACIÓN			✓			
ACEITE TORNAMESA DE GIRO				✓		
REVISIÓN DE ORUGAS				✓		


SUPÉRVISADO: NATALIA CASALLAS

TÉCNICO: DIEGO CELIS

OPERADOR: JESUS ACUÑA

3. Altura para el transporte	2880 mm
9. Altura máxima de corte	7550 mm
10. Altura máxima de carga	5470 mm
11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	6660 mm
12. Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	4060 mm
13. Profundidad máxima de excavación	4660 mm

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDAD

COMPARACIÓN

ESPECIFICACIONES

PIEZAS


CONTACTOS

DIMENSIONES

4. Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2140 mm
5. Despeje sobre el suelo	360 mm
7. Altura hasta la parte superior de la cabina	2570 mm
8. Radio de giro de la parte trasera de la plataforma	1750 mm
15. Despeje del contrapeso sobre el suelo	760 mm
15. Despeje del contrapeso sobre el suelo	760 mm

Característica de plumas/secciones 1

1. Longitud para el transporte	6080 mm
3. Altura para el transporte	2570 mm
9. Altura máxima de corte	7150 mm
10. Altura máxima de carga	5070 mm
11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	6160 mm
12. Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	3520 mm
13. Profundidad máxima de excavación	4150 mm
1. Longitud para el transporte	6120 mm

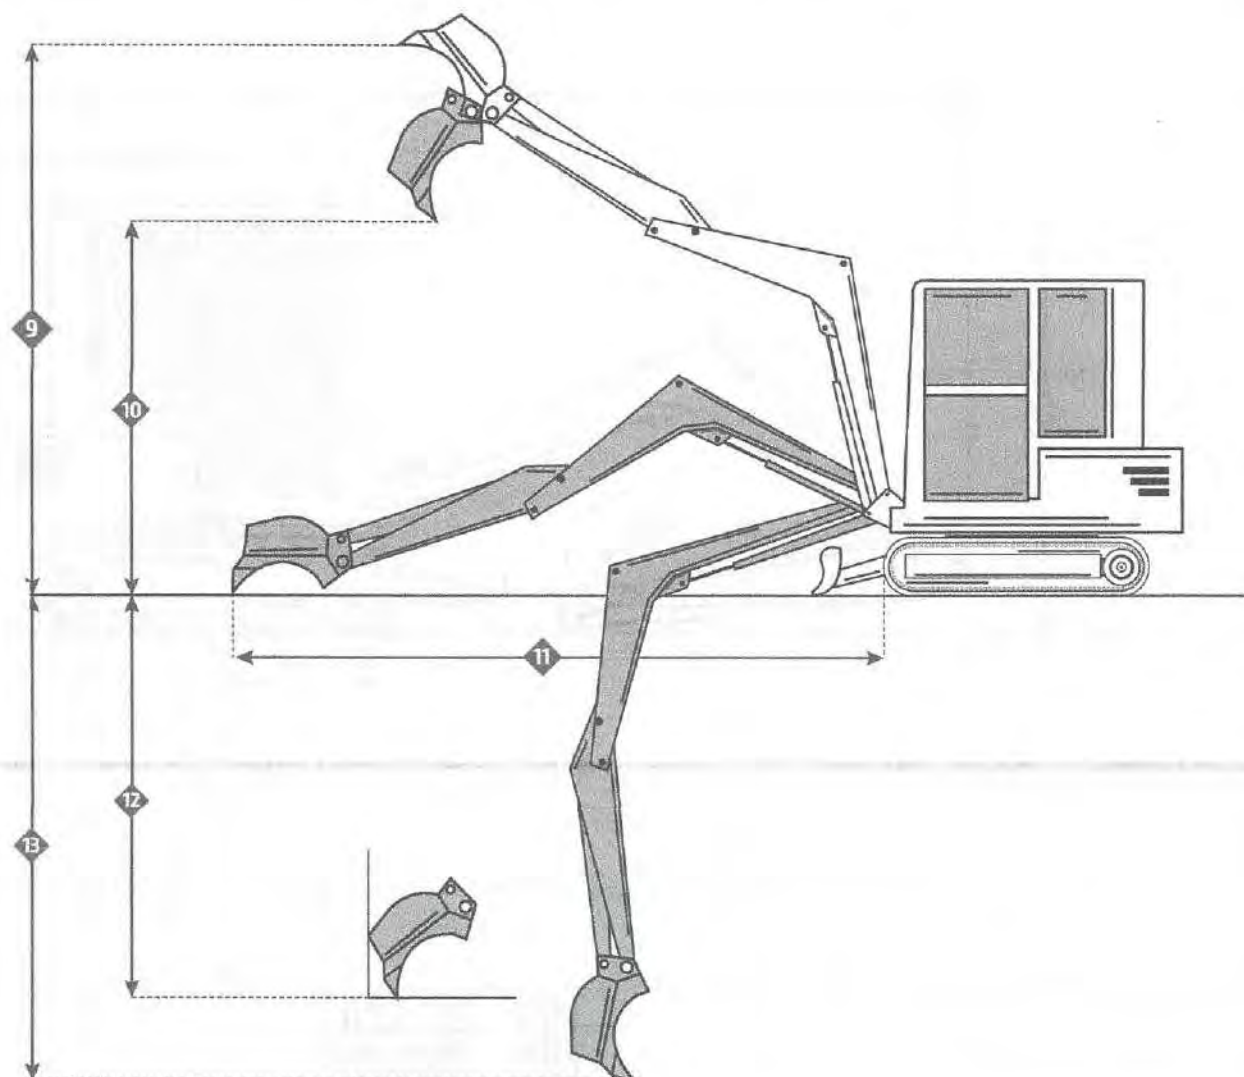


Imágenes

Tren de rodaje

6. Ancho de vía	1750 mm
14. Tamaño de la zapata	450 mm

Dimensiones

2. Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga	2200 mm
---	---------

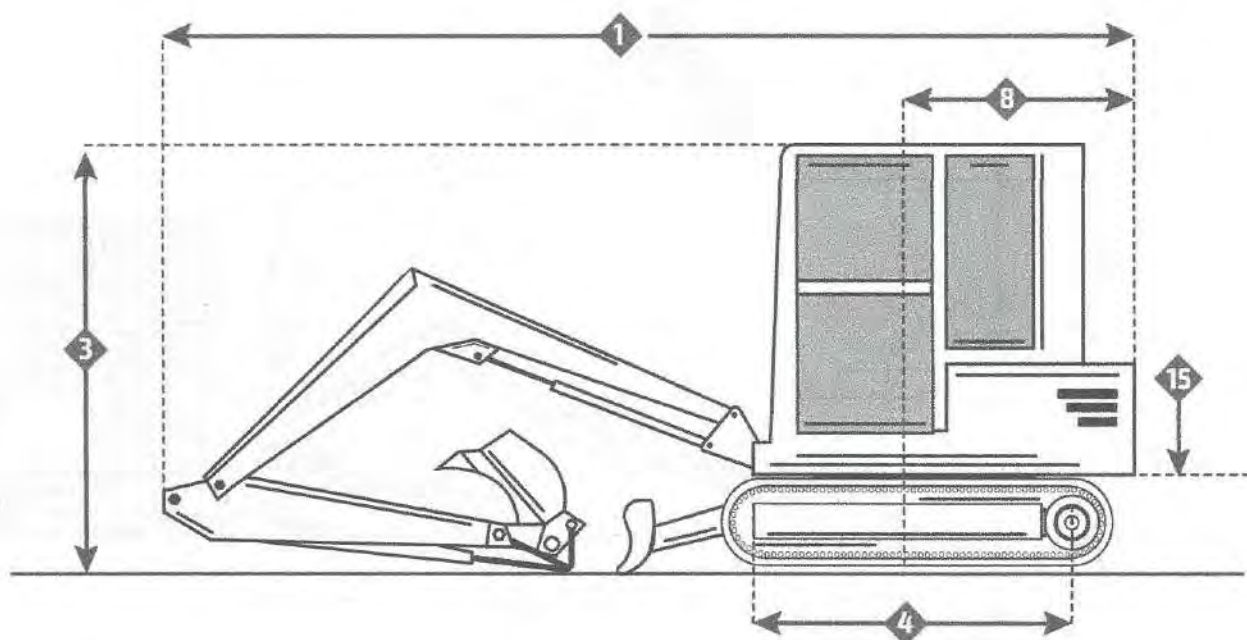


DATOS TÉCNICOS

COMPARACIÓN

PIEZAS

DIMENSIONES

FUNCIO

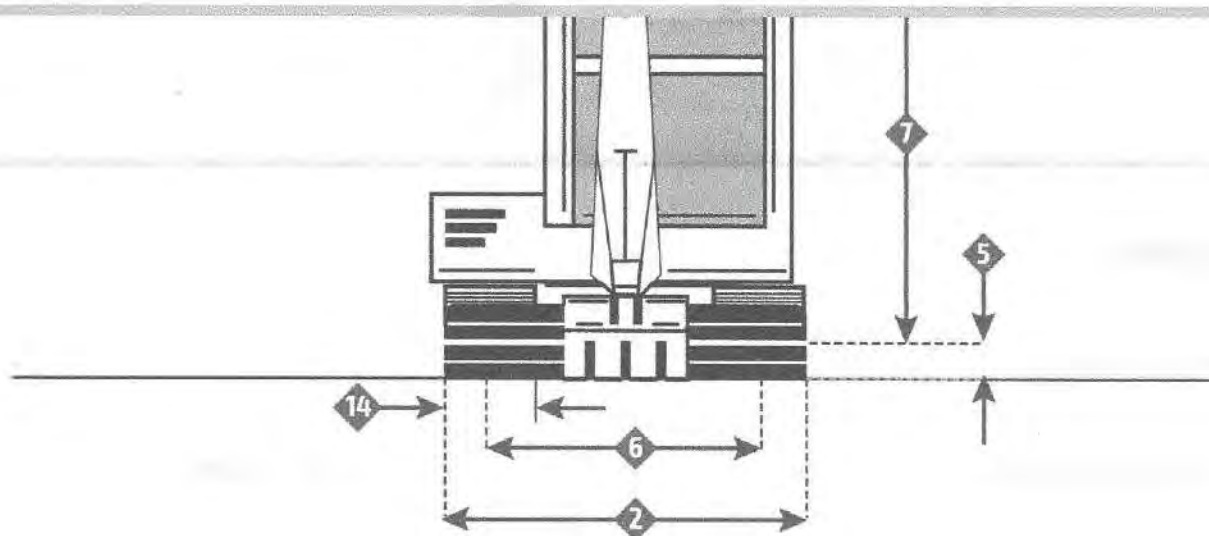

Profundidad máxima de excavación	4660 mm
Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	6660 mm
Altura máxima de corte	7550 mm
Altura máxima de carga	5470 mm
Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	4060 mm

Característica de plumas/secciones 1

Altura para el transporte	2570 mm
Longitud para el transporte	6080 mm
Profundidad máxima de excavación	4150 mm
Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	6160 mm
Altura máxima de corte	7150 mm
Altura máxima de carga	5070 mm
Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	3520 mm

longitud de la pluma**Tensión de funcionamiento****12 V****Amperaje del generador****25 amperios****Presión de la válvula de
regulación del sistema
hidráulico****31371.1 kPa****Capacidad de la bomba
hidráulica****158.4 l/min**

Dimensiones

**Ancho hasta el lado exterior de
la cadena de oruga****2200 mm****Altura hasta la parte superior
de la cabina****2570 mm****Despeje sobre el suelo****360 mm****Despeje del contrapeso sobre el
suelo****760 mm****Radio de giro de la parte trasera
de la plataforma****1750 mm****Longitud de la cadena de la
oruga a nivel del suelo****2140 mm**

Característica de plumas/secciones 2

Altura para el transporte**2880 mm****Longitud para el transporte****6120 mm**

Fabricante	Nissan
Modelo	A-BD30
Potencia efectiva	40.3 kW
Potencia medida en	2200 RPM.
Cilindrada	3 l.
Momento de fuerza tomado en	1500 RPM.
Momento de fuerza máximo	181 Nm
Aspiración	aspiración natural

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	14.5 RPM.
--------------------------	------------------

Explotación

Peso útil	6300 kg
Volumen de combustible	35.7 l.
Volumen del fluido del sistema refrigerante	10 l.
Volumen del fluido del sistema hidráulico	90 l.
Volumen de aceite del motor	12.5 l.
Volumen del fluido del mecanismo del cambio de	1.8 l.

[Inicio](#) / [Datos técnicos](#) / [Excavadora de tamaño medio](#) / [Hitachi](#) / EX60-5

Maquinaria de construcción. Excavadora de tamaño medio - Hitachi EX60-5

Tren de rodaje

Velocidad máxima de transporte	4.8 km/h
Ancho de vía	1750 mm
Número de zapatas de un lado	37
Tamaño de la zapata	450 mm
Número de rodillos de apoyo a cada lado	1
Número de cojinetes a cada lado	5
Presión específica sobre el suelo	29.4 kPa

Pala

Volumen inicial de la pala	0.28 m3
Volumen mínimo de la pala	0.11 m3
Volumen máximo de la pala	0.34 m3

Motor



FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: FOR-DO-46

PÁGINA: 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

Nombre del Equipo:	RETRO EXCAVADORA
Ubicación del equipo:	BOGOTA D.C
Marca:	HITACHI
Modelo:	EX60-5
Serie:	BD30-050210
Fecha de puesta en funcionamiento:	FEBRERO 2012

DATOS DEL PROVEEDOR

Fabricante y Lugar de origen:	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY TOKYO JAPON
Fecha de adquisición:	FEBRERO 2012
Nombre de proveedor y Dirección:	CASA COLOMBIA Carrera 70 n°74c-04
Datos de contacto E-mail, teléfono:	subgerente@importadoracasacolombia.com 2509894
Posee catálogo de manejo u operación:	si
Mantenimiento indicado por el fabricante:	si
Condiciones de operación:	Optimas de acuerdo a los parámetros del fabricante

CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO

Medición a realizar:	
Rango de Uso:	diaria
Resolución:	
Exactitud:	0.5
Frecuencia de Calibración:	Cada 250 hrs
Frecuencia de Verificación:	mensual
Patrones:	
Garantía: SI ____ NO <u>x</u> ____	Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES

C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.

FECHA	C	V	M	Descripción	Responsable

 DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación		Privada	500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1. Año 2012 Espacio reservado para la DIAN antes de diligenciar este formulario Lea cuidadosamente las instrucciones				4. Número de formulario 352012000183905-9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900170399 13. Dirección CR 70 74 C 04		6. DV. 6 11. Apellidos y nombres o Razón Social IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S		15. Teléfono 2509694 12. Cód. Admón. 35 16. Cód. Dpto. 11 17. Cód. Ciudad Municipal 001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 900036951 29. Número documento de identificación 79713659		25. DV. 1 26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS FENIX S A S NIVEL 2 30. Apellidos y nombres CALDERON GARCIA WILLIAM RICARDO		27. Tipo usuario 25 28. Cód. usuario 495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31. Clase Importador 02 32. Tipo declaración Inicial 33. Cód. 1 34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 36. Cód. Admón. XX 37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX 38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX 39. Cód. Admón. XX		40. Cód. lugar ingreso mercancías BUN 41. Cód. Depósito 20950 42. Manifiesto de carga No. 116575003391774 43. Año - Mes - Día 2012 - 06 - 28 44. Documento de transporte No. SUDUN24206648100 45. Año - Mes - Día 2012 - 05 - 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY TRADING CO., LTD 49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 6-9-3, HIGASHI-UENO TAITO-KU, TOKYO, 110-0015, JAPAN				47. Ciudad TOKYO 48. Cód. País Exportador 399																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
51. No. de factura AN000862 52. Año - Mes - Día 2012 - 05 - 22 53. Cód. país procedencia 399 54. Cód. Modo Transporte 1 55. Código de Bandera 351 56. Cód. Depósito destino 11		57. Empresa transportadora EDUARDO L GERLEIN S A 58. Tasa de cambio \$ c/u. 1,774.37		59. Subpartida arancelaria S 8429520000 60. Cód. Complementario XX 61. Cód. Suplementario XX 62. Cód. Modalidad C100 63. No. cuotas o meses XX 64. Valor cuota USD XXXX 65. Periodicidad del pago de la cuota XX 66. Cód. país de origen 399 67. Cód. Acuerdo XXX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
68. Forma de pago de la importación 08 69. Tipo de importación 01 70. Cód. país compra 399 71. Peso bruto kgs. 20,500.00 72. Peso neto kgs. 20,500.00 73. Código embalaje PK 74. No. bultos 44 75. Subpartidas 2 76. Cód. unidad comercial U 77. Cantidad docs. 3.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>78. Valor FOB USD</th> <th>79. Valor fletes USD</th> <th>80. Valor Seguros USD</th> <th>81. Valor Otros Gastos USD</th> <th>82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD</th> <th>83. Ajuste valor USD</th> <th>84. Valor aduana USD</th> <th>85. Código registro o licencia</th> <th>86. Número</th> <th>87. Año</th> <th>88. Programa No.</th> <th>89. Cód. Interno del Producto</th> <th>90. Cód. Admón.</th> <th>91. Año</th> <th>92. Programa No.</th> <th>93. Cód. Interno del Producto</th> <th>94. Cód. Admón.</th> <th>95. Año</th> <th>96. Programa No.</th> <th>97. Cód. Interno del Producto</th> <th>98. Cód. Admón.</th> <th>99. Año</th> <th>100. Programa No.</th> <th>101. Cód. Interno del Producto</th> <th>102. Cód. Admón.</th> <th>103. Año</th> <th>104. Programa No.</th> <th>105. Cód. Interno del Producto</th> <th>106. Cód. Admón.</th> <th>107. Año</th> <th>108. Programa No.</th> <th>109. Cód. Interno del Producto</th> <th>110. Cód. Admón.</th> <th>111. Año</th> <th>112. Programa No.</th> <th>113. Cód. Interno del Producto</th> <th>114. Cód. Admón.</th> <th>115. Año</th> <th>116. Programa No.</th> <th>117. Cód. Interno del Producto</th> <th>118. Cód. Admón.</th> <th>119. Año</th> <th>120. Programa No.</th> <th>121. Cód. Interno del Producto</th> <th>122. Cód. Admón.</th> <th>123. Año</th> <th>124. Programa No.</th> <th>125. Cód. Interno del Producto</th> <th>126. Cód. Admón.</th> <th>127. Año</th> <th>128. Programa No.</th> <th>129. Cód. Interno del Producto</th> <th>130. Cód. Admón.</th> <th>131. Año</th> <th>132. Programa No.</th> <th>133. Cód. Interno del Producto</th> <th>134. Cód. Admón.</th> <th>135. Año</th> <th>136. Programa No.</th> <th>137. Cód. Interno del Producto</th> <th>138. Cód. Admón.</th> <th>139. Año</th> <th>140. Programa No.</th> <th>141. Cód. Interno del Producto</th> <th>142. Cód. Admón.</th> <th>143. Año</th> <th>144. Programa No.</th> <th>145. Cód. Interno del Producto</th> <th>146. Cód. Admón.</th> <th>147. Año</th> <th>148. Programa No.</th> <th>149. Cód. Interno del Producto</th> <th>150. Cód. Admón.</th> <th>151. Año</th> <th>152. Programa No.</th> <th>153. Cód. Interno del Producto</th> <th>154. Cód. Admón.</th> <th>155. Año</th> <th>156. Programa No.</th> <th>157. Cód. Interno del Producto</th> <th>158. Cód. Admón.</th> <th>159. Año</th> <th>160. Programa No.</th> <th>161. Cód. Interno del Producto</th> <th>162. Cód. Admón.</th> <th>163. Año</th> <th>164. Programa No.</th> <th>165. Cód. Interno del Producto</th> <th>166. Cód. Admón.</th> <th>167. Año</th> <th>168. Programa No.</th> <th>169. Cód. Interno del Producto</th> <th>170. Cód. Admón.</th> <th>171. Año</th> <th>172. Programa No.</th> <th>173. Cód. Interno del Producto</th> <th>174. Cód. Admón.</th> <th>175. Año</th> <th>176. Programa No.</th> <th>177. Cód. Interno del Producto</th> <th>178. Cód. Admón.</th> <th>179. Año</th> <th>180. Programa No.</th> <th>181. Cód. Interno del Producto</th> <th>182. Cód. Admón.</th> <th>183. Año</th> <th>184. Programa No.</th> <th>185. Cód. Interno del Producto</th> <th>186. Cód. Admón.</th> <th>187. Año</th> <th>188. Programa No.</th> <th>189. Cód. Interno del Producto</th> <th>190. Cód. Admón.</th> <th>191. Año</th> <th>192. Programa No.</th> <th>193. Cód. Interno del Producto</th> <th>194. Cód. Admón.</th> <th>195. Año</th> <th>196. Programa No.</th> <th>197. Cód. Interno del Producto</th> <th>198. Cód. Admón.</th> <th>199. Año</th> <th>200. Programa No.</th> <th>201. Cód. Interno del Producto</th> <th>202. Cód. Admón.</th> <th>203. Año</th> <th>204. Programa No.</th> <th>205. Cód. Interno del Producto</th> <th>206. Cód. Admón.</th> <th>207. Año</th> <th>208. Programa No.</th> <th>209. Cód. Interno del Producto</th> <th>210. Cód. Admón.</th> <th>211. Año</th> <th>212. Programa No.</th> <th>213. Cód. Interno del Producto</th> <th>214. Cód. Admón.</th> <th>215. Año</th> <th>216. Programa No.</th> <th>217. Cód. Interno del Producto</th> <th>218. Cód. Admón.</th> <th>219. Año</th> <th>220. Programa No.</th> <th>221. Cód. Interno del Producto</th> <th>222. Cód. Admón.</th> <th>223. Año</th> <th>224. Programa No.</th> <th>225. Cód. Interno del Producto</th> <th>226. Cód. Admón.</th> <th>227. Año</th> <th>228. Programa No.</th> <th>229. Cód. Interno del Producto</th> <th>230. Cód. Admón.</th> <th>231. Año</th> <th>232. Programa No.</th> <th>233. Cód. Interno del Producto</th> <th>234. Cód. Admón.</th> <th>235. Año</th> <th>236. Programa No.</th> <th>237. Cód. Interno del Producto</th> <th>238. Cód. Admón.</th> <th>239. Año</th> <th>240. Programa No.</th> <th>241. Cód. Interno del Producto</th> <th>242. Cód. Admón.</th> <th>243. Año</th> <th>244. Programa No.</th> <th>245. Cód. Interno del Producto</th> <th>246. Cód. Admón.</th> <th>247. Año</th> <th>248. Programa No.</th> <th>249. Cód. Interno del Producto</th> <th>250. Cód. Admón.</th> <th>251. Año</th> <th>252. Programa No.</th> <th>253. Cód. Interno del Producto</th> <th>254. Cód. Admón.</th> <th>255. Año</th> <th>256. Programa No.</th> <th>257. Cód. Interno del Producto</th> <th>258. Cód. Admón.</th> <th>259. Año</th> <th>260. Programa No.</th> <th>261. Cód. Interno del Producto</th> <th>262. Cód. Admón.</th> <th>263. Año</th> <th>264. Programa No.</th> <th>265. Cód. Interno del Producto</th> <th>266. Cód. Admón.</th> <th>267. Año</th> <th>268. Programa No.</th> <th>269. Cód. Interno del Producto</th> <th>270. Cód. Admón.</th> <th>271. Año</th> <th>272. Programa No.</th> <th>273. Cód. Interno del Producto</th> <th>274. Cód. Admón.</th> <th>275. Año</th> <th>276. Programa No.</th> <th>277. Cód. Interno del Producto</th> <th>278. Cód. Admón.</th> <th>279. Año</th> <th>280. Programa No.</th> <th>281. Cód. Interno del Producto</th> <th>282. Cód. Admón.</th> <th>283. Año</th> <th>284. Programa No.</th> <th>285. Cód. Interno del Producto</th> <th>286. Cód. Admón.</th> <th>287. Año</th> <th>288. Programa No.</th> <th>289. Cód. Interno del Producto</th> <th>290. Cód. Admón.</th> <th>291. Año</th> <th>292. Programa No.</th> <th>293. Cód. Interno del Producto</th> <th>294. Cód. Admón.</th> <th>295. Año</th> <th>296. Programa No.</th> <th>297. Cód. Interno del Producto</th> <th>298. Cód. Admón.</th> <th>299. Año</th> <th>300. Programa No.</th> <th>301. Cód. Interno del Producto</th> <th>302. Cód. Admón.</th> <th>303. Año</th> <th>304. Programa No.</th> <th>305. Cód. Interno del Producto</th> <th>306. Cód. Admón.</th> <th>307. Año</th> <th>308. Programa No.</th> <th>309. Cód. Interno del Producto</th> <th>310. Cód. Admón.</th> <th>311. Año</th> <th>312. Programa No.</th> <th>313. Cód. Interno del Producto</th> <th>314. Cód. Admón.</th> <th>315. Año</th> <th>316. Programa No.</th> <th>317. Cód. Interno del Producto</th> <th>318. Cód. Admón.</th> <th>319. Año</th> <th>320. Programa No.</th> <th>321. Cód. Interno del Producto</th> <th>322. Cód. Admón.</th> <th>323. Año</th> <th>324. Programa No.</th> <th>325. Cód. Interno del Producto</th> <th>326. Cód. Admón.</th> <th>327. Año</th> <th>328. Programa No.</th> <th>329. Cód. Interno del Producto</th> <th>330. Cód. Admón.</th> <th>331. Año</th> <th>332. Programa No.</th> <th>333. Cód. Interno del Producto</th> <th>334. Cód. Admón.</th> <th>335. Año</th> <th>336. Programa No.</th> <th>337. Cód. Interno del Producto</th> <th>338. Cód. Admón.</th> <th>339. Año</th> <th>340. Programa No.</th> <th>341. Cód. Interno del Producto</th> <th>342. Cód. Admón.</th> <th>343. Año</th> <th>344. Programa No.</th> <th>345. Cód. Interno del Producto</th> <th>346. Cód. Admón.</th> <th>347. Año</th> <th>348. Programa No.</th> <th>349. Cód. Interno del Producto</th> <th>350. Cód. Admón.</th> <th>351. Año</th> <th>352. Programa No.</th> <th>353. Cód. Interno del Producto</th> <th>354. Cód. Admón.</th> <th>355. Año</th> <th>356. Programa No.</th> <th>357. Cód. Interno del Producto</th> <th>358. Cód. Admón.</th> <th>359. Año</th> <th>360. Programa No.</th> <th>361. Cód. Interno del Producto</th> <th>362. Cód. Admón.</th> <th>363. Año</th> <th>364. Programa No.</th> <th>365. Cód. Interno del Producto</th> <th>366. Cód. Admón.</th> <th>367. Año</th> <th>368. Programa No.</th> <th>369. Cód. Interno del Producto</th> <th>370. Cód. Admón.</th> <th>371. Año</th> <th>372. Programa No.</th> <th>373. Cód. Interno del Producto</th> <th>374. Cód. Admón.</th> <th>375. Año</th> <th>376. Programa No.</th> <th>377. Cód. Interno del Producto</th> <th>378. Cód. Admón.</th> <th>379. Año</th> <th>380. Programa No.</th> <th>381. Cód. Interno del Producto</th> <th>382. Cód. Admón.</th> <th>383. Año</th> <th>384. Programa No.</th> <th>385. Cód. Interno del Producto</th> <th>386. Cód. Admón.</th> <th>387. Año</th> <th>388. Programa No.</th> <th>389. Cód. Interno del Producto</th> <th>390. Cód. Admón.</th> <th>391. Año</th> <th>392. Programa No.</th> <th>393. Cód. Interno del Producto</th> <th>394. Cód. Admón.</th> <th>395. Año</th> <th>396. Programa No.</th> <th>397. Cód. Interno del Producto</th> <th>398. Cód. Admón.</th> <th>399. Año</th> <th>400. Programa No.</th> <th>401. Cód. Interno del Producto</th> <th>402. Cód. Admón.</th> <th>403. Año</th> <th>404. Programa No.</th> <th>405. Cód. Interno del Producto</th> <th>406. Cód. Admón.</th> <th>407. Año</th> <th>408. Programa No.</th> <th>409. Cód. Interno del Producto</th> <th>410. Cód. Admón.</th> <th>411. Año</th> <th>412. Programa No.</th> <th>413. Cód. Interno del Producto</th> <th>414. Cód. Admón.</th> <th>415. Año</th> <th>416. Programa No.</th> <th>417. Cód. Interno del Producto</th> <th>418. Cód. Admón.</th> <th>419. Año</th> <th>420. Programa No.</th> <th>421. Cód. Interno del Producto</th> <th>422. Cód. Admón.</th> <th>423. Año</th> <th>424. Programa No.</th> <th>425. Cód. Interno del Producto</th> <th>426. Cód. Admón.</th> <th>427. Año</th> <th>428. Programa No.</th> <th>429. Cód. Interno del Producto</th> <th>430. Cód. Admón.</th> <th>431. Año</th> <th>432. Programa No.</th> <th>433. Cód. Interno del Producto</th> <th>434. Cód. Admón.</th> <th>435. Año</th> <th>436. Programa No.</th> <th>437. Cód. Interno del Producto</th> <th>438. Cód. Admón.</th> <th>439. Año</th> <th>440. Programa No.</th> <th>441. Cód. Interno del Producto</th> <th>442. Cód. Admón.</th> <th>443. Año</th> <th>444. Programa No.</th> <th>445. Cód. Interno del Producto</th> <th>446. Cód. Admón.</th> <th>447. Año</th> <th>448. Programa No.</th> <th>449. Cód. Interno del Producto</th> <th>450. Cód. Admón.</th> <th>451. Año</th> <th>452. Programa No.</th> <th>453. Cód. Interno del Producto</th> <th>454. Cód. Admón.</th> <th>455. Año</th> <th>456. Programa No.</th> <th>457. Cód. Interno del Producto</th> <th>458. Cód. Admón.</th> <th>459. Año</th> <th>460. Programa No.</th> <th>461. Cód. Interno del Producto</th> <th>462. Cód. Admón.</th> <th>463. Año</th> <th>464. Programa No.</th> <th>465. Cód. Interno del Producto</th> <th>466. Cód. Admón.</th> <th>467. Año</th> <th>468. Programa No.</th> <th>469. Cód. Interno del Producto</th> <th>470. Cód. Admón.</th> <th>471. Año</th> <th>472. Programa No.</th> <th>473. Cód. Interno del Producto</th> <th>474. Cód. Admón.</th> <th>475. Año</th> <th>476. Programa No.</th> <th>477. Cód. Interno del Producto</th> <th>478. Cód. Admón.</th> <th>479. Año</th> <th>480. Programa No.</th> <th>481. Cód. Interno del Producto</th> <th>482. Cód. Admón.</th> <th>483. Año</th> <th>484. Programa No.</th> <th>485. Cód. Interno del Producto</th> <th>486. Cód. Admón.</th> <th>487. Año</th> <th>488. Programa No.</th> <th>489. Cód. Interno del Producto</th> <th>490. Cód. Admón.</th> <th>491. Año</th> <th>492. Programa No.</th> <th>493. Cód. Interno del Producto</th> <th>494. Cód. Admón.</th> <th>495. Año</th> <th>496. Programa No.</th> <th>497. Cód. Interno del Producto</th> <th>498. Cód. Admón.</th> <th>499. Año</th> <th>500. Programa No.</th> <th>501. Cód. Interno del Producto</th> <th>502. Cód. Admón.</th> <th>503. Año</th> <th>504. Programa No.</th> <th>505. Cód. Interno del Producto</th> <th>506. Cód. Admón.</th> <th>507. Año</th> <th>508. Programa No.</th> <th>509. Cód. Interno del Producto</th> <th>510. Cód. Admón.</th> <th>511. Año</th> <th>512. Programa No.</th> <th>513. Cód. Interno del Producto</th> <th>514. Cód. Admón.</th> <th>515. Año</th> <th>516. Programa No.</th> <th>517. Cód. Interno del Producto</th> <th>518. Cód. Admón.</th> <th>519. Año</th> <th>520. Programa No.</th> <th>521. Cód. Interno del Producto</th> <th>522. Cód. Admón.</th> <th>523. Año</th> <th>524. Programa No.</th> <th>525. Cód. Interno del Producto</th> <th>526. Cód. Admón.</th> <th>527. Año</th> <th>528. Programa No.</th> <th>529. Cód. Interno del Producto</th> <th>530. Cód. Admón.</th> <th>531. Año</th> <th>532. Programa No.</th> <th>533. Cód. Interno del Producto</th> <th>534. Cód. Admón.</th> <th>535. Año</th> <th>536. Programa No.</th> <th>537. Cód. Interno del Producto</th> <th>538. Cód. Admón.</th> <th>539. Año</th> <th>540. Programa No.</th> <th>541. Cód. Interno del Producto</th> <th>542. Cód. Admón.</th> <th>543. Año</th> <th>544. Programa No.</th> <th>545. Cód. Interno del Producto</th> <th>546. Cód. Admón.</th> <th>547. Año</th> <th>548. Programa No.</th> <th>549. Cód. Interno del Producto</th> <th>550. Cód. Admón.</th> <th>551. Año</th> <th>552. Programa No.</th> <th>553. Cód. Interno del Producto</th> <th>554. Cód. Admón.</th> <th>555. Año</th> <th>556. Programa No.</th> <th>557. Cód. Interno del Producto</th> <th>558. Cód. Admón.</th> <th>559. Año</th> <th>560. Programa No.</th> <th>561. Cód. Interno del Producto</th> <th>562. Cód. Admón.</th> <th>563. Año</th> <th>564. Programa No.</th> <th>565. Cód. Interno del Producto</th> <th>566. Cód. Admón.</th> <th>567. Año</th> <th>568. Programa No.</th> <th>569. Cód. Interno del Producto</th> <th>570. Cód. Admón.</th> <th>571. Año</th> <th>572. Programa No.</th> <th>573. Cód. Interno del Producto</th> <th>574. Cód. Admón.</th> <th>575. Año</th> <th>576. Programa No.</th> <th>577. Cód. Interno del Producto</th> <th>578. Cód. Admón.</th> <th>579. Año</th> <th>580. Programa No.</th> <th>581. Cód. Interno del Producto</th> <th>582. Cód. Admón.</th> <th>583. Año</th> <th>584. Programa No.</th> <th>585. Cód. Interno del Producto</th> <th>586. Cód. Admón.</th> <th>587. Año</th> <th>588. Programa No.</th> <th>589. Cód. Interno del Producto</th> <th>590. Cód. Admón.</th> <th>591. Año</th> <th>592. Programa No.</th> <th>593. Cód. Interno del Producto</th> <th>594. Cód. Admón.</th> <th>595. Año</th> <th>596. Programa No.</th> <th>597. Cód. Interno del Producto</th> <th>598. Cód. Admón.</th> <th>599. Año</th> <th>600. Programa No.</th> <th>601. Cód. Interno del Producto</th> <th>602. Cód. Admón.</th> <th>603. Año</th> <th>604. Programa No.</th> <th>605. Cód. Interno del Producto</th> <th>606. Cód. Admón.</th> <th>607. Año</th> <th>608. Programa No.</th> <th>609. Cód. Interno del Producto</th> <th>610. Cód. Admón.</th> <th>611. Año</th> <th>612. Programa No.</th> <th>613. Cód. Interno del Producto</th> <th>614. Cód. Admón.</th> <th>615. Año</th> <th>616. Programa No.</th> <th>617. Cód. Interno del Producto</th> <th>618. Cód. Admón.</th> <th>619. Año</th> <th>620. Programa No.</th> <th>621. Cód. Interno del Producto</th> <th>622. Cód. Admón.</th> <th>623. Año</th> <th>624. Programa No.</th> <th>625. Cód. Interno del Producto</th> <th>626. Cód. Admón.</th> <th>627. Año</th> <th>628. Programa No.</th> <th>629. Cód. Interno del Producto</th> <th>630. Cód. Admón.</th> <th>631. Año</th> <th>632. Programa No.</th> <th>633. Cód. Interno del Producto</th> <th>634. Cód. Admón.</th> <th>635. Año</th> <th>636. Programa No.</th> <th>637. Cód. Interno del Producto</th> <th>638. Cód. Admón.</th> <th>639. Año</th> <th>640. Programa No.</th> <th>641. Cód. Interno del Producto</th> <th>642. Cód. Admón.</th> <th>643. Año</th> <th>644. Programa No.</th> <th>645. Cód. Interno del Producto</th> <th>646. Cód. Admón.</th> <th>647. Año</th> <th>648. Programa No.</th> <th>649. Cód. Interno del Producto</th> <th>650. Cód. Admón.</th> <th>651. Año</th> <th>652. Programa No.</th> <th>653. Cód. Interno del Producto</th> <th>654. Cód. Admón.</th> <th>655. Año</th> <th>656. Programa No.</th> <th>657. Cód. Interno del Producto</th> <th>658. Cód. Admón.</th> <th>659. Año</th> <th>660. Programa No.</th> <th>661. Cód. Interno del Producto</th> <th>662. Cód. Admón.</th> <th>663. Año</th> <th>664. Programa No.</th> <th>665. Cód. Interno del Producto</th> <th>666. Cód. Admón.</th> <th>667. Año</th> <th>668. Programa No.</th> <th>669. Cód. Interno del Producto</th> <th>670. Cód. Admón.</th> <th>671. Año</th> <th>672. Programa No.</th> <th>673. Cód. Interno del Producto</th> <th>674. Cód. Admón.</th> <th>675. Año</th> <th>676. Programa No.</th> <th>677. Cód. Interno del Producto</th> <th>678. Cód. Admón.</th> <th>679. Año</th> <th>680. Programa No.</th> <th>681. Cód. Interno del Producto</th> <th>682. Cód. Admón.</th> <th>683. Año</th> <th>684. Programa No.</th> <th>685. Cód. Interno del Producto</th> <th>686. Cód. Admón.</th> <th>687. Año</th> <th>688. Programa No.</th> <th>689. Cód. Interno del Producto</th> <th>690. Cód. Admón.</th> <th>691. Año</th> <th>692. Programa No.</th> <th>693. Cód. Interno del Producto</th> <th>694. Cód. Admón.</th> <th>695. Año</th> <th>696. Programa No.</th> <th>697. Cód. Interno del Producto</th> <th>698. Cód. Admón.</th> <th>699. Año</th> <th>700. Programa No.</th> <th>701. Cód. Interno del Producto</th> <th>702. Cód. Admón.</th> <th>703. Año</th> <th>704. Programa No.</th> <th>705. Cód. Interno del Producto</th> <th>706. Cód. Admón.</th> <th>707. Año</th> <th>708. Programa No.</th> <th>709. Cód. Interno del Producto</th> <th>710. Cód. Admón.</th> <th>711. Año</th> <th>712. Programa No.</th> <th>713. Cód. Interno del Producto</th> <th>714. Cód. Admón.</th> <th>715. Año</th> <th>716. Programa No.</th> <th>717. Cód. Interno del Producto</th> <th>718. Cód. Admón.</th> <th>719. Año</th> <th>720. Programa No.</th> <th>721. Cód. Interno del Producto</th> <th>722. Cód. Admón.</th> <th>723. Año</th> <th>724. Programa No.</th> <th>725. Cód. Interno del Producto</th> <th>726. Cód. Admón.</th> <th>727. Año</th> <th>728. Programa No.</th> <th>729. Cód. Interno del Producto</th> <th>730. Cód. Admón.</th> <th>731. Año</th> <th>732. Programa No.</th> <th>733. Cód. Interno del Producto</th> <th>734. Cód. Admón.</th> <th>735. Año</th> <th>736. Programa No.</th> <th>737. Cód. Interno del Producto</th> <th>738. Cód. Admón.</th> <th>739. Año</th> <th>740. Programa No.</th> <th>741. Cód. Interno del Producto</th> <th>742. Cód. Admón.</th> <th>743. Año</th> <th>744. Programa No.</th> <th>745. Cód. Interno del Producto</th> <th>746. Cód. Admón.</th> <th>747. Año</th> <th>748. Programa No.</th> <th>749. Cód. Interno del Producto</th> <th>750. Cód. Admón.</th> <th>751. Año</th> <th>752. Programa No.</th> <th>753. Cód. Interno del Producto</th> <th>754. Cód. Admón.</th> <th>755. Año</th> <th>756. Programa No.</th> <th>757. Cód. Interno del Producto</th> <th>758. Cód. Admón.</th> <th>759. Año</th> <th>760. Programa No.</th> <th>761. Cód. Interno del Producto</th> <th>762. Cód. Admón.</th> <th>763. Año</th> <th>764. Programa No.</th> <th>765. Cód. Interno del Producto</th> <th>766. Cód. Admón.</th> <th>767. Año</th> <th>768. Programa No.</th> <th>769. Cód. Interno del Producto</th> <th>770. Cód. Admón.</th> <th>771. Año</th> <th>772. Programa No.</th> <th>773. Cód. Interno del Producto</th> <th>774. Cód. Admón.</th> <th>775. Año</th> <th>776. Programa No.</th> <th>777. Cód. Interno del Producto</th> <th>778. Cód. Admón.</th> <th>779. Año</th> <th>780. Programa No.</th> <th>781. Cód. Interno del Producto</th> <th>782. Cód. Admón.</th> <th>783. Año</th> <th>784. Programa No.</th> <th>785. Cód. Interno del Producto</th> <th>786. Cód. Admón.</th> <th>787. Año</th> <th>788. Programa No.</th> <th>789. Cód. Interno del Producto</th> <th>790. Cód. Admón.</th> <th>791. Año</th> <th>792. Programa No.</th> <th>793. Cód. Interno del Producto</th> <th>794. Cód. Admón.</th> <th>795. Año</th> <th>796. Programa No.</th> <th>797. Cód. Interno del Producto</th> <th>798. Cód. Admón.</th> <th>799. Año</th> <th>800. Programa No.</th> <th>801. Cód. Interno del Producto</th> <th>802. Cód. Admón.</th> <th>803. Año</th> <th>804. Programa No.</th> <th>805. Cód. Interno del Producto</th> <th>806. Cód. Admón.</th> <th>807. Año</th> <th>808. Programa No.</th> <th>809. Cód. Interno del Producto</th> <th>810. Cód. Admón.</th> <th>811. Año</th> <th>812. Programa No.</th> <th>813. Cód. Interno del Producto</th> <th>814. Cód. Admón.</th> <th>815. Año</th> <th>816. Programa No.</th> <th>817. Cód. Interno del Producto</th> <th>818. Cód. Admón.</th> <th>819. Año</th> <th>820. Programa No.</th> <th>821. Cód. Interno del Producto</th> <th>822. Cód. Admón.</th> <th>823. Año</th> <th>824. Programa No.</th> <th>825. Cód. Interno del Producto</th> <th>826. Cód. Admón.</th> <th>827.</th></tr></thead></table>				78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Año	88. Programa No.	89. Cód. Interno del Producto	90. Cód. Admón.	91. Año	92. Programa No.	93. Cód. Interno del Producto	94. Cód. Admón.	95. Año	96. Programa No.	97. Cód. Interno del Producto	98. Cód. Admón.	99. Año	100. Programa No.	101. Cód. Interno del Producto	102. Cód. Admón.	103. Año	104. Programa No.	105. Cód. Interno del Producto	106. Cód. Admón.	107. Año	108. Programa No.	109. Cód. Interno del Producto	110. Cód. Admón.	111. Año	112. Programa No.	113. Cód. Interno del Producto	114. Cód. Admón.	115. Año	116. Programa No.	117. Cód. Interno del Producto	118. Cód. Admón.	119. Año	120. Programa No.	121. Cód. Interno del Producto	122. Cód. Admón.	123. Año	124. Programa No.	125. Cód. Interno del Producto	126. Cód. Admón.	127. Año	128. Programa No.	129. Cód. Interno del Producto	130. Cód. Admón.	131. Año	132. Programa No.	133. Cód. Interno del Producto	134. Cód. Admón.	135. Año	136. Programa No.	137. Cód. Interno del Producto	138. Cód. Admón.	139. Año	140. Programa No.	141. Cód. Interno del Producto	142. Cód. Admón.	143. Año	144. Programa No.	145. Cód. Interno del Producto	146. Cód. Admón.	147. Año	148. Programa No.	149. Cód. Interno del Producto	150. Cód. Admón.	151. Año	152. Programa No.	153. Cód. Interno del Producto	154. Cód. Admón.	155. Año	156. Programa No.	157. Cód. Interno del Producto	158. Cód. Admón.	159. Año	160. Programa No.	161. Cód. Interno del Producto	162. Cód. Admón.	163. Año	164. Programa No.	165. Cód. Interno del Producto	166. Cód. Admón.	167. Año	168. Programa No.	169. Cód. Interno del Producto	170. Cód. Admón.	171. Año	172. Programa No.	173. Cód. Interno del Producto	174. Cód. Admón.	175. Año	176. Programa No.	177. Cód. Interno del Producto	178. Cód. Admón.	179. Año	180. Programa No.	181. Cód. Interno del Producto	182. Cód. Admón.	183. Año	184. Programa No.	185. Cód. Interno del Producto	186. Cód. Admón.	187. Año	188. Programa No.	189. Cód. Interno del Producto	190. Cód. Admón.	191. Año	192. Programa No.	193. Cód. Interno del Producto	194. Cód. Admón.	195. Año	196. Programa No.	197. Cód. Interno del Producto	198. Cód. Admón.	199. Año	200. Programa No.	201. Cód. Interno del Producto	202. Cód. Admón.	203. Año	204. Programa No.	205. Cód. Interno del Producto	206. Cód. Admón.	207. Año	208. Programa No.	209. Cód. Interno del Producto	210. Cód. Admón.	211. Año	212. Programa No.	213. Cód. Interno del Producto	214. Cód. Admón.	215. Año	216. Programa No.	217. Cód. Interno del Producto	218. Cód. Admón.	219. Año	220. Programa No.	221. Cód. Interno del Producto	222. Cód. Admón.	223. Año	224. Programa No.	225. Cód. Interno del Producto	226. Cód. Admón.	227. Año	228. Programa No.	229. Cód. Interno del Producto	230. Cód. Admón.	231. Año	232. Programa No.	233. Cód. Interno del Producto	234. Cód. Admón.	235. Año	236. Programa No.	237. Cód. Interno del Producto	238. Cód. Admón.	239. Año	240. Programa No.	241. Cód. Interno del Producto	242. Cód. Admón.	243. Año	244. Programa No.	245. Cód. Interno del Producto	246. Cód. Admón.	247. Año	248. Programa No.	249. Cód. Interno del Producto	250. Cód. Admón.	251. Año	252. Programa No.	253. Cód. Interno del Producto	254. Cód. Admón.	255. Año	256. Programa No.	257. Cód. Interno del Producto	258. Cód. Admón.	259. Año	260. Programa No.	261. Cód. Interno del Producto	262. Cód. Admón.	263. Año	264. Programa No.	265. Cód. Interno del Producto	266. Cód. Admón.	267. Año	268. Programa No.	269. Cód. Interno del Producto	270. Cód. Admón.	271. Año	272. Programa No.	273. Cód. Interno del Producto	274. Cód. Admón.	275. Año	276. Programa No.	277. Cód. Interno del Producto	278. Cód. Admón.	279. Año	280. Programa No.	281. Cód. Interno del Producto	282. Cód. Admón.	283. Año	284. Programa No.	285. Cód. Interno del Producto	286. Cód. Admón.	287. Año	288. Programa No.	289. Cód. Interno del Producto	290. Cód. Admón.	291. Año	292. Programa No.	293. Cód. Interno del Producto	294. Cód. Admón.	295. Año	296. Programa No.	297. Cód. Interno del Producto	298. Cód. Admón.	299. Año	300. Programa No.	301. Cód. Interno del Producto	302. Cód. Admón.	303. Año	304. Programa No.	305. Cód. Interno del Producto	306. Cód. Admón.	307. Año	308. Programa No.	309. Cód. Interno del Producto	310. Cód. Admón.	311. Año	312. Programa No.	313. Cód. Interno del Producto	314. Cód. Admón.	315. Año	316. Programa No.	317. Cód. Interno del Producto	318. Cód. Admón.	319. Año	320. Programa No.	321. Cód. Interno del Producto	322. Cód. Admón.	323. Año	324. Programa No.	325. Cód. Interno del Producto	326. Cód. Admón.	327. Año	328. Programa No.	329. Cód. Interno del Producto	330. Cód. Admón.	331. Año	332. Programa No.	333. Cód. Interno del Producto	334. Cód. Admón.	335. Año	336. Programa No.	337. Cód. Interno del Producto	338. Cód. Admón.	339. Año	340. Programa No.	341. Cód. Interno del Producto	342. Cód. Admón.	343. Año	344. Programa No.	345. Cód. Interno del Producto	346. Cód. Admón.	347. Año	348. Programa No.	349. Cód. Interno del Producto	350. Cód. Admón.	351. Año	352. Programa No.	353. Cód. Interno del Producto	354. Cód. Admón.	355. Año	356. Programa No.	357. Cód. Interno del Producto	358. Cód. Admón.	359. Año	360. Programa No.	361. Cód. Interno del Producto	362. Cód. Admón.	363. Año	364. Programa No.	365. Cód. Interno del Producto	366. Cód. Admón.	367. Año	368. Programa No.	369. Cód. Interno del Producto	370. Cód. Admón.	371. Año	372. Programa No.	373. Cód. Interno del Producto	374. Cód. Admón.	375. Año	376. Programa No.	377. Cód. Interno del Producto	378. Cód. Admón.	379. Año	380. Programa No.	381. Cód. Interno del Producto	382. Cód. Admón.	383. Año	384. Programa No.	385. Cód. Interno del Producto	386. Cód. Admón.	387. Año	388. Programa No.	389. Cód. Interno del Producto	390. Cód. Admón.	391. Año	392. Programa No.	393. Cód. Interno del Producto	394. Cód. Admón.	395. Año	396. Programa No.	397. Cód. Interno del Producto	398. Cód. Admón.	399. Año	400. Programa No.	401. Cód. Interno del Producto	402. Cód. Admón.	403. Año	404. Programa No.	405. Cód. Interno del Producto	406. Cód. Admón.	407. Año	408. Programa No.	409. Cód. Interno del Producto	410. Cód. Admón.	411. Año	412. Programa No.	413. Cód. Interno del Producto	414. Cód. Admón.	415. Año	416. Programa No.	417. Cód. Interno del Producto	418. Cód. Admón.	419. Año	420. Programa No.	421. Cód. Interno del Producto	422. Cód. Admón.	423. Año	424. Programa No.	425. Cód. Interno del Producto	426. Cód. Admón.	427. Año	428. Programa No.	429. Cód. Interno del Producto	430. Cód. Admón.	431. Año	432. Programa No.	433. Cód. Interno del Producto	434. Cód. Admón.	435. Año	436. Programa No.	437. Cód. Interno del Producto	438. Cód. Admón.	439. Año	440. Programa No.	441. Cód. Interno del Producto	442. Cód. Admón.	443. Año	444. Programa No.	445. Cód. Interno del Producto	446. Cód. Admón.	447. Año	448. Programa No.	449. Cód. Interno del Producto	450. Cód. Admón.	451. Año	452. Programa No.	453. Cód. Interno del Producto	454. Cód. Admón.	455. Año	456. Programa No.	457. Cód. Interno del Producto	458. Cód. Admón.	459. Año	460. Programa No.	461. Cód. Interno del Producto	462. Cód. Admón.	463. Año	464. Programa No.	465. Cód. Interno del Producto	466. Cód. Admón.	467. Año	468. Programa No.	469. Cód. Interno del Producto	470. Cód. Admón.	471. Año	472. Programa No.	473. Cód. Interno del Producto	474. Cód. Admón.	475. Año	476. Programa No.	477. Cód. Interno del Producto	478. Cód. Admón.	479. Año	480. Programa No.	481. Cód. Interno del Producto	482. Cód. Admón.	483. Año	484. Programa No.	485. Cód. Interno del Producto	486. Cód. Admón.	487. Año	488. Programa No.	489. Cód. Interno del Producto	490. Cód. Admón.	491. Año	492. Programa No.	493. Cód. Interno del Producto	494. Cód. Admón.	495. Año	496. Programa No.	497. Cód. Interno del Producto	498. Cód. Admón.	499. Año	500. Programa No.	501. Cód. Interno del Producto	502. Cód. Admón.	503. Año	504. Programa No.	505. Cód. Interno del Producto	506. Cód. Admón.	507. Año	508. Programa No.	509. Cód. Interno del Producto	510. Cód. Admón.	511. Año	512. Programa No.	513. Cód. Interno del Producto	514. Cód. Admón.	515. Año	516. Programa No.	517. Cód. Interno del Producto	518. Cód. Admón.	519. Año	520. Programa No.	521. Cód. Interno del Producto	522. Cód. Admón.	523. Año	524. Programa No.	525. Cód. Interno del Producto	526. Cód. Admón.	527. Año	528. Programa No.	529. Cód. Interno del Producto	530. Cód. Admón.	531. Año	532. Programa No.	533. Cód. Interno del Producto	534. Cód. Admón.	535. Año	536. Programa No.	537. Cód. Interno del Producto	538. Cód. Admón.	539. Año	540. Programa No.	541. Cód. Interno del Producto	542. Cód. Admón.	543. Año	544. Programa No.	545. Cód. Interno del Producto	546. Cód. Admón.	547. Año	548. Programa No.	549. Cód. Interno del Producto	550. Cód. Admón.	551. Año	552. Programa No.	553. Cód. Interno del Producto	554. Cód. Admón.	555. Año	556. Programa No.	557. Cód. Interno del Producto	558. Cód. Admón.	559. Año	560. Programa No.	561. Cód. Interno del Producto	562. Cód. Admón.	563. Año	564. Programa No.	565. Cód. Interno del Producto	566. Cód. Admón.	567. Año	568. Programa No.	569. Cód. Interno del Producto	570. Cód. Admón.	571. Año	572. Programa No.	573. Cód. Interno del Producto	574. Cód. Admón.	575. Año	576. Programa No.	577. Cód. Interno del Producto	578. Cód. Admón.	579. Año	580. Programa No.	581. Cód. Interno del Producto	582. Cód. Admón.	583. Año	584. Programa No.	585. Cód. Interno del Producto	586. Cód. Admón.	587. Año	588. Programa No.	589. Cód. Interno del Producto	590. Cód. Admón.	591. Año	592. Programa No.	593. Cód. Interno del Producto	594. Cód. Admón.	595. Año	596. Programa No.	597. Cód. Interno del Producto	598. Cód. Admón.	599. Año	600. Programa No.	601. Cód. Interno del Producto	602. Cód. Admón.	603. Año	604. Programa No.	605. Cód. Interno del Producto	606. Cód. Admón.	607. Año	608. Programa No.	609. Cód. Interno del Producto	610. Cód. Admón.	611. Año	612. Programa No.	613. Cód. Interno del Producto	614. Cód. Admón.	615. Año	616. Programa No.	617. Cód. Interno del Producto	618. Cód. Admón.	619. Año	620. Programa No.	621. Cód. Interno del Producto	622. Cód. Admón.	623. Año	624. Programa No.	625. Cód. Interno del Producto	626. Cód. Admón.	627. Año	628. Programa No.	629. Cód. Interno del Producto	630. Cód. Admón.	631. Año	632. Programa No.	633. Cód. Interno del Producto	634. Cód. Admón.	635. Año	636. Programa No.	637. Cód. Interno del Producto	638. Cód. Admón.	639. Año	640. Programa No.	641. Cód. Interno del Producto	642. Cód. Admón.	643. Año	644. Programa No.	645. Cód. Interno del Producto	646. Cód. Admón.	647. Año	648. Programa No.	649. Cód. Interno del Producto	650. Cód. Admón.	651. Año	652. Programa No.	653. Cód. Interno del Producto	654. Cód. Admón.	655. Año	656. Programa No.	657. Cód. Interno del Producto	658. Cód. Admón.	659. Año	660. Programa No.	661. Cód. Interno del Producto	662. Cód. Admón.	663. Año	664. Programa No.	665. Cód. Interno del Producto	666. Cód. Admón.	667. Año	668. Programa No.	669. Cód. Interno del Producto	670. Cód. Admón.	671. Año	672. Programa No.	673. Cód. Interno del Producto	674. Cód. Admón.	675. Año	676. Programa No.	677. Cód. Interno del Producto	678. Cód. Admón.	679. Año	680. Programa No.	681. Cód. Interno del Producto	682. Cód. Admón.	683. Año	684. Programa No.	685. Cód. Interno del Producto	686. Cód. Admón.	687. Año	688. Programa No.	689. Cód. Interno del Producto	690. Cód. Admón.	691. Año	692. Programa No.	693. Cód. Interno del Producto	694. Cód. Admón.	695. Año	696. Programa No.	697. Cód. Interno del Producto	698. Cód. Admón.	699. Año	700. Programa No.	701. Cód. Interno del Producto	702. Cód. Admón.	703. Año	704. Programa No.	705. Cód. Interno del Producto	706. Cód. Admón.	707. Año	708. Programa No.	709. Cód. Interno del Producto	710. Cód. Admón.	711. Año	712. Programa No.	713. Cód. Interno del Producto	714. Cód. Admón.	715. Año	716. Programa No.	717. Cód. Interno del Producto	718. Cód. Admón.	719. Año	720. Programa No.	721. Cód. Interno del Producto	722. Cód. Admón.	723. Año	724. Programa No.	725. Cód. Interno del Producto	726. Cód. Admón.	727. Año	728. Programa No.	729. Cód. Interno del Producto	730. Cód. Admón.	731. Año	732. Programa No.	733. Cód. Interno del Producto	734. Cód. Admón.	735. Año	736. Programa No.	737. Cód. Interno del Producto	738. Cód. Admón.	739. Año	740. Programa No.	741. Cód. Interno del Producto	742. Cód. Admón.	743. Año	744. Programa No.	745. Cód. Interno del Producto	746. Cód. Admón.	747. Año	748. Programa No.	749. Cód. Interno del Producto	750. Cód. Admón.	751. Año	752. Programa No.	753. Cód. Interno del Producto	754. Cód. Admón.	755. Año	756. Programa No.	757. Cód. Interno del Producto	758. Cód. Admón.	759. Año	760. Programa No.	761. Cód. Interno del Producto	762. Cód. Admón.	763. Año	764. Programa No.	765. Cód. Interno del Producto	766. Cód. Admón.	767. Año	768. Programa No.	769. Cód. Interno del Producto	770. Cód. Admón.	771. Año	772. Programa No.	773. Cód. Interno del Producto	774. Cód. Admón.	775. Año	776. Programa No.	777. Cód. Interno del Producto	778. Cód. Admón.	779. Año	780. Programa No.	781. Cód. Interno del Producto	782. Cód. Admón.	783. Año	784. Programa No.	785. Cód. Interno del Producto	786. Cód. Admón.	787. Año	788. Programa No.	789. Cód. Interno del Producto	790. Cód. Admón.	791. Año	792. Programa No.	793. Cód. Interno del Producto	794. Cód. Admón.	795. Año	796. Programa No.	797. Cód. Interno del Producto	798. Cód. Admón.	799. Año	800. Programa No.	801. Cód. Interno del Producto	802. Cód. Admón.	803. Año	804. Programa No.	805. Cód. Interno del Producto	806. Cód. Admón.	807. Año	808. Programa No.	809. Cód. Interno del Producto	810. Cód. Admón.	811. Año	812. Programa No.	813. Cód. Interno del Producto	814. Cód. Admón.	815. Año	816. Programa No.	817. Cód. Interno del Producto	818. Cód. Admón.	819. Año	820. Programa No.	821. Cód. Interno del Producto	822. Cód. Admón.	823. Año	824. Programa No.	825. Cód. Interno del Producto	826. Cód. Admón.	827.
78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Año	88. Programa No.	89. Cód. Interno del Producto	90. Cód. Admón.	91. Año	92. Programa No.	93. Cód. Interno del Producto	94. Cód. Admón.	95. Año	96. Programa No.	97. Cód. Interno del Producto	98. Cód. Admón.	99. Año	100. Programa No.	101. Cód. Interno del Producto	102. Cód. Admón.	103. Año	104. Programa No.	105. Cód. Interno del Producto	106. Cód. Admón.	107. Año	108. Programa No.	109. Cód. Interno del Producto	110. Cód. Admón.	111. Año	112. Programa No.	113. Cód. Interno del Producto	114. Cód. Admón.	115. Año	116. Programa No.	117. Cód. Interno del Producto	118. Cód. Admón.	119. Año	120. Programa No.	121. Cód. Interno del Producto	122. Cód. Admón.	123. Año	124. Programa No.	125. Cód. Interno del Producto	126. Cód. Admón.	127. Año	128. Programa No.	129. Cód. Interno del Producto	130. Cód. Admón.	131. Año	132. Programa No.	133. Cód. Interno del Producto	134. Cód. Admón.	135. Año	136. Programa No.	137. Cód. Interno del Producto	138. Cód. Admón.	139. Año	140. Programa No.	141. Cód. Interno del Producto	142. Cód. Admón.	143. Año	144. Programa No.	145. Cód. Interno del Producto	146. Cód. Admón.	147. Año	148. Programa No.	149. Cód. Interno del Producto	150. Cód. Admón.	151. Año	152. Programa No.	153. Cód. Interno del Producto	154. Cód. Admón.	155. Año	156. Programa No.	157. Cód. Interno del Producto	158. Cód. Admón.	159. Año	160. Programa No.	161. Cód. Interno del Producto	162. Cód. Admón.	163. Año	164. Programa No.	165. Cód. Interno del Producto	166. Cód. Admón.	167. Año	168. Programa No.	169. Cód. Interno del Producto	170. Cód. Admón.	171. Año	172. Programa No.	173. Cód. Interno del Producto	174. Cód. Admón.	175. Año	176. Programa No.	177. Cód. Interno del Producto	178. Cód. Admón.	179. Año	180. Programa No.	181. Cód. Interno del Producto	182. Cód. Admón.	183. Año	184. Programa No.	185. Cód. Interno del Producto	186. Cód. Admón.	187. Año	188. Programa No.	189. Cód. Interno del Producto	190. Cód. Admón.	191. Año	192. Programa No.	193. Cód. Interno del Producto	194. Cód. Admón.	195. Año	196. Programa No.	197. Cód. Interno del Producto	198. Cód. Admón.	199. Año	200. Programa No.	201. Cód. Interno del Producto	202. Cód. Admón.	203. Año	204. Programa No.	205. Cód. Interno del Producto	206. Cód. Admón.	207. Año	208. Programa No.	209. Cód. Interno del Producto	210. Cód. Admón.	211. Año	212. Programa No.	213. Cód. Interno del Producto	214. Cód. Admón.	215. Año	216. Programa No.	217. Cód. Interno del Producto	218. Cód. Admón.	219. Año	220. Programa No.	221. Cód. Interno del Producto	222. Cód. Admón.	223. Año	224. Programa No.	225. Cód. Interno del Producto	226. Cód. Admón.	227. Año	228. Programa No.	229. Cód. Interno del Producto	230. Cód. Admón.	231. Año	232. Programa No.	233. Cód. Interno del Producto	234. Cód. Admón.	235. Año	236. Programa No.	237. Cód. Interno del Producto	238. Cód. Admón.	239. Año	240. Programa No.	241. Cód. Interno del Producto	242. Cód. Admón.	243. Año	244. Programa No.	245. Cód. Interno del Producto	246. Cód. Admón.	247. Año	248. Programa No.	249. Cód. Interno del Producto	250. Cód. Admón.	251. Año	252. Programa No.	253. Cód. Interno del Producto	254. Cód. Admón.	255. Año	256. Programa No.	257. Cód. Interno del Producto	258. Cód. Admón.	259. Año	260. Programa No.	261. Cód. Interno del Producto	262. Cód. Admón.	263. Año	264. Programa No.	265. Cód. Interno del Producto	266. Cód. Admón.	267. Año	268. Programa No.	269. Cód. Interno del Producto	270. Cód. Admón.	271. Año	272. Programa No.	273. Cód. Interno del Producto	274. Cód. Admón.	275. Año	276. Programa No.	277. Cód. Interno del Producto	278. Cód. Admón.	279. Año	280. Programa No.	281. Cód. Interno del Producto	282. Cód. Admón.	283. Año	284. Programa No.	285. Cód. Interno del Producto	286. Cód. Admón.	287. Año	288. Programa No.	289. Cód. Interno del Producto	290. Cód. Admón.	291. Año	292. Programa No.	293. Cód. Interno del Producto	294. Cód. Admón.	295. Año	296. Programa No.	297. Cód. Interno del Producto	298. Cód. Admón.	299. Año	300. Programa No.	301. Cód. Interno del Producto	302. Cód. Admón.	303. Año	304. Programa No.	305. Cód. Interno del Producto	306. Cód. Admón.	307. Año	308. Programa No.	309. Cód. Interno del Producto	310. Cód. Admón.	311. Año	312. Programa No.	313. Cód. Interno del Producto	314. Cód. Admón.	315. Año	316. Programa No.	317. Cód. Interno del Producto	318. Cód. Admón.	319. Año	320. Programa No.	321. Cód. Interno del Producto	322. Cód. Admón.	323. Año	324. Programa No.	325. Cód. Interno del Producto	326. Cód. Admón.	327. Año	328. Programa No.	329. Cód. Interno del Producto	330. Cód. Admón.	331. Año	332. Programa No.	333. Cód. Interno del Producto	334. Cód. Admón.	335. Año	336. Programa No.	337. Cód. Interno del Producto	338. Cód. Admón.	339. Año	340. Programa No.	341. Cód. Interno del Producto	342. Cód. Admón.	343. Año	344. Programa No.	345. Cód. Interno del Producto	346. Cód. Admón.	347. Año	348. Programa No.	349. Cód. Interno del Producto	350. Cód. Admón.	351. Año	352. Programa No.	353. Cód. Interno del Producto	354. Cód. Admón.	355. Año	356. Programa No.	357. Cód. Interno del Producto	358. Cód. Admón.	359. Año	360. Programa No.	361. Cód. Interno del Producto	362. Cód. Admón.	363. Año	364. Programa No.	365. Cód. Interno del Producto	366. Cód. Admón.	367. Año	368. Programa No.	369. Cód. Interno del Producto	370. Cód. Admón.	371. Año	372. Programa No.	373. Cód. Interno del Producto	374. Cód. Admón.	375. Año	376. Programa No.	377. Cód. Interno del Producto	378. Cód. Admón.	379. Año	380. Programa No.	381. Cód. Interno del Producto	382. Cód. Admón.	383. Año	384. Programa No.	385. Cód. Interno del Producto	386. Cód. Admón.	387. Año	388. Programa No.	389. Cód. Interno del Producto	390. Cód. Admón.	391. Año	392. Programa No.	393. Cód. Interno del Producto	394. Cód. Admón.	395. Año	396. Programa No.	397. Cód. Interno del Producto	398. Cód. Admón.	399. Año	400. Programa No.	401. Cód. Interno del Producto	402. Cód. Admón.	403. Año	404. Programa No.	405. Cód. Interno del Producto	406. Cód. Admón.	407. Año	408. Programa No.	409. Cód. Interno del Producto	410. Cód. Admón.	411. Año	412. Programa No.	413. Cód. Interno del Producto	414. Cód. Admón.	415. Año	416. Programa No.	417. Cód. Interno del Producto	418. Cód. Admón.	419. Año	420. Programa No.	421. Cód. Interno del Producto	422. Cód. Admón.	423. Año	424. Programa No.	425. Cód. Interno del Producto	426. Cód. Admón.	427. Año	428. Programa No.	429. Cód. Interno del Producto	430. Cód. Admón.	431. Año	432. Programa No.	433. Cód. Interno del Producto	434. Cód. Admón.	435. Año	436. Programa No.	437. Cód. Interno del Producto	438. Cód. Admón.	439. Año	440. Programa No.	441. Cód. Interno del Producto	442. Cód. Admón.	443. Año	444. Programa No.	445. Cód. Interno del Producto	446. Cód. Admón.	447. Año	448. Programa No.	449. Cód. Interno del Producto	450. Cód. Admón.	451. Año	452. Programa No.	453. Cód. Interno del Producto	454. Cód. Admón.	455. Año	456. Programa No.	457. Cód. Interno del Producto	458. Cód. Admón.	459. Año	460. Programa No.	461. Cód. Interno del Producto	462. Cód. Admón.	463. Año	464. Programa No.	465. Cód. Interno del Producto	466. Cód. Admón.	467. Año	468. Programa No.	469. Cód. Interno del Producto	470. Cód. Admón.	471. Año	472. Programa No.	473. Cód. Interno del Producto	474. Cód. Admón.	475. Año	476. Programa No.	477. Cód. Interno del Producto	478. Cód. Admón.	479. Año	480. Programa No.	481. Cód. Interno del Producto	482. Cód. Admón.	483. Año	484. Programa No.	485. Cód. Interno del Producto	486. Cód. Admón.	487. Año	488. Programa No.	489. Cód. Interno del Producto	490. Cód. Admón.	491. Año	492. Programa No.	493. Cód. Interno del Producto	494. Cód. Admón.	495. Año	496. Programa No.	497. Cód. Interno del Producto	498. Cód. Admón.	499. Año	500. Programa No.	501. Cód. Interno del Producto	502. Cód. Admón.	503. Año	504. Programa No.	505. Cód. Interno del Producto	506. Cód. Admón.	507. Año	508. Programa No.	509. Cód. Interno del Producto	510. Cód. Admón.	511. Año	512. Programa No.	513. Cód. Interno del Producto	514. Cód. Admón.	515. Año	516. Programa No.	517. Cód. Interno del Producto	518. Cód. Admón.	519. Año	520. Programa No.	521. Cód. Interno del Producto	522. Cód. Admón.	523. Año	524. Programa No.	525. Cód. Interno del Producto	526. Cód. Admón.	527. Año	528. Programa No.	529. Cód. Interno del Producto	530. Cód. Admón.	531. Año	532. Programa No.	533. Cód. Interno del Producto	534. Cód. Admón.	535. Año	536. Programa No.	537. Cód. Interno del Producto	538. Cód. Admón.	539. Año	540. Programa No.	541. Cód. Interno del Producto	542. Cód. Admón.	543. Año	544. Programa No.	545. Cód. Interno del Producto	546. Cód. Admón.	547. Año	548. Programa No.	549. Cód. Interno del Producto	550. Cód. Admón.	551. Año	552. Programa No.	553. Cód. Interno del Producto	554. Cód. Admón.	555. Año	556. Programa No.	557. Cód. Interno del Producto	558. Cód. Admón.	559. Año	560. Programa No.	561. Cód. Interno del Producto	562. Cód. Admón.	563. Año	564. Programa No.	565. Cód. Interno del Producto	566. Cód. Admón.	567. Año	568. Programa No.	569. Cód. Interno del Producto	570. Cód. Admón.	571. Año	572. Programa No.	573. Cód. Interno del Producto	574. Cód. Admón.	575. Año	576. Programa No.	577. Cód. Interno del Producto	578. Cód. Admón.	579. Año	580. Programa No.	581. Cód. Interno del Producto	582. Cód. Admón.	583. Año	584. Programa No.	585. Cód. Interno del Producto	586. Cód. Admón.	587. Año	588. Programa No.	589. Cód. Interno del Producto	590. Cód. Admón.	591. Año	592. Programa No.	593. Cód. Interno del Producto	594. Cód. Admón.	595. Año	596. Programa No.	597. Cód. Interno del Producto	598. Cód. Admón.	599. Año	600. Programa No.	601. Cód. Interno del Producto	602. Cód. Admón.	603. Año	604. Programa No.	605. Cód. Interno del Producto	606. Cód. Admón.	607. Año	608. Programa No.	609. Cód. Interno del Producto	610. Cód. Admón.	611. Año	612. Programa No.	613. Cód. Interno del Producto	614. Cód. Admón.	615. Año	616. Programa No.	617. Cód. Interno del Producto	618. Cód. Admón.	619. Año	620. Programa No.	621. Cód. Interno del Producto	622. Cód. Admón.	623. Año	624. Programa No.	625. Cód. Interno del Producto	626. Cód. Admón.	627. Año	628. Programa No.	629. Cód. Interno del Producto	630. Cód. Admón.	631. Año	632. Programa No.	633. Cód. Interno del Producto	634. Cód. Admón.	635. Año	636. Programa No.	637. Cód. Interno del Producto	638. Cód. Admón.	639. Año	640. Programa No.	641. Cód. Interno del Producto	642. Cód. Admón.	643. Año	644. Programa No.	645. Cód. Interno del Producto	646. Cód. Admón.	647. Año	648. Programa No.	649. Cód. Interno del Producto	650. Cód. Admón.	651. Año	652. Programa No.	653. Cód. Interno del Producto	654. Cód. Admón.	655. Año	656. Programa No.	657. Cód. Interno del Producto	658. Cód. Admón.	659. Año	660. Programa No.	661. Cód. Interno del Producto	662. Cód. Admón.	663. Año	664. Programa No.	665. Cód. Interno del Producto	666. Cód. Admón.	667. Año	668. Programa No.	669. Cód. Interno del Producto	670. Cód. Admón.	671. Año	672. Programa No.	673. Cód. Interno del Producto	674. Cód. Admón.	675. Año	676. Programa No.	677. Cód. Interno del Producto	678. Cód. Admón.	679. Año	680. Programa No.	681. Cód. Interno del Producto	682. Cód. Admón.	683. Año	684. Programa No.	685. Cód. Interno del Producto	686. Cód. Admón.	687. Año	688. Programa No.	689. Cód. Interno del Producto	690. Cód. Admón.	691. Año	692. Programa No.	693. Cód. Interno del Producto	694. Cód. Admón.	695. Año	696. Programa No.	697. Cód. Interno del Producto	698. Cód. Admón.	699. Año	700. Programa No.	701. Cód. Interno del Producto	702. Cód. Admón.	703. Año	704. Programa No.	705. Cód. Interno del Producto	706. Cód. Admón.	707. Año	708. Programa No.	709. Cód. Interno del Producto	710. Cód. Admón.	711. Año	712. Programa No.	713. Cód. Interno del Producto	714. Cód. Admón.	715. Año	716. Programa No.	717. Cód. Interno del Producto	718. Cód. Admón.	719. Año	720. Programa No.	721. Cód. Interno del Producto	722. Cód. Admón.	723. Año	724. Programa No.	725. Cód. Interno del Producto	726. Cód. Admón.	727. Año	728. Programa No.	729. Cód. Interno del Producto	730. Cód. Admón.	731. Año	732. Programa No.	733. Cód. Interno del Producto	734. Cód. Admón.	735. Año	736. Programa No.	737. Cód. Interno del Producto	738. Cód. Admón.	739. Año	740. Programa No.	741. Cód. Interno del Producto	742. Cód. Admón.	743. Año	744. Programa No.	745. Cód. Interno del Producto	746. Cód. Admón.	747. Año	748. Programa No.	749. Cód. Interno del Producto	750. Cód. Admón.	751. Año	752. Programa No.	753. Cód. Interno del Producto	754. Cód. Admón.	755. Año	756. Programa No.	757. Cód. Interno del Producto	758. Cód. Admón.	759. Año	760. Programa No.	761. Cód. Interno del Producto	762. Cód. Admón.	763. Año	764. Programa No.	765. Cód. Interno del Producto	766. Cód. Admón.	767. Año	768. Programa No.	769. Cód. Interno del Producto	770. Cód. Admón.	771. Año	772. Programa No.	773. Cód. Interno del Producto	774. Cód. Admón.	775. Año	776. Programa No.	777. Cód. Interno del Producto	778. Cód. Admón.	779. Año	780. Programa No.	781. Cód. Interno del Producto	782. Cód. Admón.	783. Año	784. Programa No.	785. Cód. Interno del Producto	786. Cód. Admón.	787. Año	788. Programa No.	789. Cód. Interno del Producto	790. Cód. Admón.	791. Año	792. Programa No.	793. Cód. Interno del Producto	794. Cód. Admón.	795. Año	796. Programa No.	797. Cód. Interno del Producto	798. Cód. Admón.	799. Año	800. Programa No.	801. Cód. Interno del Producto	802. Cód. Admón.	803. Año	804. Programa No.	805. Cód. Interno del Producto	806. Cód. Admón.	807. Año	808. Programa No.	809. Cód. Interno del Producto	810. Cód. Admón.	811. Año	812. Programa No.	813. Cód. Interno del Producto	814. Cód. Admón.	815. Año	816. Programa No.	817. Cód. Interno del Producto	818. Cód. Admón.	819. Año	820. Programa No.	821. Cód. Interno del Producto	822. Cód. Admón.	823. Año	824. Programa No.	825. Cód. Interno del Producto	826. Cód. Admón.	827.						



NEWS

Declaración de Importación

Aceptación: 352012000183905-9
Subpartida: 8429520000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, señales y otros)

[illegible]

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901402105
Número Afiliación: 9001382
Razón social: CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE
S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1019008681
Nombre: DARLIN MEJIA ZAMBRANO
Fecha Ingreso: 17/06/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 16/6/2023 8:26:10 AM

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DARLIN MEJIA ZAMBRANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.019.008.681**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

... (b) ...

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

	SI	NO	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y deberes del Afiliado y del Paciente?	☒	☐	<p>En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la EPS FAMISANAR S.A.S en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en www.famisanar.com.co, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.</p> <p>Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar; y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).</p> <p><i>"Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos."</i> (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).</p>
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	☒	☐	
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	☒	☐	
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	☒	☐	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	☒	☐	
¿Autoriza a EPS Famisanar S.A.S el envío de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico?	☐	☒	

Firma del afiliado:

Nombres y Apellidos DARLIN MEJIA ZAMBRANO
Identificación: CC 1019008681

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el artículo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI ☐ NO ☒

Firma del afiliado:

Nombres y Apellidos DARLIN MEJIA ZAMBRANO
Identificación: CC 1019008681

ARTÍCULO 15. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (8) horas siguientes a la concurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

Firmante a Ruego:

Nombres y Apellidos: _____
Identificación: _____
Edad: _____
Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos
de quien no sabe o
no puede firmar: _____



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.019.008.681

MEJIA ZAMBRANO

APELLIDO
DARLIN

NOMBRES

Darlin Mejia Zambrano

FIRMA



4:14 p. m.



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1986

EL BANCO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G S RH

F

SEXO

01-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1500150-01125762-F-1019008681-20200114

0059648824A 1

9912456016

4:14 p. m.

ITEMS	NOMBRE	CÉDULA	CARGO DEL TRABAJADOR	EMPRESA
INTERVENTORIA				
1	Edison Ricardo Duarte	1090403332	Director de interventoria	Consortio TGI
2	María Alejandra Angarita	27606417	Residente de interventoria 1	Consortio TGI
3	Alvaro Hernán Coronado García	80068868	Residente de interventoria 2	Consortio TGI
4	Betty Aracelly Benavides	36951549	Residente de interventoria 3	Consortio TGI
5	Steven Alejandro Camacho Triana	1032483591	Residente de interventoria - administrativo	Consortio TGI
6	Carlos Alberto Mayorga Vela	80020496	Asesor estructural	Consortio TGI
7	Dalia Minerva Briceño Rodríguez	52729457	Asesor ambiental	Consortio TGI
8	Jesús Alberto López	10260102	Asesor de redes electricas telefonicas voz y datos	Consortio TGI
9	Omar Johanny Archila Mendoza	7227618	Asesor hidro sanitario red contra incendios y gas	Consortio TGI
10	Juan Carlos Morales Rivera	79955903	Asesor de costos presupuestos y programacion de obra	Consortio TGI
11	Juan Diego Bolivar Buitrago	1053799027	Inspector de interventoria 1	Consortio TGI
12	John Rocha Caicedo	1032462324	Inspector de interventoria 2	Consortio TGI
13	William Piamonte	7126904	Inspector de interventoria 3	Consortio TGI
14	Yajaira Rincon Pinzón	27683483	Inspector de interventoria 4	Consortio TGI
15	Juan Diego Duarte Díaz	1092389900	Arquitecto de interventoria	Consortio TGI
16	Erick Steven Ramirez Avendaño	1014241970	Técnico sst o tecnologo sst	Consortio TGI
17	Katherine Guañarita Diaz	1075236242	Técnico sst o tecnologo sst	Consortio TGI
CONTRATISTA DE OBRA				
18	Luisa Proaños	53036744	Residente de obra	Consortio Mia GP
19	Yesenia Arenas	1049638441	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
20	Angela Tarazona	60448725	Inspector sst	Consortio Mia GP
21	Guillermo Pérez	1065881660	Inspector Ambiental	Consortio Mia GP
22	Juan Camilo Cristancho	1018483607	Inspector sst	Consortio Mia GP
23	Luis Felipe Miguez López	1051240768	Inspector sst	Consortio Mia GP
24	Fabio Toro	3082270	Maestro	Consortio Mia GP
25	Marcos Antonio Patiño	13240346	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
26	Neider Polo de la Hoz	1041890049	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
27	Yesenia Arenas	1049638441	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
28	Fabio Toro	3082270	Maestro	Consortio Mia GP
29	Willian cortes	79040683	Oficial	Consortio Mia GP
30	Pablo Simbaqueba	79417961	Ing Especialista	Consortio Mia GP
31	Mauricio Moreno	79669502	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
32	Leyder José Vizcaino	1041901626	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
33	Jose Yuri Cubillos	791258390	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
34	Cesar Andres Colo	80758455	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
35	Luis Fernando Coronado	800369941	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
36	Orlando Rafael Barrios	73290321	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
37	Fred Junior Rico	1018818001	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
38	Jefre Rico Mejia	1235240272	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
39	Jorge Enrique Orobio	1114881453	Oficial de obra	Consortio Mia GP
40	Brandon Posada	1023006968	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
41	Angel Galvis	1914182771	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
42	William Caicedo	93413312	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
43	Luis Alberto Diaz	79659540	Mantenimiento de baños	Sanipor
44	Fabian Rodriguez	1109492137	Mantenimiento de baños	Sanipor
45	Luis Gabriel Acosta	79972033	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
46	William Caicedo	93413312	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
47	Daniel Cordero	19323595	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
48	Sebastian Rivera	1042996208	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
49	Jhon Alain Villasmil Blanco	6414743	Técnico eléctrico	Electricidad
50	Luis Felipe Parrado Firmado	79369992	Técnico eléctrico	Electricidad
51	German Viasus Picacoca	7177181	Técnico eléctrico	Electricidad
52	Jesús Amaya Mendoza	80262889	Técnico eléctrico	Electricidad
53	Juan De Jesús Jiménez	7911102	Técnico eléctrico	Electricidad
54	Gilberto José Díaz	15681213	Técnico eléctrico	Electricidad
55	Samir Ulloa Castañeda	100189362	Técnico eléctrico	Electricidad
56	Román Elías Conde	14278793	Ayudante plomería	Consortio Mia GP
57	Cristancho Cárdenas Sáenz	74328190	Oficial de plomería	Consortio Mia GP
58	Jhon Freyder Perea Hurtado	1014176195	Ayudante plomería	Consortio Mia GP
59	Juan de Jesús SogamosoQuesada	5969876	Ayudante plomería	Consortio Mia GP
60	David Ricardo Luna	80113612	Ayudante plomería	Consortio Mia GP
61	Luis Omar ZambranoChacón	11524197	Ventanero	Consortio Mia GP
62	William Caicedo Ardila	93413312	Ventanero	Consortio Mia GP
63	Anderson Gallego	1001190940	topografia	Consortio Mia GP
64	Guillermo Guilombo	7687771	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
65	Jose Gallego	80116540	topografia	Consortio Mia GP
66	Miguel Diaz	80777906	topografia	Consortio Mia GP
67	Jhon Coronado	1033716256	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
68	Deyder Polo	1001962795	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
69	Diego Cubillos	1012333574	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
70	Yorsuan Castro	7353844	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
71	Pedro Chaverra	6513909	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
72	Edgar Riaño	79304802	Ayudante de obra	Consortio Mia GP
73	Nelson Garcia	79697171	Ayudante de obra	Consortio Mia GP



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-13, 01:35:20 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1055461299
Periodo Cotización 202305 Periodo Servicio 202306

PAGADA 2023-06-13 13:20:57.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVIDINAMICOS SAS						
Documento	NI 900423759			Dirección	CALLE 12A N 9 89		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	5750449		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	8
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MARROQUIN RICO JULY PATRICIA			Identificación	CC 53893161		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79304802		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	03					RIAÑO EDGAR JOSE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
														0	0	0	30	30	30																												
																	F		\$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS017		4 %	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	14-7	5	6,960 %	\$ 1.160.000	\$ 80.800	CCF26	4 %	\$ 1	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	\$ 0	

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 80.800	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-13, 02:13:34 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1055461875
Periodo Cotización 202305 Periodo Servicio 202306

PAGADA 2023-06-13 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADMINISTRACION Y GERENCIA EMPRESARIAL SAS				
Documento	NI 900962851		Dirección	CL 12 #9 - 23	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	9007038	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 24
Ciudad	BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.	
Representante Legal	MORENO GOMEZ RAFAEL ALEJANDRO		Identificación	CC 79207513	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79697171		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				GARCIA BENAVIDES NELSON DAVID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF			
														0	30	30	30			F	\$ 1.160.000	25-14	16 %	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	EPS017		4 %	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	14-7	5	6,960 %	\$ 1.160.000	\$ 80.800	CCF22	4 %	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 80.800	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-13, 02:13:34 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1055461875

Periodo Cotización 202305 Periodo Servicio 202306

PAGADA 2023-06-13 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADMINISTRACION Y GERENCIA EMPRESARIAL SAS						
Documento	NI 900962851			Dirección	CL 12 #9 - 23		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	9007038		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	24
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MORENO GOMEZ RAFAEL ALEJANDRO			Identificación	CC 79207513		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79697171		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GARCIA BENAVIDES NELSON DAVID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														0	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 80.800	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2119558760	9451881248	E	2023/06/02	2023/06/05	BANCO ITAU	3	\$26,738,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	isp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: ADMON (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0			\$284,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0			\$284,500				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0			\$284,500				
9	CC	1018457992	GONIMA DIANA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	Si	\$284,500					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES						
EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

Página 2 de 5

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COLEGIO OLAYA HERRERA (15 Afiliados)																							\$6,496,005	\$1,039,800			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005		\$452,700	\$0	\$0		\$2,013,700			
Centro de Trabajo: COLEGIO OLAYA HERRERA (15 Afiliados)																							\$6,496,005	\$1,039,800			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005		\$452,700	\$0	\$0		\$2,013,700			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$6,496,005	\$1,039,800			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005		\$452,700	\$0	\$0		\$2,013,700			
87	CC	6768943	BARAJAS LUIS		X															25-14	13	\$502,667	\$80,500	EPS008	13	\$502,667	\$20,200	CCF24	13	\$502,667	\$20,200	14-4	13	\$502,667	6.960%	\$35,000	13	\$0	\$0	Si	\$155,900			
88	CC	1028184319	CANDELO SAMIR	X																23030	14	\$541,334	\$86,700	EPS012	14	\$541,334	\$21,700	CCF24	14	\$541,334	\$21,700	14-4	14	\$541,334	6.960%	\$37,700	14	\$0	\$0	Si	\$167,800			
89	PT	6377064	GONZALEZ JESUS	X	X															23020	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$3,100	14-4	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000			
90	CC	79632384	LONDOÑO JAIME	X	X															23030	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100			
91	PT	7035136	MARQUEZ SANTIAGO																	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
92	CC	11799322	MORENO VICTORIANO		X															25-14	13	\$502,667	\$80,500	EPS002	13	\$502,667	\$20,200	CCF24	13	\$502,667	\$20,200	14-4	13	\$502,667	6.960%	\$35,000	13	\$0	\$0	Si	\$155,900			
93	CC	1072523890	PEREZ YEISON	X	X															23030	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100			
94	PT	5385179	PUERTA JOHNNY	X																23030	16	\$618,667	\$99,000	EPS037	16	\$618,667	\$24,800	CCF24	16	\$618,667	\$24,800	14-4	16	\$618,667	6.960%	\$43,100	16	\$0	\$0	Si	\$191,700			
95	CC	1078920581	REENTERIA YUBER	X	X															23030	9	\$348,000	\$55,700	EPS002	9	\$348,000	\$14,000	CCF24	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	6.960%	\$24,300	9	\$0	\$0	Si	\$108,000			
96	CC	79899646	ROZO RICARDO	X	X															23020	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100			
97	CC	80721547	SANDOVAL ALEXANDER																	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
98	PT	6613255	URDANETA JONATAHAN	X																23030	11	\$425,334	\$68,100	EPSC34	11	\$425,334	\$17,100	CCF24	11	\$425,334	\$17,100	14-4	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000			
99	CC	19421071	VARGAS GUSTAVO	X																25-14	16	\$618,667	\$99,000	EPS008	16	\$618,667	\$24,800	CCF24	16	\$618,667	\$24,800	14-4	16	\$618,667	6.960%	\$43,100	16	\$0	\$0	Si	\$191,700			
100	CC	79960184	VILLANUEVA JOSE	X	X															23030	9	\$348,000	\$55,700	EPS008	9	\$348,000	\$14,000	CCF24	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	6.960%	\$24,300	9	\$0	\$0	Si	\$108,000			
101	PT	4881395	VILLARREAL EDGARDO	X	X															23030	2	\$77,334	\$12,400	EPSC34	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$3,100	14-4	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COLEGIO REINO HOLANDA (5 Afiliados)																							\$5,142,668	\$823,000			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668		\$358,200	\$0	\$0		\$1,592,800			
Centro de Trabajo: COLEGIO REINO HOLANDA (5 Afiliados)																							\$5,142,668	\$823,000			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668		\$358,200	\$0	\$0		\$1,592,800			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							\$5,142,668	\$823,000			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668		\$358,200	\$0	\$0		\$1,592,800			
102	CC	1050397472	ARIAS YOBER	X																23030	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF24	29	\$1,121,334	\$44,900	14-4	29	\$1,121,334	6.960%	\$78,100	29	\$0	\$0	Si	\$347,400			
103	PT	6971469	GUTIERREZ YERIMY																	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
104	CC	1121528070	LOPEZ SIMON	X																23030	14	\$541,334	\$86,700	EPS002	14	\$541,334	\$21,700	CCF24	14	\$541,334	\$21,700	14-4	14	\$541,334	6.960%	\$37,700	14	\$0	\$0	Si	\$167,800			
105	PT	7038443	MARQUEZ UBALDO																	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
106	CC	1027521715	QUIROGA JORGE																	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COLEGIO IRIARTE (1 Afiliados)																							\$425,334	\$68,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334		\$29,700	\$0	\$0		\$132,000			
Centro de Trabajo: COLEGIO IRIARTE (1 Afiliados)																							\$425,334	\$68,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334		\$29,700	\$0	\$0		\$132,000			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$425,334	\$68,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334		\$29,700	\$0	\$0		\$132,000			
107	CC	1006745641	LOPEZ ABAD	X																23020	11	\$425,334	\$68,100	EPS002	11	\$425,334	\$17,100	CCF24	11	\$425,334	\$17,100	14-4	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000			
Total Afiliados(107)																							\$85,105,350	\$13,618,300			\$87,502,684	\$3,502,700			\$87,502,684	\$3,502,700			\$87,502,684		\$6,020,500	\$0	\$0		\$26,644,200			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901402105	9	CASTANO CONSTRUCCIONES CONSCIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CR 23 B 67 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8909333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2119558760	9451881248	E	2023/06/02	2023/06/05	BANCO ITAU	3	\$26,738,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$13,618,300	\$47,800	\$0	\$13,666,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$940,400	\$3,300	\$0	\$943,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$1,645,900	\$5,800	\$0	\$1,651,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$6,583,600	\$23,100	\$0	\$6,606,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$4,448,400	\$15,600	\$0	\$4,464,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$6,020,500	\$21,100	\$0	\$6,041,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	107	\$6,020,500	\$21,100	\$0	\$6,041,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$3,502,700	\$12,300	\$0	\$3,515,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	107	\$3,502,700	\$12,300	\$0	\$3,515,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				107	\$3,502,700	\$13,100	\$0	\$3,515,800	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$1,600	\$100	\$0	\$1,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$114,600	\$500	\$0	\$115,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$21,700	\$100	\$0	\$21,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$150,400	\$600	\$0	\$151,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$233,600	\$900	\$0	\$234,500	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$35,600	\$200	\$0	\$35,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$400	\$0	\$93,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$939,100	\$3,300	\$0	\$942,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$72,800	\$300	\$0	\$73,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$354,700	\$1,300	\$0	\$356,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$94,400	\$400	\$0	\$94,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	\$976,800	\$3,500	\$0	\$980,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$414,600	\$1,500	\$0	\$416,100	
TOTAL				107	\$26,644,200	\$94,300	\$0	\$26,738,500	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.365.555

PRATTO MONTENEGRO

APELLIDOS

RONIN ALFONSO

NOMBRES

Rony Pratto

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-2002

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA


B+
G.S. RH

M
SEXO

03-SEP-2020 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO



P-2100150-01157172-M-1004365555-20200904

0071671983A 1

8500589519

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/06/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	87	17/06/2023	CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

728033FF7CF65CCABF6135A3DCD1F35F

Certificado impreso el día 6/16/2023 3:40:34 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



RONIN ALFONSO
PRATTO MONTENEGRO

1004365555

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.004.365.555**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



28210520

28210520

Fecha de Radicación

16062023

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite

A. Afiliación

B. Reporte de Novedades

B. Colectiva

C. Institucional

D. De oficio

A. Individual

Cotizante o Cabeza de Familia

Beneficiario o Afiliado adicional

3. Régimen

C. Contributivo

B. Subsidiado

4. Tipo de Afiliado

A. Cotizante

B. Cabeza de Familia

C. Beneficiario

5. Tipo de Cotizante

A. Dependiente

B. Independiente

C. Pensionado

Código (a registrar por la EPS)

01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

PRATTO

MONTENGERO

RONIN

ALFONSO

7. Tipo documento de Identidad

CC

8. Número del documento de Identidad

1004365555

9. Sexo

Femenino

Masculino

10. Fecha de nacimiento

16042002

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia

06

12. Discapacidad

Tipo

F

N

M

Condición

T

P

13. Puntaje SISBÉN

14. Grupo de población especial

00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL

POSITIVA S.A.

16. Administradora de Pensiones

003 / PORVENIR

17. Ingreso base de Cotización - IBC

1.160.000

18. Residencia

Avenida

45 BIS N 87 21

Dirección

3156872510

Teléfono fijo

3156872510

Teléfono Celular

ronninpratto@hotmail.com

Correo electrónico

11001 / BOGOTA

Municipio/Distrito

Urbana

Rural

Localidad/Comuna

11 / BOGOTA D.C.

Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad

21. Número del documento de identidad

22. Sexo

Femenino

Masculino

23. fecha de Nacimiento

D

D

M

M

A

A

A

A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

B1

B2

B3

B4

B5

25. Tipo de documento de identidad

26. Numero del documento de identidad

27. Sexo

Femenino

Masculino

28. Fecha de nacimiento

B1

B2

B3

B4

B5

Datos complementarios

29. Parentescos

30. Etnia

31. Discapacidad

Tipo

F

N

M

Condición

T

P

B1

B2

B3

B4

B5

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito

Zona

Urbana

Rural

Departamento

Telefonofijo y/o Celular

33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)

B1

B2

B3

B4

B5

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS

C

SINERGIA U.P.R.E.C BOGOTA PPR

SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R

Código de la IPS (a registrar por la EPS)

11600433

11600437

B

B

B

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

36. Tipo de documento de identificación

CC

37. Número del documento de identificación

13240346

38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

01

39. Ubicación

CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA 5801473

Dirección

5801473

Teléfono

obras.joyavi@gmail.com

Correo electronico

LOS PATIOS

Municipio/Distrito

NORTE DE SANTANDER

Departamento

EPS-FT-144

Mod. May/2016

EPS-FT-144

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

**INGRESO EMPLEADO****DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901402105
Número Afiliación: 9001382
Razón social: CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE
S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 80047727
Nombre: WILLINGTON RODRIGUEZ VILLANUEVA
Fecha Ingreso: 17/06/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 16/6/2023 8:06:38 AM

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

INSTRUMENTO 27480045

CERTIFICA QUE:

WILLINGTON RODRIGUEZ VILLANUEVA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.047.727**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicación

4010426726

Fecha de Radicación

1/6/06/2/0/2/3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lee las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒	2. Tipo de afiliación B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐	A. Individual: - Cotizante Cabeza de familia ☒ - Beneficiario afiliado adicional ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	6. Código (a registrar por la EPS) <input type="text" value="1"/>	

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

7. Apellidos y nombres RODRIGUEZ Primer apellido	VILLANUEVA Segundo apellido	WILLINGTON Primer nombre	Segundo nombre
8. Tipo documento de Identidad CC	9. Número del documento de Identidad 80047727	10. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	11. Fecha de nacimiento 1/6/1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

12. Etnia 6	13. Discapacidad Tipo FINI Condición YIP	14. Puntaje SISBEN	15. Grupo de población especial
16. Administradora de riesgos Laborales - ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	17. Administradora de Pensiones INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	18. Ingreso base de cotización - IBC 1160000	
19. Residencia CR 5 BIS A 47 75 SUR Dirección	20. Teléfono fijo	21. Teléfono celular 3214964357	22. Correo electrónico WILLINGTONRODRIGUEZ@GMAIL.COM
23. Municipio/Distrito BOGOTA	24. Zona Urbana ☒ Rural ☐	25. Localidad / comuna	26. Departamento BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

27. Apellidos y nombres completos Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre	28. Tipo documento de Identidad	29. Número documento Identidad	30. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	31. Fecha de nacimiento
--	---------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

32. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre	33. Tipo documento de Identidad	34. Número de Identidad	35. Sexo Femenino Masculino	36. Fecha de nacimiento
--	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------

Datos complementarios

37. Parentesco	38. Etnia	39. Discapacidad Tipo F N M Condición Y P
40. Datos de residencia Municipio/Distrito Zona Urbana Rural Departamento Teléfono Fijo y/o celular	41. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)	

Selección de la IPS Primaria

42. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS VS AMERICAS - UOD CPO AMERICAS	43. Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSAMERICAS - UODCPOAMER
--	--

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

44. Nombre o razón social CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	45. Tipo de identificación NIT	46. Número de documento de Identificación 901402105	47. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
48. Ubicación CR 23 B 67 56 Dirección	49. Teléfono 3218671656	50. Correo electrónico LMCASTANOC@GMAIL.COM	51. Municipio/distrito MANIZALES
		52. Departamento CALDAS	

M-PYGA-F001 V 1.0-2018

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Primer apellido							
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo		Fecha de nacimiento		42. Fecha	
☐		Femenino ☐ Masculino ☐				11/501612013	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: ☐		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- ☒ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☒ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☒ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

<p>Willington Rodríguez Villanueva</p> <p>54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario</p>	<p>Marcia Selva Osorio</p> <p>55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio</p>
--	---

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
- Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN		68. Fecha de radicación		69. Fecha de validación	
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel			
☐	☐	☐	☐	☐			
70. Datos funcionario que realiza la validación		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Primer apellido							
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
☐							
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **80.047.727**
RODRIGUEZ VILLANUEVA

APELLIDOS

WILLINGTON

NOMBRES

Willington Rodriguez

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **A+** **M**

ESTATURA O.S. RH SEXO

09-OCT-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1525000-00882016-M-0090047727-20170208

0053548934A 2

47006663

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901402105
Número Afiliación: 9001382
Razón social: CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE
S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento 7085677
Nombre: YOHAN DAVID RINCON CARRILLO
Fecha Ingreso: 17/06/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 16/6/2023 8:19:09 AM

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YOHAN DAVID RINCON CARRILLO, identificado(a) con Permiso de Protección Temporal **7.085.677**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de junio de 2023.

Cordialmente,



Gerente de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

9010139445
9010139445

Nº de Radicación
26354553

Fecha de Radicación
16 06 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite A. Afiliación B. Reporte de Novedades ☒	2. Tipo de Afiliación A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia ☒ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
--	---	---	--	---

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres RINCON	CARRILLO	YOHAN	DAVID
7. Tipo de documento de identidad PT	8. Número del documento de identidad 7085677	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 20 03 2005
11. Etnia ☐ 12. Discapacidad Tipo ☐ Condición ☐			
13. Puntaje SISBÉN ☐ 14. Grupo de población especial ☐			
15. Administradora de riesgos laborales - ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A			
16. Administradora de pensiones			
17. Ingreso base de cotización - IBC \$1.160.000			
18. Residencia			

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres	20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento
-------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Etnia
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						
31. Discapacidad				32. Datos de residencia		
Tipo ☐ Condición ☐				Municipio / Distrito		
F ☐ N ☐ M ☐ T ☐ P ☐				Zona Urbana ☐ Rural ☐		
				Departamento		
				Teléfono fijo y/o celular		
				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)		

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social CASTAÑO CONSTRUCCION	36. Tipo de documento de identificación NT	37. Número del documento de identificación 901402105	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación CRA 23CB 67 56	3218565198	MANIZALES	CALDAS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad	1. Modificación de datos básicos de identificación ☐	2. Corrección de datos básicos de identificación ☐	3. Actualización del documento de identidad ☐	4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐	5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐	6. Reinscripción en la EPS ☐	7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐	8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐	9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☒	10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐	11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐	12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐	13. Movilidad A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐	14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐	15. Reporte de fallecimiento ☐	16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐	17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐	18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐
---------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación	42. Fecha novedad
Tipo de documento de identidad ☐ Número del documento de identidad ☐ Sexo Femenino ☐ Masculino ☐ Fecha de nacimiento ☐	16 06 2023
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado ☐ 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones ☐

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales	47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción	48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios	49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud	50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales	51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran	52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013	53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto
---	--	---	---	---	--	--	--

VIII. FIRMAS

54. El cotizante o afiliado, beneficiario o representante	55. El representante legal de la entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
---	--

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad	57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente	58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital	59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital	60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor	61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia	62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres	63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio
--	--	--	---	---	--	---	---	---	--

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial Código del municipio ☐ Código del departamento ☐	67. Datos del SISBÉN Número de la ficha ☐ Puntaje ☐ Nivel ☐	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Tipo de documento de identidad ☐ Número del documento de identidad ☐			
71. Firma del funcionario			
OBSERVACIONES: CARGO: AYUDANTE DE ALBAÑILERIA			

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Cambio Empleo



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 7085677

RINCON CARRILLO

APELLIDOS

YOHAN DAVID

NOMBRES

VEN

NACIONALIDAD

M

SEXO

31033648

DNI N°.

20-03-2005

FECHA DE NACIMIENTO

16-07-2022

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

BOGOTA D.C.

30-05-2031

FECHA DE VENCIMIENTO



Yohan

F 1485677

VISIBLES



El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

[Handwritten signature]
Jorge Francisco Espinosa Peláez
Ministerio Nacional de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPC0L7085677<<6<<<<<<<<<<<<<<
0503202M3105308VENE2207413<<<1
RINCON<CARRILLO<<YOHAN<DAVID<<

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901712463-0	VIRAMTRANSPORT SAS		CALLE 28 SUR 4 81 ESTE	3214980506	viramtransport04@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-05	2023-05	Y	08/06/2023	68374363	\$822.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	161.600				161.600	0	0	161.600			1.616	161.600	2

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	290.000	290.000
Pensión	2	371.200	371.200
Riesgos Laborales	1	161.600	161.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	822.800	822.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901712463-0	VIRAMTRANSPORT SAS		CALLE 28 SUR 4 81 ESTE	3214980506	viramtransport04@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-05	2023-05	Y	08/06/2023	68374363	\$822.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79811922	PARRA DIAZ DIEGO ALEXANDER	59	0		N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	80115979	BERNAL PARRA WILLIAM FERNEY	59	0		N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80115979

LIBERTAD Y ORDEN

NOMBRE

WILLIAM FERNEY BERNAL PARRA

FECHA DE NACIMIENTO

14-06-1982

SANGRE

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

23-01-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁFICO EXPEDIDOR

EDM - BOGOTÁ D.C.

CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	ESPECIES
A2	MOTOCICLETA Y MONOTRUCULO DE CUALQUIER CATEGORÍA	15-06-2023	PARTICULAR
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRO RUEDAS CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSQUETA, BUS Y AUTOCARRO	23-01-2023	PARTICULAR
C3	AUTOCARRO, MOTOCARRO, CAMION, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION BÚSQUETA, BUS Y AUTOCARRO	23-01-2023	PÚBLICO





ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODAS LAS CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79812922

NOMBRE

DIEGO ALEXANDER PARRA DIAZ

FECHA DE NACIMIENTO

10-06-1978

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICIÓN

12-01-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONducir con LENTES


ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTÁ D.C.



CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	12-01-2026	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	12-01-2026	PÚBLICO



ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL


LC03005146642

Servicios Integrados 01847 204 0100



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
Registro Único Nacional de Transportes



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 155580203

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 301417787

No. de Certificado de
Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2023/04/17

Fecha de vencimiento: 2024/04/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SXJ087

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35306523

NRO. CHASIS: 9HTWYAHT7DN300582

VIN: 9HTWYAHT7DN300582

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

Service	Address	City	State	Zip	Fax
2001-07-01	1000 N. 1st St.	Phoenix	AZ	85004	(602) 955-1111



MAPFRE

[illegible]

■ **ABSTRACT**

* Hasta 900 599,99; para las siguientes tarifas: 100.100.120.140.160.711.713.721.722.731.732.810.910 y 920 Decreto 1897-2022.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

- [illegible]

* O autor declara não ter recebido financiamento para a realização da pesquisa.

- La Dirección de Asesoría Jurídica de la Universidad de Chile, en el marco de la Ley 19.100, de 1990, y de la Ley 19.253, de 1996, ha elaborado el presente Manual de Procedimientos para la tramitación de los recursos de amparo y de hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en la Ley 19.100, de 1990, y en la Ley 19.253, de 1996, y en el Decreto 1.400, de 1990, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.100, de 1990, y en el Decreto 1.401, de 1990, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.253, de 1996.

Autore: [la categoria di ricerca per una migliore esperienza.](#)

[illegible]



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

No. 165680393

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de
Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2023/04/12

Fecha de vencimiento: 2024/04/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SXJ087

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35306523

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT7DN300562

VIN: 3HTWYAHT7DN300562

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO | MES | DÍA

2023/FEB/10

VIGENCIA

DESDE

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA

HASTA

AÑO | MES | DÍA



MAPFRE

Nº DE PÓLIZA	PLACA Nº	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VEHICULO	MODELO
3431123000517	SXJ087	VEHICULOS DE CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2013
PASAJEROS	MARCA	INTERNATIONAL	CARROCERIA		
2	LÍNEA VEHICULO	7600 SBA	PLATON		
Nº MOTOR	Nº CHASIS O Nº SERIE	Nº VIN	CAPACIDAD TON.		
35308523	3HTWYAHT7DN300562	3HTWYAHT7DN300562	16.5		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR	
LEASING BOLIVAR SA	3143812956	NT	8600672037	COPACABANA	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTO	Nº FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
1326	3431	4874	3431123000517	BOGOTA D.C.	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN PORTUA	TASA RUNT	APAROS POR VICTIMA	MARCA
330	\$981500	\$510300	\$2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800 *
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10
TOTAL A PAGAR				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	
\$1493900					

FIRMA AUTORIZADA

MAPFRE

* Hasta 300 SMLDV, para las siguientes tarifas: 100,110,120,140,150,711,712,721,722,731,732,810,910 y 920. Decreto 2497-2022.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a tercero.

Texto haberes data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Bogotá, D.C, junio 20 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_182 - DISEÑO REFUERZO ESTRUCTURAL COLEGIO REFAEL DELGADO

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_182 radicada mediante correo electrónico el 13 de junio de 2023 y que tiene por asunto “DISEÑO REFUERZO ESTRUCTURAL COLEGIO REFAEL DELGADO”.

Una vez revisada la documentación adjunta, esta interventoría se permite emitir su concepto favorable frente a la propuesta técnica relacionada con la estructura metálica para este bloque y que está debidamente soportado con el documento expedido por parte de nuestro profesional especialista del área, el cual anexamos para su conocimiento.

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



Sin otro particular, quedamos atentos al resultado de las gestiones que se susciten, en pro del avance del proyecto.

Cordialmente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC.
Anexos

Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Cuatro (4) folios



Bogotá, D.C. 20 de junio de 2023

23-06-165
PN°313-23

Señores
CONSORCIO TIG

REF: 2° REVISIÓN CONCEPTO TÉCNICO SOBRE CERCHAS DE CUBIERTA COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO.

Respetados Señores

A continuación, se presenta la segunda revisión correspondiente al concepto técnico estructural sobre las cerchas de cubierta del colegio Rafael Delgado Salguero elaborado por el ingeniero Geovanny Alexander Castaño Castaño.

1. Documento recibido

- Concepto técnico sobre Cerchas de cubierta Colegio Rafael Delgado Salguero recibido el día 14 de junio de 2023.

2. Descripción general del documento recibido

En el documento relacionado se presenta evaluación de exigencia y revisión de elementos estructurales de cerchas o correas de cubierta de las áreas acceso, aula 1-702, sala de computadores y coliseo, proponiendo alternativa de solución para el apropiado funcionamiento de la teja nueva a instalar.

3. Observaciones generales

- Las cargas y combinaciones de cargas relacionadas y evaluadas para carga viva, carga muerta, granizo y viento, se consideran apropiadas y cumplen con lo exigido en NSR-10. Lo anterior para las evaluaciones de los diferentes puntos de cubierta.
- Se considera apropiada la propuesta de cambio de tejas de asbesto cemento por otra que no represente posible afectación a la salud.

- Dadas las características de material de las tejas actuales, es posible su funcionamiento con separaciones entre apoyos superiores a las que requiere una teja como la tipo standing sean, por lo que la adición de perfiles intermedios se vuelve un requisito para lograr el apropiado funcionamiento del sistema, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica de la misma.

4. Observaciones acceso

- La instalación del perfil intermedio entre correas se considera apropiado, ya que permite cumplir con las exigencias de separación entre apoyos de las diferentes fichas técnicas de las tejas y disminuye las exigencias directas aplicadas en la cercha tipo celosía evaluada.
- La evaluación de capacidad del perfil tubular empleado como soporte intermedio de la teja de cubierta en sección tubular de 50x100x3mm, se considera apropiado de acuerdo al soporte estructural que el ingeniero Castaño presenta en su informe.
- El procedimiento presentado para el acceso se aprueba a nivel estructural.

5. Observaciones aula 1-702

- La instalación del perfil intermedio entre correas se considera apropiado, ya que permite cumplir con las exigencias de separación entre apoyos de las diferentes fichas técnicas de las tejas y disminuye las exigencias directas aplicadas en la cercha tipo celosía evaluada.
- La evaluación de capacidad del perfil tubular empleado como soporte intermedio de la teja de cubierta en sección tubular de 50x100x3mm, se considera apropiado de acuerdo al soporte estructural que el ingeniero Castaño presenta en su informe.
- El procedimiento presentado para aula 1-702 se aprueba a nivel estructural.

6. Observaciones sala de computadores

- La instalación del perfil intermedio entre correas se considera apropiado, ya que permite cumplir con las exigencias de separación entre apoyos de las diferentes fichas técnicas de las tejas y disminuye las exigencias directas aplicadas en la cercha tipo celosía evaluada.
- La evaluación de capacidad del perfil tubular empleado como soporte intermedio de la teja de cubierta en sección tubular de 50x100x3mm, se considera apropiado de acuerdo al soporte estructural que el ingeniero Castaño presenta en su informe.
- La instalación del perfil intermedio además de permitir menor distancia entre apoyos de correas también permite disminuir los esfuerzos de diseño de la correa o cercha actual, de acuerdo a lo presentado y evaluado en el documento del ingeniero Castaño.
- El procedimiento presentado para sala de computadores se aprueba a nivel estructural.


7. Observaciones coliseo

- La instalación de los templetes intermedios mejora la capacidad de carga de las correas tipo celosía que actualmente tiene el coliseo.
- Para el coliseo, el área de separación entre cerchas o correas actuales es de 1.00m y de acuerdo a lo expresado en la página 30 del segundo informe del ingeniero Castaño la cercha inicial cumple y se encuentra en capacidad de soportar las cargas a las cuales se está exigiendo, de manera seguida se deja la nota “*se instalan apoyos intermedios por el cambio de teja de asbesto tipo canal a teja tipo standing seam*”.
- De la anotación anterior se establece que el perfil intermedio se empleará para poder asegurar la teja a las correas, ya que la cercha en celosía actualmente existente no permite fijar los

tornillos autoperforantes que la teja requiere para ser asegurada.

- Dado lo anterior se ve la posibilidad de usar dos caminos: instalar una lámina en las cerchas o correas actuales en celosía para poder permitir la fijación del tornillo autoperforante o instalar una correa intermedia cuya función será poder fijar el tornillo autoperforante y así asegurar la teja a instalar. Las dos posibilidades a nivel estructural son viables y se aprueban, por lo que la decisión de cual alternativa será instalada se deja a la obra basándose en costos, rendimientos y otros aspectos diferentes al punto estructural.
- El procedimiento presentado para el coliseo se aprueba a nivel estructural y la decisión de usar una de las dos alternativas interpretadas se deja a criterios diferentes al estructural, como son costos, rendimientos, presentación, otros.

Cordialmente,



ING. CARLOS MAYORGA VELA
Mat. 25202-131425 CND

Bogotá, D.C, junio 20 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_184 - INFORME DE RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_184 radicada mediante correo electrónico el 14 de junio de 2023 y que tiene por asunto “INFORME DE RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B”.

Una vez revisada la documentación adjunta, esta interventoría se permite emitir su concepto parcialmente favorable frente a la propuesta técnica relacionada con la estructura aportada para el área de la batería sanitaria y que está debidamente soportado con el documento expedido por parte de nuestro profesional especialista

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com



del área, donde se indican una serie de consideraciones y necesidades para poder emitir el aval definitivo.

Sin otro particular, quedamos atentos al resultado de las gestiones que se susciten, en pro del avance del proyecto.

Cordialmente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC.
Anexos

Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Tres (3) folios



Bogotá, D.C. 20 de junio de 2023

23-06-167
PN°313-23

Señores
CONSORCIO TIG

**REF: REVISIÓN CONCEPTO ESTRUCTURAL COLEGIO DISTRITAL DIANA TURBAY
SEDE B – PÓRTICO PRINCIPAL.**

Respetados Señores

A continuación, se presenta la revisión al concepto estructural correspondiente al pórtico principal que soportará el segundo nivel de las baterías de baños y pasarelas del colegio Distrital Diana Turbay sede B elaborado por el ingeniero Alejandro Morales Farfán.

1. Documento recibido

Concepto estructural Colegio Distrital Diana Turbay, sobre recomendaciones constructivas de carácter general para la conformación de un pórtico principal que soportará el segundo nivel de baterías de baños y pasarelas.

2. Descripción general del documento recibido

En el documento relacionado se presentan una serie de características a tener en cuenta para los diferentes elementos estructurales a ser empleados en la construcción del punto relacionado. Se presentan secciones de vigas, columnas, zapatas, entre otros.

3. Observaciones y conclusiones


- La edificación en dimensiones generales presenta separación entre columnas cercanas a 3.80m y 3.20m entre ejes.
- El concreto relacionado debe alcanzar una resistencia igual o superior a 21 MPa, lo que se considera apropiado.

- En el documento se presentan dimensiones de vigas de cimentación de 30x30cm, lo cual se considera apropiado dados los requisitos de recubrimiento adicional por estar en contacto con material natural o material de relleno.
- El refuerzo presentado para las vigas es superior al mínimo, teniendo presente la cuantía mínima de 0.003333 para vigas y de 0.01 para columnas en sección completa.
- El nivel de las zapatas se solicita sea a un metro por debajo del terreno o más profundo si lo encontrado no es competente para su construcción, lo que se considera apropiado.
- Las dimensiones para las columnas son superiores a lo exigido por NSR-10 para sistemas estructurales de disipación moderada, así como las dimensiones de las vigas.
- Para la placa de entrepiso se presenta lámina colaborante tipo metaldeck cal 22 de 2" y un espesor de concreto de 10cm, para lo cual no hay inconveniente.
- Para la placa se solicita vigueta en perfil de lámina delgada con sección tipo cajón de 120x100x2mm, para lo cual no se presenta observación.
- En la página 9 del documento se mencionan unas grietas presentadas, pero no se entiende como se relaciona este párrafo con lo presentado dentro del documento.
- No se presentan las características correspondientes al apoyo de la teja de cubierta del último nivel, por lo que se solicita la presentación de estas.
- Para las secciones presentadas no se ve inconveniente ya que cumple con condiciones superiores a lo mínimo exigido por el Reglamento NSR-10.
- Debido que no es un mejoramiento menor sino una edificación que presenta un sistema estructural definido e independencia estructural con las estructuras vecinas y unas características dimensionales definidas, se solicita la presentación del diseño estructural de la misma, modelo matemático, evaluación de

cargas vivas y muertas, evaluación de solicitaciones sísmicas y todo aquello que solicita NSR-10 para este tipo de estructuras.

- El modelo matemático debe tener en cuenta todas las características dimensionales de la estructura, incluido el voladizo o pasarela apoyada en el extremo, la cubierta, el entrepiso y todo aquello que se requiera para su apropiada evaluación.
- Una vez presentada esta evaluación matemática se procederá a su correspondiente revisión y aprobación.

Cordialmente,



ING. CARLOS MAYORGA VELA

Mat. 25202-131425 CND

C.C. 80.020.496 de Bta.

Bogotá, D.C, junio 20 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5 PERIODO 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO

Respetados señores:

Con base en las obligaciones contractuales sujetas a los documentos previos del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645, mediante la presente comunicación solicitamos el informe mensual de obra No. 5 correspondiente al periodo del 20 de mayo al 19 de junio de 2023.

El informe mensual de obra debe contener los anexos que demuestren el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión ambiental, SST y gestión social contenidas en el numeral 8. *Obligaciones administrativas*. De igual manera se recalca que en compromisos anteriores pactados en acta, se acordó que el informe mensual se entregaría el día 20 de cada mes, sujeto a las obligaciones contenidas en el numeral 18. *Obligaciones de información*. Los incumplimientos de estos compromisos siguen afectando la transparencia y el cumplimiento del contrato de obra.

La entrega de este informe es de vital importancia para realizar una evaluación integral del progreso de la obra y garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos correspondientes, Asimismo, es necesario para proceder con la radicación del corte de cobro parcial No. 5.

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



En virtud de lo anterior, esta interventoría establece un plazo perentorio de UN (1) día hábil a partir de la recepción de esta comunicación, para que el CONSORCIO MIA GP remita los soportes que respalden el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

Agradecemos su pronta atención y cumplimiento en este asunto. Cualquier consulta o aclaración adicional, estamos a su disposición.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE

Director de interventoría

CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente



Bogotá, D.C, junio 21 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTACION DE PERSONAL PARA INGRESO A OBRA PARA EL COLEGIO RESTREPO MILLAN

Respetados señores:

Con base a la solicitud de ingreso que realizaron el día de hoy en horas de la mañana por vía correo electrónico y relacionada con los trabajadores Neiver Portilla Muñoz identificado con la CC 1.030.557.207 y del señor Luis Miguel Ruiz López identificado con la CC 1.022.995.427, nos permitimos solicitar de manera oficial, la documentación de afiliación de ARL, EPS y AFP de los trabajadores antes mencionados, debido, a que una vez verificada por parte de la interventoría, las planillas de seguridad social que adjuntaron en el correo electrónico, presuntamente no son veraces.

En caso de que se verifique que efectivamente no se encuentra vinculado el personal antes mencionado, la interventoría exige que se inicie el procedimiento pertinente de parte del CONSORCIO MIA GP hacia los subcontratistas independientes, los señores Neiver Portilla Muñoz y Luis Miguel Ruiz por incumplimiento en temas de afiliación a seguridad social y por los perjuicios que puede traer consigo ese actuar. Así mismo requerimos el envío de los soportes que sustenten esta diligencia, teniendo en cuenta el grado de importancia y/o relevancia que representa este hecho que estos momentos representa al contratista de obra.

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com




Adicional a esto, se le conmina al contratista de obra, para que antes de enviar la documentación a la presente interventoría, realicen la respectiva revisión de los soportes que los subcontratistas les envían y de paso verifiquen que los mismos sean válidos, debido a que no es la primera vez que encontramos inconsistencias al respecto.

Ahora y de continuar con esta situación, el CONSORCIO MIA-GP deberá entrar a responder de manera directa por esta responsabilidad, a causa de su omisión a la hora de validar el cumplimiento estricto de sus obligaciones contractuales.

Agradecemos su pronta atención y cumplimiento en este asunto. Cualquier consulta o aclaración adicional, estamos a su disposición.

Atentamente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría

CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente

Anexo: Soporte documento RUAF y FOSYGA



Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BÁSICA					Fecha de Corte: 2023-06-16
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1022995427	LUIS	MIGUEL	RUIZ	FLOREZ	M
AFILIACIÓN A SALUD					Fecha de Corte: 2023-06-16
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS FAMISANAR S.A.S.	Contributivo	01/07/2017	Suspensión por mora.	COTIZANTE	BOGOTA D.C.
AFILIACIÓN A PENSIONES					Fecha de Corte: 2023-06-16
Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación		
PENSIONES: PRIMA MEDIA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2013-08-13	Inactivo		
AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES					Fecha de Corte: 2023-06-16
Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2020-04-18	Activa	OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	
Seguros de Vida Suramericana	2022-04-27	Activa	OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	
Seguros de Vida Suramericana	2023-02-03	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	2022-05-03	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
------------------------------	------------	--------	--	----------------------

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2023-06-16

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2017-06-09	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2023-06-16

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2023-06-16

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2023-06-16

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BÁSICA					Fecha de Corte: 2023-06-16
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1030557207	NEIVER		PORTILLA	MUÑOZ	M
AFILIACIÓN A SALUD					Fecha de Corte: 2023-06-16
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	Contributivo	01/12/2021	Suspensión por mora.	COTIZANTE	SOACHA
AFILIACIÓN A PENSIONES					Fecha de Corte: 2023-06-16
Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación		
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2012-09-14	Activo cotizante		
AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES					Fecha de Corte: 2023-06-16
Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2022-10-21	Activa	INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2019-08-23	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMÁQUINAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2021-01-01	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES DE FUTBOL, TENIS, BALONCESTO, ATLETISMO, BEISBOL.ETC.	Cundinamarca- SOACHA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2023-06-16

AFILIACIÓN A CESANTIAS

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2023-06-16

PENSIONADOS

No se han reportado pensiones para esta persona.

Fecha de Corte: 2023-06-16

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2023-06-16

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1022995427
NOMBRES	LUIS MIGUEL
APELLIDOS	RUIZ FLOREZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
SUSPENSIÓN POR MORA.	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/07/2017	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 06/21/2023 12:43:54 Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1030557207
NOMBRES	NEIVER
APELLIDOS	PORTILLA MUÑOZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
SUSPENSIÓN POR MORA.	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	CONTRIBUTIVO	01/12/2021	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	06/21/2023 12:43:06	Estación de origen:	192.168.70.220
---------------------	------------------------	---------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.



IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Bogotá, D.C, junio 22 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS EL LIBERTADOR SEDE C, REINO DE HOLANDA, FE Y ALEGRÍA, MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ, MARRUECOS Y MOLINOS

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.


No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Brayan Urrea	1028880680	Ayudante	Colegio el Libertador sede C
2	Daniel Acosta	1010162335	Ayudante	Colegio el Libertador sede C
3	Vladimiro Vásquez	10185609	Ayudante	Colegio el Libertador sede C



4	Manuel Macías	1000777156	Ayudante	Reino de Holanda
5	Jhon Suarez	1031131349	Ayudante	Fe y Alegría
6	Carlos Julio Suarez	79560984	Ayudante	Fe y Alegría
7	José Corona	1033811872	Ayudante	Fe y Alegría
8	Jorge merchán	79383377	Ayudante	Manuel del Socorro Rodríguez
9	Diego Carrillo	1010007822	Ayudante	Marruecos y Molinos
10	Brandon Primera	1047222711	Ayudante	Colegio el Libertador sede C
11	Yiseth Camila Espejo	1000803471	Apoyo de obra	Rafael delgado Salguero sede A
12	Víctor Zambrano	1216972412	Ayudante	Reino de Holanda

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE

Director de interventoría

CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Dalia Minerva Ambiental CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	100	22/06/2023	CC 1047222741	PRIMERA CORTES BRANDON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

392AAB339069F776B9E342CA109E483B

Certificado impreso el día 6/21/2023 5:36:49 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

BRANDON

PRIMERA CORTES

1047222741

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No de Radicacion

4010339222

Fecha de Radicación

2|1|0|6|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		A. Individual: ☐ B. Colectiva ☐		A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo documento de Identidad		8. Número del documento de Identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
PRIMERA Primer apellido		CORTES Segundo apellido		BRANDON Primer nombre		Segundo nombre			
CC		1047222741		Femenino ☐ Masculino ☒		1 5 1 2 1 9 9 7			

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
6		Tipo FINH Condición TIP					
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL		16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso base de cotización - IBC			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		PORVENIR		1160000			
18. Residencia		19. Teléfono fijo		20. Teléfono celular		21. Correo electrónico	
AVENIDA 45 N 34 21 Dirección		67928810		3054578748		Obras.ard@hotmail.com	
BOGOTA D.C. Municipio/Distrito		zona Urbana ☒ Rural ☐		Localidad / comuna		BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido		Segundo apellido	
20. Tipo documento de identidad		21. Número documento identidad	
22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido		Segundo apellido	
Primer nombre		Segundo nombre	
25. Tipo documento de identidad		26. Número de identidad	
27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		Condición	
				Tipo F N M		T P	
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
32. Datos de residencia		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)					
Municipio/Distrito		Zona Urbana Rural		Departamento		Teléfono Fijo y/o celular	
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP		VSCENTRO - BOGOTA	
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social		36. Tipo de identificación		37. Número de documento de Identificación		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		CC		13240346		01	
39. Ubicación		40. Teléfono		41. Correo electrónico		42. Municipio/distrito	
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección		5801473		ALRODE73@HOTMAIL.COM		ENVIGADO Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código:
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Femenino ☐ Masculino ☐	<input type="text"/>	2 1 0 6 2 0 2 3			
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="text"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

BRANDON PRIMERA CORTES CC 1047222741

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

BRANDON PRIMERA CORTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.047.222.741**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	95	22/06/2023	CC 1028880680	URREA DIAZ BRAYAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

392AAB339069F776B9E342CA109E483B

Certificado impreso el día 6/21/2023 9:11:31 AM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



BRAYAN MANUEL

URREA DIAZ

1028880680

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección


NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **BRAYAN MANUEL URREA DIAZ** identificado(a) con **CC** número **1.028.880.680** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de octubre de 2021 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 21 de junio de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2023061515002

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO					
35. Nombre o razón social JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		36. Tipo de documento de identificación ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		37. Número del documento de identificación 13240346	
38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)					
39. Ubicación Dirección CALLE 3A 7B 140		Teléfono Fijo 5801473		Correo Electrónico obras.joyavi@gmail.com	
				Municipio / Distrito Los Patios	
				Departamento Nd S	

☐ 1. Modificación datos básicos de identificación

☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación

☐ 3. Actualización del documento de identidad

☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios

☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS

Código

☐ 6. Reinscripción en la EPS

☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar

☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado

☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo Régimen
☐ B. Diferente Régimen

☐ 15. Reporte de fallecimiento

☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante

☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado

☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		Sexo		Fecha de Radicación	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Femenino ☐ Masculino ☐		42. Fecha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
43. EPS Anterior		44. Motivo de Traslado		45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones			
		Código <input type="text"/>					

☐	46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
☐	47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
☐	48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
☐	49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
☐	50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
☐	51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
☐	52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☐	53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

BRAYAN MANUEL URREA DIAZ CC 1028880680

55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

[illegible]

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio Código del Departamento <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		67. Datos del SISBÉN Número de Ficha Puntaje Nivel <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		68. Fecha de Radicación <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		69. Fecha de Validación <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre							
Tipo de documento de identidad <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		Número del documento de identidad <div></div>		71. Firma del funcionario <div></div>			

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN****POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.****HACE CONSTAR QUE:**

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, se identificó que **YISSETH CAMILA ESPEJO FARFAN** con CC No. **1000803471**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
Contratante: NI 901646396 - JIC ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	Fecha de última cobertura: 11/06/2023 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723 Fecha de inicio de Contrato: 01/06/2023 Fecha fin de Contrato: 05/12/2023 Clase de Riesgo: 4 Cargo : AUXILIAR INGENIERIA CIVIL Fecha fin de Retiro: SIN FECHA DE RETIRO

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301016227668.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de junio de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) YISSETH CAMILA ESPEJO FARFAN identificado(a) con Cedula Ciudadania 1000803471, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente contrato de prestación según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20230609	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 21 días del mes de Junio de 2.023

Observaciones:

Con destino a:

A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
22104397

CER-AFI

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YISSETH CAMILA ESPEJO FARFAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.803.471**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	96	22/06/2023	CC 1010162335	ACOSTA CALDERON DANIEL	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

392AAB339069F776B9E342CA109E483B

Certificado impreso el día 6/21/2023 9:37:18 AM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



DANIEL STIVEN

ACOSTA CALDERON

1010162335

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

Resultados del registro de novedades de reingreso



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud6I_10285

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NIT 13240346 JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Afiliado	CC 1010162335 DANIEL STIVEN ACOSTA CALDERON
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	\$ 1.160.000
Cargo	OTRO
Sucursal	CUCUTA CL 3 A 7 B-140
Fecha de ingreso	21/06/2023
Fecha de radicación	21/06/2023 03:15:22 p.m.
Código de Transacción	1279852147
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 07/2023

Fecha de generación

21/06/2023

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor DANIEL STIVEN ACOSTA CALDERON identificado(a) con CC No. 1.010.162.335, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 21 de junio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/06/2023**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	101	22/06/2023	CC 1010007822	CARRILLO GUTIERREZ DIEGO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

392AAB339069F776B9E342CA109E483B

Certificado impreso el día 6/21/2023 5:37:48 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

DIEGO FERNANDO

CARRILLO GUTIERREZ

1010007822

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

No. **28211531****Fecha de Radicación**

2	1	0	6	2	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite		2. Tipo de Afiliación		3. Regimen	
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		A. Individual ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐		C. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de Afiliado		5. Tipo de Cotizante		Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		01	
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)					
6. Apellidos y nombres		GUTIERREZ		DIEGO	
CARRILLO				FERNANDO	
7. Tipo documento de Identidad		8. Número del documento de Identidad		9. Sexo	
CC		1010007822		Femenino ☐ Masculino ☒	
10. Fecha de nacimiento					
2 8 0 3 1 9 9 7					
III. DATOS COMPLEMENTARIOS					
Datos personales					
11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBÉN	
06		Tipo F N M Condición T P			
15. Administradora de Riegos Laborales - ARL		16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso base de Cotización - IBC	
POSITIVA S.A.		003 / PORVENIR		1.160.000	
18. Residencia		3133138066		3133138066	
CALLE 21 N 23 33		Teléfono fijo		Teléfono Celular	
Dirección				diegocarrillo@hotmail.com	
54001 / CUCUTA		Urbana ☒		Correo electrónico	
Municipio/Distrito		Zona Rural ☐		54 / NORTE DE SANTANDER	
		Localidad/Comuna		Departamento	
IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR					
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante					
19. Apellidos y nombres					
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre	
				Segundo nombre	
20. Tipo de documento de identidad		21. Número del documento de identidad		22. Sexo	
				Femenino ☐ Masculino ☐	
				23. fecha de Nacimiento	
				D D M M A A A A	
Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales					
24. Apellidos y nombres					
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre	
B1				Segundo nombre	
B2					
B3					
B4					
B5					
25. Tipo de documento de identidad		26. Numero del documento de identidad		27. Sexo	
				Femenino Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					
28. Fecha de nacimiento					
				D D M M A A A A	
				D D M M A A A A	
				D D M M A A A A	
				D D M M A A A A	
				D D M M A A A A	
Datos complementarios					
29. Parentescos		30. Etnia		31. Discapacidad	
				Tipo Condición	
				F N M T P	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					
32. Datos de residencia		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)			
Municipio/Distrito		Zona Urbana Rural			
		Departamento			
		Telefonofijo y/o Celular			
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					
Selección de la IPS Primaria					
34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS				Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R				30600433 30600437	
B					
B					
B					
V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.					
35. Nombre o razón social		36. Tipo de documento de identificación		37. Número del documento de identificación	
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		CC		13240346	
38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)		39. Ubicación			
0 1		CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIR		LOS PATIOS	
		Dirección		Municipio/Distrito	
		Teléfono		NORTE DE SANTANDER	
		Correo electrónico		Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación

☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación

☐ 3. Actualización del documento de identidad

☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios

☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS

Código

☐ 6. Reinscripción en la EPS

☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar

☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.

☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

☐ 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

13. Movilidad:

☐ A. Régimen Contributivo

☐ B. Régimen Subsidiado

☐ 14. Traslado:

☐ A. Mismo régimen

☐ B. Diferente régimen

☐ 15. Reporte de fallecimiento

☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante

☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado

☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo documento de Identidad

Número documento de Identidad

Sexo

Femenino

☐

Masculino

☐

Fecha de nacimiento

D

D

M

M

A

A

A

A

2

1

0

6

2

0

2

3

42. Fecha

43. EPS anterior

44. Motivo de traslado

Código

45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales

☒ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.

☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios

☒ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud

☒ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales

☒ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran

☒ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

☒ 56. Anexo copia del documento de identidad:

CN

RC

TI

CC

PA

CE

CD

SC

Cantidad:

0

0

0

1

0

0

0

0

Total

1

☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente

☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital

☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital

☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor

☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia

☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial

Código del municipio

Código del departamento

67. Datos del SISBÉN

Número de ficha

Puntaje

Nivel

68. Fecha de radicación

D

D

M

M

A

A

A

A

69. Fecha de validación

D

D

M

M

A

A

A

A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo documento de Identidad

Número documento de Identidad

71. Firma del funcionario

Observaciones:

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:

¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?

()

()

¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?

()

()

¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?

()

()

¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?

()

()

¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?

()

()

EPS-FT-144

Mod. May/2016

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DIEGO FERNANDO CARRILLO GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.010.007.822**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	99	22/06/2023	CC 79383377	MERCHAN RODRIGUEZ JORGE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

392AAB339069F776B9E342CA109E483B

Certificado impreso el día 6/21/2023 5:35:49 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JORGE ELIECER

MERCHAN RODRIGUEZ

79383377

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No de Radicacion

4010339223

Fecha de Radicación

2|1|0|6|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		A. Individual: ☐ B. Colectiva ☐		A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo documento de Identidad		8. Número del documento de Identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
MERCHAN Primer apellido		CC		RODRIGUEZ Segundo apellido		79383377		Jorge Primer nombre	
						Femenino ☐ Masculino ☒		0 3 0 5 1 9 6 5	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
6		Tipo FINH Condición TIP					
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL				16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso base de cotización - IBC	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				COLPENSIONES		1160000	
18. Residencia							
CALLE 23 N 90 32 Dirección		67928810 Teléfono fijo		3054578748 Teléfono celular		Obras.ard@hotmail.com Correo electrónico	
BOGOTA D.C. Municipio/Distrito		zona Urbana ☒ Rural ☐		Localidad / comuna		BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido		Segundo apellido	
20. Tipo documento de identidad		21. Número documento identidad	
22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido		Segundo apellido	
Primer nombre		Segundo nombre	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
25. Tipo documento de identidad		26. Número de identidad	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		Condición	
				Tipo F N M		T P	
B1		B2		B3		B4	
B5							
32. Datos de residencia							
Municipio/Distrito		Zona		Departamento		Teléfono Fijo y/o celular	
		Urbana Rural					
B1		B2		B3		B4	
B5							
						33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)	

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP		VSCENTRO - BOGOTA	
B		-	
B		-	
B		-	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social		36. Tipo de identificación		37. Número de documento de identificación		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		CC		13240346		01	
39. Ubicación		5801473 Teléfono		ALRODE73@HOTMAIL.COM Correo electrónico		ENVIGADO Municipio/distrito	
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección						ANTIOQUIA Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código:
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo		Fecha de nacimiento		42. Fecha	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Femenino ☐ Masculino ☐		<input type="text"/>		2 1 0 6 2 0 2 3	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="text"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JORGE ELIECER MERCHAN RODRIGUEZ CC 79383377

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación							
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JORGE ELIECER MERCHAN RODRIGUEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79383377**, se encuentra afiliado/a desde **04/12/1995** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 21 de junio de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901402105
Número Afiliación: 9001382
Razón social: CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE
S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1000777156
Nombre: VICTOR MANUEL MACIAS RAMIREZ
Fecha Ingreso: 21/06/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 20/6/2023 4:05:56 PM

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT. 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VICTOR MANUEL MACIAS RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.777.156**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.216.972.412

QUINTERO ZAMBRANO

APELLIDOS

VICTOR ALFONSO

NOMBRES

Victor Quintero

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1992**

EL BANCO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.80
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

04-MAR-2015 EL BANCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2102500-00707314-M-1216972412-20150522

0044245221A 1

44136624

PAGADO 13/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	Nombre Sucursal	BUNKER	Código Sucursal	ONBUNKER
Documento	NI13240346	Dirección	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	3
Ciudad	LOS PATIOS	Departamento	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	Identificación	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TAE	TAP	TAP	VSP	CR	VST	SEN	IGE	LM	VAC	AVP	ANP	VT	ICP	RP	Dis AP	Dis EPS	Dis AFP	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30		PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 1.160.000	\$ 80.800	COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30		PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 1.160.000	\$ 80.800	COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30		PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.160.000	\$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 1.160.000	\$ 80.800	COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 3.480.000	\$ 556.800	\$ 0	\$ 0	\$ 139.200	\$ 242.400	\$ 139.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.077.600	\$ 10.200	\$ 1.087.800



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/06/2023, el empleador CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS identificado con NIT número 901402105 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5866380	20/06/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1216972412	VICTORALFONSO QUINTERO ZAMBRANO	1160000	AYUDANTE DE OBRA	2023-06-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Junio del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva



Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Seguros de Vida Suramericana	2022-04-06	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN UNIDADES NO ESPECIALIZADAS INCLUYE LA AGRICULTURA NO MECANIZADA NI CONTEMPLADA EN OTRAS EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES (SIEMBRA, CULTIVO Y/O RECOLECCIÓN)	Meta- PUERTO RICO
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	2019-02-20	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMACOL COMFAMILIAR CAMACOL	2019-02-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2018-02-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2022-05-21	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

Fecha de Corte: 2023-06-16

AFILIACIÓN A CESANTIAS

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2023-06-16

PENSIONADOS

No se han reportado pensiones para esta persona.

Fecha de Corte: 2023-06-16

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección: Cra. 13 # 32 - 76, Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Fecha: 6/20/2023 8:37:07 AM

Pag.2



**MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL**

SISPRO

Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF

Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

Fecha de Corte: 2023-06-16

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección: Cra. 13 # 32 - 76, Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Fecha: 6/20/2023 8:37:07 AM

Pag.3



Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BÁSICA

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1216972412	VICTOR	ALFONSO	QUINTERO	ZAMBRANO	M

Fecha de Corte: 2023-06-16

AFILIACIÓN A SALUD

Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	10/04/2022	Activo	COTIZANTE	BOGOTÁ D.C.

Fecha de Corte: 2023-06-16

AFILIACIÓN A PENSIONES

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	COMPAÑIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA COLFONDOS	2015-03-19	Inactivo

Fecha de Corte: 2023-06-16

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Económica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2019-05-24	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN UNIDADES NO ESPECIALIZADAS INCLUYE LA AGRICULTURA NO MECANIZADA NI CONTEMPLADA EN OTRAS EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES (SIEMBRA, CULTIVO Y/O RECOLECCIÓN)	Meta- CUMARAL

Fecha de Corte: 2023-06-16

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Fecha: 6/20/2023 8:37:07 AM

Pag.1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.216.972.412

QUINTERO ZAMBRANO

APELLIDOS

VICTOR ALFONSO

NOMBRES

Victor Quintero

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1992**

EL BANCO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.80
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

04-MAR-2015 EL BANCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2102500-00707314-M-1216972412-20150522

0044245221A 1

44136624

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 21/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	97	22/06/2023	CC 10185609	VASQUEZ ARCE VLADIMIRO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

392AAB339069F776B9E342CA109E483B

Certificado impreso el día 6/21/2023 9:39:08 AM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



**VLADIMIRO
VASQUEZ ARCE**

10185609

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 21/06/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5874723	21/06/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	10185609	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	1160000	OBRAERO DE CONSTRUCCION	2023-06-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de Junio del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VLADIMIRO VASQUEZ ARCE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **10.185.609**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Bogotá, D.C, junio 22 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_179 - INFORME PRELIMINAR DISEÑO RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO - FE Y ALEGRÍA

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_179 radicada mediante correo electrónico el 14 de junio de 2023 y que tiene por asunto “INFORME PRELIMINAR DISEÑO RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO - FE Y ALEGRÍA”.

Una vez revisada la documentación adjunta, esta interventoría se permite emitir su concepto parcialmente favorable frente a la propuesta técnica relacionada con el sistema de recolección de aguas lluvias de los bloques objeto de intervención y que está debidamente soportado con el documento expedido por parte de nuestro



profesional especialista del área, donde se indican una serie de consideraciones y necesidades para poder emitir el aval definitivo.

Sin otro particular, quedamos atentos al resultado de las gestiones que se susciten, en pro del avance del proyecto.

Cordialmente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC.
Anexos

Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Dos (2) folios



Bogotá 22 de Junio 2023

Señores

CONSORCIO TIG

Atn: Edison Ricardo Duarte

Director de interventoría

Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana Bogotá D.C.

Ref: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: INFORME PRELIMINAR DISEÑO RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO – COLEGIO FE & ALEGRIA.

CONCEPTO: DRENAJE AGUAS LLUVIAS Y SU DIPSOSICION FINAL

MARCO LEGAL

Todas las revisiones, análisis, ajustes se deben encuadrar bajo un marco legal y en las observaciones se debe hacer referencia a la norma:

- Código Colombiano de Fontanería NTC 1500. Cuarta actualización
- Código colombiano de sismo resistencia NRS 10, título J y K, y Normas a las que remite.

INFORMACION RECIBIDA

- Levantamiento topográfico sede Fe y Alegría
- Palermo sur. - Calculo bajantes aguas lluvias de cubiertas a intervenir.
- Calculo red alcantarillado pluvial descole de las áreas a intervenir teniendo en cuenta todas las áreas aferentes del colegio en general.
- Plano redes de aguas lluvias áreas de cubierta y andenes a intervenir.
- ACAD- Colegio fe y alegría – cotas de fondo cajas

Respetado arquitecto: teniendo en cuenta la información presentada tenemos las siguientes consideraciones:

- Se considera viable la propuesta presentada
- Se debe indicar las dimensiones validar capacidad del canal receptor que garantice no tener rebose o desbordamientos.

Cordialmente,



ING. OMAR ARCHILA MENDOZA
Asesor Especialista hidráulico
M.P.: 25202088535 cnd

Bogotá, D.C, junio 22 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_188 - INFORME PRELIMINAR DISEÑO SANITARIO - BATERIAS SANITARIAS - FE Y ALEGRÍA

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta a su comunicación 2023_RUU_MGP_188 radicada mediante correo electrónico el 15 de junio de 2023 y que tiene por asunto “INFORME PRELIMINAR DISEÑO SANITARIO - BATERIAS SANITARIAS - FE Y ALEGRÍA”.

Una vez revisada la documentación adjunta, esta interventoría se permite emitir su concepto parcialmente favorable frente a la propuesta técnica relacionada con el sistema sanitario de los bloques objeto de intervención y que está debidamente soportado con el documento expedido por parte de nuestro profesional especialista

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



del área, donde se indican una serie de consideraciones y necesidades para poder emitir el aval definitivo.

Sin otro particular, quedamos atentos al resultado de las gestiones que se susciten, en pro del avance del proyecto.

Cordialmente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC.
Anexos

Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Dos (2) folios



Bogotá 22 de junio 2023

Señores

CONSORCIO TIG

Atn: Edison Ricardo Duarte

Director de interventoría

Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana Bogotá D.C.

Ref: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

**Asunto: INFORME PRELIMINAR DISEÑO SANITARIO – PROPUESTA
BATERIAS SANITARIAS – COLEGIO FE & ALEGRIA**

MARCO LEGAL

Todas las revisiones, análisis, ajustes se deben encuadrar bajo un marco legal y en las observaciones se debe hacer referencia a la norma:

- Código Colombiano de Fontanería NTC 1500. Cuarta actualización
- Código colombiano de sismo resistencia NRS 10, título J y K, y Normas a las que remite.

INFORMACION RECIBIDA

- Memorias técnicas manejo aguas lluvias ied fe y alegría palermo sur
- Calculo red sanitaria área a intervenir
- Plano redes de baterías sanitarias propuestas y diámetro de tuberías
- Se anexa acta 10 de mayo de 2023 donde se eleva solicitud de diseños.

Respetado arquitecto: teniendo en cuenta la información presentada tenemos las siguientes consideraciones:

- Se considera viable la propuesta presentada siempre y cuando en área de baños:
 - o Se lleve el tapón al muro
 - o La tubería que recoge los sanitarios se recomienda en 6"

- Se debe indicar la domiciliaria propuesta y la red pública donde se conectan.

Cordialmente,



ING. OMAR ARCHILA MENDOZA
Asesor Especialista hidráulico
M.P.: 25202088535 cnd

Bogotá, D.C, junio 26 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 5

Respetados señores:


Dando alcance al oficio 2023_RUU_MGP_189 Acta de Pago Parcial de obra No 5. Enviado por contratista de obra CONSORCIO MIA GP y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos el correspondiente aval con soporte en los documentos anexos para el trámite del acta parcial de obra No. 5:

1. Oficio de solicitud de aprobación de obra a interventoría
2. Oficio de solicitud de aprobación de interventoría a la SED
3. Acta parcial en Excel y PDF
4. Memorias de Calculo
5. Aportes parafiscales
6. FURC - hoja información de pagos
7. RUT CONSORCIO
8. Pre Factura No. MGP-05
9. Resolución de facturación DIAN
10. Certificación Bancaria
11. Acta de autorización de pagos
12. Anexos



Esta documentación esta con sus respectivos soportes debidamente revisados, avalados y aprobados por esta Interventoría y por ello recomienda al Secretaria de educación tramitar el pago No. 5 correspondiente al periodo del 20 DE MAYO DE 2023 AL 19 DE JUNIO DE 2023 con un porcentaje total de avance del contrato a la fecha de 25,03%.

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal

Representante legal

CONSORCIO TIG

Nit: 90164989-03

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP



Bogotá, D.C, junio 26 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.23


Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.23, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.23:** 19/06/2023 al 25/06/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios


Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com



		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA	26/06/2023			PERIODO No.	23	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	RAFAEL URIBE URIBE								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022				CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645			
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES				PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023				FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
PRÓRROGA :	N/A				PRORROGA 1:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023			
PLAZO ACTUALIZADO:	364				PLAZO ACTUALIZADO:	333			
PLAZO TRANSCURRIDO:	173	EQUIVALE AL	48%		PLAZO TRANSCURRIDO:	156	EQUIVALE AL	47%	
VALOR INICIAL :	\$	878.587.938,00			VALOR INICIAL :	\$	11.941.262.150,00		
VALOR ADICION(ES):	\$	371.557.789,00			VALOR ADICION(ES):	\$	5.050.000.000,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$	1.250.145.727,00			VALOR ACTUALIZADO:	\$	16.991.262.150,00		
VALOR PAGADO:	\$	-			VALOR PAGADO:	\$	-		
VALOR POR PAGAR:	\$	1.250.145.727,00			VALOR POR PAGAR:	\$	16.991.262.150,00		
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ				INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.									
2. CONTROL DE HITOS.									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO				FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO		
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)				20/01/2023	20/01/2023	0		
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE				21/01/2023	6/05/2023	-105		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES				21/01/2023	3/03/2023	-41		
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II				21/01/2023	10/02/2023	-20		
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA				21/01/2023	21/02/2023	-31		
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA				21/01/2023	15/02/2023	-25		
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA				21/01/2023	21/02/2023	-31		
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA				21/01/2023	15/02/2023	-25		
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN				21/01/2023	10/02/2023	-20		
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR				29/07/2023		No iniciado		
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO				29/07/2023	26/06/2023	33		
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO				29/07/2023		No iniciado		
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO				27/02/2023	27/02/2023	0		
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ				29/07/2023	12/06/2023	47		
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL				29/07/2023		No iniciado		
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ				29/07/2023	22/05/2023	68		
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL				29/07/2023		No iniciado		
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO				29/07/2023		No iniciado		
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR				28/04/2023	28/04/2023	0		
19	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS				29/07/2023		No iniciado		
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A				29/07/2023	25/05/2023	65		
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM				3/04/2023	3/04/2023	0		
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A				29/07/2023		No iniciado		
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
30	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo transcurrido del proyecto en días					156	DÍAS			
3. EJECUCIÓN POR FRENTES									
No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE			
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	\$ 354.706.368,00	\$ 99.288.889,00	27,99%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN			
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	\$ 298.698.658,00	\$ 139.807.385,36	46,81%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN			
3	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	\$ 561.308.317,00	\$ -	0,00%		NO HA INICIADO			

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		26/06/2023			PERIODO No.	23	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED		VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE		ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		\$ 825.556.509,00	\$ 208.083.649,84	25,21%	18/09/2023		EN EJECUCIÓN		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		\$ 516.187.772,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		\$ 924.714.131,00	\$ 284.703.857,89	30,79%	29/07/2023		EN EJECUCIÓN		
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		\$ 1.438.352.552,00	\$ 640.341.856,15	44,52%	18/08/2023		EN EJECUCIÓN		
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		\$ 332.100.486,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		\$ 408.412.332,00	\$ 172.414.161,48	42,22%	31/07/2023		EN EJECUCIÓN		
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ		\$ 852.757.422,00	\$ 59.722.746,00	7,00%			EN EJECUCIÓN		
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL		\$ 227.195.808,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ		\$ 671.327.930,00	\$ 109.669.967,00	16,34%			EN EJECUCIÓN		
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		\$ 1.069.620.410,00	\$ 423.559.700,69	39,60%	16/09/2023		EN EJECUCIÓN		
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		\$ 688.067.369,00	\$ 535.426.115,70	77,82%	12/07/2023		EN EJECUCIÓN		
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		\$ 498.001.754,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		\$ 1.381.489.250,00	\$ 776.169.395,25	56,18%	26/08/2023		EN EJECUCIÓN		
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		\$ 457.831.172,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		\$ 304.703.052,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		\$ 656.544.890,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		\$ 339.352.709,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		\$ 2.027.739.816,00	\$ 470.744.747,75	23,22%	28/11/2023		EN EJECUCIÓN		
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS		\$ 455.893.410,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		\$ 335.852.053,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		\$ 502.836.423,00	\$ 120.404.069,00	23,94%			EN EJECUCIÓN		
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		\$ 427.077.647,00	\$ 190.465.293,79	44,60%	16/06/2023		EN EJECUCIÓN		
26	EMERGENCIAS		\$ 862.485.928,00	\$ 113.635.741,07	13,18%	19/12/2023		EN EJECUCIÓN		
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL										
No.	NOMBRE DE LA IED		PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS			PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA				
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		Se instala la pergola y el bajante de aguas lluvias.			PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (3) personas Equipo: Un (1) mixer y herramienta menor				
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		Continúa actividad de pintura, Continúa actividad de corte de regatas para instalación de bajantes, Inicia instalación de tubería para bajantes. Continúa actividad de demolición de enchape, Continúa actividad de pañete sobre muro, Continúa actividad de instalación de enchape			PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios y herramienta menor				

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		26/06/2023			PERIODO No.	23	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED				PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS				PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA	
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II				Se continua la instalación de acero en zapatas y vigas, a la fecha se encuentra fundida las zapatas, y se programa fundida de vigas para el martes 27/06/2023,continua con demolición de afinado de piso en edificio # 3 segundo piso.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Seis (6) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor	
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA				Se continua con la compactacion del terreno y se comienza con la intalacion del adoquin, se realiza la renivelacion de cajas de inspeccion en los baños de niñas primer piso y se comienza a raspar la placa plana.				PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: Siete (8) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor	
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA				Se instalo la cubierta en zona de serigrafia, pendiente la instalación de caballete en zona inferior, se espera que Compensar desocupe el espacio en comedor, para iniciar la intervención de cubierta.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor	
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO				Se continua con la instalacion del enchape, se comienza con la intalacion de los bloques en concreto, se continua con los acabados.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (5) personas Equipo: Herramienta menor	
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ				Se continua con la demolicion, se inicia actividades de excavacion en el parque infantil y en la cancha multiple.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (5) personas Equipo: Herramienta menor	
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ				Inicia actividad de demolición de alistado, Continúa la instalación de flanches sobre cubierta, continúa con el proceso de aplicación de pintura en esmalte sobre cerchas existente, continúa actividad de instalación de red eléctrica.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor	
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA				Continúa actividad de demolición de muros, enchape y pisos en el baño de las niñas. Continúa la actividad de pintura sobre muros en las aulas, Inicia actividad de instalación de tubería hidráulicos.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor	
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA				Se continua con los acabados y se inicia la actividad de postura del mastico para el piso en vinilo.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura	
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN				Se continua con la instalación de divisiones de baños en el tercer piso, demolición de enchape existente en segundo piso y continua instalación de cubierta del cuarto salón,e inicia la instalación de tuberia EMT en salones, pintura en cerchas existentes en zona de pasillo y retiro de sobrantes.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Siete (7) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor	
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR				Se inicio la instalación de piso en granito el día viernes 23/06/2023 en areas de segundo nivel, se continua con las instalación hy pintura de estructura metálica en bloque E, se continua con la demolición de pisos existentes en aulas aprobados por la SED el día 22/06/2023.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor	
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A				Continúa el suministro de mortero impermeabilizado y endurecido con refuerzo de microfibra para la terraza. Continúa con la actividad de retiro de manto asfáltico y la demolición de alistado.				PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor	
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM				Se inician actividades de traslado del material hacia el sector.				PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor	
26	EMERGENCIAS				Se tiene previsto atender una emergencia en la IED Gustavo Restrepo sede A, la cual se revisará la semana entrante en compañía de la SED.					
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA										
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 5.590.858.292,67		32,90%		-7,34%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.				\$ 4.344.437.575,97		25,57%			

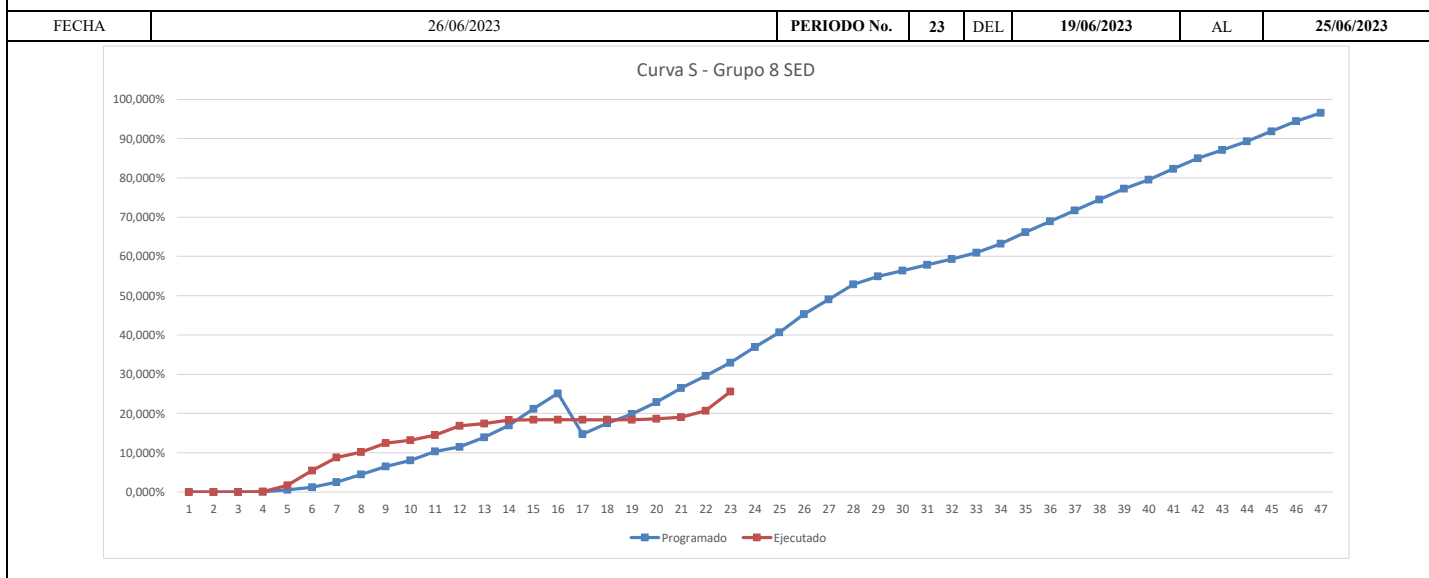

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se ha evidenciado una mejoría importante en la ejecución del proyecto, donde el atraso materializado hace dos (2) semanas ha venido disminuyendo, encontrándose a hoy al -7,34%. Esto, básicamente es el producto del desarrollo de la contingencia que está llevando a cabo el CONSORCIO MIA GP. No obstante, se requiere que la tendencia continúe, a fin de poder liberar el contrato de cualquier mínima alerta.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Fe y Alegría - Envío de propuesta de implantación de la estructura metálica de los bloques E y D	Contratista de obra	20/06/2023 (Incumplido)
IED Santa Lucía CAFAM - Reinicio de actividades según alcance recientemente definido por la SED	Contratista de obra	20/06/2023 (Cumplido el 23/06/23)
IED Enrique Olaya - Definición de la intervención de la cubierta	Contratista de interventoría	21/06/2023 (Cumplido el 19/06/23)
IED Alexander Fleming sede B - Inicio de reemplazo de la tubería de succión por polipropileno	Contratista de obra	20/06/2023 (Incumplido)
IED Reino de Holanda sede A - Esquema de la reja contraimpacto y el resultado de su análisis	Contratista de obra	20/06/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* Reposición de push, Mesones en granito, Marcos metálicos para lámparas, Muro doble en fibrocemento con estructura particular, tubería en polipropileno.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR




Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:




Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.

Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.

Al contratista de obra se le continúa reconociendo avances teóricos por suministros de materiales en obra, no obstante el avance materializado no es el esperado, ya que se siguen evidenciando atrasos. Esto, a pesar de realizar el análisis sobre la programación actualizada, la cual involucró el 100% de los frentes a ejecutar.

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		26/06/2023		PERIODO No.	23	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE								
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES								
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II								
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA								
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA								

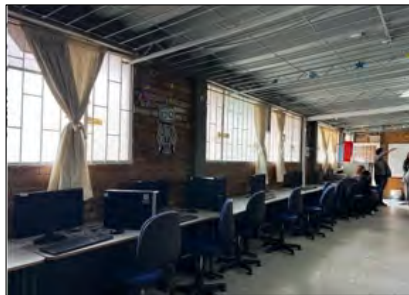		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública				
FECHA		26/06/2023			PERIODO No.	23	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE						
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO			  						
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	 		  						
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	 		  						
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA			  						
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA			  						

FECHA		26/06/2023		PERIODO No.	23	DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN								
21	COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR								
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A								
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM								


FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Directora de Interventora
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, D.C, junio 28 de 2023

TIG-MEM-261

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.5

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se presenta informe mensual de interventoría No.5 correspondiente al periodo MAYO 20 DE 2023 A JUNIO 19 DE 2023. El cual contiene sus respectivos aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales establecidos en los pliegos de condiciones y establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED.

Sin otro particular.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE

Director de interventoría

CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Un (1) archivo PDF de 1261 folios + Dos (2) archivos de 213 MB

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



Bogotá, D.C, junio 29 de 2023

TIG-MEM-262

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS DEL NP-09 AL NP-21 AVALADOS

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir los análisis de precios no previstos comprendidos entre los consecutivos 09 y 21 con sus respectivos anexos y que cuenta con el aval pertinente de parte nuestra.

Los ítems revisados y avalados se relacionan a continuación:

- NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)
- NP-10 DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS
- NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).
- NP-12 REPOSICION DE VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA 0,20*1,00).
- NP-13 INSPECCION DE REDES HIDROSANITARIAS POR EMERGENCIA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS (Incluye alquiler de geofono, sonda metálica, microcamara, excavación manual). Aplica tanto para agua potable

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



como aguas negras evidenciando la fuga y destaponamiento de la tubería según sea el caso.

- NP-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE.
- NP-15 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 14 MM E INTERIOR DE 10 MM CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, REMACHES O TACHES, NO INCLUYE PINTURA.
- NP-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.
- NP-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO.
- NP-18 REPARACION EN TUBERIA GALVANIZADA MEDIANTE UNION MECANICA TIPO DRESSER 3 HD. INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" Y ACCESORIOS.
- NP-19 CAMBIO ACOMETIDA SUCCION DE BOMBAS ALEXANDER FLEMMING TUBERIA EXISTENTE EN HIERRO COLADO POR TUBERIA EN POLIPROPILENO . INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" , FLOTADOR Y ACCESORIOS.
- NP-20 RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA).
- NP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120.

Quedamos atentos al resultado de su revisión y a la programación de la mesa de trabajo virtual, a fin de llevar a cabo el consenso final de precios.

Sin otro particular.

Atentamente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Un (1) archivo PDF de 128 folios y 23,5 MB



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ID	NOMBRE DEL INSUMO	UNID	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNAL ALTO TRES COTIZACIONES	PRO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON FALDON DE 15CM, REENGRUSE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM	M2	\$ 660.450	granitos y cuarzos	\$ 780.000	decor marmol codinas y marmoles	\$ 650.001	Natural stone colombia SAS	\$ 696.817	\$ 72.228	\$789.045	\$624.589	\$ 660.450		\$ 690.001	\$ 695.228
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.	M2	\$ 709.240	granitos y cuarzos	\$ 780.000	decor marmol codinas y marmoles	\$ 650.001	Natural stone colombia SAS	\$ 713.080	\$ 65.085	\$778.165	\$647.990	\$ 709.240		\$ 690.001	\$ 679.635
	MASTICO	BULTO	\$ 60.000	HOME-CENTER	\$ 0		\$ 0		\$ 60.000	\$ -	\$60.000	\$0	\$ 60.000	\$ 0,00	\$ -	\$ 60.000
	VIDRIO LAMINADO 4 MM CUBIERTA	M2	\$ 688.900	VELIANA	\$ 679.964	PUICO	\$ 643.332	FRFRTERFRIA AA	\$ 643.332	\$ -	\$679.964	\$ 660.900	\$ 688.900	\$ 679.964	\$ -	\$ 688.900
	PUSH ANTIVANDAL 1/2" PARA RANOS	UNID	\$ 417.900	HOME-CENTER	\$ 417.900	FRFRTERFRIA COLUMBIA	\$ 430.780	FRFRTERFRIA AA	\$ 422.193	\$ 7.436	\$429.630	\$414.757	\$ 417.900		\$ 417.900	\$ 417.900
	UNION DRESSER 3"	UNID	\$ 189.270	UNION DRESSER 3"	\$ 189.250	UNION DRESSER 3"	\$ 168.980	TUVALREP	\$ 181.867	\$ 13.755	\$180.971	\$168.112	\$ 180.270		\$ 168.980	\$ 174.609
	Cableado digital	UNID	\$ 8.330.000	JANAGER TECNOLOGIA	\$ 8.734.600	TECHNOSKILLS	\$ 7.900.000	MERCADOLIBRE	\$ 8.021.533	\$ 907.509	\$8.020.043	\$7.114.024	\$ 8.330.000		\$ 8.330.000	\$ 8.330.000
	Camara endoscopica	UNID	\$ 535.500	JANAGER TECNOLOGIA	\$ 618.800	TECHNOSKILLS			\$ 577.150	\$ -	\$6.180.000	\$535.500	\$ 535.500		\$ 618.800	\$ 577.150
	ALUMIN 3 KG O SIMILAR	UNID	\$ 65.567	COVAL	\$ 61.667	LOENCIENTRAS.COM	\$ 56.163	EASY	\$ 61.132	\$ 4.725	\$55.887	\$56.408	\$ 65.567		\$ 61.667	\$ 63.617
	LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM	M2	\$ 43.164	HOME-CENTER	\$ 44.620	EAST	\$ 45.379	PINTURAS YESOS	\$ 44.390	\$ 1.126	\$45.577	\$43.264	\$ 44.620		\$ 45.379	\$ 45.079
	LAMINA DE FIBROCEMENTO 8 MM	M2	\$ 30.836	HIDRA	\$ 30.836	ACE COMANDERAS	\$ 29.029	ARISA	\$ 30.134	\$ 969	\$29.192	\$30.836	\$ 30.836		\$ 30.836	\$ 30.836
	Paral Base 9.3-5/8 x 1.1-1/4tp 0.38mm 2.44m	UNID	\$ 18.990	EASY	\$ 20.800	ADL DRYWALL	\$ 21.530	HOME-CENTER	\$ 19.773	\$ 2.438	\$22.211	\$17.335	\$ 20.800		\$ 21.530	\$ 21.165
	Canal Base 9.3-5/8 x 1tp 0.38mm 2.44m	UNID	\$ 18.320	HOME-CENTER	\$ 12.090	EASY	\$ 18.534	ADL DRYWALL	\$ 16.315	\$ 3.660	\$22.975	\$12.654	\$ 18.320		\$ 18.534	\$ 18.427
	suministro e instalacion de sistema de impermeabilizaci3n por impregnaci3n de placa. Membrana elastom3rica multicapa, monolitica y flexible en frio. Con refuerzo en malla estructural + poli3ster de alto calibre impermeable + recubrimiento en silice de cuarzo. Sistema de impermeabilizaci3n de tr3nsito de agua. Apto para quedar expuesto a la intemperie y recibir los rayos del sol. Permite un transito peatonal de mantenimiento.	M2	\$ 162.123	IMPERDEC	\$ 169.306	ACTOATECH	\$ 151.726	ACTIVOS SAS	\$ 161.052	\$ 8.839	\$169.891	\$162.211	\$ 162.123		\$ 169.306	\$ 165.716
	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia polipropileno 3" INCLUDE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UN	\$ 10.807.368	PASLO SIMBAJEBA BARRERA	\$ 12.138.000	OSCAR PINZON	\$ 11.305.000	SOLUCIONES INTEGRADORAS SOSTENIBLES	\$ 11.416.789	\$ 672.323	\$12.089.112	\$10.744.496	\$ 10.807.368		\$ 11.305.000	\$ 11.026.194
	vidrio laminado 3-3 para reposicion en ventaneria	UN	\$ 57.000	ALUDOROS	\$ 65.500	LUIS PERLEY CRUZ			\$ 61.290	\$ -	\$65.500	\$57.000	\$ 57.000		\$ 65.500	\$ 61.290
	campana led ufo 2000w	UN	\$ 212.500	FORMAS ELECTRICAS	\$ 240.000	SMARTH LED			\$ 226.250	\$ -	\$240.000	\$212.500	\$ 212.500		\$ 240.000	\$ 226.250

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO No:	CO1.PCCTR4077645	DE 2022	FECHA INICIO 20/01/2023 FECHA TERMINACIÓN 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO I

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)	M2	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			10%	8,367.16	836.7
SUBTOTAL					836.7

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
MASTICO POLIMÉRICO BULTO x 10 KILOS	BULTO	0.092	60000 \$	5,520.00	
SUBTOTAL					5,520

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	0.0400	8,367.2
SUBTOTAL					8,367
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 14,723.88
AJU CONTRACTUAL 28.19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 4,150.66
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 18,875.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Vilamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
--

Firma: [Firma]
Nombre: Edgar Salazar - Representante Legal

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ARG. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-10	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS (todo tipo de canales)	M	0.00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10,458.95	522.9	
Sección andamio certificado (alquiler)			4,500.00	0.100	450.0	
SUBTOTAL					972.9	

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
SUBTOTAL				-	

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	0.0500	10,459.0
SUBTOTAL					10,459
TOTAL COSTO DIRECTO \$					11,431.90
TOTAL COSTO INDIRECTO \$					3,222.65
VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$					14,655.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$					-

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Lizardo V.
Nombre: Mateo Lizardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
--

Firma: Ricardo Bucar - Director de Interventoría
Nombre: Ricardo Bucar - Director de Interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCONTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10,458.95	522.9
SUBTOTAL					522.9

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
ALUMOL 3 KG O SIMILAR	kg	0.022	63617	\$	1,399.57
Rodillo 5"	un	0.01	15000	\$	150.00
Brocha 3"	un	0.01	13500	\$	135.00
Cinta de enmascarar 40 mts 12mm	un	0.05	6500	\$	325.00
SUBTOTAL					2,010

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	0.0500	10,459.0
SUBTOTAL					10,459
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	12,991.47
AJU CONTRACTUAL				28.19%	TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 3,662.30
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$	16,654.00

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Matteo Luzardo V.
Nombre: Matteo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	

Firma: [Firma]
Nombre: Edgar Salazar - Representante Legal

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022	FECHA INICIO	20/01/2023
		FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP		
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG		
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ		

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-12	REPOSICION DE VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA 0,25'1.00)	UND	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	20,917.90	1,045.9
Pulidora manual con disco (alquiler)			20,000.00	0.05	1,000.0
SUBTOTAL					2,045.9

2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
suministro e instalacion vidrio 3mm+3mm incluida pelicula	UND	1	62250	\$ 62,250.00
SUBTOTAL				62,250

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	0.1000	20,917.9
SUBTOTAL					20,918
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 85,213.80
AJU CONTRACTUAL 28.19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 24,021.77
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 109,236.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
 Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
 REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	

Firma: [Firma]
 Nombre: Ricardo Duarte - Director de Interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCONTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-13	INSPECCION DE REDES HIDROSANITARIAS POR EMERGENCIA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS (Incluye alquiler de geofono, sonda metálica, microcamara, excavacion manual). Aplica tanto para agua potable como aguas negras evidenciando la fuga y destaponamiento de la tubería según sea el caso.	M	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O.)			5%	110,928.00	5,546.4
Geofono digital			\$ 8,532,300.00	0.01	85,323.0
Camara endoscopica			\$ 577,150.00	0.01	5,771.5
SUBTOTAL					96,640.9

2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
SUBTOTAL				-

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla HH instalaciones hidraulicas (ofc+ayud)	145,833	52.13%	221,856	0.5000	110,928.0
SUBTOTAL					110,928
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 207,568.90
AJU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 58,513.67
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 266,083.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
 Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
 REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Ricardo Duarte
 Nombre: Ricardo Duarte - Director de Interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES				
CONTRATO No:	CO1.PCCTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO 20/01/2023 FECHA TERMINACIÓN 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENIOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARG. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	M	0.00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-	
SUBTOTAL						-

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON FALDON DE 15CM, REENGUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM	M	1	\$ 655,225.00	\$ 655,225.00	
SUBTOTAL					655,225

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					-
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
					-
SUBTOTAL					-
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	655,225.00
AJU CONTRACTUAL				28.19%	
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$	184,708
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$	839,933
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					-

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los nueve (9) días, del mes de febrero del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	

Firma: Ricardo Duarte
Nombre: Ricardo Duarte
Director de Interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO No:	2220554	DE 2022	FECHA INICIO 17/03/2022 FECHA TERMINACIÓN 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO I

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 14 MM E INTERIOR DE 8 MM CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, REMACHES O TACHES, NO INCLUYE PINTURA	M2	

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83,671.60	4,183.6
Andamio tubular			1,200.00	5.00	6,000.0
Pulidora manual con disco (alquiler)			\$ 20,000.00	0.15	3,000.0
SUBTOTAL					13,183.6

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
LAMINA DE FIBROCEMENTO 14MM	M2	1.05	\$ 45,003.00	\$ 47,253.15	
LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM	M2	1.05	\$ 30,686.00	\$ 32,220.30	
Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	un	1.30	\$ 21,165.00	\$ 27,514.50	
Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.38mm 2.44m	un	1.30	\$ 18,427.00	\$ 23,955.10	
Masilla SUPERMASTIC x Caneca 5 gl.	un	0.07	\$ 50,575.00	\$ 3,612.50	
Cinta Malla SUPERTAPE Rollo x 150 mt.	un	0.01	\$ 21,420.00	\$ 157.08	
Tomillo Yeso Punta Fina 1	un	10.00	\$ 35.70	\$ 357.00	
Tomillo Estructura Punta Fina 7/16	un	10.00	\$ 36.89	\$ 368.90	
SUBTOTAL					135,439

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	0.4	83,671.6
SUBTOTAL					83,672

			TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 232,293.71
AJU CONTRACTUAL	28.19%		TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 65,484
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 297,777
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (01) días, del mes de junio del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	
--	--

Firma: [Firma]
Nombre: Edgar Salazar Representante Legal

Original - ENTORNO
Copias: Contratista, Interventor

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.	UN	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-
SUBTOTAL					-

2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.	M	1	\$ 679,620.00	\$ 679,620.00
SUBTOTAL				679,620

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	679,620.00
AIU CONTRACTUAL				28.19%	
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$	191,585
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$	871,205
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$	-

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los nueve (9) días, del mes de febrero del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	
--	--

Firma: [Firma]
Nombre: Picardo Duarte - Director de interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCONTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIO
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO PARA SANITARIO (incluye retiro de push de sanitario existente)	UN	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	209,179.00	10,459.0
Pulidora manual con disco (alquiler)			20,000.00	1.00	20,000.0
SUBTOTAL					30,459.0

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
VALVULA TIPO PUSH ANTIVANDALICA	UND	1.00	\$ 417,900.00	\$ 417,900.00	
SUBTOTAL					417,900

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	1.00	209,179.0
SUBTOTAL					209,179
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 657,537.95
AIU CONTRACTUAL 28.19%					\$ 185,360
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 185,360
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 842,898
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					-

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (01) días, del mes de junio del año 2023.

Matias Lizardo V.

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	

Firma: *Ricardo Duarte*
Nombre: Ricardo Duarte - Director de interventoría

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8						
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP						
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG						
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ						

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-19	CAMBIO ACOMETIDA SUCCION DE BOMBAS ALEXANDER FLEMMING TUBERIA EXISTENTE EN HIERRO COLADO POR TUBERIA EN POLIPROPILENO . INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" , FLOTADOR Y ACCESORIOS	GL	0,00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-	
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0	
				SUBTOTAL	1.000,0	

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
18 metros lineales de tubería de 3" en tubería Polipropileno PPR PN 16 termofundido tubería	gl	1,00	\$ 11.056.000,00	\$ 11.056.000,00	
2 nipples tipo termofundido de 3" X 50 cm					
2 nipples tipo termofundido de 3" x 50 cm					
2 codos tipo termofundido de 3"					
4 semicodos tipo termofundido de 3"					
2 Válvulas pie 3" bronce					
2 flotador switch					
Instalación de 2 uniones Dreser existentes en obra .					

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,1000	350.000	35.000,0
				SUBTOTAL	35.000

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 11.092.000,00
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 3.126.834,80
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 14.218.835,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
 Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
 REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
 Nombre: Edison Ricardo Duarte
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES				
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO

20/01/2023 FECHA TERMINACIÓN 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARG. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS CARAS)	M	0.00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	5,857.01	292.9
Seccion andamio certificado (alquiler)			4,500.00	1.000	4,500.0
SUBTOTAL					4,792.9

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
Cepillo De Alambre Grata 64 Pinceles Acero Truper 11559	un	0.1	12000	\$	1,200.00
Lija Agua # 150 x Pliego	un	0.5	1200	\$	600.00
SUBTOTAL					1,800

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137,500	52.13%	209,179	0.0280	5,857.0
SUBTOTAL					5,857
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12,449.86
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 3,509.62
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 15,959.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ -


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Lizardo V.

Nombre: Mateo Lizardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: Edger Selcher - Representante legal

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP				
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG				
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ				

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120	UND	0.00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	6,275.37	313.8	
					SUBTOTAL	
					313.8	

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
MARCOS EN ALUMINO DIMENSION 30X120	UND	1	31000	\$ 31,000.00	
				\$ -	
				SUBTOTAL	
				31,000	

3. Transportes						
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario	
					SUBTOTAL	
					-	

4. Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+syud)	137,500	52.13%	209,179	0.0300	6,275.4	
					SUBTOTAL	
					6,275	
					TOTAL COSTO DIRECTO \$	
					37,589.14	
					TOTAL COSTO INDIRECTO \$	
					10,596.38	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$	
					48,186.00	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$	
					-	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

Edgier Salazar - Representante Legal

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCONTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:					
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8					
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP				
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG				
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ				

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)	M2	0,00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			10%	8.367,16	836,7
SUBTOTAL					836,7

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
MASTICO POLIMÉRICO BULTO x 10 KILOS	BULTO	0,092	60000	\$	5.520,00
SUBTOTAL					5.520

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra						
Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)		137.500	52,13%	209.179	0,0400	8.367,2
SUBTOTAL						8.367
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 14.723,88
AIU CONTRACTUAL	28,19%	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 4.150,66
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 18.875,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO
(UNA CAPA)**

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

*Previo a la instalación del piso es fundamental la aplicación de una capa de mastico (cemento y poli vinil acetato mezclados para lograr una transición entre el mortero y el pegante acuoso a base de agua que se utiliza para la instalación de piso en vinilo. Esta capa de mastico NO nivela, es la encargada de retener partículas sueltas de la placa para garantizar la tracción del pegante, es un puente de adherencia entre la placa y el piso vinílico, así como de cubrir pequeñas imperfecciones de la placa no mayores a 2 mm, cierra porosidades de placa, brinda un acabado más estético y nos permite optimizar el adhesivo. **Su aplicación es fundamental, ya que solo así, SE PUEDE GARANTIZAR LA GARANTIA SOBRE LA INSTALACION DEL PISO EN VINILO.***



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO
PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-09- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA), sobre las superficies que requieren instalación de piso en vinilo.

EJECUCIÓN:

- Limpie y retire las manchas de aceite, grasa, mugre y elementos sueltos.
- Adicione 1 (un) galón(3,75Ltrs) de agua LIMPIA por unidad de 10 kilos de MASTICO POLIMERICO.
- Adicione el agua sobre el compuesto solido. Mezcle hasta lograr una mezcla pastosa, homogénea y libre de grumos.
- En superficies porosas es aconsejable humedecer la placa con agua.
- Aplique la mezcla sobre la superficie con la ayuda de una llana metálica.
- Dejar secar durante 24 horas y proceder a aplicar el adhesivo VINISOL para instalar el piso correspondiente

MATERIALES:

- LLANA METALICA
- MASTICO
- MAQUINA PULIDORA

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA) recibidos a satisfacción por la interventoría.

*Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com*

PRODUCTO

MASTICO POLIMERICO

CARACTERÍSTICAS

Compuesto en polvo resanador para bases de concreto, baldosin, madera o similares.
Mezcla de cemento con cargas minerales y copolimero en polvo redispersable.

- NO REQUIERE PRODUCTO ADICIONAL
- NO ES UN PRODUCTO NIVELADOR

**INSTRUCCIONES
DE USOS**

1. Limpie y retire las manchas de aceite, grasa, mugre y elementos sueltos.
2. Adicione 1 (un) galón(3,75Ltrs) de agua LIMPIA por unidad de 10 kilos de **MASTICO POLIMERICO**.
3. Adicione el agua sobre el compuesto solido. Mezcle hasta lograr una mezcla pastosa, homogénea y libre de grumos.
4. En superficies porosas es aconsejable humedecer la placa con agua.
5. Aplique la mezcla sobre la superficie con la ayuda de una llana metálica.
6. Dejar secar durante 24 horas y proceder a aplicar el adhesivo **VINISOL** para instalar el piso correspondiente.
7. Se puede aplicar hasta 3 capas finas de 1mm de espesor cada una, dejar secar entre capas.

VENTAJAS

1. Fácil dispersión en agua y libre de grumos.
2. No se separa el material sólido.
3. Excelente adhesión a las superficies.
4. Permanece elástico y resistente a la indentación.
5. No requiere adicionar mastico líquido.
6. Resistente.

PRECAUCIONES

1. Evite instalar sobre p/lacas arenosas sin la resistencia adecuada. La resistencia deber minimo de 2500 libras por pulgada.
2. Compruebe que la base esté completamente lisa, seca, firme, sin perforaciones, libres de grasa, polvo o aceite.
3. Realice pruebas de humedad.
4. Aplique exclusivamente áreas internas.
5. Si tiene alguna duda comuníquese con el departamento técnico de Vinisol

ALMACENAMIENTO

1. Mantenga el recipiente bien cerrado, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.
2. Una vez destapado y luego de usar el producto; cierre herméticamente la bolsa con el sobrante y consumase en el menor tiempo posible.

RENDIMIENTO

una unidad de mastico rinde de 12 a 15 m² por capa; dependiendo de la porosidad de la placa y el espesor aplicado.

Home

Pisos, Pinturas y Terminaciones

Pisos y Paredes

Pegantes y Adhesivos para Pisos

Adhesivos para vinilos, caucho y PVC

Mastico Resanador Polimerico para superficie en Concreto 10 Kilos Blanco



Vinisol

Código 403964

Mastico Resanador Polimerico para superficie en Concreto 10 Kilos Blanco

\$59.900und

\$5.990,00 KILOGRAMO

CMR

Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online

Obtén un bono de \$45.000 para tu primera compra

Solicítala aquí

-

1

+

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 30771115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

homecenter.com.co/homecenter-co/product/403964/mastico-resanador-polimerico-para-superficie-en-concreto-10-kilos-blanco/403964/?kid=goosho_1161...

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogotá D.C.

0

Carrito

Mi Cuenta

Ficha técnica

Tipo	Adhesivos para vinilos, caucho y PVC
Color	Blanco
Áreas recomendadas de uso	Interior
Peso por caja	10Kilos
Ancho	16 cm
Largo	23 cm
Formato	10 Kilos
Material	Compuesto en polvo resanador de superficies en concreto, baldosin o similares
Garantía	1 Mes
País de origen	Colombia
Presentacion	Bolsa
Peso	10 Kilos
Rendimiento	15 m2 X Saco
Contenido	10 Kilos

Opciones de entrega para Bogotá D.C.

Disponible

Despacho a domicilio

ver fechas

Disponible

Retiro en tienda

ver tiendas

No disponible

Stock en tienda

otras opciones

perando a network-a-bazaarbydice.com...

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
--------------	--------------------	----	------	--------------	------------	-------------------	------------

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
----------------------	--	--	--

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
SUBTOTAL					522,9

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
ALUMOL 3 KG O SIMILAR	kg	0,022	63617	\$	1.399,57
Rodillo 5"	un	0,01	15000	\$	150,00
Brocha 3"	un	0,01	13500	\$	135,00
Cinta de enmascarar 40 mts 12mm	un	0,05	6500	\$	325,00
SUBTOTAL					2.010

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra						
Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)		137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
SUBTOTAL						10.459
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	12.991,47
AIU CONTRACTUAL	28,19%	TOTAL COSTO INDIRECTO			\$	3.662,30
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$	16.654,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$	-

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
--

Firma: _____
Nombre Edinson ricardo duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá, D.C, abril 04 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C


REFERENCIA: CONTRATO No. No.CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: VISTO BUENO PARA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA SED ITEM NP 11

Respetados señores:

Se revisan el ítem NP11 con sus respectivas especificaciones técnicas y cotizaciones, y de acuerdo al análisis realizado por esta interventoría donde se revisa la documentación presentada se da aval de visto bueno para posterior aprobación por parte de la secretaria de educación.

Cordialmente,



Pamela Beltrán

Tel: 3057847825

Directora interventoría

CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: NP 11 con cotizaciones.





**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO
PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,
INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20
CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. Esta actividad se realizará sobre juntas de manto asfáltico en un ancho no mayor a 20 cm y se cobrará

EJECUCIÓN:

- Identificar las áreas donde se requiere la implementación de esta actividad.
- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La pintura reflectiva de aluminio viene listo para su uso. Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.
- Dejar secar.

MATERIALES:

- ALUMOL 3 KG O SIMILAR
- Rodillo 5"
- Brocha 3"
- Cinta de enmascarar 40 mts 12mm

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A



[Inicio](#) / [ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS](#) / [IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES](#) / [IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS](#)
/ Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg



Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

\$196,701

IVA Incluido

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones



1



AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES



Unidad de Medida: UN
Referencia: 2594546
Código de ERP: 41943
Categoría: IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

ESTOY DE ACUERDO | POLITICAS DE COOKIES

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

DESCRIPCIÓN

Alumol®
PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Alumol es una pintura reflectiva de aluminio listo para su uso para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar, es gran resistencia a la intemperie.
- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere imprimación.
- Consumo: Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m2 • Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m2

MÉTODO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.

USOS

- Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

Detalles	
Atributos	Detalle
Categoría b2c	IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIER
Criterio adicional descuento	SIKA PROMOCION
Grupo	SIKA
Lineas mayores	IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES
Lineas menores	IMPERMEABILIZANTES
Visible b2b	VISIBLE B2B
Visible b2c	SI

Calificaciones del PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Productos

RELACIONADOS



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO GALÓN ALGRECO

\$ 48,274

Antes: ~~\$ 56,793~~

IVA Incluido

AÑADIR

EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA X 3.5 KG SIKA

\$ 41,742

Antes: ~~\$ 46,380~~

IVA Incluido

AÑADIR



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO X 1.6 KILOS SIKA

\$ 23,872

Antes: ~~\$ 26,525~~

IVA Incluido

AÑADIR

PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CANECA ALGRECO

\$ 205,118

Antes: ~~\$ 241,315~~


IVA Incluido

AÑADIR

10%



15%



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA Y TERRAZA 3.5KG SIKA

\$ 38,406
Antes: \$ 42,674
IVA Incluido

AÑADIR

PLACCORETA CANECA 5 GALONES ALGRECO

\$ 264,331
Antes: \$ 310,978
IVA Incluido

AÑADIR

15%



15%



PLACCORETA 1 GALÓN ALGRECO

\$ 60,732
Antes: \$ 71,450
IVA Incluido

AÑADIR

PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BALDE ALGRECO

\$ 120,283
Antes: \$ 141,509
IVA Incluido

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresar tu nombre

Ingresar tu email

SUSCRÍBETE

*Al hacer clic en suscríbete, estás aceptando nuestros [términos y condiciones](#).

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros
- Blog

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?



GetButton

- [Términos y Condiciones](#)
- [Políticas de Tratamiento de Datos](#)
- [Derecho al Retrato y Devoluciones](#)
- [Puntos de Venta](#)
- [Contáctenos](#)

MI CUENTA

- [Iniciar Sesión](#)
- [Registrarse](#)
- [Recuperar Contraseña](#)

CONTACTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 60 (1) 875-9100
tiendavirtual@coval.com.co
COTA

SÍGUENOS EN



TRANSACCIONES SEGURAS



Copyright 2023 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce





INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS / ALUMOL SIKA 3 KILOS



Alumol Sika 3 Kilos

Referencia: 94545

Estado: Producto nuevo

Precio corresponde a la ubicación de BOGOTA

El precio puede cambiar si obedece a otra zona de envío.

\$ 185,000

Presentaciones de Producto

☒ 3 kg

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje



 **Contáctanos por Whatsapp**



MÁS INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Impermeabilizantes
Características	Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda.
Contenido	3 kilos
Uso	Para reducir temperatura interior en edificaciones techadas con laminas de asbesto, cemento, zinc, concreto, etc
Recomendaciones	El producto contiene solventes volátiles por lo cual se debe tener ventilación adecuada en recintos
Superficie a aplicar	Asfálticas y cubiertas
Preparación de la superficie	La superficie debe estar cerca y limpia, libre de polvo, grasas y óxido
Dilusión	Listo para su uso
Rendimiento aprox. (m2/galón)	Aproximadamente 110 gramos / m2

Productos relacionados



Sika-101 Mortero Plus

\$ 133,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



Sika Anchorfix S 300 ml

\$ 77,000

En Stock



SikaGrout - 200 30 Kg

\$ 211,000

En Stock



Sikadur-32 Primer 3Kg

\$ 418,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje



 **Contáctanos por Whatsapp**

Venta telefónica: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

[BLOG](#) | [Metro](#) | [SPID](#) | [JUMBO](#)

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?

Configura tu método de entrega | Regístrate | Mi Cuenta

CATEGORIAS

OFERTAS

CATÁLOGOS

MUNDO EXPERTO

VENTA EMPRESAS

TIENDAS

SERVICIOS

ENCUENTRA AQUÍ LOS MUEBLES QUE NECESITAS PARA TUS ESPACIOS

tiendaseasy.co

Construcción

Impermeabilización en frío

Impermeabilizantes

ALUMOL 3 KG



ALUMOL 3 KG

SIKA | Código de producto: 2191671

Características principales:

ALUMOL 3 KG

\$ 168.490 (gr a \$ 56,16)

1

+

-

+

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características Reseñas

Comentarios

★★★★★

0 Calificación promedio (0 comentarios)

[Comenzar sesión para escribir un](#)

Más reciente Todos

No hay comentarios.

Recomendados para ti

SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 4 KG

SIKA

\$ 91.590

(gr a \$ 22,9)

20 %

JUNTA CERESIT CE 33 BLANCO 1.5 KG

CERESIT

Precio Regular ~~\$ 14.200~~

Precio Ahora \$ 11.360

(gr a \$ 7,57)

\$ 10.508

20 %

JUNTA CERESIT CE 33 HUESO 1.5 KG

CERESIT

Precio Regular ~~\$ 14.200~~

Precio Ahora \$ 11.360

(gr a \$ 7,57)

\$ 10.508

FESTER HIDROPRIMER PLUS NEGRO 4 L

FESTER

\$ 67.290

(ml a \$ 16,82)

1

+

-

+

🛒

1

+

-

+

🛒

1

+

-

+

🛒

1

+

-

+

🛒

Calidad

Fácil y seguro

Exclusividad

Entrega en tu ciudad

EASY

Acerca de EASY

Catálogos

Tiendas y Horarios

Mundo Experto

¿Cómo comprar?

Trabaja con Nosotros

Tarjeta Cencosud

Responsabilidad Social

Proveedores

POLÍTICAS

Preguntas Frecuentes

Cambios y Devoluciones

Términos y Condiciones

Protección de Datos

Política de Cookies

Superintendencia de industria y comercio SIC

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS

TIENDAS:

Horario: 7:00 am – 9:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 8:00 pm Domingos y Festivos Bogotá: (601) 7460340

clientes@easy.com.co

VENTA TELEFÓNICA:

Horario: 8:00 am – 6:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 5:00 pm Domingos Bogotá: (601) 7460344 Medellín: (604) 6044775 Resto del país: 018000180340

EMAIL: clientes@easy.com.co

Haz tus compras con estos Medios de Pago

© 2023 Easy | Esta tienda está autorizada por Visa para realizar transacciones electrónicas. | Copyright © Cencosud

Visa

https://www.easy.com.co/alumol-3-kg/p

2/2

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	CONSORCIO MIA GP			

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
SUBTOTAL					522,9

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
ALUMOL 3 KG O SIMILAR	kg	0,022	63617	\$	1.399,57
Rodillo 5"	un	0,01	15000	\$	150,00
Brocha 3"	un	0,01	13500	\$	135,00
Cinta de enmascarar 40 mts 12mm	un	0,05	6500	\$	325,00
SUBTOTAL					2.010

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra						
Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)		137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
					SUBTOTAL	10.459
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 12.991,47
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	\$	3.662,30
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$	16.654,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: Edinson Ricardo Duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá, D.C, abril 04 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C


REFERENCIA: CONTRATO No. No.CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: VISTO BUENO PARA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA SED ITEM NP 11

Respetados señores:

Se revisan el ítem NP11 con sus respectivas especificaciones técnicas y cotizaciones, y de acuerdo al análisis realizado por esta interventoría donde se revisa la documentación presentada se da aval de visto bueno para posterior aprobación por parte de la secretaria de educación.

Cordialmente,



Pamela Beltrán

Tel: 3057847825

Directora interventoría

CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: NP 11 con cotizaciones.





[Inicio](#) / [ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS](#) / [IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES](#) / [IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS](#)
/ Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg



Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

\$196,701

IVA Incluido

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones



1



AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES



Unidad de Medida: UN
Referencia: 2594546
Código de ERP: 41943
Categoría: IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

ESTOY DE ACUERDO | POLITICAS DE COOKIES

DESCRIPCIÓN

Alumol®
PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Alumol es una pintura reflectiva de aluminio listo para su uso para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar, es gran resistencia a la intemperie.
- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere imprimación.
- Consumo: Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m2 • Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m2

MÉTODO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.

USOS

- Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

Detalles	
Atributos	Detalle
Categoría b2c	IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIER
Criterio adicional descuento	SIKA PROMOCION
Grupo	SIKA
Lineas mayores	IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES
Lineas menores	IMPERMEABILIZANTES
Visible b2b	VISIBLE B2B
Visible b2c	SI

Calificaciones del PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Productos

RELACIONADOS

15%



10%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO GALÓN ALGRECO

\$ 48,274
Antes: ~~\$ 56,793~~
IVA Incluido

 AÑADIR

EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA X 3.5 KG SIKA

\$ 41,742
Antes: ~~\$ 46,380~~
IVA Incluido

 AÑADIR

10%
Oferta



15%



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO X 1.6 KILOS SIKA

\$ 23,872
Antes: ~~\$ 26,525~~
IVA Incluido

 AÑADIR

PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CANECA ALGRECO

\$ 205,118
Antes: ~~\$ 241,315~~
IVA Incluido

 AÑADIR

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?




GetButton

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

10%



15%



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA Y TERRAZA 3.5KG SIKA

\$ 38,406
Antes: \$ 42,674
IVA Incluido

AÑADIR

PLACCORETA CANECA 5 GALONES ALGRECO

\$ 264,331
Antes: \$ 310,978
IVA Incluido

AÑADIR

15%



15%



PLACCORETA 1 GALÓN ALGRECO

\$ 60,732
Antes: \$ 71,450
IVA Incluido

AÑADIR

PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BALDE ALGRECO

\$ 120,283
Antes: \$ 141,509
IVA Incluido

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresar tu nombre

Ingresar tu email

SUSCRÍBETE

*Al hacer clic en suscríbete, estás aceptando nuestros [términos y condiciones](#).

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros
- Blog

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?



GetButton

- [Términos y Condiciones](#)
- [Políticas de Tratamiento de Datos](#)
- [Derecho al Retrato y Devoluciones](#)
- [Puntos de Venta](#)
- [Contáctenos](#)

MI CUENTA

- [Iniciar Sesión](#)
- [Registrarse](#)
- [Recuperar Contraseña](#)

CONTACTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 60 (1) 875-9100
tiendavirtual@coval.com.co
COTA

SÍGUENOS EN



TRANSACCIONES SEGURAS



Copyright 2023 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce





INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS / ALUMOL SIKA 3 KILOS



Alumol Sika 3 Kilos

Referencia: 94545

Estado: Producto nuevo

Precio corresponde a la ubicación de BOGOTA

El precio puede cambiar si obedece a otra zona de envío.

\$ 185,000

Presentaciones de Producto

☒ 3 kg

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje



 **Contáctanos por Whatsapp**

1



MÁS INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Impermeabilizantes
Características	Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda.
Contenido	3 kilos
Uso	Para reducir temperatura interior en edificaciones techadas con laminas de asbesto, cemento, zinc, concreto, etc
Recomendaciones	El producto contiene solventes volátiles por lo cual se debe tener ventilación adecuada en recintos
Superficie a aplicar	Asfálticas y cubiertas
Preparación de la superficie	La superficie debe estar cerca y limpia, libre de polvo, grasas y óxido
Dilusión	Listo para su uso
Rendimiento aprox. (m2/galón)	Aproximadamente 110 gramos / m2

Productos relacionados



Sika-101 Mortero Plus

\$ 133,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



Sika Anchorfix S 300 ml

\$ 77,000

En Stock



SikaGrout - 200 30 Kg

\$ 211,000

En Stock



Sikadur-32 Primer 3Kg

\$ 418,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje



 **Contáctanos por Whatsapp**

Venta telefónica: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

[BLOG](#) | [Metro](#) | [SPID](#) | [JUMBO](#)

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?

Configura tu método de entrega | Regístrate | Mi Cuenta

CATEGORIAS

OFERTAS

CATÁLOGOS

MUNDO EXPERTO

VENTA EMPRESAS

TIENDAS

SERVICIOS

ENCUENTRA AQUÍ LOS MUEBLES QUE NECESITAS PARA TUS ESPACIOS

tiendaseasy.co

Construcción

Impermeabilización en frío

Impermeabilizantes

ALUMOL 3 KG



ALUMOL 3 KG

SIKA | Código de producto: 2191671

Características principales:

ALUMOL 3 KG

\$ 168.490 (gr a \$ 56,16)

1

+

-

+

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características

Reseñas

Comentarios

★★★★★

0 Calificación promedio (0 comentarios)

[Comenzar sesión para escribir un](#)

Más reciente

Todos

No hay comentarios.

Recomendados para ti

SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 4 KG

SIKA

\$ 91.590

(gr a \$ 22,9)

20 %

JUNTA CERESIT CE 33 BLANCO 1.5 KG

CERESIT

Precio Regular ~~\$ 14.200~~

Precio Ahora \$ 11.360

(gr a \$ 7,57)

\$ 10.508

20 %

JUNTA CERESIT CE 33 HUESO 1.5 KG

CERESIT

Precio Regular ~~\$ 14.200~~

Precio Ahora \$ 11.360

(gr a \$ 7,57)

\$ 10.508

FESTER HIDROPRIMER PLUS NEGRO 4 L

FESTER

\$ 67.290

(ml a \$ 16,82)

1

+

-

+

🛒

1

+

-

+

🛒

1

+

-

+

🛒

1

+

-

+

🛒

Calidad

Fácil y seguro

Exclusividad

Entrega en tu ciudad

EASY

- Acerca de EASY
- Catálogos
- Tiendas y Horarios
- Mundo Experto
- ¿Cómo comprar?
- Trabaja con Nosotros
- Tarjeta Cencosud
- Responsabilidad Social
- Proveedores

POLÍTICAS

- Preguntas Frecuentes
- Cambios y Devoluciones
- Términos y Condiciones
- Protección de Datos
- Política de Cookies
- Superintendencia de industria y comercio SIC

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS

TIENDAS: Horario: 7:00 am – 9:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 8:00 pm Domingos y Festivos Bogotá: (601) 7460340
clientes@easy.com.co
VENTA TELEFÓNICA: Horario: 8:00 am – 6:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 5:00 pm Domingos Bogotá: (601) 7460344 Medellín: (604) 6044775 Resto del país: 018000180340
EMAIL: clientes@easy.com.co

Haz tus compras
con
estos Medios de
Pago

© 2023 Easy | Esta tienda está autorizada por Visa para realizar transacciones
electrónicas. | Copyright © Cencosud





**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO
PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS,
INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20
CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. Esta actividad se realizará sobre juntas de manto asfáltico en un ancho no mayor a 20 cm y se cobrará

EJECUCIÓN:

- Identificar las áreas donde se requiere la implementación de esta actividad.
- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La pintura reflectiva de aluminio viene listo para su uso. Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.
- Dejar secar.

MATERIALES:

- ALUMOL 3 KG O SIMILAR
- Rodillo 5"
- Brocha 3"
- Cinta de enmascarar 40 mts 12mm

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8						
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP						
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG						
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ						

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-12	REPOSICION DE VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA 0,25*1,00)	UND	0,00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	20.917,90	1.045,9
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
SUBTOTAL					2.045,9

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
suministro e instalacion vidrio 3mm+3mm incluida pelicula	UND	1	62250	\$	62.250,00
SUBTOTAL					62.250

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,1000	20.917,9
SUBTOTAL					20.918
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 85.213,80
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 24.021,77
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 109.236,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
 Nombr Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombr Edinson ricardo duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-12 - REPOSICION VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA
0,20*1,00)**

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem debido a que existe la necesidad de reponer vidrios que se encuentran en mal estado o instalar vidrios nuevos en las puertas y ventanas existentes.

**Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com**



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO
PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-12 - REPOSICION DE VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA 0,20*1,00)

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA 0,20*1,00) para reposición en puertas o ventanas existentes o nuevas.

EJECUCIÓN:

- Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se instalara el vidrio.
- Rectificar medidas para cortar el vidrio según las dimensiones del vano. (Se debe considerar un centímetro adicional tanto en el ancho como en el alto del vano).
- Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte.
- Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta vidrios a las medidas necesarias.
- Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocará el vidrio, la superficie donde se pegara el vidrio deberá estar libre de polvo y grasa.
- Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicación limpia.
- Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegará el vidrio.
- Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera.
- Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espátula para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio.
- Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona.

MATERIALES:

- Vidrio 3+3 incoloro
- Película
- Silicona

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por UNIDAD (UN) de suministro e instalación de VIDRIOS 3+3mm + PELICULA (DIMENSIONES HASTA 0,25*1,00) recibidos a satisfacción por la interventoría.

*Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com*



VIDRIOS Y ALUMINIOS
LUIS FERLEY CRUZ REYES
C.C 1.121.846.956.

23 de junio de 2023.

PROPUESTA COMERCIAL # 029

Señores:
CONSORCIO MÍA GP
Ciudad

Por medio de la presente, me permito enviar la propuesta comercial de mano de obra para la fabricación e instalación de vidrio 3+3 y película :

DESCRIPCIÓN	VALOR M2 UNITARIO
Vidrio 3+3 dimensiones hasta 0.20 x 1.00	\$ 52.000
Película dimensiones hasta 0.20 x1.00	\$ 13.500

FORMA DE PAGO. 60% al inicio y 40% a la entrega.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN. 15 días hábiles.

Cordialmente,

Luis Ferley Cruz Reyes
C.C. 1.121.846.956.
Cel. 305 925 9469



Cel.: 305 925 94 69

Correo electrónico: ferneycruz141118@gmail.com.



Fusagasugá, 23 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO MIA GP

Ciudad

REF. COTIZACIÓN A TODO COSTO

Con la presente me permito poner a su consideración cotización a todo costo de suministro e instalación de vidrio laminado 3+3 con película de seguridad y silicona en ventanearía existente

VALOR X UNIDAD DE VIDRIO (0.20 MTS X 1.00 MTS) = \$ 45.000

VALOR X UNIDAD DE PELICUAL (.02 MTS X 1.00 MTS) = \$ 12.000

Forma de Pago: 60% al Iniciar y 40% a contra entrega.

De antemano agradezco su pronta y favorable respuesta.

Atentamente,

Luis Omar Zamudio

C.C 11.524.197

Cel. 3202458501



320 245 8501



Calle 28 #4-94 Barrio el vergel, Fusagasugá



omarsamudio_09@hotmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	CONSORCIO MIA GP			

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
--------------	--------------------	----	------	--------------	------------	-------------------	------------

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-13	INSPECCION DE REDES HIDROSANITARIAS POR EMERGENCIA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS (Incluye alquiler de geofono, sonda metálica, microcamara, excavacion manual). Aplica tanto para agua potable como aguas negras evidenciando la fuga y destaponamiento de la tubería según sea el caso.	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	110.928,00	5.546,4
Geofono digital			\$ 8.532.300,00	0,01	85.323,0
Camara endoscopica			\$ 577.150,00	0,01	5.771,5
SUBTOTAL					96.640,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SUBTOTAL				-

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla HH instalaciones hydraulicas (ofc+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,5000	110.928,0
SUBTOTAL					110.928
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 207.568,90
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 58.513,67
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 266.083,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
--

--

Firma: _____
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-13 - IINSPECCION DE REDES HIDROSANITARIAS POR EMERGENCIA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS (Incluye alquiler de geofono, sonda metálica, microcamara, excavacion manual). Aplica tanto para agua potable como aguas negras evidenciando la fuga y destaponamiento de la tubería según sea el caso.

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem toda vez que contractualmente no se cuenta con una actividad para la inspección de redes sanitarios, teniendo en cuenta que el contrato en mención cuenta con dentro de sus obligaciones la atención de emergencias que se presenten en las instituciones educativas y en su mayoría son de inconvenientes de fuga por la necesidad de mantenimiento o edad de las edificaciones.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-13 - INSPECCION DE REDES HIDROSANITARIAS POR EMERGENCIA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS (Incluye alquiler de geofono, sonda metálica, microcamara, excavacion manual). Aplica tanto para agua potable como aguas negras evidenciando la fuga y destaponamiento de la tubería según sea el caso.

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la inspección de redes sanitarias con equipos especializados como geófono, microcámara y la excavación superficial de áreas, para detectar posibles fugas.

- EJE•** Excavación o detección del entorno de la fuga.
- Manipulación de equipos especializados para detección de la fuga (geófono)
 - Visualización de la fuga (microcámara).
 - Diagnóstico de la afectación para proceder con la mitigación y solución del inconveniente.

MATERIALES:

- Herramienta menor

EQUIPOS:

- Geófono digital
- microcámara

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro lineal (M) inspección de redes sanitarias con equipos especializados, recibidos a satisfacción por la interventoría.

// OFERTA COMERCIAL //

Cotización :	COT-GM-20230412 041	Fecha:	12/05/2023
Razón social:	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	Presentada a:	LUISA FERNANDA PROAÑOS
NIT:	901531834-2	Cargo:	
Dirección:	BOGOTÁ	Celular:	
Teléfono:			

Asunto:	Suministro e Instalación de Sistema CCTV
---------	--

2. SUMINISTRO EQUIPOS CCTV						
ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Geofono detector de figas de agua	TECHOAC	Un	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
2.2	Disco Duro 2TB Cache 256MB. 3,5SATA	ESTERNDIGITA	Un	1	\$ 450.000	\$ 450.000
SUBTOTAL SUMINISTRO						\$ 7.450.000

4. MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SUBTOTAL MANO DE OBRA Y CONFIGURACION						

TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 7.450.000
IVA (19%)	\$ 1.415.500
TOTAL DESPUES DE IMPUESTOS	\$ 8.865.5000

Términos y Condiciones	
Forma de pago:	<p>* Anticipo: Pago 100%</p> <p>* Facturacion: Venta de producto: Contra Despacho o entrega de equipo Facturados.</p> <p>Facturacion del 100% del La orden de Venta o contrato a la entrega a Satisfacción</p> <p>Transferencias o consignaciones unicamente a las siguientes cuentas: - Banco Davivienda Cuenta Ahorros No. 009400796943 A nombre de JANAGER TECNOLOGÍA S.A.S y escribir el NIT de su empresa en el comprobante de consignación</p>
Entrega:	Entrega 45 días Hábiles
Precios en:	Pesos Colombianos
Vigencia:	15 días
Garantía:	<p>Los equipos suministrados por JANAGER TECNOLOGÍA S.A.S están amparados por una garantía de un (1) año, la cual cubre repuestos por daños o fallas producidas por defectos de fabricación, Exclusiones de la garantía:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La intervención de terceros en la reparación o revisión de los equipos. • Uso inapropiado o mala operación de los equipos. • Sobrecargas eléctricas, corriente débil, o defectos en la instalación eléctrica del lugar. • Eventos de fuerza mayor (hechos violentos, entre otros) • Fenómenos naturales (descargas eléctricas, terremoto, inundación y otros).
Requerimientos:	Orden de Compra y pago de contado
Alcance:	<p>A continuación algunas observaciones referentes a la cotización presentada:</p> <p>Se cotiza de acuerdo a los requerimientos del Cliente, quien es el responsable de validar la propuesta</p> <p>Prestación de Servicios en la Ciudad de Bogotá</p> <p>El cliente debe poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y del objeto contractual</p>
Realizado por:	<p>Germán A. Muñoz</p> <p>Móvil: 3118155941</p> <p>gmunoz@janager.com</p>



Características principales

Marca **TEXHOAC**

Modelo **AT-407N**

Usado

Geofono, Detector De Fugas De Agua

\$ 7.000.000

Hasta 48 cuotas



[Más información](#)

 **Envío gratis a nivel nacional**
Conoce los tiempos y las formas de envío.
[Calcular cuándo llega](#)

¡Última disponible!


Comprar ahora

Agregar al carrito

 **Devolución gratis.** Tienes 30 días desde que lo recibes.

 **Compra Protegida,** recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Información sobre el vendedor



DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GEOFONO DETECTOR DE FIGAS DE AGUA	TEXHOAC	TEXHOAC	1	\$ 7.340.000	\$ 7.340.000
CÁMARA ENDOSCÓPICA CON PANTALLA IPS DE 4.3 PULGADAS	XCF	HD1080P	1	\$ 520.000	\$ 520.000
VALOR SIN IVA					\$ 7.860.000
IVA (19%)					\$ 1.493.400
VALOR TOTAL					\$ 9.353.400

Office: (+57) (1) 2859270
Dir: Calle 74 #15-80 of 2-509
Bogota, D.C. – Colombia
www.tses.com.co

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	CONSORCIO MIA GP			

A. DATOS GENERALES					
--------------------	--	--	--	--	--

CONTRATO No:	CO1.PCINTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
--------------	--------------------	----	------	--------------	------------	-------------------	------------

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
----------------------	--	--	--

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM. NO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	M	0,00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-	
SUBTOTAL						-

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM	M	1	\$ 655.225,00	\$	655.225,00
SUBTOTAL					655.225

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	655.225,00
AIU CONTRACTUAL				28,19%	
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$	184.708
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$	839.933
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$	-

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
--

Firma: _____
Nombi Edinson ricardo duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-14 - SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE GRIFOS A 60CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Debido a que los mesones serán instalados en construcciones institucionales de gran afluencia de personal lo cual debe garantizar la durabilidad de los elementos en el tiempo y buen comportamiento frente a acciones mecánicas, golpes, rayaduras; a que los costos y requerimientos de mantenimiento son mínimos; a que garantizan larga durabilidad y a que estéticamente generan un acabado agradable y cálido que mejora la apariencia de los espacios a intervenir, y a que el mármol es un material que cuenta con todas propiedades, es un material apto para ser usado en instituciones educativas.

Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-14 - SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO 60CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE GRIFOS A 60CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de Mesón corrido a doble altura en grano de mármol con subdivisión por módulo de servicio de acuerdo, faldón de 15cm, renegréese de 2cm terminado ancho 60cm y distanciamiento entre grifos a 60cm.

EJECUCIÓN:

- Localización puntos de apoyo.
- Se instalará soportes.
- Instalar mesón corrido de grano de mármol a doble altura

MATERIALES:

- Estructura metálica soporte
- Mesón corrido a doble altura en grano de mármol con subdivisión por módulo de servicio.

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro lineal (M) de suministro e instalación de mesón corrido de grano de mármol a doble altura recibidos a satisfacción por la interventoría.



¡ SUPERFICIES QUE INSPIRAN ESTILO !

NIT: 901196673-6

Para	Juan Camilo Cristancho
Dirección	
Teléfono	312 3544250
NIT/CC	
Fecha	Junio 01 de 2023

En atención a su amable invitación a cotizar el suministro e instalación del mesón en Mármol Café Pinto, pongo a su disposición la siguiente cotización.

COTIZACIÓN 2023-516					
Item	Material	Especificaciones	Cantidad	Valor unitario por m2 o ml	Valor total o Global
1	Café Pinto	<p>Mesones en Mármol con salpicadero de 0,07 y frentero de 0,10</p> <p>- Mesones: Primer mesón: 2,45*0,60 Segundo mesón: 1,95*0,60 Tercer mesón: 2,32*0,60 Cuarto mesón: 2,32*0,60</p> <p>- Unión de los mesones: Uniones (2): 0,60*0,10</p>	9.05	\$ 555.000	\$ 5.022.750
2	Café Pinto	<p>Lavamanos en mármol</p> <p>- Lavadero: 0,70*0,50</p>	13	\$ 596.000	\$ 7.748 000
3	Anglos metálicos 2"	<p>Ángulos metálicos escuadras con refuerzos De 0.55*0.12(instalados)</p>	15	\$ 80.000	\$ 1.200.000
				Sub total	\$ 13.970.750
				IVA 19%	\$ 2.654.443
				Total a pagar	\$ 16.625.193



¡ SUPERFICIES QUE INSPIRAN ESTILO !

GRANITOS Y CUARZOS GRANITOS Y CUARZOS

INCLUYE LO SIGUIENTE:

1. SUMINISTRO:

- Material (Mármol Café Pinto)
- Pegamentos, materia prima para la elaboración e instalación.

2. MANO DE OBRA E INSTALACIÓN:

- Cuadreada de piezas a medida solicitada.
- Molduras, cortes a 45° de frenteros, partes vistas de mesón y brillo de borde salpicaderos.
- Huecos de griferías.

TRANSPORTE: dentro de la ciudad de Bogotá D.C. no tiene costo adicional, sin embargo, si es fuera del perímetro urbano tiene costo adicional por cotización, transporte y viáticos de obra.

TIEMPO DE OBRA: 5 - 6 días hábiles para la instalación con el área totalmente adecuado para dicho proceso.

FORMA DE PAGO: anticipo 80% de pago para suministro de material, 20% contra entrega satisfacción.

NO INCLUYE:

- El precio NO incluye: trabajos de plomería, electricidad, carpintería, montaje y desmontaje de electrodomésticos.
- El precio NO incluye: ningún tipo de soportes o anclajes para los mesones.
- El precio NO incluye: transporte vertical o grúa si se requiere. Si incluye por ascensor o escaleras.
- El precio NO incluye: nivelación del área donde va el mesón instalado. (debe estar nivelada).
- El precio NO incluye transporte fuera del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá (consultar precio de tu ciudad)

Cordialmente,

PITER ROCHA
C.C. No. 80.280.001



RODOLFO BUSTOS
NIT. 98503096-2 Régimen simplificado
Mesones en granito-mármol natural para cocinas, baños, pisos
Muebles en toda clase de maderas
Cra 20 43 35 Sur Barrio Santa Lucia
TEL.: - Cels: 313 358 80 48 - 310 261 06 00

COTIZACIÓN

FECHA: 01/06/2023

CLIENTE:

NIT: 901646396-2

DIR:

TEL: 3123544250

CANT. ML	DESCRIPCION	VALOR METRO	TOTAL
4.40	GRANITO JASPED	\$ 780.000	\$ 3'432.000
13	LAVAMANOS GRANITO JASPED	\$	\$ 10'140.000
4.65	HRANITO JASPED	\$	\$ 3'627.00
TOTAL COTIZACION			\$ 17'199.000

NOTA: ESTE PRECIO SE MANTIENE SIEMPRE Y CUANDO NO SE APLIQUEN RETENCIONES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS APROX. DESPUES DE RECIBIDO EL ANTICIPO

FORMAS DE PAGO: EL 50% PARA INICIAR OBRA Y 50% CUANDO SE ENTREGUE A SATISFACCIÓN. O SEGÚN ACUERDO

FIRMA CONTRATISTA



Item	Descripción	Cant	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Mesón en grano de mármol con cambio de nivel y frente de 15cm – Medida 4,40x0,60	1	4,40 ml	\$ 546.219	\$ 2.403.364
2	Mesón en grano de mármol con cambio de nivel y frente de 15cm – Medida 4,65x0,60m	1	4.65 ml	\$ 546.219	\$ 2.539.918
3	Lavamanos en grano de mármol – Medida 0,60x0,65m	1	13 un	\$ 546.219	\$ 7.100.847
Subtotal					\$ 12.044.129
iva 19%					\$ 2.288.385
Total					\$ 14.332.514

-
- *Suministro e instalación mesones y pisos en mármol, granito y piedra artificial. .*
 - *Pulido y cristalización.*
 - *Restauración y limpieza en mármol, granito.*
 - *Protección y sellado pierdas naturales*

Correo: naturalstonecolombiasas@gmail.com - Tel: 318 301 12



Observaciones Específicas;

- Tener en cuenta que el transporte de instalación es en Bogotá, si es fuera de la ciudad tendrá un costo adicional
- El valor NO incluye trabajos de electricidad, plomería y/o carpintería como desmonte o arreglo de muebles o instalación de electrodomésticos o tomas eléctricas.
- Las paredes y pisos deberán estar nivelas, esto influye en la instalación final.
- El material será entregado en obra y descargado. Si es posible que sea por ascensor o escalera, si es por escalera mayor a un tercer piso tendrá un valor adicional que se calculara de acuerdo con el trasiego de material, si se prefiere placas completas y placas a medida y no es posible por alguno de estas dos opciones se deberá contratar una empresa que suba el material por la parte exterior, y será un costo adicional.
- La programación de los trabajos se realizará con una semana de antelación a su ejecución.
- Esta cotización incluye pegante adecuado para la instalación de acuerdo con la zonas y condiciones expuestas.
- Tiempo de entrega será acordado con el cliente.
- Los valores de pegante calculados en los rendimientos adecuados en una superficie con nivel óptimo de desnivel.
- Anticipo 80% sobre el subtotal.

Atentamente

Carlos Eduardo Gaitán.

Observaciones Generales

- Natural Stone Colombia S.A.S es una empresa prestadora de servicios de Granitos y Mármol S.A.S. Por lo tanto, toda la responsabilidad de suministro e instalación será responsabilidad de Natural Stone Colombia S.A.S.
- Los mármoles, granitos y piedras son piedras naturales, por lo tanto, pueden presentar variaciones normales de tonalidad y vetas incluso dentro del mismo lote.
- Las piedras artificiales se clasifican entre quartztone y gramarstone. Son piedras hechas sintéticamente y asemejan mármoles o granitos.
- Las piedras artificiales pueden variar de tonos de acuerdo con lotes y presentar variaciones cromáticas.

-
- *Suministro e instalación mesones y pisos en mármol, granito y piedra artificial. .*
 - *Pulido y cristalización.*
 - *Restauración y limpieza en mármol, granito.*
 - *Protección y sellado piedras naturales*

Correo: naturalstonecolombiasas@gmail.com - Tel: 318 301 12



Natural Stone Colombia S.A.S

- El valor no incluye trabajos de electricidad, plomería y/o carpintería como desmonte o arreglo de muebles o instalación de electrodomésticos.
- El valor no incluye soportes o estructuras metálicas.
- Natural Stone Colombia S.A.S solo suministrara piedras naturales, no suministra muebles, pocetas, griferías ni accesorios de baño, cocina o lugar donde se dispone a instalar.
- Este valor es provisional hasta no ratificar medidas en obra

Forma de pago 80% anticipo y saldo contra entrega.

Tiempo de entrega: Acordado con el cliente

-
- *Suministro e instalación mesones y pisos en mármol, granito y piedra artificial. .*
 - *Pulido y cristalización.*
 - *Restauración y limpieza en mármol, granito.*
 - *Protección y sellado pierdas naturales*

Correo: naturalstonecolombiasas@gmail.com - Tel: 318 301 12

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 FECHA INICIO 20/01/2023 FECHA TERMINACIÓN 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.	UN	0,00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	-	-	
SUBTOTAL						-

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.	M	1	\$ 679.620,00	\$ 679.620,00	
SUBTOTAL					679.620

3. Transportes						
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario	
SUBTOTAL						-

4. Mano de Obra							
Trabajador			Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
SUBTOTAL							-
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 679.620,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%	TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 191.585
VALOR TOTAL ACTIVIDAD							\$ 871.205
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD							\$

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
 Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
 REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombr Edinson ricardo duarte
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-16- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA
MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO
DE SERVICIO.**

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Debido a que los mesones serán instalados en construcciones institucionales de gran afluencia de personal lo cual debe garantizar la durabilidad de los elementos en el tiempo y buen comportamiento frente a acciones mecánicas, golpes, rayaduras; a que los costos y requerimientos de mantenimiento son mínimos; a que garantizan larga durabilidad y a que estéticamente generan un acabado agradable y cálido que mejora la apariencia de los espacios a intervenir, y a que el mármol es un material que cuenta con todas propiedades, es un material apto para ser usado en instituciones educativas.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-16 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.

UNIDAD:UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.

EJECUCIÓN:

- Localización puntos de apoyo.
- Se instalará soportes.
- Instalar mesón corrido de grano de mármol a doble altura

MATERIALES:

LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO.

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA MESON CORRIDO EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO. recibidos a satisfacción por la interventoría.



¡ SUPERFICIES QUE INSPIRAN ESTILO !

NIT: 901196673-6

Para	Juan Camilo Cristancho
Dirección	
Teléfono	312 3544250
NIT/CC	
Fecha	Junio 01 de 2023

En atención a su amable invitación a cotizar el suministro e instalación del mesón en Mármol Café Pinto, pongo a su disposición la siguiente cotización.

COTIZACIÓN 2023-516					
Item	Material	Especificaciones	Cantidad	Valor unitario por m2 o ml	Valor total o Global
1	Café Pinto	<p>Mesones en Mármol con salpicadero de 0,07 y frentero de 0,10</p> <p>- Mesones: Primer mesón: 2,45*0,60 Segundo mesón: 1,95*0,60 Tercer mesón: 2,32*0,60 Cuarto mesón: 2,32*0,60</p> <p>- Unión de los mesones: Uniones (2): 0,60*0,10</p>	9.05	\$ 555.000	\$ 5.022.750
2	Café Pinto	<p>Lavamanos en mármol</p> <p>- Lavadero: 0,70*0,50</p>	13	\$ 596.000	\$ 7.748 000
3	Anglos metálicos 2"	<p>Ángulos metálicos escuadras con refuerzos De 0.55*0.12(instalados)</p>	15	\$ 80.000	\$ 1.200.000
				Sub total	\$ 13.970.750
				IVA 19%	\$ 2.654.443
				Total a pagar	\$ 16.625.193



¡ SUPERFICIES QUE INSPIRAN ESTILO !

INCLUYE LO SIGUIENTE:

1. SUMINISTRO:

- Material (Mármol Café Pinto)
- Pegamentos, materia prima para la elaboración e instalación.

2. MANO DE OBRA E INSTALACIÓN:

- Cuadreada de piezas a medida solicitada.
- Molduras, cortes a 45° de frenteros, partes vistas de mesón y brillo de borde salpicaderos.
- Huecos de griferías.

TRANSPORTE: dentro de la ciudad de Bogotá D.C. no tiene costo adicional, sin embargo, si es fuera del perímetro urbano tiene costo adicional por cotización, transporte y viáticos de obra.

TIEMPO DE OBRA: 5 - 6 días hábiles para la instalación con el área totalmente adecuado para dicho proceso.

FORMA DE PAGO: anticipo 80% de pago para suministro de material, 20% contra entrega satisfacción.

NO INCLUYE:

- El precio NO incluye: trabajos de plomería, electricidad, carpintería, montaje y desmontaje de electrodomésticos.
- El precio NO incluye: ningún tipo de soportes o anclajes para los mesones.
- El precio NO incluye: transporte vertical o grúa si se requiere. Si incluye por ascensor o escaleras.
- El precio NO incluye: nivelación del área donde va el mesón instalado. (debe estar nivelada).
- El precio NO incluye transporte fuera del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá (consultar precio de tu ciudad)

Cordialmente,

PITER ROCHA
C.C. No. 80.280.001



RODOLFO BUSTOS
NIT. 98503096-2 Régimen simplificado
Mesones en granito-mármol natural para cocinas, baños, pisos
Muebles en toda clase de maderas
Cra 20 43 35 Sur Barrio Santa Lucia
TEL.: - Cels: 313 358 80 48 - 310 261 06 00

COTIZACIÓN

FECHA: 01/06/2023

CLIENTE:

NIT: 901646396-2

DIR:

TEL: 3123544250

CANT. ML	DESCRIPCION	VALOR METRO	TOTAL
4.40	GRANITO JASPED	\$ 780.000	\$ 3'432.000
13	LAVAMANOS GRANITO JASPED	\$	\$ 10'140.000
4.65	HRANITO JASPED	\$	\$ 3'627.00
TOTAL COTIZACION			\$ 17'199.000

NOTA: ESTE PRECIO SE MANTIENE SIEMPRE Y CUANDO NO SE APLIQUEN RETENCIONES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS APROX. DESPUES DE RECIBIDO EL ANTICIPO

FORMAS DE PAGO: EL 50% PARA INICIAR OBRA Y 50% CUANDO SE ENTREGUE A SATISFACCIÓN. O SEGÚN ACUERDO

FIRMA CONTRATISTA



Item	Descripción	Cant	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Mesón en grano de mármol con cambio de nivel y frente de 15cm – Medida 4,40x0,60	1	4,40 ml	\$ 546.219	\$ 2.403.364
2	Mesón en grano de mármol con cambio de nivel y frente de 15cm – Medida 4,65x0,60m	1	4.65 ml	\$ 546.219	\$ 2.539.918
3	Lavamanos en grano de mármol – Medida 0,60x0,65m	1	13 un	\$ 546.219	\$ 7.100.847
Subtotal					\$ 12.044.129
iva 19%					\$ 2.288.385
Total					\$ 14.332.514

-
- Suministro e instalación mesones y pisos en mármol, granito y piedra artificial. .
 - Pulido y cristalización.
 - Restauración y limpieza en mármol, granito.
 - Protección y sellado pierdas naturales

Correo: naturalstonecolombiasas@gmail.com - Tel: 318 301 12



Observaciones Específicas;

- Tener en cuenta que el transporte de instalación es en Bogotá, si es fuera de la ciudad tendrá un costo adicional
- El valor NO incluye trabajos de electricidad, plomería y/o carpintería como desmonte o arreglo de muebles o instalación de electrodomésticos o tomas eléctricas.
- Las paredes y pisos deberán estar nivelas, esto influye en la instalación final.
- El material será entregado en obra y descargado. Si es posible que sea por ascensor o escalera, si es por escalera mayor a un tercer piso tendrá un valor adicional que se calculara de acuerdo con el trasiego de material, si se prefiere placas completas y placas a medida y no es posible por alguno de estas dos opciones se deberá contratar una empresa que suba el material por la parte exterior, y será un costo adicional.
- La programación de los trabajos se realizará con una semana de antelación a su ejecución.
- Esta cotización incluye pegante adecuado para la instalación de acuerdo con la zonas y condiciones expuestas.
- Tiempo de entrega será acordado con el cliente.
- Los valores de pegante calculados en los rendimientos adecuados en una superficie con nivel óptimo de desnivel.
- Anticipo 80% sobre el subtotal.

Atentamente

Carlos Eduardo Gaitán.

Observaciones Generales

- Natural Stone Colombia S.A.S es una empresa prestadora de servicios de Granitos y Mármol S.A.S. Por lo tanto, toda la responsabilidad de suministro e instalación será responsabilidad de Natural Stone Colombia S.A.S.
- Los mármoles, granitos y piedras son piedras naturales, por lo tanto, pueden presentar variaciones normales de tonalidad y vetas incluso dentro del mismo lote.
- Las piedras artificiales se clasifican entre quartztone y gramarstone. Son piedras hechas sintéticamente y asemejan mármoles o granitos.
- Las piedras artificiales pueden variar de tonos de acuerdo con lotes y presentar variaciones cromáticas.

-
- *Suministro e instalación mesones y pisos en mármol, granito y piedra artificial. .*
 - *Pulido y cristalización.*
 - *Restauración y limpieza en mármol, granito.*
 - *Protección y sellado piedras naturales*

Correo: naturalstonecolombiasas@gmail.com - Tel: 318 301 12



Natural Stone Colombia S.A.S

- El valor no incluye trabajos de electricidad, plomería y/o carpintería como desmonte o arreglo de muebles o instalación de electrodomésticos.
- El valor no incluye soportes o estructuras metálicas.
- Natural Stone Colombia S.A.S solo suministrara piedras naturales, no suministra muebles, pocetas, griferías ni accesorios de baño, cocina o lugar donde se dispone a instalar.
- Este valor es provisional hasta no ratificar medidas en obra

Forma de pago 80% anticipo y saldo contra entrega.

Tiempo de entrega: Acordado con el cliente

-
- *Suministro e instalación mesones y pisos en mármol, granito y piedra artificial. .*
 - *Pulido y cristalización.*
 - *Restauración y limpieza en mármol, granito.*
 - *Protección y sellado pierdas naturales*

Correo: naturalstonecolombiasas@gmail.com - Tel: 318 301 12

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	DE	2022	FECHA INICIO	17/03/2022	FECHA TERMINACIÓN	16/09/2023
--------------	---------	----	------	--------------	------------	-------------------	------------

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIC
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 14 MM E INTERIOR DE 10 MM CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, REMACHES O TACHES, NO INCLUYE PINTURA	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	83.671,60	4.183,6
Andamio tubular			1.200,00	5,00	6.000,0
Pulidora manual con disco (alquiler)			\$ 20.000,00	0,15	3.000,0
SUBTOTAL					13.183,6

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
LAMINA DE FIBROCEMENTO 14MM	M2	1,05	\$ 45.003,00	\$ 47.253,15
LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM	M2	1,05	\$ 30.686,00	\$ 32.220,30
Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	un	1,30	\$ 21.165,00	\$ 27.514,50
Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.38mm 2.44m	un	1,30	\$ 18.427,00	\$ 23.955,10
Masilla SUPERMASTIC x Caneca 5 gl.	un	0,07	\$ 50.575,00	\$ 3.612,50
Cinta Malla SUPERTAPE Rollo x 150 mt.	un	0,01	\$ 21.420,00	\$ 157,08
Tornillo Yeso Punta Fina 1	un	10,00	\$ 35,70	\$ 357,00
Tornillo Estructura Punta Fina 7/16	un	10,00	\$ 36,89	\$ 368,90
SUBTOTAL				135.439

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					

4. Mano de Obra

Trabajador			Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)			137.500	52,13%	209.179	0,4	83.671,6
SUBTOTAL							83.672
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 232.293,71
AIU CONTRACTUAL	28,19%	TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 65.484
VALOR TOTAL ACTIVIDAD							\$ 297.777
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD							\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (01) días, del mes de junio del año 2023.

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)
--

Firma: _____
Nombre: Edinson Ricardo Duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-15 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 14 MM E INTERIOR DE 10 MM CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, REMACHES O TACHES, NO INCLUYE PINTURA

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión del ítem debido a la necesidad de incorporar en la obra unos muros divisorios que deben ser en construcción liana a fin de no aportar cargas representativas a la estructura existente que impliquen reforzamientos.

Los muros en lamina de fibrocemento aporta cargas mínimas a la estructura además de garantizar adecuado comportamiento a la intemperie y humedad.



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO
PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-15 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR DE 14 MM E INTERIOR DE 10 MM CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, REMACHES O TACHES, NO INCLUYE PINTURA

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Esta especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de muro en lamina de fibrocemento exterior de 14 mm e interior de 10 mm con dilataciones según diseño, remaches o taches, no incluye pintura de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

EJECUCIÓN:

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Consultar Planos de Detalles.
- Replantar paneles en piso según localización y orientación con cimbra.
- Colocar perfilera canal en piso y techo con clavo de pistola
- Fijar perfiles tipo paral sobre la canal cuidando que se conserve una distancia de 60cm entre ellos y que estén plomados.
- Modular las láminas de fibrocemento y cortar las que sean necesarias para generar la piezas.
- Fijar las láminas a los perfiles con tornillos autoperforantes para fibrocemento.
- Encintar y empastar las juntas de las láminas. Lijar hasta dejar una superficie lisa.

MATERIALES:

- LAMINA DE FIBROCEMENTO 14MM
- LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM
- Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m
- Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.38mm 2.44m
- Masilla SUPERMASTIC x Caneca 5 gl.
- Cinta Malla SUPERTAPE Rollo x 150 mt.
- Tornillo Yeso Punta Fina 1
- Tornillo Estructura Punta Fina 7/16

**EQUIPOS:**

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

El suministro, transporte e instalación de muro en lamina de fibrocemento exterior de 14 mm e interior de 10 mm con dilataciones según diseño, remaches o taches, se pagará por metro cuadrado (M2). Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato.



321791_1



Descripción

Matecsa

Código 321791

Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.53mm 2.44m
NTC5680

★★★★★ 0.0 (0)

\$18.320und

\$7.508,20 METRO

- 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista



Satisfacción Garantizada

[ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogotá D.C.



Disponible
Despacho a domicilio

[ver fechas](#)



Canal 2 1/2" x 1" x 2.44 CAL 24 C25010024

★★★★★ 0 Opiniones

\$ 18,534⁰

1

🛒 Agregar

Referencia:	0010764
Código de Erp:	10764
Categoría:	PERFILERIA MUROS ESPECIAL
Clase De Inventario:	BAJO PEDIDO
Línea:	PERFILERIA DRYWALL
Marcas:	MATECSA





¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?



Configura tu método de entrega | Regístrate | Mi Cuenta

CATEGORÍAS

OFERTAS

CATÁLOGOS

MUNDO EXPERTO

VENTA EMPRESAS


TIENDAS

SERVICIOS

0 Productos

Esta oferta termina el 7 de junio **GRAN LIQUIDACIÓN EN MUEBLES** Encuentra **SILLAS Y SOFÁS DESDE \$64.000**

tiendaseasy.co | Construcción | Construcción En Seco | Ángulo | Canal Base 9 0.40 x 2.44M

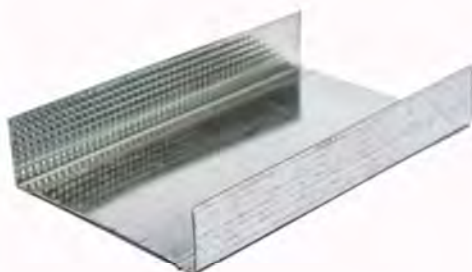

Canal Base 9 0.40 x 2.44M

BUILDCO | Código de producto: 1239972

Características principales:

CANAL BASE 9 BUILDCO 0.40 X 2.44M

\$ 12.090 (m a \$ 4.854,82)

1



COMPRAR

MEDIOS DE PAGO



Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO



Envío a domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**

Características

Especificaciones técnicas

Reseñas

Características



¿Qué estás buscando?



Estás comprando para
Bogotá D.C.



CONSTRUCCIÓN
Y FERRETERÍA

PISOS, PINTURAS Y
TERMINACIONES

HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS

BAÑO,
COCINA Y
ASEO

ELECTROHOGAR,
TECNOLOGÍA Y
CLIMATIZACIÓN

MUEBLES Y
ORGANIZACIÓN

DECORACIÓN, MENAJE
E ILUMINACIÓN

AIRE LIBRE,
JARDÍN Y
MASCOTAS

AUTOMÓVILES Y
CARCENTER

SERVICIOS
HOGAR

PROYECTOS E
INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferrería > Tijas y Drywall > Láminas de Drywall > Láminas de Fibrocemento > Placa Fibrocemento 10mm 244x122cm 42.93kg aprox.



SUPERBOARD

Código 97676

Placa Fibrocemento 10mm 244x122cm 42.93kg
aprox.

★★★★★ 5.0 (2)

\$91.800und

\$30.836,41 METRO CUADRADO.

- 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista



Servicios
Hogar



Descripción

Servicios Hogar

Visita
Técnica
\$ 35.900

Sin
Servicio



Satisfacción Garantizada

[ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077 115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



Lamina Eterboard 8mm 2.44X1.22m



Lamina Eterboard 8mm 2.44X1.22m

No hay comentarios aún, sé el primero en comentar.

SKU: 10002354

\$86.396,56

Disponibilidad: **En inventario**

- 1 +



Al carrito



ETERNIT

Placa Eterboard de 8 mm por 122 x 244 cm

SKU: 37575

STOCK: 9

PRECIO

\$90.900

AÑADIR AL CARRO

DESCRIPCIÓN

Placa Eterboard de 8 mm por 122 x 244 cm marca Eternit. Encuentra aquí los mejores materiales para la construcción, gran variedad de productos con calidad garantizada al mejor precio.

Este producto está disponible únicamente para venta dentro del departamento de Sucre.

El precio de este producto está sujeto a negociación por volumen, en caso de requerir mayor información visítenos en nuestro almacén en Sincelejo o solicite su cotización en la ventana Cotice Aquí.





Servicios
Hogar



Descripción

SUPERBOARD

Código 63969

Placa Fibrocemento 14mm 244x122cm 59.75kg
aprox.

★★★★★ 5.0 (1)

\$128.500und

\$43.164,26 METRO CUADRADO.

- 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

 Servicios Hogar

Visita
Técnica
\$ 35.900

Sin
Servicio



Satisfacción Garantizada

[ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado; sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.



¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?



Configura tu método de entrega

Regístrate

Mi Cuenta

CATEGORIAS

OFERTAS

CATÁLOGOS

MUNDO EXPERTO

VENTA EMPRESAS

TIENDAS

SERVICIOS

0 Productos

ENCUENTRA **AQUÍ** LOS MUEBLES QUE NECESITAS PARA TUS ESPACIOS

tiendaseasy.co | Construcción | Construcción En Seco | Placa De Fibrocemento | Superboard Entrepiso 14mm Placa Fibrocemento



Superboard Entrepiso 14mm Placa Fibrocemento

SUPERBOARD | Código de producto: 1242014

Características principales:

SUPERBOARD ENTREPISO 1220X2440X14MM

\$ 132.990 (m2 a \$ 44.827,52)

1



COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características

Especificaciones técnicas

Reseñas



¿Qué producto estás buscando?



(604) 448 1802
310 449 3023
¡Contáctanos!



[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Productos](#)

[Contáctenos](#)

[Nuestras Tiendas P&Y](#)

[Inicio](#) / [Catálogo](#) / [Sistema Drywall](#) / [Placas](#)



Placa Superboard ST – 14mm

~~\$143.220~~ **\$135.085**

(PRECIO ONLINE)

68 disponibles



Añadir al carrito



Envío a tu dirección

De 1 a 2 días hábiles

Ciudades disponibles: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Métodos de pago



Compra protegida

Tus datos y transacciones están protegidos, los tratamos de acuerdo a nuestra política de privacidad.

♥ [Añadir a Favoritos](#)

SKU: 1305033

Categorías: Placas, Sistema Drywall

Etiquetas: fachadas, placas



¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?



Configura tu método de entrega

Regístrate

Mi Cuenta

CATEGORÍAS

OFERTAS

CATÁLOGOS

MUNDO EXPERTO

VENTA EMPRESAS

TIENDAS

SERVICIOS

0 Productos

Esta oferta termina el 7 de junio

GRAN LIQUIDACIÓN EN MUEBLES

Encuentra SILLAS Y SOFÁS DESDE \$64.000

tiendaseasy.co | Construcción | Construcción En Seco | Paneles | PARAL BASE 9 BUILDCO 0.40 X 2.44M



PARAL BASE 9 BUILDCO 0.40 X 2.44M

BUILDCO | Código de producto: 1239973

Características principales:

PARAL BASE 9 BUILDCO 0.40 X 2.44M

\$ 16.990 (m a \$ 6.983,11)

1



COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.



Paral 59 0.55X2.44 Cal. 24 Matecsa

★★★★★ 0 Opiniones

\$ 20,800⁰

1

Agregar

Referencia:	0004072
Codigo de Erp:	4072
Categoría:	PERFILERIA MUROS ESPECIAL
Clase De Inventario:	ESPECIAL EQUIVALENTE
Línea:	PERFILERIA DRYWALL
Marca:	MATECSA



[Descripción](#) [Asistencia](#)

Hasaha Relacionados < >



318224_1



Descripción

Matecsa

Código 318224

**Paral Base 9 3-5/8 x 1-5/8pg 0.53mm 2.44m
NTC5680**

★★★★★ 0.0 (0)

\$21.530und

\$8.823,77 METRO

- 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista



Satisfacción Garantizada

[ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogotá D.C.

🚚 **Disponible**
Despacho a domicilio

[ver fechas](#)

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 FECHA INICIO 20/01/2023 FECHA TERMINACIÓN 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO PARA SANITARIO (incluye retiro de push para sanitario existente)	UN	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	209.179,00	10.459,0
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	1,00	20.000,0
SUBTOTAL					30.459,0

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
VÁLVULA TIPO PUSH ANTIVANDALICA	UND	1,00	\$ 417.900,00	\$ 417.900,00
SUBTOTAL				417.900

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	1,00	209.179,0
SUBTOTAL					209.179
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 657.537,95
AIU CONTRACTUAL	28,19%		TOTAL COSTO INDIRECTO	\$	185.360
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$	842.898
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO PARA
SANITARIO (incluye retiro de push para sanitario existente)**

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Debido a que se encuentra en intervención áreas de baños en colegios, se identificó que existen unos sanitarios que no pueden ser desaguados debido a deficiencias o mal estado de los push existentes, por lo cual previo al cambio de enchapes se requiere desmontar los push defectuosos e instalar unos nuevos.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-18- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO PARA SANITARIO (incluye retiro de push para sanitario existente)

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO PARA SANITARIO (incluye retiro de push para sanitario existente).

EJECUCIÓN:

- Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel en cada batería.
- Instalar orinal mediano con grifería anti vandálica tipo push.
- Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
- Ejecutar desagüe con sifón plástico tipo botella, desmontable o inspeccionable y conexión completa.
- Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

MATERIALES:

- PUSH ANTIBANDALICO
- ACCESORIOS HIDROSANITARIOS

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será unidad (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIBANDALICO recibidos a satisfacción por la interventoría.

*Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com*



Descripción

Válvula Antivandálica Para Sanitario

Ficha técnica

GRIVAL

Válvula Antivandálica Para Sanitario

Código 165895

★★★★★ 0.0 (0)

\$417.900unidad

- 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista



Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogotá D.C.

🚚 Disponible
Despacho a domicilio

ver fechas

🚚 Despacho express

Ver condiciones

🏪 Disponible
Retiro en tienda

ver tiendas



corona

Inicio / Grifería Sanitaria / Válvulas /
VÁLVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS



VÁLVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS

corona

\$417.900

La válvula para sanitario tipo push te brindará un diseño compacto que optimiza espacio y evita acciones vandálicas, mientras garantizas un ahorro de agua en cada uso ¡Adquiérela ahora mismo!

✓ 1 disponibles

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 751250001

Categorías: **Accesorios**, **Grifería Sanitaria**, **Línea institucional**,
Repuestos, **Válvulas**

Share:   

Contácta



Hogar y Muebles > Baños > Sanitarios > Accesorios para Sanitarios > Válvulas de Descarga

[Compartir](#) | [Vender uno igual](#)



Nuevo | 1 vendido

Set De Válvula Push Antivandálica Para Sanitario Docol

\$ 430.780

Hasta 48 cuotas



[Más información](#)

Llega gratis el sábado

Comprando dentro de las próximas 16 h 19 min

[Ver más formas de entrega](#)

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

[Conocer más](#)

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad ▾ (5 disponibles)

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Publicaciones de Accesorios y Acabados

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8						
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP						
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG						
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ						

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-18	REPARACION EN TUBERIA GALVANIZADA MEDIANTE UNION MECANICA TIPO DRESSER 3 HD. INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" Y ACCESORIOS	GL	0,00

1. Equipo					
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	209.179,00	10.459,0
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
SUBTOTAL					11.459,0

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
TUBERIA PVC SANITARIA 3"	un	1,6	121000	\$	193.600,00
Accesorios pvc 3"	un	8	32000	\$	256.000,00
UNION DRESSER 3"	un	2	174625	\$	349.250,00
SUBTOTAL					798.850

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,1000	350.000	35.000,0
SUBTOTAL					35.000

4. Mano de Obra					
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	1,0000	209.179,0
SUBTOTAL					209.179
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1.054.487,95
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 297.260,15
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 1.351.748,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma:
 Nombro Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
 Nombro Edinson ricardo duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-19 REPARACION EN TUBERIA GALVANIZADA MEDIANTE UNION MECANICA TIPO DRESSER 3 HD. INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" Y ACCESORIOS

UNIDAD: GL

JUSTIFICACIÓN:

Durante la demolición de placa de contrapiso en cancha se identificó que la acometida en hierro dúctil de 3" que suministra el equipo de bombeo de la institución presentaba deterioro, corrosión y fisuramiento. La transición entre los dos tipos de tubería debe realizarse mediante una UNION MECANICA TIPO DRESSER 3 HD.

Este tramo de tubería debe ser reparado a fin de fundir la nueva placa en concreto de la cancha múltiple del centro educativo.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-09 REPARACION EN TUBERIA GALVANIZADA MEDIANTE UNION MECANICA TIPO DRESSER 3 HD. INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" Y ACCESORIOS

UNIDAD: GL

DESCRIPCIÓN:

Las uniones están diseñadas para acoplar diferentes tipos de tuberías, como las de PVC, HD, HF, acero, asbesto cemento, y polietileno PEAD. Asi como realizar transiciones entre elementos con diferentes extremos o conexiones, entre bridas y extremos lisos, por ejemplo. Ademas cuentan con pintura temofusionada epoxica que bindan un excelente acabado y máxima adherencia. Uso Recomendado Utilizadas para acoplar tubos de extremo liso PVC, Acero o PVC ISO, permiten desplazar su aro sobre uno de los tubos, lo que asegura un fácil desmontaje de las válvulas o accesorios adyacentes

EJECUCIÓN:

- Limpieza de la tubería
- Uso de llaves para forcé de tuercas

MATERIALES:

- 2 Union dresser 3"
- Tuberia PVC 3"
- Accesorios 3"

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Volqueta

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por global (GL) de la actividad

TECNOLOGÍA

APOLO



Los productos APOLO son fabricados con PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA. Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.

Uniones y Adaptadores

Norma AWWA C-219



Made in Colombia



Las uniones y los adaptadores APOLO están diseñados para acoplar diferentes tipos de tuberías, como las de PVC, HD, HF, Acero, Asbesto Cemento y Polietileno (PEAD), así como para realizar transiciones entre elementos con diferentes extremos o conexiones, entre bridas y extremos lisos, por ejemplo.

Además cuentan con pintura termofusionada epóxica que brinda un excelente acabado, espesores adecuados y máxima adherencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- **Norma:**
AWWA C-219.
- **Material:**
Hierro Dúctil ASTM A-536.
Acero ASTM A-53 (Apolo-Quik).
- **Tornillería:**
Acero Galvanizado.
Acero Inoxidable (Opcional).
- **Empaques:**
EPDM.
- **Revestimiento:**
Pintura Epóxica en Polvo aplicada por Termofusión.
- **Temperatura:**
70°C Máximo.
- **Presión de operación:**
250 PSI (Probadas a 375 PSI).
- **Desviación angular:**
+/- 6°.
- **Torque de apriete:**
55 a 65 Nm en cruz.

ESQUEMA DE ENSAMBLE

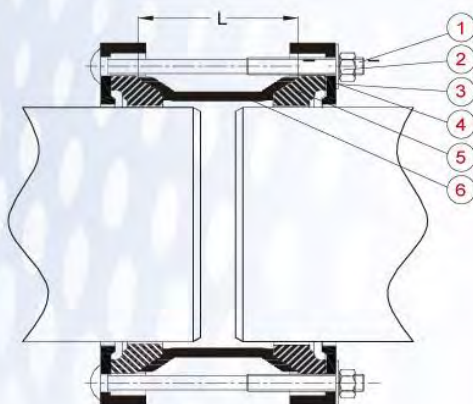


TABLA 1. Rango de uniones universales Apolo.

Diám. Nom.	Rango (mm)	L (mm)	Tornillos
2"	57 - 70	102	4
3"	85 - 103	102	4
4"	110 - 128	102	4
6"	R1 (159 - 181)	130	4
	R2 (167 - 189)	150	4
8"	R1 (218 - 235)	130	4
	R2 (234 - 252)	160	4
10"	R1 (268 - 286)	160	6
	R2 (292 - 310)	168	6
12"	R1 (315 - 333)	160	6
	R3 (350 - 368)	170	6

"Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica."

Lista de Componentes:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Tornillos | 4. Brida |
| 2. Tuerca | 5. Empaque |
| 3. Arandela | 6. Barril |

www.apolo.net.co

Uniones y Adaptadores **APOLO**

TABLA 2. Selección de uniones APOLO según aplicación

TUBERÍAS A UNIR	AC - HD - HF	PVC - Acero	PEAD
AC - HD - HF	Universal	Universal, Apolo-Flex	GT X Universal
PVC - Acero	Universal, Apolo-Flex	Universal, Dresser, Apolo-Quik	GT X Universal
PEAD	GT X Universal	GT X Universal	Garra de Tigre

SELECCIÓN DE UNIONES APOLO

Para seleccionar adecuadamente una unión **APOLO**, refiérase a la TABLA 2 e identifique el accesorio especializado para la aplicación particular que requiere. En caso de elegir una Unión Universal o al menos un extremo con esta tecnología, seleccione el rango de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Se requiere unir o reparar una tubería de asbesto cemento de 8" CL-25 con una tubería de PVC (ANSI).

- 1) En el Esquema de Ensamble, simulamos que al lado izquierdo está la tubería de asbesto y al lado derecho la de PVC.
- 2) En la TABLA 3, en la columna de Diámetro Nominal, ubicamos en 8" la tubería de asbesto CL-25 y su diámetro exterior (247 mm).
- 3) Con esta medida vamos a la TABLA 1 y en la columna de Diámetro Nominal, en la fila de 8", seleccionamos el rango requerido; en este caso sería el rango R2 (234 -252 mm).
- 4) Repetimos el mismo procedimiento para la tubería de PVC. Se

identifica en la TABLA 3 la medida del diámetro exterior del PVC (ANSI) para 8" (219,1 mm); vamos para la TABLA 1, seleccionamos 8" en la columna Diámetro Nominal y verificamos que el diámetro exterior requerido está dentro del rango R1 (216-235 mm). De esta manera se selecciona una Unión Universal de 8" R1xR2.

Observaciones Importantes:

- 1) Las uniones universales no aplican para tuberías de polietileno. Para empalmar tuberías de PEAD entre sí y hacer transiciones entre el PEAD y otras tuberías, **APOLO** ha desarrollado las Uniones y Adaptadores Garra de Tigre PEAD.
- 2) Todos los productos **APOLO** en extremos lisos (espigos) se fabrican con los mismos diámetros de las tuberías PVC (ANSI) o Acero (ASTM A- 53), pero también se pueden producir bajo otras normas como la del PVC (ISO o Plastigama) y HD, entre otros.

TABLA 3. Dimensiones de tuberías

DIÁMETRO NOMINAL		PVC - ACERO			HIERRO DÚCTIL		HF	PEAD		ASBESTO CEMENTO		
		ASTM D2241 NTC 382 RDE 21 AWWA 905 (Desde 14") ACERO SCH 40 (2" a 14")	ISO-4422 Plastigama	AWWA C900	ISO 2531	AWWA C-110	AWWA Class 100-205	ISO 4427 NTC 4585	ASTM F-714 AWWA C-906	NTC-44 / ISO R-160		
										CL-20	CL-25	CL-30
Pulg.	mm	DIÁMETRO EXTERIOR										
2"	50	60,3	63	-	66	63,5	-	63	60,3	72	72	72
3"	75	88,9	90	-	98	100,6	-	90	88,9	98	98	100
4"	100	114,3	110	121,9	118	121,9	122	110	114,3	124	126	130
6"	150	168,3	160	175,3	170	175,3	175	160	168,3	180	186	190
8"	200	219,1	200	229,9	222	229,9	230	200	219,1	137	247	251
10"	250	273,1	250	281,9	274	281,9	282	250	273,1	291	299	309
12"	300	323,9	315	335,3	326	335,3	335	315	323,8	347	359	369
14"	350	355,6	355	-	378	388,6	388	355	355,6	406	420	432
16"	400	406,4	400	-	429	441,9	442	400	406,4	465	479	493
18"	450	457,2			480	495,3	495	450	457,2	521	598	616
20"	500	508,0	-	-	532	548,6	549	500	508,0	580	598	616

"Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica".

Uniones y Adaptadores

APOLO



1. Uniones Universales

Permiten acoplar tuberías de PVC, Acero, HF, HD y Asbesto Cemento (A.C.) entre sí. Solo basta con verificar los diámetros exteriores de las tuberías a unir para seleccionar el rango de la Unión Universal requerido. (Ver Tabla N.1)

Diámetros	2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
-----------	------------------------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.



2. Uniones Apolo-Flex

Se utiliza cuando existe la certeza de que uno de los extremos a unir es PVC, Acero o productos APOLO en extremo liso y el otro extremo es AC, HD o HF. El lado para el PVC o Acero va con un empaque gris que es más cerrado que el empaque negro del otro extremo. De esta manera se garantiza un ensamble más rápido y se protege la débil tubería de AC al no tener que apretar tanto.

Diámetros	2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
-----------	------------------------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.



3. Uniones Dresser

Se identifican porque llevan el empaque gris (para PVC o Acero) en ambos extremos. Su aplicación es exclusiva para empalmar tuberías de PVC (ANSI) o Acero (ASTM A-53) entre sí o productos APOLO en extremos lisos. Tienen las mismas dimensiones y número de tornillos que las uniones universales.

Diámetros	2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14"
-----------	-----------------------------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.



4. Uniones Dresser Apolo-Quik

Tienen las mismas aplicaciones que las uniones Dresser, con la diferencia de que son fabricadas en lámina de acero ASTM A53, con pintura que garantiza 1000 horas de cámara salina. Son más livianas, fáciles de instalar y económicas que las uniones Dresser en HD.

Diámetros	2", 3", 4", 6"
-----------	----------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.

Uniones y Adaptadores **APOLO**



5. Uniones Garra de Tigre PEAD

Además de acoplar tubería de polietileno entre sí, ofrece combinaciones para hacer transiciones con tuberías de Acero, PVC, HD o extremos lisos de productos Apolo.

Diámetros	2", 3", 4", 6", 8"
-----------	--------------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.



6. Adaptadores Brida X Universal

Permite hacer transiciones entre elementos bridados (ANSI / ISO) y diferentes tipos de tuberías o productos Apolo en extremos lisos.

Diámetros	2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
-----------	------------------------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.



7. Adaptadores Brida X Polietileno

Permite hacer transiciones entre elementos bridados (ANSI / ISO) y tuberías y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD).

Diámetros	2", 3", 4", 6", 8"
-----------	--------------------

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.



8 Uniones de Desmontaje Autoportante

Acopla elementos bridados (ANSI / ISO) expuestos como es el caso de las estaciones de control, para facilitar las operaciones de montaje y desmontaje, ya que permite variar la distancia entre bridas.

Para acoplar	Bridas (ANSI) / ISO) con Bridas (ANSI / ISO)	D.N. Pulg.	Distancia entre Bridas (mm)		
			Mínima	Nominal	Máxima
Diámetros	2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"	2"	-	-	-
		3"	180	203	226
		4"	180	203	226
		6"	180	203	226
		8"	240	263	286
		10"	280	305	330
		12"	280	305	330

Para otros diámetros y aplicaciones, favor consultar con fábrica.

Versión #2 Nov.2017

APOLO

MEDELLÍN

Fábrica: Cra. 42 No. 29 A- 49, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (4) 303 11 66

BOGOTÁ

Cra. 27 No. 17-74, Paloquemao
Teléfono: (1) 360 70 53

CALI

Cra. 28 No. 9-39 Local 01 Teléfono (2) 308 71 08

BARRANQUILLA

Cel: 318- 481 37 31 / 310- 632 76 19

BUCARAMANGA

Cel: 317- 664 54 10

www.apolo.net.co

[INICIO](#)[CATÁLOGO](#)[MEDIDORES](#)[CONTACTO](#)[BLOGS](#)[SOPORTE](#)

Productos

[Inicio](#) > [Productos](#) > [Uniones Universales](#) > [Página 1 de 1](#)

Etiquetas

[All Productos](#)

[ACCESORIOS](#)

[ACCESORIOS CONTROLAGUA](#)

[ACCESORIOS EN BRONCE](#)

[ACCESORIOS HIERRO DUCTIL](#)

[Accesorios Novafort](#)

[Accesorios para PF](#)

[Accesorios PF + UAD](#)



Union Universal PVC FIMACA

de \$151.487,00 COP

[Inicio](#) > [Productos](#) > [Union Dresser para PVC FIMACA \(1-1/2" A 10"\)](#)

Union Dresser para PVC FIMACA (1-1/2" A 10")

\$165.000,00 COP

Diametro

1 1/2" 

-	1	+
---	---	---

AÑADIR A LA CESTA

COMPRAR AHORA

Unión tipo Gibault. Cuerpo en hierro dúctil, ASTM A-536 grado 65-45-12.



Ch

Artículo 387

COTIZACION	
Número:	261466
Fecha:	05/27/2023
Página:	1 de 1

cliente:	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	Forma de pago	CTD CONTADO	Fecha vcto	05/27/2023
Contacto:	LUISA PROAÑOS				
Nit o C.C.:	901531834	Código:	901531834	Vendedor	RAMIREZ URREGO VIRGILIO
Dirección:	CR 18 60 C 13 S				
Ciudad:	Bogotá, D.C.	Docto Alt			
Teléfono:	3 1 4 3 8 2 6 3 2 0	Moneda	COP		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Desccto	Sub total
1710515	UNION DRESSER 3 HD	0.00	1003	UND	2.00	0.00	\$142,000	20 %	\$227,200

PESO TOTAL: 0.00 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA
RESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021
POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co

LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS SUJETOS A REVISION.

OBSERVACIONES

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
\$284,000	\$56,800	\$227,200	\$43,168	\$270,368

ramirezv

ramirezv

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Firma: _____
 Nomb Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-19 CAMBIO ACOMETIDA SUCCION DE BOMBAS ALEXANDER FLEMMING
TUBERIA EXISTENTE EN HIERRO COLADO POR TUBERIA EN
POLIPROPILENO . INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" , FLOTADOR Y
ACCESORIOS**

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Durante la demolición de placa de contrapiso en cancha se identificó que la acometida en hierro dúctil de 3" que suministra el equipo de bombeo de la institución presentaba deterioro, corrosión y fisuramiento.

Este tramo de tubería debe ser reparado a fin de fundir la nueva placa en concreto de la cancha múltiple del centro educativo.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-19 - CAMBIO ACOMETIDA SUCCION DE BOMBAS ALEXANDER FLEMMING TUBERIA EXISTENTE EN HIERRO COLADO POR TUBERIA EN POLIPROPILENO . INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" , FLOTADOR Y ACCESORIOS

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el CAMBIO ACOMETIDA SUCCION DE BOMBAS ALEXANDER FLEMMING TUBERIA EXISTENTE EN HIERRO COLADO POR TUBERIA EN POLIPROPILENO . INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" , FLOTADOR Y ACCESORIOS, debido al deterioro en el que se encuentra la tubería existente.

EJECUCIÓN:

- Desmontar tubería en hierro colado existente
- Tomar medidas en sitio de tubería a instalar
- Identificar accesorios y elementos de empalme entre red existente y red de polipropileno
- Realizar la instalación de la tubería en polipropileno garantizando la adecuada unión entre elementos existentes y elementos nuevos.
- Realizar prueba de presión sobre la tubería instalada
-

MATERIALES:

- 18 metros lineales de tubería de 3" en tubería
- Polipropileno PPR PN 16 termofundido tubería
- 2 niples tipo termofundido de 3" X 50 cm
- 2 niples tipo termofundido de 3" x 50 cm
- 2 codos tipo termofundido de 3"
- 4 semicodos tipo termofundido de 3"
- 2 Válvulas pie 3" bronce
- 2 flotador switch
- Instalación de 2 uniones Dreser existentes en obra .

EQUIPOS:

- Termo difusor
- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será unidad (UN) de **CAMBIO ACOMETIDA SUCCION DE BOMBAS ALEXANDER FLEMMING TUBERIA EXISTENTE EN HIERRO COLADO POR TUBERIA EN POLIPROPILENO. INCLUYE TUBERIA DE PRESION 3" , FLOTADOR Y ACCESORIOS** a satisfacción por la interventoría.

Correo: psimbaqueba@yahoo.com www.PSB.com
Teléfono: + (318) 8 47 30 96



PRESENTACION DE OFERTA TECNICO COMERCIAL. CONSULTORIAS REDES CONTRA INCENDIO

Empresa	CONSORCIO MIA	OFERTA No.	CMTUB 0123-V1
Proyecto:	CAMBIO TUBERIA SUCCION SISTEMA BOMBEO COLEGIO ALEXANDER FLEMING.	FECHA	7/06/2023
Atención	ING. YESENIA ARENAS		
Correo:		Celular:	

ITEM 1. OBJETO DE LA CONSULTORIA.	
1. OBJETO	Realizar el cambio de dos línea de tubería de succión de 3" instalada en PVC y Acero Galvanizado por tubería en acero inoxidable HG de 3" con sus accesorios .

ITEM 3. ALCANCE	
	Realizar el cambio de dos línea de tubería de succión de 3" instalada en PVC y Acero Galvanizado por tubería en POLIPROPILENO ppr pn 16 de 3" con sus accesorios . Desmonte y retiro de tubería y accesorios de succión en PVC y Acero galvanizado de 3" en una distancia de 18 metros dividido en dos líneas cada una de 9 metros. Suministro e instalación en piso de tubería y accesorios en PPR PN 16 de 3" con accesorios desde la válvula de pie en el tanque de almacenamiento hasta empate de la red antes del muro del cuarto de máquinas. Incluye instalación de uniones Dreser, semi-codos, codos, tipo termofundido Suministro e Instalación de dos válvulas de pie de 3" en el tanque de almacenamiento. Suministro e instalación flotador tipo switch dentro del tanque de almacenamiento.

ITEM 6. CONDICIONES COMERCIALES					
				VALORES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
6.1	Suministro e instalación de : 18 metros lineales de tubería de 3" en tubería Polipropileno PPR PN 16 termofundido tubería 2 nipples tipo termofundido de 3" X 50 cm 2 nipples tipo termofundido de 3" x 50 cm 2 codos tipo termofundido de 3" 4 semicodos tipo termofundido de 3" 2 Válvulas pie 3" bronce 2 flotador switch Instalación de 2 uniones Dreser existentes en obra .	GL	1	\$ 10.807.368	\$ 10.807.368
	TOTAL CAPITULO				\$ 10.807.368

TIEMPO DE EJECUCION 2 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO 100% Anticipo

VALIDEZ DE LA OFERTA HASTA junio 30 2023

TIPO DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO.

CONSULTOR


PABLO SIMBAQUEBA
Consultor Hidráulico.
Ingeniero Ambiental y Sanitario



SEÑORES: CONSORCIO MIA

CIUDAD.

Respetados señores :

SIMVEL INGENIERIA Ltda., presenta la siguiente oferta comercial para la instalación de 20 metros de tubería succión en 3" tipo Polipropileno color verde con accesorios, válvulas de pie, flotador de nivel acoplado a tubería en hierro galvanizado de 3" mediante uniones dresser a la entrada del cuarto de maquinas, según se observe en vista al sitio de obra.

La tubería y accesorios son marca DICOL.
Las válvulas de pie marca Helbert o similar.

El trabajo será desarrollado en un tiempo estimado de tres días por medio de una cuadrilla hidráulica conformada por oficial y ayudante.

El Valor de los trabajos a realizar es de \$ 10.200.000 + IVA del 19%

La forma de pago es Anticipo del 50% y saldo a la entrega.

Atentamente,



OSCAR PINZON
GERENTE DE INGENIERIA



Bogotá DC., Junio 7 de 2023

Cotización 106-23

Señores **CONSORCIO MIA**
ATENCION **INGENIERA LUISA PROAÑOS**

Respetada Ingeniera

De acuerdo a su amable solicitud, estamos presentando la siguiente oferta comercial correspondiente al cambio de tubería de succión del equipo de bombeo para la Institución Educativa Alexander Flemming en la ciudad de Bogotá

Condiciones Comerciales

- Desmante de dos líneas de succión existente construida en PVC y en HG en un longitud de cada una de 10 metros lineales y accesorios en el mismo material.
- Suministro, Instalación, de 20 metros líneas de tubería en polipropileno clase PN 16 bajo el proceso de termofusión.
- Suministro, Instalación de accesorios en polipropileno tipo termofusión en diámetro de 3": 2 codos, 4 semicodos, 2 uniones y dos adaptadores macho.
- Suministro e instalación de dos válvulas de pie de 3" en bronce.
- Desmante e instalación de dos uniones tipo Dreser para empate entre tubería HG y Polipropileno.
- Llenado y puesta en marcha del sistema de bombeo una vez se realice el cambio de tubería

Suministro e instalación del sistema descrito	VALOR
PRECIO GLOBAL	\$ 9.500.000
SUB TOTAL OFERTA	\$ 9.500.000
IVA VIGENTE 19%	\$ 1.805.000
TOTAL OFERTA	\$ 11.305.000



Validez de la oferta

La presente oferta tiene una validez de quince (15) días a partir de la fecha presentación.

Ejecución y sitio de entrega.

ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS
DESMONTE TUBERIA	1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SUCCION	2
PUESTA EN MARCHA	1

CUATRO (4) días calendario a partir de la fecha de legalización de la orden de trabajo y recibido el respectivo anticipo.

Forma de pago

50% Como anticipo, con la orden de compra.

40% Entrega tubería instalada.

10% Entrega final

Atentamente,

Mauricio Amar Ospina

Gerente Comercial .

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.407/645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023
				FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARIQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS CARAS)	M	0,00

1. Equipo						
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
Herramienta Menor (% M.O)			5%	5.857,01	292,9	
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,000	4.500,0	
SUBTOTAL						4.792,9

2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cepillo De Alambre Grata 64 Pinceles Acero Truper 11559	un	0,1	12000	\$ 1.200,00
Lija Agua # 150 x Pliego	un	0,5	1200	\$ 600,00
SUBTOTAL				1.800

3. Transportes					
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
SUBTOTAL					-

4. Mano de Obra						
Trabajador		Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)		137.500	52,13%	209.179	0,0280	5.857,0
SUBTOTAL						5.857
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 12.449,86
AIU CONTRACTUAL	28,19%	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 3.509,62
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 15.959,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días, del mes de junio del año 2023

Firma: _____
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO
PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-20 - RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE
LIJADO Y LIMPIEZA)**

UNIDAD:M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA), de todas las estructuras metálicas existentes en cubierta.

EJECUCIÓN:

- Identificar elementos a limpiar y lijar
- Realizar montaje de andamios
- Limpiar con grata y lija la pintura de la estructura de manera que se realice el retiro de toda la pintura existente para su posterior repintado.

MATERIALES:

- Grata
- Lija

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en alturas

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro lineal (M) de RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA) recibidos a satisfacción por la interventoría.



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

**NP-20- RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE
LIJADO Y LIMPIEZA)**

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem debido a que es una actividad que antecede la pintura de mantenimiento de la estructura metálica y no esta contemplada dentro del presupuesto contractual.

***Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com***



**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645**

NP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Las lámparas 30 x 120 requieren para su instalación y para evitar pandeos de la misma, de ser instalada sobre un elemento que la soporte generando rigidez y estabilidad en el elemento, es decir un marco en algún elemento rígido, metálico o en aluminio.

**Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com**



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-21- SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120.

EJECUCIÓN:

- Establecer la ubicación del marco
- Realizar fijación de elementos de amarre
- Verificar niveles
- Amarrar el marco a los elementos de fijación verificando niveles y alturas
-

MATERIALES:

- MARCO LUMINARIAS 30X120
- ELEMENTOS DE FIJACION

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120 recibidos a satisfacción por la interventoría.

Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com

Bogotá, D.C, junio 29 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN BATERÍAS COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

Respetado señor(es):

En atención a la solicitud y compromisos establecidos en el acta de reunión que data del 10 de mayo del año en curso, esta interventoría se permite informar que, para la finalización del periodo de receso escolar de mitad de año, esto es el 9 de julio de 2023, se reitera la obligación de dar cumplimiento a la entrega formal y total de las siguientes actividades, a saber:

1. Intervención a la zona de las baterías sanitarias;

El CONSORCIO MIA GP debe intervenir en simultáneo dos (2) baterías sanitarias, es decir, dos (2) niveles del bloque, que son el primero y el tercer piso y entregarlas culminadas en su totalidad.

2. Suministro e instalación de las puertas de los ocho (8) salones que están siendo objeto de intervención en el tercer nivel.
3. Solución técnica a la ranura que quedó una vez se retiraron los rieles en el interior de los salones de clase.

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



En atención a lo anterior, esta interventoría ha realizado seguimiento constante en campo de las zonas referidas y a la fecha no se evidencia avance que propenda por el cumplimiento a tiempo de las actividades pactadas entre las partes, esto es antes del 9 de julio de 2023; fecha en la que se termina el receso escolar de mitad de año. Soporte de ello, se relaciona el siguiente registro fotográfico:



Ilustración 2 Baño nivel 3



Ilustración 1 Baño nivel 3



Ilustración 4 Baños piso 1

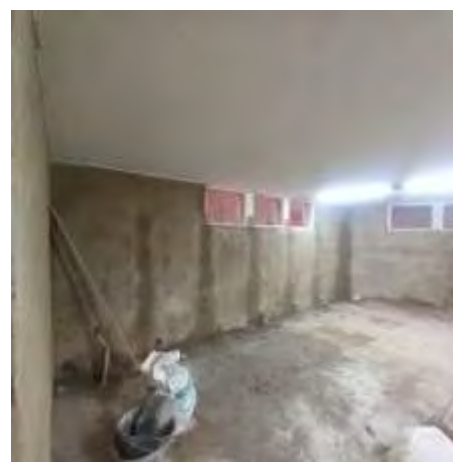


Ilustración 3 Baños piso 1

A la fecha está pendiente por iniciar con la ejecución de actividades de suministro e instalación de luminarias, ventanas, enchapes, pisos, mesones, orinales, sanitarios, puertas, divisiones en acero inoxidable, interruptores, estuco, pintura, entre otros. Esto genera inevitablemente una gran preocupación, ya que como Interventoría es nuestro deber propender por el cumplimiento de la ejecución de las actividades contratadas, dentro de los plazos acordados con los distintos involucrados.



Ahora y en caso en que no se logre el anhelado cumplimiento a estos compromisos en las fechas establecidas, claramente impediría el desarrollo normal y adecuado de las clases que corresponden al segundo (2º) semestre del año 2023, perjudicando significativamente a la comunidad estudiantil, ya que se puede llegar hasta la suspensión de las clases en toda la IED y muy seguramente harán corresponsable de este perjuicio al contratista de obra.

Bajo este panorama poco alentador, se CONMINA al CONSORCIP MIA GP, para que busque los mecanismos que terminen por garantizar el cumplimiento a todo lo pactado y advertido desde el pasado 11 de mayo de 2023 mediante comunicación 180, y así poder evitar inconvenientes como los que se mencionan en el parágrafo anterior.

Sin otro particular.

Cordialmente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Cinco (5) folios





CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>

TIG-MEM-180-SOLICITUDES Y COMPROMISOS EN RELACIÓN A COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

1 mensaje

CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>

11 de mayo de 2023, 7:37

Para: ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com>, OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>

Cc: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <Htibaquira@educacionbogota.gov.co>, ALEXANDER OSORIO PAEZ <Alosorio@educacionbogota.gov.co>, CRISTIAN LEONARDO CONTADOR ALONSO <clcontador@educacionbogota.gov.co>, CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>

Señores:

CONSORCIO MIA GP**Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR**

Representante legal

Bogotá D.C

Por medio de la presente adjuntamos comunicado: TIG-MEM-180-SOLICITUDES Y COMPROMISOS EN RELACIÓN A COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE

**TIG-MEM-180-SOLICITUDES Y COMPROMISOS EN RELACIÓN A COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE****A.pdf**

881K

Bogotá, D.C, mayo 11 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUDES Y COMPROMISOS EN RELACIÓN A COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

Respetados señores:

Dando alcance al correo electrónico remitido el 10 de mayo del 2023 a las 20:25, donde esta interventoría compartió el acta gestada durante la visita que realizó la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (en adelante SED) a la IED Reino de Holanda sede A el mismo 10 de mayo del 2023 y de la cual también anexamos copia a la presente misiva, el CONSORCIO TIG se permite relacionar las siguientes solicitudes y compromisos que quedaron pactados a la luz de la intervención a materializar en este frente, a saber:

Solicitudes:

1. Elaboración y entrega del esquema del planteamiento de la cubierta de la zona de circulación, donde actualmente existen los módulos de acrílico. Esto deberá involucrar la solución para el manejo de las aguas lluvia. Una vez se

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



cuenta con la aprobación de la propuesta por las demás partes, deberán proceder con la actualización del presupuesto del frente.

2. Elaboración y entrega de un presupuesto adicional de intervención, el cual involucre el siguiente alcance:
 - Reemplazo de la totalidad de la ventanería de la zona del auditorio por cuerpos similares a los que se están instalando en el 3 piso del bloque de intervención. Esto se concibe inicialmente en las áreas de los vanos existentes.
 - Reemplazo de la carpintería metálica (puertas y ventanas) del primer nivel donde se encuentra el auditorio.
 - Pintura sobre muro en la zona interna del cuarto piso. Para el acceso a esta zona hay unas rejas metálicas, que también deberán ser incluidas dentro del análisis. De paso se deberá chequear si dentro del alcance actual están incluida la impermeabilización total de la placa cubierta de esa área, o de lo contrario de debe contemplar.

Compromisos:

1. Se mantiene la iniciativa de intervenir la zona de las baterías sanitarias durante el periodo de receso estudiantil a mitad de año, el cual está previsto entre el 17 de junio y el 09 de julio de 2023. Durante este periodo el CONSORCIO MIA GP deberá intervenir en simultáneo dos (2) baterías sanitarias, es decir, dos (2) niveles del bloque, que serían el segundo y el tercer piso. Como el tiempo es bastante justo, se buscará a través de la SED que podamos contar con unos días de más, iniciando antes de esa fecha prevista, pero eso solo lo sabremos los próximos días y no supedita el cumplimiento del compromiso. No obstante, es obligación de la firma contratista iniciar con las gestiones a que haya lugar, a fin de que garanticemos que en esos veintitrés (23) días calendario se contará con la terminación y puesta en funcionamiento de estas baterías sanitarias. Por lo tanto, es imperante que desde hoy se inicie con el proceso de consecución de los materiales más relevantes, los cuales relacionamos a continuación:
 - Enchape de piso y pared.
 - Unidades sanitarias.
 - Mesones en policuarzo.
 - Divisiones metálicas en acero inoxidable.
 - Entre otros.
2. Durante el mismo periodo mencionado anteriormente, se deberá proceder con la instalación de las puertas de los ocho (8) salones que están siendo objeto de intervención en el tercer nivel. Como está indicado en el acta

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com



adjunta, el color está en proceso de definición, pero lo mismo no supedita su fabricación.

3. También es necesario buscar una solución técnica viable a la ranura que quedó una vez se retiraron los rieles en el interior de los salones de clase, ya que durante ese mismo periodo deberá quedar instalada y verificada.

Con todo lo anterior, instamos al CONSORCIO MIA GP para que despliegue una logística efectiva y se logre el cubrimiento de cada uno de los compromisos ya pactados, así como el cumplimiento de cada una de las solicitudes acá elevadas, para lo cual se le otorgará un plazo perentorio hasta el 15 de mayo de 2023.

Sin otro particular.

Cordialmente,


EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Un (1) folio



ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	10-05-2023	Inicio	04:00pm	Fin	05:00pm	Lugar	Colegio Reino de Holanda
Proyecto	Mantenimiento de colegio - Grupo B SED					Asunto			
Asistentes	Rectoría, Interventoría y SED					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	10-05-2023		Elaborado por	Interventoría - Ricardo Duarte				Próxima Reunión	

Se realiza visita por parte de la SED a la IED, donde se recultan los siguientes puntos sobre el recorrido:

1. Se revisaron las 4 aulas entregadas al colegio a la fecha.
2. Se deberá intervenir las bodegas de 2 pisos en simultaneo durante el tiempo de receso de mitad de año. La rectoría buscará que se otorgue el derecho de intervención antes del 15 de junio de 2023, con una diligencia propia de interna, pero requiere que para el momento de la renovación de clases solo se esté interviniendo un nivel.
3. El valor de las puestas a instalar en las aulas intervinientes queda a sujeta a definición.
4. El contratista de obra deberá elaborar presupuestalmente el costo de la ventanería del auditorio, conforme a las propuestas que nos suministre la SED. Se estima que sean iguales a las del 3 piso. También se deberá incluir dentro de este costo la pintura en muros del 4 piso y la carpintería ~~y~~ de los salones del 1 nivel del fondo, para mejorar la ventilación, con el mismo dueño que se viene implementando.


Ricardo Duarte - interventoría


Alexander Osorio


Ricardo Duarte


ALEXANDER OSORIO

SIG-IF-005
V.1

Bogotá, D.C, junio 30 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS MARRUECOS Y MOLINOS, ALFREDO IRIARTE, SANTA LUCIA, ALFREDO IRIARTE

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	José Caro.	1000685444	Ayudante	Marruecos y Molinos
2	Jorman Orozco	1047470156	Ayudante	Alfredo Iriarte
3	Tania Cuesta	1122626027	Ayudante	Santa Lucia



3	Oscar Páez	1032377206	Ayudante	Alfredo Iriarte
4	Carlos Franco	1022998075	Ayudante	San Agustín
5	Cleto García	6872382	Ayudante	San Agustín
6	Jefferson Hernadez	1033744995	Ayudante	San Agustín
7	Juan Arias	1031145584	Ayudante	San Agustín
8	Juan Mantilla	112038123	Ayudante	San Agustín
9	Ricard Guerrero	4274045	Ayudante	San Agustín

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE

Director de interventoría

CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Dalia Minerva Ambiental CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	91	21/06/2023	CC 1022998075	FRANCO CASTAÑEDA CARLOS	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F2269AF02C697B8C21776111FB042DB6

Certificado impreso el día 6/20/2023 12:37:03 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



CARLOS EDUARDO

FRANCO CASTAÑEDA

1022998075

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No de Radicacion

4010339220

Fecha de Radicación

2|0|0|6|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		A. Individual: ☐ B. Colectiva ☐		A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo documento de Identidad		8. Número del documento de Identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
FRANCO Primer apellido		CC		CASTAÑEDA Segundo apellido		CARLOS Primer nombre		EDUARDO Segundo nombre	
				1022998075		Femenino ☐ Masculino ☒		0 3 0 6 1 9 9 4	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
6		Tipo FINH Condición TIP					
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL				16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso base de cotización - IBC	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				PORVENIR		1160000	
18. Residencia							
CALLE 98 N 23 12 Dirección		67928810 Teléfono fijo		3054578748 Teléfono celular		Obras.ard@hotmail.com Correo electrónico	
BOGOTA D.C. Municipio/Distrito		zona Urbana ☒ Rural ☐		Localidad / comuna		BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido		Segundo apellido	
20. Tipo documento de identidad		21. Número documento identidad	
22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido		Segundo apellido	
Primer nombre		Segundo nombre	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
25. Tipo documento de identidad		26. Número de identidad	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		Condición	
				Tipo F N M		T P	
B1		B2		B3		B4	
B5							
32. Datos de residencia							
Municipio/Distrito		Zona		Departamento		Teléfono Fijo y/o celular	
		Urbana Rural					
B1		B2		B3		B4	
B5							
						33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)	

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP		VSCENTRO - BOGOTA	
B		-	
B		-	
B		-	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social		36. Tipo de identificación		37. Número de documento de Identificación		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		CC		13240346		01	
39. Ubicación		5801473 Teléfono		ALRODE73@HOTMAIL.COM Correo electrónico		ENVIGADO Municipio/distrito	
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección						ANTIOQUIA Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código:
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Femenino ☐ Masculino ☐	<input type="text"/>	2 0 0 6 2 0 2 3			
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="text"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

CARLOS EDUARDO FRANCO CASTAÑEDA CC 1022998075

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS EDUARDO FRANCO CASTAÑEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.022.998.075**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	90	21/06/2023	PT 6872382	GARCIA CLETO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F2269AF02C697B8C21776111FB042DB6

Certificado impreso el día 6/20/2023 12:32:07 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

CLETO LUCIDO

GARCIA

6872382

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor CLETO LUCIDO GARCIA identificado con PT 6872382 con fecha de ingreso 20 de junio de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 20 días del mes de junio de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) CLETO LUCIDO GARCIA identificado(a) con PT No. 6.872.382, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 20 de junio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	89	21/06/2023	CC 1033744995	HERNANDEZ JEFFERSON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F2269AF02C697B8C21776111FB042DB6

Certificado impreso el día 6/20/2023 12:29:20 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



**JEFFERSON
HERNANDEZ**

1033744995

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JEFFERSON HERNANDEZ identificado(a) con CC No. 1.033.744.995, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 20 de junio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



28211519

2023-06-20

Fecha de Radicación

20230620

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite

A. Afiliación

B. Reporte de Novedades

2. Tipo de Afiliación

A. Individual

B. Colectiva

3. Régimen

C. Contributivo

B. Subsidiado

4. Tipo de Afiliado

A. Cotizante

B. Cabeza de Familia

C. Beneficiario

5. Tipo de Cotizante

A. Dependiente

B. Independiente

C. Pensionado

Código (a registrar por la EPS)

01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

HERNANDEZ

Primer apellido

JEFFERSON

Primer nombre

Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad

CC

8. Número del documento de Identidad

1033744995

9. Sexo

Femenino

Masculino

10. Fecha de nacimiento

18051992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia

06

12. Discapacidad

Tipo

F

N

M

Condición

T

P

13. Puntaje SISBÉN

14. Grupo de población especial

00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL

POSITIVA S.A.

16. Administradora de Pensiones

004 / PROTECCION

17. Ingreso base de Cotización - IBC

1.160.000

18. Residencia

CARRERA 45 N 34 21

Dirección

3133138066

Teléfono fijo

3133138066

Teléfono Celular

jhernandez@hotmail.com

Correo electrónico

54001 / CUCUTA

Municipio/Distrito

Urbana

Rural

54 / NORTE DE SANTANDER

Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad

21. Número del documento de identidad

22. Sexo

Femenino

Masculino

23. fecha de Nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

B1

B2

B3

B4

B5

25. Tipo de documento de identidad

26. Numero del documento de identidad

27. Sexo

Femenino

Masculino

28. Fecha de nacimiento

B1

B2

B3

B4

B5

Datos complementarios

29. Parentescos

30. Etnia

31. Discapacidad

Tipo

F

N

M

Condición

T

P

B1

B2

B3

B4

B5

32. Datos de residencia

Zona

Urbana

Rural

Departamento

Telefonofijo y/o Celular

33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)

B1

B2

B3

B4

B5

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS

C

SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR

SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R

Código de la IPS (a registrar por la EPS)

30600433

30600437

B

B

B

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

36. Tipo de documento de identificación

CC

37. Número del documento de identificación

13240346

38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

01

39. Ubicación

CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA 5801473

Dirección

5801473

Teléfono

obras.joyavi@gmail.com

Correo electronico

LOS PATIOS

Municipio/Distrito

NORTE DE SANTANDER

Departamento

EPS-FT-144

Mod. May/2016

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación

☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación

☐ 3. Actualización del documento de identidad

☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios

☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS

Código

☐ 6. Reinscripción en la EPS

☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar

☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.

☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

☐ 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

13. Movilidad:

☐ A. Régimen Contributivo

☐ B. Régimen Subsidiado

☐ 14. Traslado:

☐ A. Mismo régimen

☐ B. Diferente régimen

☐ 15. Reporte de fallecimiento

☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante

☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado

☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo documento de Identidad

Número documento de Identidad

Sexo

Femenino

☐

Masculino

☐

Fecha de nacimiento

D

D

M

M

A

A

A

A

2

0

0

6

2

0

2

3

42. Fecha

43. EPS anterior

44. Motivo de traslado

45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

Código

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales

☒ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.

☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios

☒ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud

☒ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales

☒ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran

☒ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

☒ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

☒ 56. Anexo copia del documento de identidad:

CN

0

RC

0

TI

0

CC

1

PA

0

CE

0

CD

0

SC

0

Total

1

☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente

☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital

☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital

☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor

☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia

☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial

Código del municipio

Código del departamento

67. Datos del SISBÉN

Número de ficha

Puntaje

Nivel

68. Fecha de radicación

D

D

M

M

A

A

A

A

69. Fecha de validación

D

D

M

M

A

A

A

A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo documento de Identidad

Número documento de Identidad

71. Firma del funcionario

Observaciones:

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:

¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?

()

()

¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?

()

()

¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?

()

()

¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?

()

()

¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?

()

()

EPS-FT-144

Mod. May/2016

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 27/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	116	28/06/2023	CC 1000685444	CARO ZAMORA JOSE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

6B7216B85884A02A9BC08A206D3A2D24

Certificado impreso el día 6/27/2023 12:42:49 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



JOSE DAVID

CARO ZAMORA

1000685444

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No de Radicacion

4010339228

Fecha de Radicación

2/7/06/2/0/2/3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		A. Individual: ☐ B. Colectiva ☐		A. Contributivo ☒ B. Subsidado ☐	
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo documento de Identidad		8. Número del documento de Identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
CARO Primer apellido		CC		ZAMORA Segundo apellido		JOSE Primer nombre		DAVID Segundo nombre	
				1000685444		Femenino ☐ Masculino ☒		2/2/01/2/0/0/1	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
6		Tipo FINH Condición TIP					
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL				16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso base de cotización - IBC	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				PORVENIR		1160000	
18. Residencia							
AVENIDA 122 N 34 98 Dirección		67928810 Teléfono fijo		3054578748 Teléfono celular		Obras.ard@hotmail.com Correo electrónico	
BOGOTA D.C Municipio/Distrito		zona Urbana ☒ Rural ☐		Localidad / comuna		BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido		Segundo apellido	
20. Tipo documento de identidad		21. Número documento identidad	
22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido		Segundo apellido	
Primer nombre		Segundo nombre	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
25. Tipo documento de identidad		26. Número de identidad	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		Condición	
				Tipo F N M		T P	
B1		B2		B3		B4	
B5							
32. Datos de residencia							
Municipio/Distrito		Zona Urbana Rural		Departamento		Teléfono Fijo y/o celular	
B1		B2		B3		B4	
B5							
33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)							

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP		VSCENTRO - BOGOTA	
B		-	
B		-	
B		-	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social		36. Tipo de identificación		37. Número de documento de identificación		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		CC		13240346		01	
39. Ubicación		5801473 Teléfono		ALRODE73@HOTMAIL.COM Correo electrónico		ENVIGADO Municipio/distrito	
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección						ANTIOQUIA Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código:
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo		Fecha de nacimiento		42. Fecha	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Femenino ☐ Masculino ☐		<input type="text"/>		2/7/0 6 2 0 2 3	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="text"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JOSE DAVID CARO ZAMORA CC 1000685444

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación							
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE DAVID CARO ZAMORA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.685.444**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/06/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	92	21/06/2023	CC 1031145584	ARIAS HERNANDEZ JUAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F2269AF02C697B8C21776111FB042DB6

Certificado impreso el día 6/20/2023 12:38:14 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



JUAN CAMILO
ARIAS HERNANDEZ

1031145584

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No de Radicacion

4010339221

Fecha de Radicación

2|0|0|6|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite		2. Tipo afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		A. Individual: ☐ B. Colectiva ☐		A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		6. Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo documento de identidad		8. Número del documento de identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
ARIAS Primer apellido		CC		HERNANDEZ Segundo apellido		JUAN Primer nombre		CAMILO Segundo nombre	
				1031145584		Femenino ☐ Masculino ☒		1 4 0 4 1 9 9 3	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
6		Tipo FINH Condición TIP					
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL				16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso base de cotización - IBC	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				PORVENIR		1160000	
18. Residencia							
CARRERA 16 N 58A 31 Dirección		67928810 Teléfono fijo		3054578748 Teléfono celular		Obras.ard@hotmail.com Correo electrónico	
BOGOTA D.C Municipio/Distrito		zona Urbana ☒ Rural ☐		Localidad / comuna		BOGOTA D.C. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido		Segundo apellido	
20. Tipo documento de identidad		21. Número documento identidad	
22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido		Segundo apellido	
Primer nombre		Segundo nombre	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
25. Tipo documento de identidad		26. Número de identidad	
B1		B2	
B3		B4	
B5			
27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Femenino ☐ Masculino ☐			

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		Condición	
				Tipo F N M		T P	
B1		B2		B3		B4	
B5							
32. Datos de residencia							
Municipio/Distrito		Zona Urbana Rural		Departamento		Teléfono Fijo y/o celular	
B1		B2		B3		B4	
B5							
33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)							

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP		VSCENTRO - BOGOTA	
B		B	
B		B	
B		B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social		36. Tipo de identificación		37. Número de documento de identificación		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR		CC		13240346		01	
39. Ubicación		CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección		5801473 Teléfono		ALRODE73@HOTMAIL.COM Correo electrónico	
				ENVIGADO Municipio/distrito		ANTIOQUIA Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código:
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo		Fecha de nacimiento		42. Fecha	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Femenino ☐ Masculino ☐		<input type="text"/>		2 0 0 6 2 0 2 3	
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: <input type="text"/>		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JUAN CAMILO ARIAS HERNANDEZ CC 1031145584	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
Cantidad: Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio		67. Datos del SISBEN Número ficha		Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN CAMILO ARIAS HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.031.145.584**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	88	21/06/2023	CC 1120381239	MANTILLA SANPAYO JUAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F2269AF02C697B8C21776111FB042DB6

Certificado impreso el día 6/20/2023 12:27:52 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JUAN DAVID
MANTILLA SANPAYO
1120381239

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



28211518

2023-06-20

Fecha de Radicación

20230620

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite

A. Afiliación

B. Reporte de Novedades

☒

2. Tipo de Afiliación

A. Individual

B. Colectiva

C. Institucional

☒

3. Regimen

C. Contributivo

B. Subsidiado

☒

4. Tipo de Afiliado

A. Cotizante

B. Cabeza de Familia

C. Beneficiario

☒

5. Tipo de Cotizante

A. Dependiente

B. Independiente

C. Pensionado

☒

Código (a registrar por la EPS)

01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

MANTILLA

SANPAYO

JUAN

DAVID

7. Tipo documento de Identidad

CC

8. Número del documento de Identidad

1120381239

9. Sexo

Femenino

Masculino

☒

10. Fecha de nacimiento

17011997

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia

06

12. Discapacidad

Tipo

F

N

M

Condición

T

P

13. Puntaje SISBÉN

14. Grupo de población especial

00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL

POSITIVA S.A.

16. Administradora de Pensiones

004 / PROTECCION

17. Ingreso base de Cotización - IBC

1.160.000

18. Residencia

CALLE 21 N 23 33

3133138066

3133138066

juanmantilla@hotmail.com

54001 / CUCUTA

Urbana

54 / NORTE DE SANTANDER

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

20. Tipo de documento de identidad

21. Número del documento de identidad

22. Sexo

23. fecha de Nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

25. Tipo de documento de identidad

26. Numero del documento de identidad

27. Sexo

28. Fecha de nacimiento

Datos complementarios

29. Parentescos

30. Etnia

31. Discapacidad

32. Datos de residencia

33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS

Código de la IPS (a registrar por la EPS)

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social

36. Tipo de documento de identificación

37. Número del documento de identificación

38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

39. Ubicación

40. Correo electrónico

41. Municipio/Distrito

42. Departamento

EPS-FT-144

Mod. May/2016

EPS-FT-144

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN DAVID MANTILLA SANPAYO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.120.381.239**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Junio del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-05	2023-06	2119558760	9451881248	E	2023/06/02	2023/06/05	BANCO ITAU	3	\$26,738,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: ADMON (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$284,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$284,500				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$284,500				
9	CC	1018457992	GONIMA DIANA																	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	Si	\$284,500						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES							
EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	

Página 2 de 5

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COLEGIO OLAYA HERRERA (15 Afiliados)																							\$6,496,005	\$1,039,800			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005		\$452,700		\$0	\$0		\$2,013,700		
Centro de Trabajo: COLEGIO OLAYA HERRERA (15 Afiliados)																							\$6,496,005	\$1,039,800			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005		\$452,700		\$0	\$0		\$2,013,700		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							\$6,496,005	\$1,039,800			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005	\$260,600			\$6,496,005		\$452,700		\$0	\$0		\$2,013,700		
87	CC	6768943	BARAJAS LUIS		X															25-14	13	\$502,667	\$80,500	EPS008	13	\$502,667	\$20,200	CCF24	13	\$502,667	\$20,200	14-4	13	\$502,667	6.960%	\$35,000	13	\$0	\$0	Si	\$155,900			
88	CC	1028184319	CANDELO SAMIR	X																23030	14	\$541,334	\$86,700	EPS012	14	\$541,334	\$21,700	CCF24	14	\$541,334	\$21,700	14-4	14	\$541,334	6.960%	\$37,700	14	\$0	\$0	Si	\$167,800			
89	PT	6377064	GONZALEZ JESUS	X	X															23020	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$3,100	14-4	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000			
90	CC	79632384	LONDOÑO JAIME	X	X															23030	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100			
91	PT	7035136	MARQUEZ SANTIAGO																	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
92	CC	11799322	MORENO VICTORIANO		X															25-14	13	\$502,667	\$80,500	EPS002	13	\$502,667	\$20,200	CCF24	13	\$502,667	\$20,200	14-4	13	\$502,667	6.960%	\$35,000	13	\$0	\$0	Si	\$155,900			
93	CC	1072523890	PEREZ YEISON	X	X															23030	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100			
94	PT	5385179	PUERTA JOHNNY	X																23030	16	\$618,667	\$99,000	EPS037	16	\$618,667	\$24,800	CCF24	16	\$618,667	\$24,800	14-4	16	\$618,667	6.960%	\$43,100	16	\$0	\$0	Si	\$191,700			
95	CC	1078920581	REENTERIA YUBER	X	X															23030	9	\$348,000	\$55,700	EPS002	9	\$348,000	\$14,000	CCF24	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	6.960%	\$24,300	9	\$0	\$0	Si	\$108,000			
96	CC	79899646	ROZO RICARDO	X	X															23020	1	\$38,667	\$6,200	EPS008	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-4	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100			
97	CC	80721547	SANDOVAL ALEXANDER																	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
98	PT	6613255	URDANETA JONATAHAN	X																23030	11	\$425,334	\$68,100	EPSC34	11	\$425,334	\$17,100	CCF24	11	\$425,334	\$17,100	14-4	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000			
99	CC	19421071	VARGAS GUSTAVO	X																25-14	16	\$618,667	\$99,000	EPS008	16	\$618,667	\$24,800	CCF24	16	\$618,667	\$24,800	14-4	16	\$618,667	6.960%	\$43,100	16	\$0	\$0	Si	\$191,700			
100	CC	79960184	VILLANUEVA JOSE	X	X															23030	9	\$348,000	\$55,700	EPS008	9	\$348,000	\$14,000	CCF24	9	\$348,000	\$14,000	14-4	9	\$348,000	6.960%	\$24,300	9	\$0	\$0	Si	\$108,000			
101	PT	4881395	VILLARREAL EDGARDO	X	X															23030	2	\$77,334	\$12,400	EPSC34	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$3,100	14-4	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COLEGIO REINO HOLANDA (5 Afiliados)																							\$5,142,668	\$823,000			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668		\$358,200		\$0	\$0		\$1,592,800		
Centro de Trabajo: COLEGIO REINO HOLANDA (5 Afiliados)																							\$5,142,668	\$823,000			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668		\$358,200		\$0	\$0		\$1,592,800		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							\$5,142,668	\$823,000			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668	\$205,800			\$5,142,668		\$358,200		\$0	\$0		\$1,592,800		
102	CC	1050397472	ARIAS YOBER	X																23030	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF24	29	\$1,121,334	\$44,900	14-4	29	\$1,121,334	6.960%	\$78,100	29	\$0	\$0	Si	\$347,400			
103	PT	6971469	GUTIERREZ YERIMY																	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
104	CC	1121528070	LOPEZ SIMON	X																23030	14	\$541,334	\$86,700	EPS002	14	\$541,334	\$21,700	CCF24	14	\$541,334	\$21,700	14-4	14	\$541,334	6.960%	\$37,700	14	\$0	\$0	Si	\$167,800			
105	PT	7038443	MARQUEZ UBALDO																	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
106	CC	1027521715	QUIROGA JORGE																	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COLEGIO IRIARTE (1 Afiliados)																							\$425,334	\$68,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334		\$29,700		\$0	\$0		\$132,000		
Centro de Trabajo: COLEGIO IRIARTE (1 Afiliados)																							\$425,334	\$68,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334		\$29,700		\$0	\$0		\$132,000		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$425,334	\$68,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334	\$17,100			\$425,334		\$29,700		\$0	\$0		\$132,000		
107	CC	1006745641	LOPEZ ABAD	X																23020	11	\$425,334	\$68,100	EPS002	11	\$425,334	\$17,100	CCF24	11	\$425,334	\$17,100	14-4	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000			
Total Afiliados(107)																							\$85,105,350	\$13,618,300			\$87,502,684	\$3,502,700			\$87,502,684	\$3,502,700			\$87,502,684		\$6,020,500		\$0	\$0		\$26,644,200		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901402105	9	CASTANO CONSTRUCCIONES CONSCIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CR 23 B 67 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8909333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2119558760	9451881248	E	2023/06/02	2023/06/05	BANCO ITAU	3	\$26,738,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$13,618,300	\$47,800	\$0	\$13,666,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$940,400	\$3,300	\$0	\$943,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$1,645,900	\$5,800	\$0	\$1,651,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$6,583,600	\$23,100	\$0	\$6,606,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$4,448,400	\$15,600	\$0	\$4,464,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$6,020,500	\$21,100	\$0	\$6,041,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	107	\$6,020,500	\$21,100	\$0	\$6,041,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$3,502,700	\$12,300	\$0	\$3,515,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	107	\$3,502,700	\$12,300	\$0	\$3,515,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				107	\$3,502,700	\$13,100	\$0	\$3,515,800	
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$1,600	\$100	\$0	\$1,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$114,600	\$500	\$0	\$115,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$21,700	\$100	\$0	\$21,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$150,400	\$600	\$0	\$151,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$233,600	\$900	\$0	\$234,500	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$35,600	\$200	\$0	\$35,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$400	\$0	\$93,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$939,100	\$3,300	\$0	\$942,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$72,800	\$300	\$0	\$73,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$354,700	\$1,300	\$0	\$356,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$94,400	\$400	\$0	\$94,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	\$976,800	\$3,500	\$0	\$980,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$414,600	\$1,500	\$0	\$416,100	
TOTAL				107	\$26,644,200	\$94,300	\$0	\$26,738,500	

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/06/2023VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento:	NI	Número de documento:	13240346	Cédula Usuario:	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		Municipio:	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	93	21/06/2023	PT 4274045	GUERRERO CAMACHO RICHARD	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FRT5_v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F2269AF02C697B8C21776111FB042DB6

Certificado impreso el día 6/20/2023 12:40:07 PM por el portal de empresas Edesk

**Positiva Compañía de Seguros S.A.** • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia**El emprendimiento**
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



RICHARD
GUERRERO CAMACHO

4274045

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor RICHARD GUERRERO CAMACHO identificado con PT 4274045 con fecha de ingreso 20 de junio de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 20 días del mes de junio de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) RICHARD GUERRERO CAMACHO identificado(a) con PT No. 4.274.045, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 20 de junio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

Bogotá, D.C, julio 03 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.24

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.24, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.24:** 26/06/2023 al 02/07/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Siete (7) folios


Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com





		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA	3/07/2023			PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	RAFAEL URIBE URIBE								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022				CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645			
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES				PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES			
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023				FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
PRÓRROGA :	N/A				PRORROGA 1:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023			
PLAZO ACTUALIZADO:	364				PLAZO ACTUALIZADO:	333			
PLAZO TRANSCURRIDO:	180	EQUIVALE AL	49%		PLAZO TRANSCURRIDO:	163	EQUIVALE AL	49%	
VALOR INICIAL :	\$	878.587.938,00			VALOR INICIAL :	\$	11.941.262.150,00		
VALOR ADICION(ES):	\$	371.557.789,00			VALOR ADICION(ES):	\$	5.050.000.000,00		
VALOR ACTUALIZADO:	\$	1.250.145.727,00			VALOR ACTUALIZADO:	\$	16.991.262.150,00		
VALOR PAGADO:	\$	-			VALOR PAGADO:	\$	-		
VALOR POR PAGAR:	\$	1.250.145.727,00			VALOR POR PAGAR:	\$	16.991.262.150,00		
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ				INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.									
2. CONTROL DE HITOS.									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO				FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO		
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)				20/01/2023	20/01/2023	0		
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE				21/01/2023	6/05/2023	-105		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES				21/01/2023	3/03/2023	-41		
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II				21/01/2023	10/02/2023	-20		
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA				21/01/2023	21/02/2023	-31		
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA				21/01/2023	15/02/2023	-25		
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA				21/01/2023	21/02/2023	-31		
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA				21/01/2023	15/02/2023	-25		
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN				21/01/2023	10/02/2023	-20		
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR				29/07/2023		No iniciado		
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO				29/07/2023	26/06/2023	33		
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO				29/07/2023		No iniciado		
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO				27/02/2023	27/02/2023	0		
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ				29/07/2023	12/06/2023	47		
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL				29/07/2023		No iniciado		
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ				29/07/2023	22/05/2023	68		
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL				29/07/2023		No iniciado		
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO				29/07/2023		No iniciado		
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR				28/04/2023	28/04/2023	0		
19	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS				29/07/2023		No iniciado		
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A				29/07/2023	25/05/2023	65		
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM				3/04/2023	3/04/2023	0		
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A				29/07/2023		No iniciado		
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B				29/07/2023		No iniciado		
30	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo transcurrido del proyecto en días					163	DÍAS			
3. EJECUCIÓN POR FRENTES									
No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE			
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	\$ 354.706.368,00	\$ 100.491.614,00	28,33%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN			
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	\$ 298.698.658,00	\$ 145.213.022,36	48,62%	30/06/2023	EN EJECUCIÓN			
3	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	\$ 561.308.317,00	\$ -	0,00%		NO HA INICIADO			



		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		3/07/2023			PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
No.	NOMBRE DE LA IED		VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE		ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		\$ 825.556.509,00	\$ 209.673.530,84	25,40%	18/09/2023		EN EJECUCIÓN		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		\$ 516.187.772,00	\$ 13.822.367,00	2,68%			NO HA INICIADO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		\$ 924.714.131,00	\$ 295.874.793,89	32,00%	29/07/2023		EN EJECUCIÓN		
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		\$ 1.438.352.552,00	\$ 642.001.059,15	44,63%	18/08/2023		EN EJECUCIÓN		
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		\$ 332.100.486,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		\$ 408.412.332,00	\$ 189.674.492,48	46,44%	31/07/2023		EN EJECUCIÓN		
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ		\$ 852.757.422,00	\$ 101.037.896,00	11,85%			EN EJECUCIÓN		
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL		\$ 227.195.808,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ		\$ 671.327.930,00	\$ 138.066.273,00	20,57%			EN EJECUCIÓN		
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		\$ 1.069.620.410,00	\$ 427.925.233,69	40,01%	16/09/2023		EN EJECUCIÓN		
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		\$ 688.067.369,00	\$ 539.312.084,70	78,38%	12/07/2023		EN EJECUCIÓN		
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		\$ 498.001.754,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		\$ 1.381.489.250,00	\$ 787.740.343,25	57,02%	26/08/2023		EN EJECUCIÓN		
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		\$ 457.831.172,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		\$ 304.703.052,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		\$ 656.544.890,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		\$ 339.352.709,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
21	COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR		\$ 2.027.739.816,00	\$ 470.905.908,75	23,22%	28/11/2023		EN EJECUCIÓN		
22	COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS		\$ 455.893.410,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		\$ 335.852.053,00	\$ -	0,00%			NO HA INICIADO		
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		\$ 502.836.423,00	\$ 134.221.344,00	26,69%			EN EJECUCIÓN		
25	COLEGIO SANTA LUCÍA CAFAM		\$ 427.077.647,00	\$ 199.970.171,79	46,82%	16/06/2023		EN EJECUCIÓN		
26	EMERGENCIAS		\$ 862.485.928,00	\$ 143.635.741,07	16,65%	19/12/2023		EN EJECUCIÓN		
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL										
No.	NOMBRE DE LA IED		PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS			PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA				
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		Se instala la pergola y el bajante de aguas lluvias.			PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (3) personas Equipo: Un (1) mixer y herramienta menor				
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		Continúa actividad de pintura, Continúa actividad de demolición de enchape, Continúa actividad de pañete sobre muro, Continúa actividad de instalación de enchape. Continúa actividad de desmonte de puertas			PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios y herramienta menor				

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA					Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA		3/07/2023			PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
No.	NOMBRE DE LA IED		PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS					PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		Se continua la instalacón de acero en vigas y columnas,a la fecha no se ha fundido las vigas, aunque de tenia programado fundir el día martes 27/06/2023,se finalizo la demolición de alistado de piso en edificio #3. No se evidencia suficiente avance.					PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		Inicia actividad de desmonte de cubierta, Inicia actividad de desmonte de reja, Inicia actividad de desmonte de luminarias, Inicia actividad de instalacón de estructura metálica.					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura herramienta menor		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		Se termina de fundi las placas, se inicia la actividad de pintar las vigas aereas y se continua con la pintada de la placa plana, se termina de instalar las laminas del cielo raso de baños niñas primer piso y se desmonta las puertras de baños de niños segundo piso.					PERSONAL Profesional y técnico: Tres (3) personas - Rotativos Operativo: Siete (8) personas Equipo: volqueta y Herramienta menor		
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		Se instaló la cubierta en zona de serigrafia, se continua con la instalacón eléctrica, (tomacorrientes, interruptor, y lámparas) e instalacón de muro en superboard para las divisiones internas en serigrafia, aún no se ha intervenido el comedor por falta de materiales en obra.					PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor		
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		Se continua con la instalacion del enchape en los laboratorios de biologia y quimica, se instala el enchape en los muros y se funde las placas de los mesones.					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (5) personas Equipo: Herramienta menor		
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ		Se termina la excavacion en el parque infantil y se continua con relleno y la compactacion, en la caencha multiple se instala la tuberia pvc conduit y se comienza hacer el relleno					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Seis (5) personas Equipo: Herramienta menor		
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ		Continua actividad de demolición de alistado, Continúa la actividad de aplicacón de pintura en esmalte sobre cerchas existente, continúa actividad de instalacón de red eléctrica. Continua actividad de instalacón de cubierta tipo sándwich, Continua actividad de instalacón de platina sobre cerchas.					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor		
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		Continua la actividad de pintura sobre muros en las aulas, Continua actividad de instalacón de tubería hidráulica, Continua actividad de corte y regatas para instalacón de tubería, Inicia actividad de mampostería, Continua actividad de pañete y resane.					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor		
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		Se inicia la actividad de instalacion de piso en vinilo, y el desmonte de la teja del bloque 2 segundo piso y se comienza asi mismo con su instalacion.					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura		
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		Se finalizo la actividad de la instalacón de divisiones de baños en el tercer piso el día 29 de junio 2023, continua con la la instalacón de tubería EMT en salones,demolición total de enchape en baños del segundo piso,instalacón de pañete en muros de los baños,e instalacón de tubería sanitaria, se continua con la pintura en cerchas existentes en zona de pasillo y retiro de sobrantes.					PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Siete (7) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor		
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		Se continua con la la instalacón de piso en granito en areas de segundo nivel, se continua con las instalacón de estructura metálica en bloque E, se continua con la demolición de pisos existentes en aulas aprobados por la SED el día 22/06/2023.					PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: Siete (7) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor		
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		Continua el suministro de mortero impermeabilizado y endurecido con refuerzo de microfibra para la terraza. Continua con la actividad de retiro de manto asfáltico y la demolición de alistado.					PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor		
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		Se inician actividades de imperbealizacion de cubierta y pintura en las aulas.					PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativas Operativo: Tres (1) personas- Rotativo Equipo: Herramienta menor		
26	EMERGENCIAS		Se está a la espera del envío de la propuesta para la separacón de los sistemas de aguas residuales de las aguas industriales en la IED Gustavo Restrepo sede A.							
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA										
No.	INDICADORES				VALORES		PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.				\$ 6.271.215.014,63		36,91%		-9,60%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.				\$ 4.639.634.042,68		27,31%			

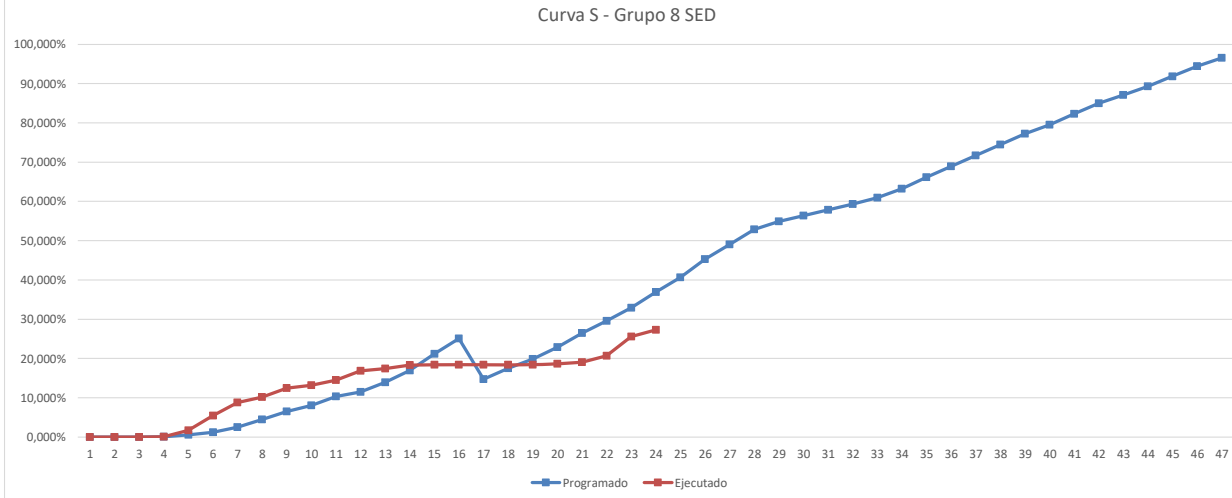		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública			
FECHA	3/07/2023			PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
<div><div>Curva S - Grupo 8 SED</div></div>									
6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS									
Hubo una disminución en el ritmo de avance que traía el CONSORCIO MIA GP en las últimas semanas, ya que para el presente periodo el atraso aumentó al 9,60%, a causa del ritmo bajo de ejecución en varios frentes de obra.									
7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA									
ACTIVIDAD					RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA		
IED Fe y Alegría - Envío de propuesta de implantación de la estructura metálica de los bloques E y D					Contratista de obra		20/06/2023 (Incumplido)		
IED Alexander Fleming sede B - Inicio de reemplazo de la tubería de succión por polipropileno					Contratista de obra		20/06/2023 (Cumplido el 27/06/23)		
IED Reino de Holanda sede A - Presentar propuesta de cubierta en policarbonato de la zona de circulación					Contratista de obra		29/06/2023 (Incumplido)		
Radicación del acta de recibo parcial No.5					Contratista de obra e Interventoría		26/06/2023		
Radicación de APU's no previstos							29/06/2023		
8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES									
* El 29 de junio de 2023 se radicó mediante correo electrónico los APU's no previstos comprendidos entre los consecutivos 09 al 21 para revisión de la Entidad Contratante.									
9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR									
Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:									
<p>Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.</p> <p>Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y se está a la espera de la entrega de su concepto técnico. Esto se sigue dilatando en el tiempo.</p> <p>Colegio Gustavo Restrepo sede A: Se inicia el proceso de atención de la emergencia, con el destaponamiento de la red sanitaria existente, la cual involucra aguas industriales provenientes de la cocina del restaurante escolar. Se habilita la funcionamiento del sistema y se está a la espera de la propuesta para individualizar las aguas residuales de las industriales.</p> <p>Al contratista de obra se le continúa reconociendo avances teóricos por suministros de materiales en obra, no obstante el avance materializado no es el esperado, ya que se siguen evidenciando atrasos. Esto, a pesar de realizar el análisis sobre la programación actualizada, la cual involucró el 100% de los frentes a ejecutar.</p>									
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL			REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE				
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE								

FECHA		3/07/2023		PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES								
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II								
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO								
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA								
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA								

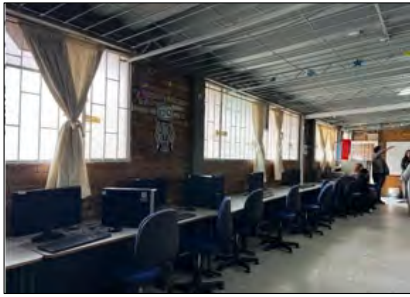FECHA		3/07/2023	PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO							
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	 						
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	 						
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA							
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA							

FECHA		3/07/2023		PERIODO No.	24	DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023
No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE					
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN								
21	COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR								
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A								
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM								


FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, D.C, julio 04 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: NOTIFICACIÓN VERBAL POR PARTE DE LA SED EN RELACIÓN A CIERTAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Respetado señor(es):

Como es de su conocimiento directo, el pasado 28 de junio de 2023, se llevó a cabo un ejercicio presencial en compañía de la SED, donde se buscó dirimir lo relacionado con el alcance teórico que se podría llegar a ejecutar en la IED Fe y Alegría y que claramente está supeditado a las delimitaciones finales que pueda entrar a establecer la Entidad Contratante. Esta introducción, con el fin de recordar que en ese momento se impartió directriz por parte de la SED, donde nos exhortan a que una vez resuelva la coyuntura que estamos atravesando por cuestiones relacionadas con el enchape de muros y con los mesones de los lavamanos, inmediatamente retomemos las obras con las actividades contractuales iniciales, lo que representaría claramente dejar de concebir para cobro los ítems no previstos NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM y los proyectados a hoy NP-14 y NP-16, que están en proceso de revisión por parte de la SED.

Dado lo anterior, le instamos para que desde ya procedan a verificar nuevamente los precios del mercado y puedan adquirir enchapes que se acomoden al precio contractual y lo mismo con los mesones en policuarzo, donde los tiempos de

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.

E-mail: consorciotig@gmail.com



fabricación de estos últimos se puedan acomodar a los tiempos de entrega previstos en cada frente.

Así las cosas, esta medida considerada por parte de la Entidad Contratante, entrará a regir en las sedes que tienen fecha prevista de entrega después del 31 de julio de 2023.

Sin otro particular.

Cordialmente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Sin folios



Bogotá, D.C, julio 04 de 2023

TIG-MEM-267

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE DESGLOSE DE ÍTEMS CONTRACTUALES SEGÚN OFERTA ECONÓMICA

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite solicitar de la manera más amable, el desglose de los ítems contractuales concebidos desde el área de estudios previos de la Entidad, con el fin de verificar el alcance de varias de las actividades que hacen parte de la propuesta económica ofrecida por parte del CONSORCIO MIA GP, que a nuestra consideración tienen ambigüedades en su descripción y hoy nos tienen en una serie de diferencias que representan importantes rubros financieros. Ahora y si bien existen unos APU's contractuales elaborados por parte del contratista de obra en su momento, deberá prevalecer la estructura con la cual la Entidad Contratante llegó a los valores unitarios que expuso a través del proceso que sacó a licitación.

Uno de los casos más importantes es el relacionado con el ítem 2.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA y el cual fue expuesto mediante comunicación TIG-MEM-210 que data del 24 de mayo de 2023, donde a la fecha todavía no contamos con una respuesta por parte de la SED.

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com



Agradecemos su diligencia con esta solicitud, con el fin de poder verificar como ya se mencionó anteriormente, el alcance de varias actividades y en los casos donde amerite, realizar los ajustes a los presupuestos en caso que exista posible duplicidad, entre otros.

Sin otro particular.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Sin folios



Bogotá, D.C, julio 04 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

Representante legal

Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 COLEGIOS EL LIBERTADOR SEDE C, RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Andrés Ortiz	1001043676	Ayudante	El libertador sede c
2	Michael Mondragón	1032374371	Ayudante	El libertador sede c
3	Jeferson Vargas	1003907928	Ayudante	Rafael delgado salguero sede A

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com



4	Juan Gómez	1023967457	Ayudante	Rafael delgado salguero sede A
5	Antonio Polo	72097594	Ayudante	colegio fé y alegría Palermo sur
6	Deimer Polo	1001874380	Ayudante	colegio fé y alegría Palermo sur
7	Sandra Pinzón	1024464486	Ayudante	colegio fé y alegría Palermo sur

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE

Director de interventoría

CONSORCIO TIG

Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe

Anexo. Documentación del personal

