

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** DIACO**FECHA INFORME:** Día 05. Mes Noviembre Año 2019.**CONTRATO N°** 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019.**CONTRATISTA:** **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS****VALOR DEL CONTRATO:** \$100.000.000**FORMA DE PAGO**

Pagos parciales de acuerdo a facturación, previo cumplimiento entrega de los documentos requeridos para pago, con corte el día 10 de cada mes y pagaderos 60 días después de la entrega del acta a recibo a satisfacción.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes Mayo Año 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:**

Mantenimiento plantas eléctricas Cummins

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Póliza de Seguros No: 11-44-101138289 Seguros del Estado S.A
Cumplimiento: del 20-05-19 hasta 31-07-20
Calidad del servicio: 31-10-19 al 31-10-20
Salarios y prestaciones sociales:
20-05-19 al 31-10-2022

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de Mayo de 2019 hasta el 31 de Octubre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 74.65%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 24.12%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 75.88%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: 74.65%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante la presente supervisión se realizaron las siguientes actividades:

RIOHACHA

De acuerdo a una novedad con el Breaker principal del generador del sitio, se realizó la solicitud a la empresa contratista y así solventar la novedad presentada.

Una vez se trató de instalar el equipo en el sistema, aparece falla de alto voltaje en el panel de control y hace que el generador se apague por protección. Una vez se realiza el caza fallas de la falla, se encuentra que la tarjeta encargada de regular el voltaje de salida del generador se encuentra con problemas, el contratista envía la cotización de la tarjeta (documento adjunto). Se autoriza el suministro de la tarjeta controladora de voltaje al sitio y así solventar la novedad, esta es instalada y puesta a prueba por 8 horas y no presento fallas durante la prueba.

Una vez se trató de poner el sistema en línea se encontró que el generador no prendió en varios intentos. Se comunicó con el contratista y se solicitó la asistencia técnica para verificar esta novedad. Una vez se encontró la novedad se determinó que la falla de que no encendiese, es por un puente rectificador de diodos en la tarjeta, que hace que el voltaje generado por el alternador no se detecte en el panel y por tanto no permite que el sistema funcione.

El contratista realiza la instalación del puente de diodos en el generador y se procede a encender el generador. Se realizan las pruebas de operación, adicional se instala una batería para la planta que por tiempo de operación se requiere su cambio antes que deje de funcionar.

SAN ANDRES

Se solicita la asistencia del personal contratista el 28 de diciembre para realizar el mantenimiento a las plantas del sitio radar, sin embargo para la fecha en la que se realizó el ingreso al sitio, la planta que se encontraba necesitada por el mantenimiento de 2000hrs llevaba poco tiempo en línea y no se podía esperar más tiempo ya que el contrato finalizaría el 31 de Octubre de 2019 y se requería la presencia en Riohacha para la novedad del equipo que se encontraba fuera de servicio.

Se instalan las baterías de cada uno de los generadores del sitio por tiempo de operación de las que se encontraban a punto de llegar a su vida útil.

De acuerdo a los informes anteriores se solicita al contratista que este realizase las tareas de mantenimiento que quedaron pendientes en visitas anteriores a lo que solo realizo la limpieza de los tanques de combustible de cada uno de los sitios radar en los que se hizo este mes Riohacha y San Andrés (01 Tanque).

Al no realizarse todas las tareas asignadas durante la vigencia actual, se realizara la modificación del contrato por una reducción del contrato en \$25.345.350.00. Los trabajos realizados a la fecha incluidas las actividades del mes de octubre tienen un total de \$74.654.650.00.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Radicación de facturación
- Liquidación

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: **X** _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T4 VARGAS CHINCHILLA JHON

FIRMA: _____

C.C. No. 74.358.010. Samacá.

DEPENDENCIA: JETIC – DIACO



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

Bogota, octubre 09 de 2019

Señores
COFAC
Ciudad

				COTIZACION HHS-1921			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	IVA 19%	Valor Unitario Total (incluido IVA)	V/TOTAL
1	SUMINISTRO BREAKER DE 630 AMP MARCA ELECTROMEC EATON EKCM5 PARA LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS DE RIOHACHA	UNIDAD	1	\$ 3,150,000.00	\$ 598,500.00	\$ 3,748,500.00	\$ 3,748,500.00
2	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BREAKER DE 630 AMP EN SITIO(CON SUMINISTRO DE LOS TERMINALES ELECTRICOS PARA PONCHAR, FIJACION DEL BREAKER, Y CONEXIONES ELECTRICAS)	UNIDAD	1	\$ 1,250,000.00	\$ 237,500.00	\$ 1,487,500.00	\$ 1,487,500.00
SON: CINCO MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.,						TOTAL	\$ 5,236,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
PLAZO DE EJECUCION	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
VALIDEZ DE LA OFERTA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.001860014990 A NOMBRE DE HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
TIEMPO DE ENTREGA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
SITIO DE ENTREGA	RIOHACHA

En nombre de HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS quiero expresar mis agradecimientos por conciderarnos una alternativa de solucion.

Agradezco la atención a la presente.



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

Bogota, Noviembre 04 de 2019

Señores
COFAC
Ciudad

COTIZACION HHS-1922

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	IVA 19%	Valor Unitario Total (incluido IVA)	V/TOTAL
	PLANTA ELECTRICA CUMMINS SAN ANDRES						
1	SUMINISTRO DE ARRANQUE 12V PARA PLANTA ELECTRICA CUMMINS EN SAN ANDRES	UNIDAD	1	\$ 2.650.000,00	\$ 503.500,00	\$ 3.153.500,00	\$ 3.153.500,00
2	ENVIO, TRANSPORTES Y ENBALAJE	UNIDAD	1	\$ 600.000,00	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00	\$ 714.000,00
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.,						TOTAL	\$ 3.867.500,00

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
PLAZO DE EJECUCION	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
VALIDEZ DE LA OFERTA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.001860014990 A NOMBRE DE HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
TIEMPO DE ENTREGA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
SITIO DE ENTREGA	COFAC

En nombre de HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS quiero expresar mis agradecimientos por conciderarnos una alternativa de solucion.

Agradezco la atención a la presente.



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

Bogota, Noviembre 04 de 2019

Señores
COFAC
Ciudad

COTIZACION HHS-1928

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	IVA 19%	Valor Unitario Total (incluido IVA)	V/TOTAL
	PLANTA ELECTRICA CUMMINS RIOHACHA						
1	INSTALACION TARJETA AVR SX-460	UNIDAD	1	\$ 1.250.000,00	\$ 237.500,00	\$ 1.487.500,00	\$ 1.487.500,00
2	BATERIA 4D	UNIDAD	1	\$ 950.000,00	\$ 180.500,00	\$ 1.130.500,00	\$ 1.130.500,00
3	TRANSPORTE Y VIATICOS RIOHACHA	UNIDAD	1	\$ 1.500.000,00	\$ 285.000,00	\$ 1.785.000,00	\$ 1.785.000,00
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE,.						TOTAL	\$ 4.403.000,00

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
PLAZO DE EJECUCION	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
VALIDEZ DE LA OFERTA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.001860014990 A NOMBRE DE HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
TIEMPO DE ENTREGA	2 DIAS
SITIO DE ENTREGA	RIOHACHA

En nombre de HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS quiero expresar mis agradecimientos por conciderarnos una alternativa de solucion.

Agradezco la atención a la presente.



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.1

FECHA: 01-11-2019	CIUDAD: RIOHACHA	UNIDAD: RADAIZ	ORDEN-HHS-No.
MARCA: CUMMINS ONAN	GENERADOR MARCA / MODELO: STAMFORD		
POTENCIA: 135 KVA	SERIE PLANTA: DS AC-997031		
PLANTA ELECTRICA / MODELO:	SERIE MOTOR: 73026946		
MOTOR MARCA / MODELO: CUMMINS QSB7-63	SERIE GENERADOR: 1090030351		

MOTOR	N	R	M	C
Nivel de aceite	X			
Estado del aceite	X			
Cambio de aceite	X			
Sellos y empaques	X			
Aletas de refrigeracion	X			
Nivel de refrigeracion	X			
Cambio de refrigerante	X			
Radiador	X			
Mangueras	X			
Abrazaderas	X			
Arranque electrico	X			
Arranque normal	X			
Bateria	X			
Autostart	X			
Filtro de aceite	X			
Filtro de combustible	X			
Filtro de aire	X			
Marqueras	X			
Carburador	X			
Llaves y selenoides	X			
Gases de escape	X			
Correas	X			
Tornillos	X			

N: NORMAL

R: REGULAR

M: MALO

C: CAMBIO

GENERADOR	N	R	M	C
Generador	X			
Cables	X			
Breaker	X			
Tomas	X			
A.V.R	X			
Terminales	X			
Tablero de control	X			

LIMPIEZA

	N	R	M	C
CUARTO	X			
PLANTA	X			

LECTURA DE INSTRUMENTOS

Voltaje AC	210 V.
Voltaje DC	14 V.
Horas	33.769. 21 minutos
Frecuencia	60 Hz
Breaker planta	

FASES

VOLTAJE	
F1-N	121 V
F1-F2	210 V
F2-N	121 V
F1-F2	209 V
F3-N	121 V
F2-F3	210 V

MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN LA PLANTA ELECTRICA:

Se Instaló y cambió tarjeta Reguladora

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

PRENDER LA PLANTA CADA 8 DIAS DURANTE 5 MINUTOS



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.2

FECHA: 01-11-2019

CIUDAD: RIOTACHA

UNIDAD: TADOR

ORDEN-HHS-No.

TRANSFERENCIA

	N	R	M	C
Manual				
Automatica				
Tarjeta de transferencia				
Temporizadores				
Minibreakers				
Selector 1				
Selector 2				
Autostart				
Contactores				
Capacidad en AC3				
Enclavamiento Mecanico				
Gabinete				

Marca Trasferencia

CARGA

Fase 1	251 Amp.
Fase 2	248 Amp.
Fase 3	251 Amp.
Voltaje F1 - F2	210 V
Voltaje F2 - F3	209 V
Voltaje F1 - F3	210 V
Voltaje F1 - Neutro	121 V

N: NORMAL

R: REGULAR

M: MALO

C: CAMBIO

MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Carlos
APELLIDO: Camacho
GRADO: T2
No. CEDULA: 1065862323
No. PLACA:
CELULAR #: 3102555844

FIRMA - USUARIO

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Jorge Luis
APELLIDOS: GAMBA P-
No. CEDULA: 79499482
CELULAR: 3202162666

Jorge Gamba

FIRMA - TECNICO



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.3


FECHA: 01-11-2019

CIUDAD: RIOHACHA

UNIDAD: RADAR

ORDEN-HHS-No.

DIAGRAMA UNIFILAR

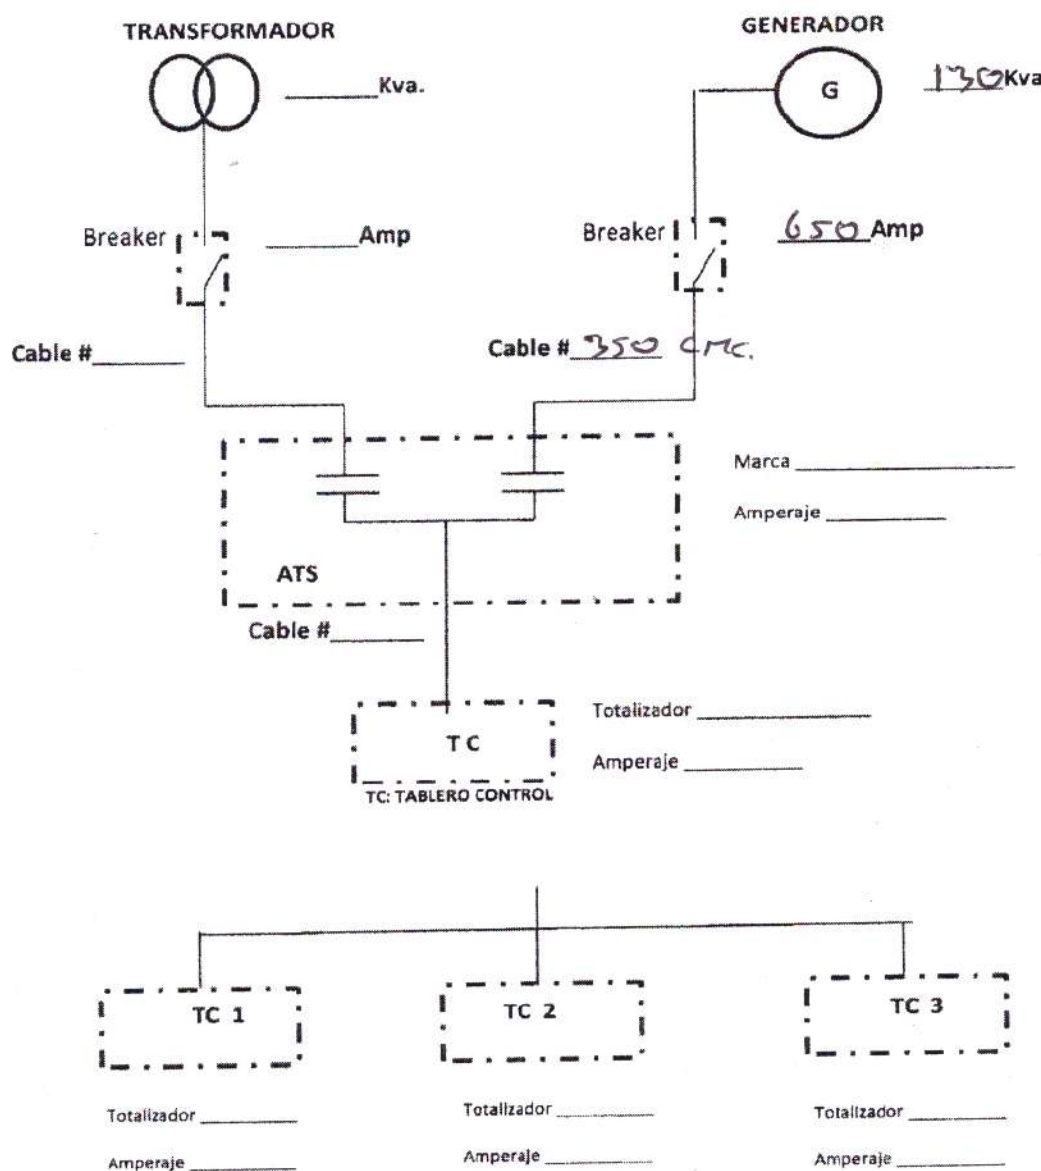

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.4

FECHA: 01-11-2019 CIUDAD: IZQUIERDA UNIDAD: IZQUIERDA ORDEN-HHS-No.

REPORTE DE CAPACITACION

TEMARIO:

PROTOCOLO DEL FUNCIONAMIENTO OK
ALIMENTACION, PROTECCIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED ELECTRICA OK
EQUIPO, FALLAS Y PRUEBA CON NORMALIZACION DEL EQUIPO EN GENERAL OK
OPERACION MANUAL Y AUTOMATICA OK
CUIDADOS PUNTOS DE VERIFICACION Y FRECUENCIA DE LA MISMA OK

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA No.

GRADO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Carlos
APELLIDO: GARCIA
GRADO: T2
No. CEDULA: 1065862323
No. PLACA:
CELULAR #: 310255844

FIRMA - USUARIO

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Jorge Luis
APELLIDOS: GARCIA P.
No. CEDULA: 79.499.487
CELULAR: 3202162666

FIRMA - TECNICO



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.5

FECHA: 01-11-2019 CIUDAD: RIOHACHA UNIDAD: IZADAR ORDEN-HHS-No.

REPORTE DE TRABAJO

ANTECEDENTES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

La planta presenta falla en la generación.

TRABAJO REALIZADO

Se procede a verificar el equipo, se encuentra que no genera, se procede a instalar una nueva tarjeta reguladora se cablea y se hacen pruebas operacionales.

Nota: la planta queda operativa

Se deja en las instalaciones la tarjeta que se desmontó con la persona que nos atendió

RECOMENDACIONES

PRENDER LA PLANTA ELECTRICA CADA 8 DIAS
DURANTE 5 MINUTOS

RECIBIDO POR:

NOMBRE: T2 Carlos
APELLIDO: Camacho
GRADO: T2.
No. CEDULA: 106586323
No. PLACA:
CELULAR #: 310255844




FIRMA - USUARIO




ENTREGADO POR:

NOMBRE: JORGE LUIS
APELLIDOS: GAMBA P.
No. CEDULA: 79.499487
CELULAR: 3202162866

Jorge Gamboa
FIRMA - TECNICO

FOTOS RIOHACHA

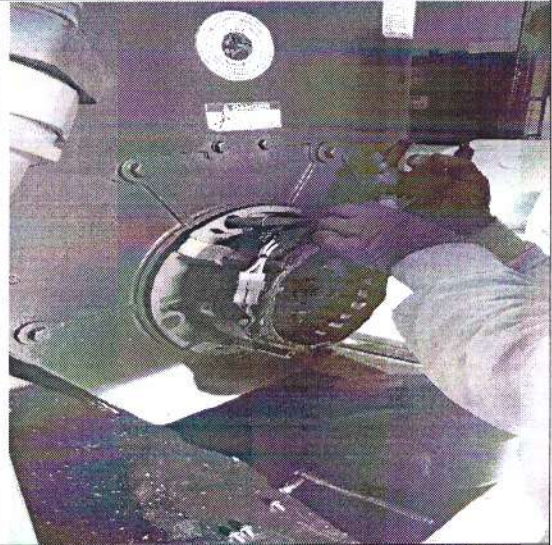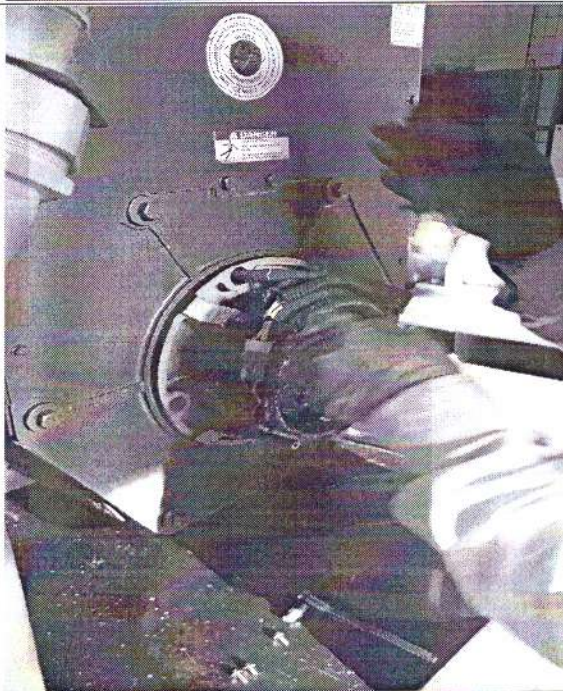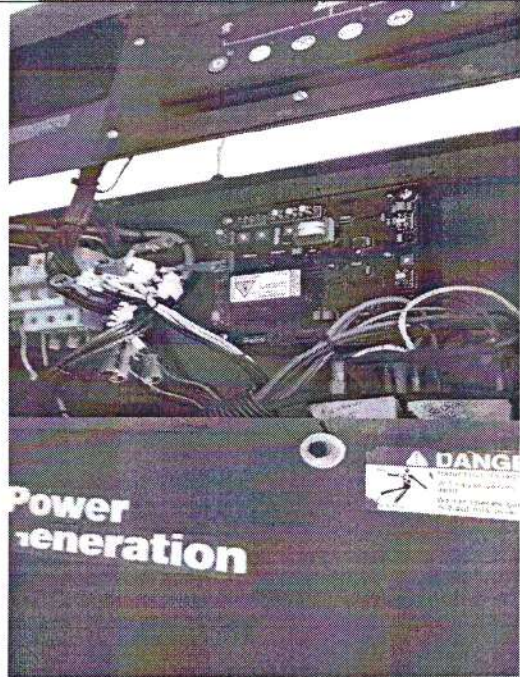

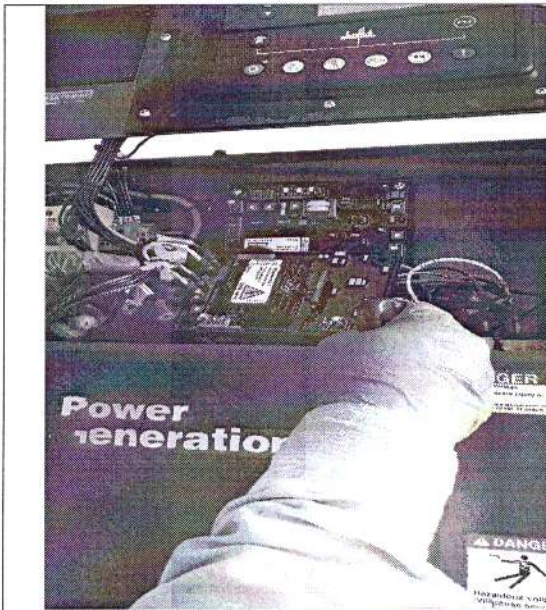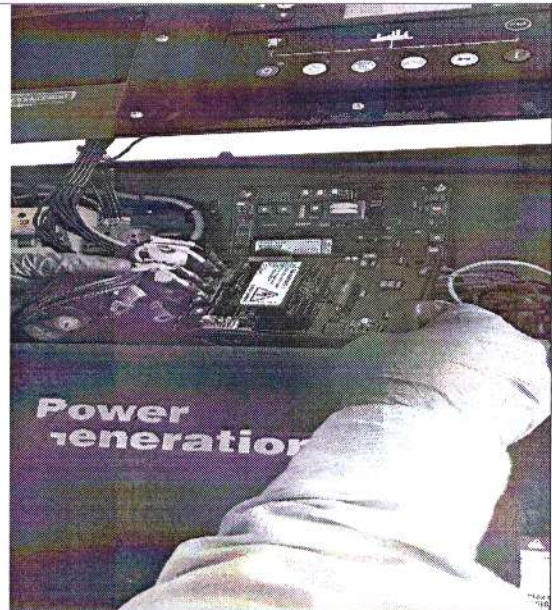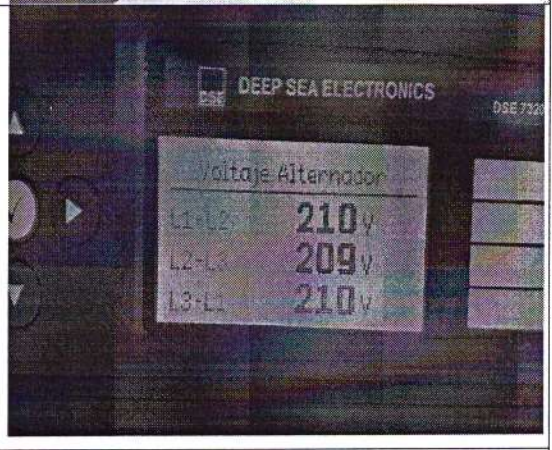



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.1

FECHA: 28-10-19	CIUDAD: Riohacha	UNIDAD: Radar	ORDEN-HHS-No.
MARCA: Cummins Onan.	GENERADOR MARCA / MODELO: Stamford D58AC-997035		
POTENCIA: 135 KVA.	SERIE PLANTA:		
PLANTA ELECTRICA / MODELO:	SERIE MOTOR: 73026946		
MOTOR MARCA / MODELO: Cummins Q5B7-23	SERIE GENERADOR: 1090030351		

MOTOR				
	N	R	M	C
Nivel de aceite	X			
Estado del aceite	X			
Cambio de aceite	X			
Sellos y empaques	X			
Aletas de refrigeracion	X			
Nivel de refrigeracion	X			
Cambio de refrigerante	X			
Radiador	X			
Mangueras	X			
Abrazaderas	X			
Arranque electrico	X			
Arranque normal	X			
Bateria	X			
Autostart	X			
Filtro de aceite	X			
Filtro de combustible	X			
Filtro de aire	X			
Marqueras	X			
Carburador	-	-	-	-
Llaves y selenoides	X			
Gases de escape	X			
Correas	X			
Tornillos	X			

N: NORMAL
R: REGULAR
M: MALO
C: CAMBIO

GENERADOR				
	N	R	M	C
Generador	X			
Cables	X			
Breaker	X			
Tomas	X			
A.V.R	X			
Terminales	X			
Tablero de control	X			

LIMPIEZA				
	N	R	M	C
CUARTO	X			
PLANTA	X			

LECTURA DE INSTRUMENTOS	
Voltaje AC	215 V.
Voltaje DC	23 V.
Horas	33.750.47
Frecuencia	60 Hz
Breaker planta	OK

FASES	
VOLTAJE	
F1-N	117 V
F1-F2	205 V
F2-N	117 V
F1-F2	205 V
F3-N	117 V
F2-F3	205 V

MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN LA PLANTA ELECTRICA:

Reguladora de voltaje, Diodos Breaker, Bateria 40.
Analisis del combustible del tanque.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Prender la planta cada 8 dias durante 5 minutos



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.2

FECHA: 28-10-19 CIUDAD: Rvobacha UNIDAD: Radar ORDEN-HHS-No.

TRANSFERENCIA

	N	R	M	C
Manual				
Automatica				
Tarjeta de transferencia				
Temporizadores				
Minibreakers				
Selector 1				
Selector 2				
Autostart				
Contactores				
Capacidad en AC3				
Enclavamiento Mecanico				
Gabinete				

Marca Trasferencia

CARGA

Fase 1	270 Amp
Fase 2	270 Amp
Fase 3	272 Amp
Voltaje F1 - F2	204 V
Voltaje F2 - F3	204 V
Voltaje F1 - F3	204 V
Voltaje F1 - Neutro	118 V

N: NORMAL

R: REGULAR

M: MALO

C: CAMBIO

MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Carlos M. Gons V.
APELLIDO: Gons Vasquez
GRADO: Tecnico Segundo
No. CEDULA: 106586323
No. PLACA:
CELULAR #: 310255844

FIRMA - USUARIO

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Jorge Luis
APELLIDOS: Gamboa Pineros
No. CEDULA: 794994187 B1a.
CELULAR: 320 216 26 66

FIRMA - TECNICO



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.3


FECHA: 28-10-19

CIUDAD: Pto. Macha

UNIDAD: Pto. Macha

ORDEN-HHS-No.

DIAGRAMA UNIFILAR

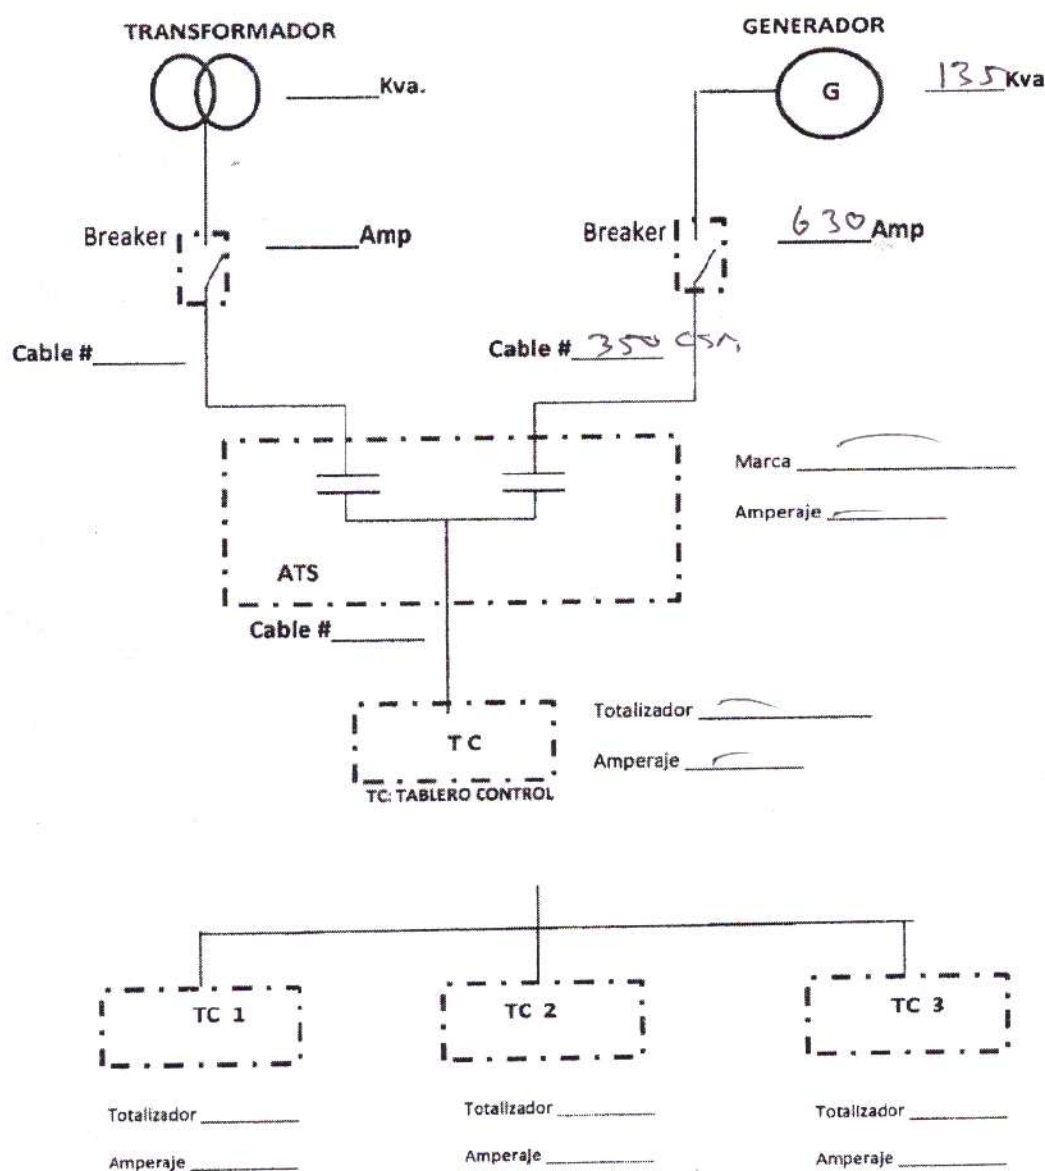

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO			HOJA No.4
FECHA: 28-10-19	CIUDAD: Prohacha	UNIDAD: Radar	ORDEN-HHS-No.
REPORTE DE CAPACITACION			
TEMARIO:			
PROTOCOLO DEL FUNCIONAMIENTO			x
ALIMENTACION, PROTECCIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED ELECTRICA			x
EQUIPO, FALLAS Y PRUEBA CON NORMALIZACION DEL EQUIPO EN GENERAL			x
OPERACION MANUAL Y AUTOMATICA			x
CUIDADOS PUNTOS DE VERIFICACION Y FRECUENCIA DE LA MISMA			x
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No.	GRADO	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	
NOMBRE:	Carlos Mario	NOMBRE:	Jorge Luis
APELLIDO:	Carretero	APELLIDOS:	Ramirez Pineda
GRADO:	Tecnico Segundo	No. CEDULA:	79499487 B1a1
No. CEDULA:	145862323	CELULAR:	320 216 2666
No. PLACA:			
CELULAR #:	3102555844		
FIRMA - USUARIO		FIRMA - TECNICO	



H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

REPORTE TECNICO

HOJA No.5

FECHA: 28-10-19 CIUDAD: Prokacha UNIDAD: Radar. ORDEN-HHS-No.

REPORTE DE TRABAJO

ANTECEDENTES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Presenta recalentamiento en el breaker, se encuentra reguladora quemada y cambiar diodos

TRABAJO REALIZADO

Se hace cambio del breaker, se cambian los diodos, se cambia la tarjeta reguladora, se deja batería 40. Se le hace análisis al combustible y al tanque. Se hace limpieza del cuerto. Se hacen pruebas de funcionamiento. La planta queda operativa.

RECOMENDACIONES

prender la planta cada 8 dias durante 5 minutos

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Carlos Nario
APELLIDO: Carras Viquez
GRADO: Tecnico Segundo
No. CEDULA: 101586323
No. PLACA:
CELULAR #: 3102555844



FIRMA - USUARIO

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Jorge Luis
APELLIDOS: Ramba Pineda
No. CEDULA: 79'499.287
CELULAR: 320 2162666

FIRMA - TECNICO

FOTOS RIOHACHA

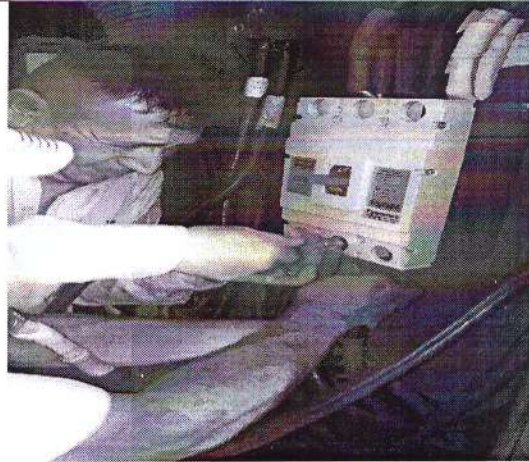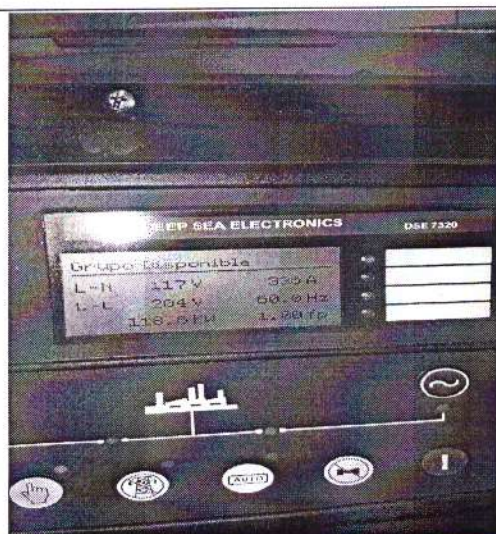





NKH ELECTRONICA SAS

NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO

HOJA No.1

FECHA: 30-10-19	CIUDAD: SAN ANDRES	UNIDAD: RADAR	ORDEN-HHS-No.
MARCA: Cummins Onan	GENERADOR MARCA / MODELO: Stamford DSEA4C-1328103		
POTENCIA: 135 KVA	SERIE PLANTA:		
PLANTA ELECTRICA / MODELO:	SERIE MOTOR: 73533196		
MOTOR MARCA / MODELO: Cummins QSB7-ES.	SERIE GENERADOR: F130513924		

MOTOR				
	N	R	M	C
Nivel de aceite	X			
Estado del aceite	X			
Cambio de aceite	X			
Sellos y empaques	X			
Aletas de refrigeracion	X			
Nivel de refrigeracion	X			
Cambio de refrigerante	X			
Radiador	X			
Mangueras	X			
Abrazaderas	X			
Arranque electrico	X			
Arranque normal	X			
Bateria	X			
Autostart	X			
Filtro de aceite	X			
Filtro de combustible	X			
Filtro de aire	X			
Marqueras	X			
Carburador	X			
Llaves y selenoides	X			
Gases de escape	X			
Correas	X			
Tornillos	X			
N: NORMAL				
R: REGULAR				
M: MALO				
C: CAMBIO				

GENERADOR				
	N	R	M	C
Generador	X			
Cables	X			
Breaker	X			
Tomas	X			
A.V.R	X			
Terminales	X			
Tablero de control	X			

LIMPIEZA				
	N	R	M	C
CUARTO	X			
PLANTA	X			

LECTURA DE INSTRUMENTOS	
Voltaje AC	202 V
Voltaje DC	14 V.
Horas	1.468 - 16 minutes
Frecuencia	60 HZ
Breaker planta	

FASES	
VOLTAJE	
F1-N	116 V.
F1-F2	202 V
F2-N	116 V
F1-F2	202 V
F3-N	116 V
F2-F3	202 V

MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN LA PLANTA ELECTRICA:

Filtros de aire, aceite, acpm, aceite en garrapa, y 2 baterias 40.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Prender la planta cada 8 dias durante 5 minutos



NKH ELECTRONICA SAS
NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO

HOJA No.2

FECHA: 30-10-19 CIUDAD: SAN ANDRES UNIDAD: Radar ORDEN-HHS-No.

TRANSFERENCIA

	N	R	M	C
Manual				
Automatica				
Tarjeta de transferencia				
Temporizadores				
Minibreakers				
Selector 1				
Selector 2				
Autostart				
Contactores				
Capacidad en AC3				
Enclavamiento Mecanico				
Gabinete				

Marca Trasferencia

CARGA

Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Voltaje F1 - F2	
Voltaje F2 - F3	
Voltaje F1 - F3	
Voltaje F1 - Neutro	

N: NORMAL

R: REGULAR

M: MALO

C: CAMBIO

MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Javier Fernando
APELLIDO: Ortiz Vergel
GRADO: Tecnico Cuarto
No. CEDULA: 1026577039
No. PLACA: N/A
CELULAR #: 3153577261

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Jorge Luis
APELLIDOS: Ramba Pineros
No. CEDULA: 79'499 487 B7d.
CELULAR: 320 2162666

FIRMA - USUARIO

FIRMA - TECNICO



NKH ELECTRONICA SAS

NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO

HOJA No.3


FECHA: 30-10-19

CIUDAD: SAN ANDRES

UNIDAD: RADAR.

ORDEN-HHS-No.

DIAGRAMA UNIFILAR

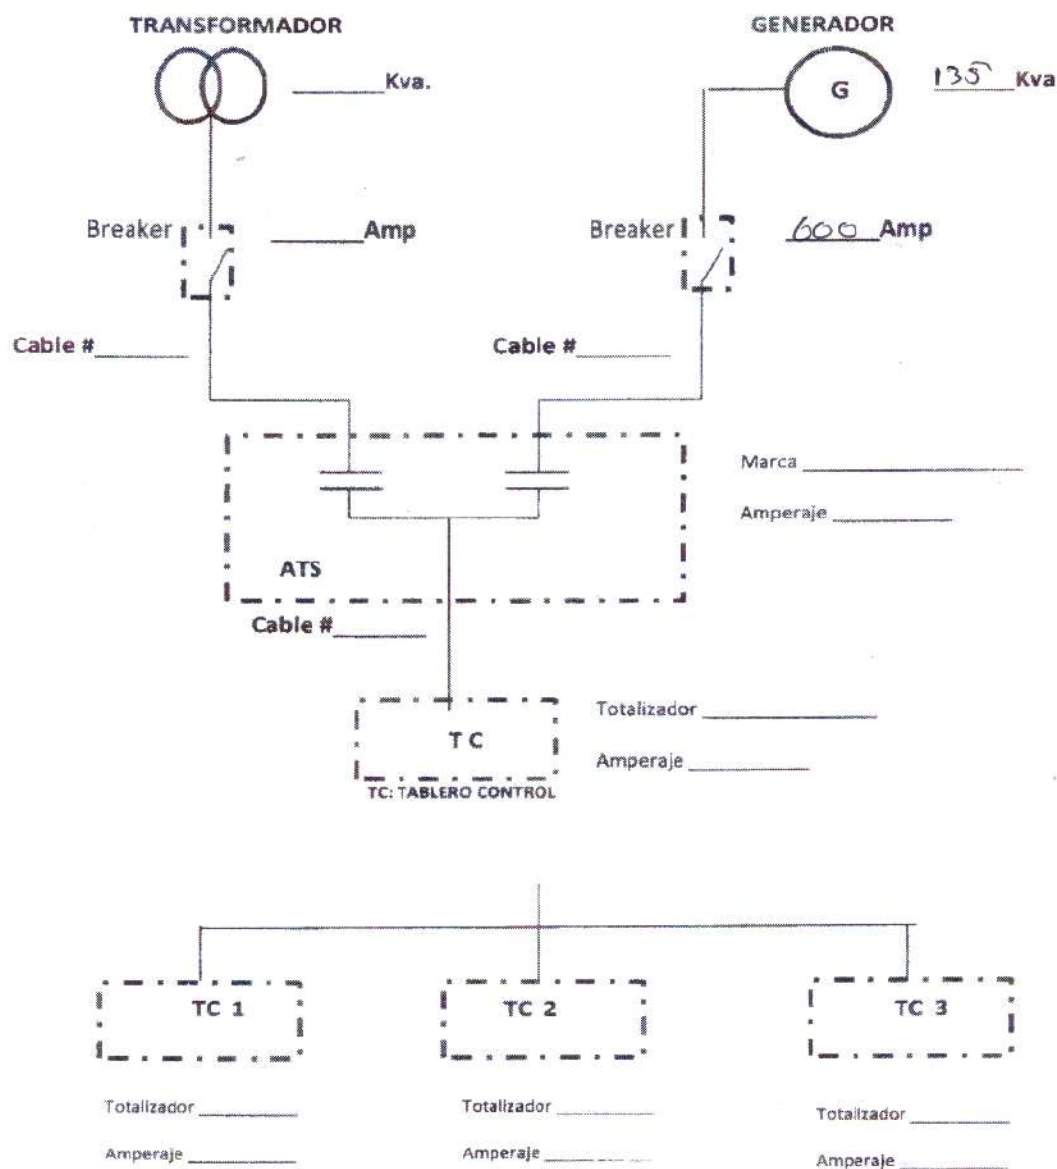


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



NKH ELECTRONICA SAS


NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO			HOJA No.4
FECHA: 30-10-19	CIUDAD: SAN ANDRES	UNIDAD: RADAR	ORDEN-HHS-No.
REPORTE DE CAPACITACION			
TEMARIO:			
PROTOCOLO DEL FUNCIONAMIENTO			X
ALIMENTACION, PROTECCIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED ELECTRICA			X
EQUIPO, FALLAS Y PRUEBA CON NORMALIZACION DEL EQUIPO EN GENERAL			X
OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMATICA			X
CUIDADOS PUNTOS DE VERIFICACION Y FRECUENCIA DE LA MISMA			X
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No.	GRADO	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	
NOMBRE:	Javier Fernando	NOMBRE:	Jorge Luis
APELLIDO:	Ortiz Vergel	APELLIDOS:	Rambla Pineros
GRADO:	Tecnico Cuarto	No. CEDULA:	79'499 487 Btd
No. CEDULA:	1026577039	CELULAR:	320 2162666
No. PLACA:	N/A		
CELULAR #:	3153577261		
			
FIRMA - USUARIO		FIRMA - TECNICO	

NKH ELECTRONICA SAS
NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO			HOJA No.5
FECHA: 30-10-19	CIUDAD: SAN ANDRES	UNIDAD: RADAR	ORDEN-HHS-No.
REPORTE DE TRABAJO			
ANTECEDENTES:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
Cambio de aceite y filtros			
TRABAJO REALIZADO			
se hace revision del equipo en general, se cambian los filtros de aire, aceite y acpm, se cambia el aceite se hace limpieza del equipo, se deja una dos bateria 4D.			
Nota: La planta queda operativa			
RECOMENDACIONES			
prender la planta cada 8 dias durante 5 minutos			
Se deja filtros de aire, aceite, acpm y bateria para la otra planta y aceite.			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	
NOMBRE:	Javier Fernando	NOMBRE:	Jorge Luis
APELLIDO:	Ortiz Vergel	APELLIDOS:	Rambla Pineros
GRADO:	Tecnico Cuanto	No. CEDULA:	79'499.487 Btal
No. CEDULA:	1026572039	CELULAR:	320 216 2666
No. PLACA:	N/A		
CELULAR #:	3153577261		
			
FIRMA - USUARIO		FIRMA - TECNICO	

FOTOS SAN ANDRES

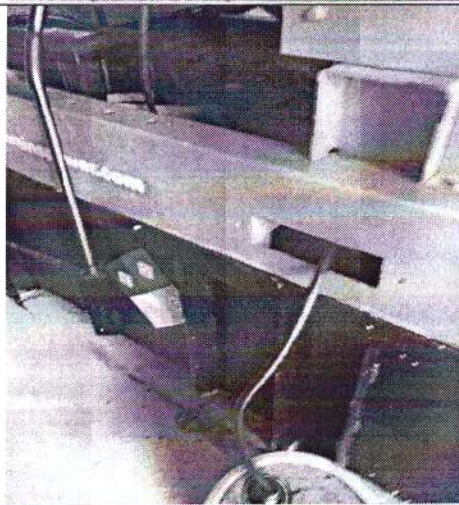





NKH ELECTRONICA SAS

NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO				HOJA No.1	
FECHA: 30-10-19	CIUDAD: San Andres	UNIDAD: Radar	ORDEN-HHS-No.		
MARCA: Cummins Onan	GENERADOR MARCA / MODELO: DSR4C-997035				
POTENCIA: 135 kVA	SERIE PLANTA:				
PLANTA ELECTRICA / MODELO:	SERIE MOTOR: 73026955				
MOTOR MARCA / MODELO: Cummins QSB7-Q3	SERIE GENERADOR: 1090030352				
MOTOR				GENERADOR	
	N	R	M	C	
Nivel de aceite	X				Generador
Estado del aceite	X				Cables
Cambio de aceite	X				Breaker
Sellos y empaques	X				Tomas
Aletas de refrigeracion	X				A.V.R
Nivel de refrigeracion	X				Terminales
Cambio de refrigerante	X				Tablero de control
Radiador	X				
Mangueras	X				
Abrazaderas	X				
Arranque electrico	X				
Arranque normal	X				
Bateria	X				
Autostart	X				
Filtro de aceite	X				
Filtro de combustible	X				
Filtro de aire	X				
Marqueras	X				
Carburador	X				
Llaves y selenoides	X				
Gases de escape	X				
Correas	X				
Tornillos	X				
N: NORMAL					
R: REGULAR					
M: MALO					
C: CAMBIO					
LIMPIEZA					
	N	R	M	C	
CUARTO	X				
PLANTA	X				
LECTURA DE INSTRUMENTOS					
Voltaje AC		208 V			
Voltaje DC		14 V			
Horas		44,028			
Frecuencia		60 Hz			
Breaker planta		OK			
FASES					
VOLTAJE					
F1-N		118 V			
F1-F2		208 V			
F2-N		118 V			
F1-F2		208 V			
F3-N		118 V			
F2-F3		208 V			
MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN LA PLANTA ELECTRICA:					
Filtros de aire, aceite, agua, 2 garrafas de aceite y Bateria 24D.					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					



NKH ELECTRONICA SAS
NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO

HOJA No.3


FECHA: 30-10-19

CIUDAD: San Andres

UNIDAD: Radar

ORDEN-HHS-No.

DIAGRAMA UNIFILAR

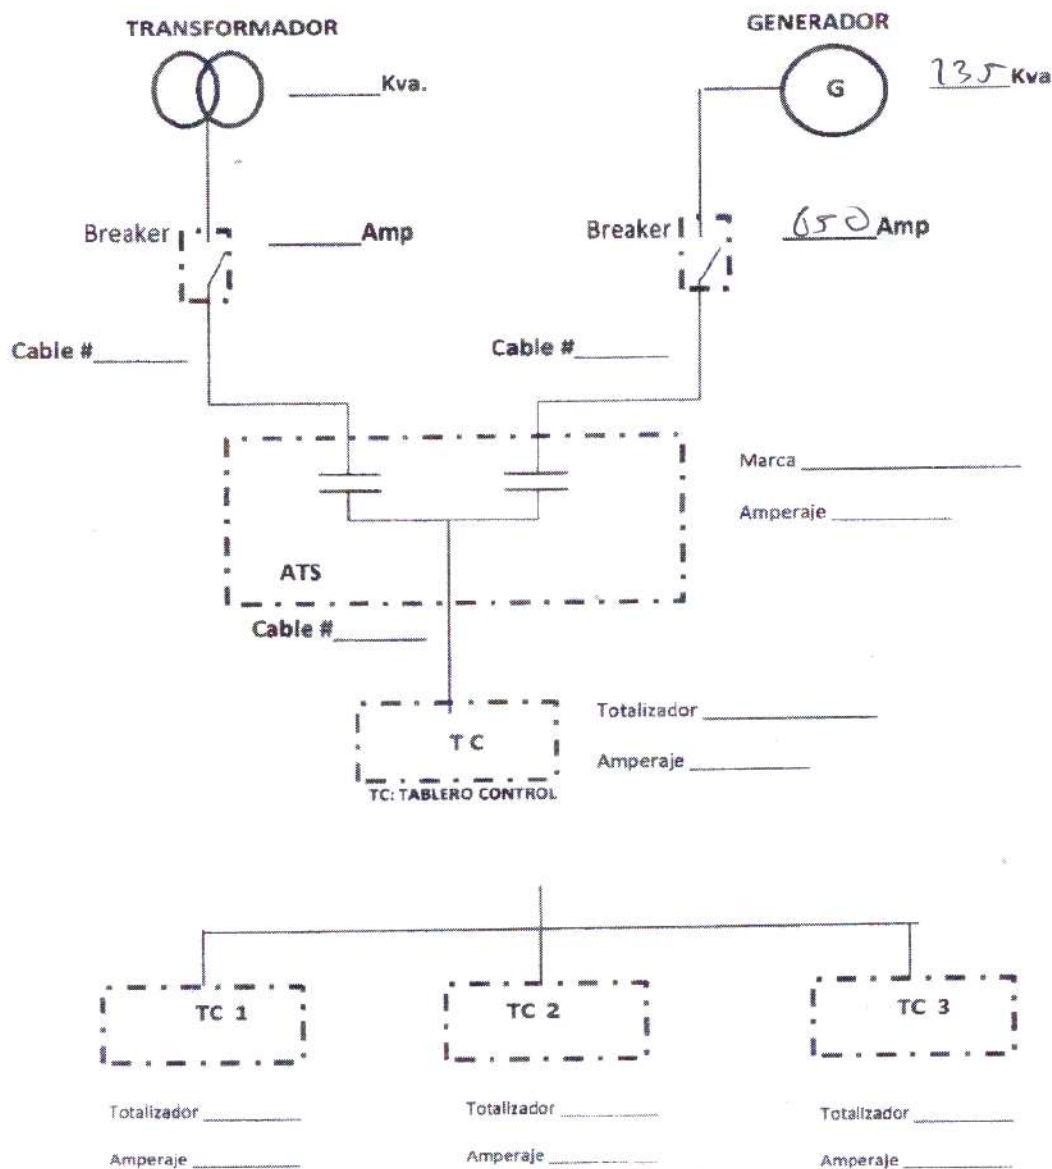

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



NKH ELECTRONICA SAS

NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO			HOJA No.4
FECHA: 30-10-19	CIUDAD: San Andres	UNIDAD: Radar.	ORDEN-HHS-No.
REPORTE DE CAPACITACION			
TEMARIO:			
PROTOCOLO DEL FUNCIONAMIENTO			✓
ALIMENTACION, PROTECCIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED ELECTRICA			✓
EQUIPO, FALLAS Y PRUEBA CON NORMALIZACION DEL EQUIPO EN GENERAL			✓
OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMATICA			✓
CUIDADOS PUNTOS DE VERIFICACION Y FRECUENCIA DE LA MISMA			✓
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No.	GRADO	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	
NOMBRE:	Javier Fernando	NOMBRE:	Jorge Luis
APELLIDO:	Ortiz Vergel	APELLIDOS:	Ramirez Prieto
GRADO:	tecnico Cuarto	No. CEDULA:	79'444.483
No. CEDULA:	1026587039	CELULAR:	320 216 2666
No. PLACA:			
CELULAR #:	318 558 72 61		
FIRMA - USUARIO		FIRMA - TECNICO	




NKH ELECTRONICA SAS

NIT. 900.944.696-1

REPORTE TECNICO			HOJA No.5
FECHA: 30-10-19	CIUDAD: San Andres	UNIDAD: Radar.	ORDEN-HHS-No.
REPORTE DE TRABAJO			
ANTECEDENTES:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
mantenimiento general			
TRABAJO REALIZADO			
no se puede realizar el mantenimiento por que la planta esta en funcionamiento, se dejan los cables de corriente, a tierra, agua, se deja el aceite y la bateria 4D.			
RECOMENDACIONES			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	
NOMBRE:	Javier Fernando	NOMBRE:	Jorge Luis
APELLIDO:	ORTIZ Vergel	APELLIDOS:	Camacho Pineda
GRADO:	tecnico Cuarto	No. CEDULA:	79'494.483
No. CEDULA:	1026577039	CELULAR:	320262666
No. PLACA:	N/A		
CELULAR #:	3153577261		
			
FIRMA - USUARIO		FIRMA - TECNICO	

FOTOS SAN ANDRES

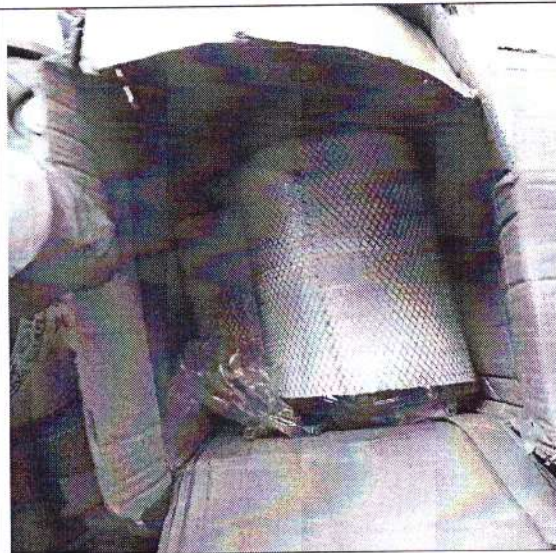



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

Bogota, octubre 15 de 2019

Señores
COFAC
Ciudad

				COTIZACION HHS-1924			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	IVA 19%	Valor Unitario Total (incluido IVA)	V/TOTAL
	GENERADOR No. 2 CUMMINS SAN ANDRES (GACAR)						
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
1.3.1	Verificación del correcto funcionamiento de los equipos electrógenos.	UNIDAD	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00
1.3.2	Prueba de carga a generador que se encuentra en standby	UNIDAD	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	\$ 142.800,00
1.3.4	Pruebas de presión de combustible en cada inyector y a nivel general.	UNIDAD	1	\$ 130.000,00	\$ 24.700,00	\$ 154.700,00	\$ 154.700,00
1.3.5	Verificación y socialización de fallas encontradas.	UNIDAD	1	\$ 100.000,00	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
1.3.7	Verificación de sistemas de enfriamiento, lubricación, inyección y generación.	UNIDAD	1	\$ 100.000,00	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
1.3.8	Revisión de estado de baterías (cambiar elementos de ser requeridos por una de las mismas características).	UNIDAD	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00
1.3.9	Revisión de cargador de baterías para evitar sobrecargas o falta de carga a las baterías.	UNIDAD	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00
1.3.10	Revisión de sensores de motor y generador.	UNIDAD	1	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 83.300,00
1.3.11	(01) Filtro de Aceite.	UNIDAD	1	\$ 150.000,00	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
1.3.12	(01) Filtro de Combustible	UNIDAD	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	\$ 142.800,00
1.3.13	(01) Filtro Separador de Agua.	UNIDAD	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	\$ 142.800,00
1.3.14	(01) Filtro de Aire Primario.	UNIDAD	1	\$ 250.000,00	\$ 47.500,00	\$ 297.500,00	\$ 297.500,00
1.3.15	(01) Filtro de Aire Secundario.	UNIDAD	1	\$ 190.000,00	\$ 36.100,00	\$ 226.100,00	\$ 226.100,00
1.3.16	(07Gls) Aceite 15W40.	UNIDAD	1	\$ 650.000,00	\$ 123.500,00	\$ 773.500,00	\$ 773.500,00
1.3.17	(01) Kit muestra de aceite	UNIDAD	1	\$ 220.000,00	\$ 41.800,00	\$ 261.800,00	\$ 261.800,00
	IMPREVISTOS						
SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE.,						TOTAL	\$ 3.189.200,00

CALLE 78 F BIS No.111D-20 - TELEFAX: 2288075- CEL. 3108500076-3138859466

EMAIL: nkhelectronic@hotmail.com - nkhelectronica@gmail.com

BOGOTA-COLOMBIA



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6


CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
PLAZO DE EJECUCION	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
VALIDEZ DE LA OFERTA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.001860014990 A NOMBRE DE HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
TIEMPO DE ENTREGA	DE ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES
SITIO DE ENTREGA	COFAC

En nombre de HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS quiero expresar mis agradecimientos por conciderarnos una alternativa de solucion.

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

Heliodoro Hernandez Sanchez


HELIODORO HERNANDEZ S.
HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
C.C. 19.374.690 de Bogotá.
Representante legal
