

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 23 de marzo de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co

Neiva, Huila.

REFERENCIA: Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 1.5k, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20 A en el municipio de suaza departamento del huila."

ASUNTO: ENTREGA DEL PRIMER INFORME MENSUAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023


Cordial saludo,

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1464 de 2022, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5K, DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA." me permito allegar el informe No.1 del periodo comprendido del 1 de febrero al 28 de febrero de 2023.

ANEXO: Dos (2) AZ, con ochocientos cuarenta y un (841) folios.

Sin otro particular,

Atentamente;



LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

C.C. No. 7.697.592 Neiva.

Interventor

 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

Interventor  gallardo2023@gmail.com

 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 23 de marzo de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co

Neiva, Huila.

REFERENCIA: Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 1.5k, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20 A en el municipio de suaza departamento del huila.”

ASUNTO: ENTREGA DEL PRIMER INFORME MENSUAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023


Cordial saludo,

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1464 de 2022, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5K, DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA.” me permito allegar el informe No.1 del periodo comprendido del 1 de febrero al 28 de febrero de 2023.

ANEXO: Dos (2) AZ, con ochocientos cuarenta y un (841) folios.

Sin otro particular,

Atentamente;



LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

C.C. No. 7.697.592 Neiva.

Interventor

 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

Interventor  gallardo2023@gmail.com

 316 864 18 74

INFORME MENSUAL No. 1
FEBRERO
INTERVENTORIA GALLARDO

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

 INFORME MENSUAL
 No.1

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
 CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
 "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
 DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA
 CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO
 CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA,
 DEPARTAMENTO DEL HUILA

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 01

CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022:

 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE
 PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE
 DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO
 DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01/02/2023 AL 28 /02/2023

FECHA DEL INFORME: 06/03/2023

 CONTRATISTA DE OBRA
 FERNANDO JIMENEZ ROA

 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
 LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

MARZO DE 2023

 Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaBallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

HUILA
CRECE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS.....	3
ANEXOS.....	4
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	5
3. ASPECTO TÉCNICO.....	7
3.1. MDESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	7
3.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA.....	7
3.3. PROGRAMACION DE OBRA.....	20
3.4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO.....	24
3.4.1. Proyecciones Del Primer Mes Del Contrato – Cumplidas/No Cumplidas.....	25
3.5. CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO.....	25
3.5.1. Estado De Las Actas De Pago Parcial- Del Contratista.....	25
3.5.2. Valor De Las Actas Pagadas.....	26
3.5.3. Valor De Las Actas En Tramite.....	26
3.5.4. Estado De Las Actas De Pago Parcial A Interventoría.....	26
3.5.5. Valor De Las Actas En Tramite.....	26
3.6. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO.....	27
3.7. CONTROL ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.....	28
3.8. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA.....	29
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.....	30
4.1. RESUMEN DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y OTROS RELEVANTES.....	30
4.2. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.....	31
4.2.1. Informe De Equipo Del Contratista.....	31
4.2.2. Inspecciones.....	32
4.3. SEGURIDAD SOCIAL.....	34
4.4. MEMORIA DIARIA O BITACORA.....	35
4.5. REGISTRO FOTOGRAFICO.....	35
4.6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	35
4.6.1. Entrega De Elementos De Protección Personal Y Dotación.....	35
5. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE.....	36
5.1. CONTROL DE LA INVERSIÓN DE LA OBRA.....	36
5.1.1. Entrega De Elementos De Protección Personal Y Dotación.....	36
6. ASPECTO JURÍDICO.....	37
6.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.....	37
6.1.1. Condiciones Contractuales Iniciales.....	37
6.2. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	38

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

6.2.1.	Condiciones Contractuales Iniciales	38
6.3	ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA	39
6.4	ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	39
7	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA).....	40
7.1.	ESCOMBREA O BOTADERO	40
7.1.1.	Manejo Y Disposición Final De Material	40
7.1.2.	Manejo Y Disposición De Residuos Solidos	40
7.1.3.	Manejo y control de emisiones de gases	40
7.1.4.	Manejo y control de emisiones de partículas.....	41
7.2.	PERMISOS AMBIENTALES	41
7.3.	LIMPIEZA DE LA OBRA (residuos convencionales y especiales	41
8	INFORMES DE OBRA	41
9	RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	42
9.1.	RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA.....	42
9.2.	CONCLUSIONES	43

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Valor inicial del contrato	6
Tabla 2.	Valor Cuadro de control de programación y avance físico de obra.....	18
Tabla 3.	Flujo del proyecto	19
Tabla 4.	Control de inversión ejecutado y programado	24
Tabla 5.	Plan de inversión del anticipo	25
Tabla 6.	Resumen actas	26
Tabla 7.	Estado del tiempo	27
Tabla 8.	Condiciones contrato de obra.....	37
Tabla 9.	Condiciones contrato de interventoría.....	38
Tabla 10.	Control de pólizas contratista	39
Tabla 11.	Control de pólizas Interventoria	40

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA
ANEXOS

- ANEXO 1** POLIZAS
- ANEXO 2** FINANCIERO Y CONTABLE
- ANEXO 3** PROGRAMACION
- ANEXO 4** BITACORA
- ANEXO 5** COMITES DE OBRA
- ANEXO 6** COMITES DE VEEDURIA
- ANEXO 7** CONTROL DE PERSONAL
- ANEXO 8** CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
- ANEXO 9** CONTROL SS
- ANEXO 10** REGISTRO FOTOGRAFICO
- ANEXO 11** CONTROL DE CORRESPONDENCIA
- ANEXO 12** INFORMES

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaBallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suza, Departamento del Huila

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

2. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento mediante la construcción de 1.500 mts de pavimento rígido desde la abscisa K20+620 hasta la abscisa K22+120 en el tramo de vía identificado con código 45HL 10, que del centro el poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20 A en el Municipio de Suza Departamento del Huila., el cual se implementara un diseño de pavimento rígido que contemplara un periodo de vida útil y diseño de 20 años; proyección acorde con el de tránsito; Debido a las deformaciones características de las capas existentes, se recomienda la remoción de la capa de rodadura y de las capas granulares y diseñar una nueva estructura, de espesores apropiados que soporte el tránsito futuro, como se plasma en el diseño, se contempla una capa de base granular de 15 cm, que cumpla con las especificaciones técnicas 330-INV-13 y un espesor de capa de pavimento rígido de (20 cm) en MR 40 (Kg/Cm2).

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA
Valor Costo Inicial del Proyecto

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	
PRELIMINARES	\$ 6.448.500,00
EXCAVACIONES NY MOVIMIENTOS DE TIERRRA	\$ 201.324.620,00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	\$ 2.098.792.116,00
TRANSPORTE	\$ 655.550.470,00
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (9)	\$ 413.835.602,00
SEÑALIZACION	\$ 14.162.604,00
SUB TOTAL OBRA	\$ 3.390.113.912,00
PAGA	\$ 20.605.000,00
PMT	\$ 27.522.180,00
PAPSO	\$ 11.877.080,00
SUB TOTAL OBRA	\$ 60.004.260,00
VALOR TOTAL	3.450.118.172,00

Tabla 1. Valor inicial del contrato

Plazo Inicial = 6 meses

A la presente fecha no se han realizado modificaciones al contrato de obra en tiempo y valor.

A la presente fecha no se han realizado modificaciones al contrato de interventoría en tiempo y valor.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

3. ASPECTO TÉCNICO.

3.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (Anexos 4 Copia Libro De Bitácora).

Condiciones Vigentes:

- La programación y Flujo de caja para el presente informe están correlacionados al Programa de Inversiones y al Flujograma del Proyecto que el Contratista entregó y que fue aceptada y validada por esta Interventoría.

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Hasta la fecha han transcurrido 28 días en obra desde la fecha del acta de inicio del contrato. (1 de febrero 2023).

Para el periodo (1 a 28 de febrero de 2023), en obra física se está adelantando las labores de topografía, localización y replanteo de la vía, así como el descapote y ampliación en unos sectores específicos, igualmente la extracción de la tubería del gas.

Conforme a la programación aprobada durante el mes de febrero, no se ejecutaron los siguientes ítems que estaban programados: demolición de concretos existentes, excavación mecánica alcantarilla, PAGA y PMT.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los ítems ejecutados hasta el 28 de febrero de 2023.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

 INFORME MENSUAL
 No.1

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
 CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
 "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
 DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA
 CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO
 CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA,
 DEPARTAMENTO DEL HUILA

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
1	1.1		1P S.V.I.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO:	m	1.500,00	\$ 4.299,00	\$ 6.448.500,00
2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA								
2	2.1	ESP. 210-13 INV		EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	4.839,07	\$ 15.000,00	\$ 72.586.020,00
4. TRANSPORTE								
9	4.1	ESP. 900-13 INV.		TRANSPORTE DE MATERIAL - PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES DE ML METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	3.722,36	\$ 1.000,00	\$ 3.722.360,00
VALOR TOTAL								\$ 82.756.880,00

Aunque en la programación de obra aprobada por la interventoría, el contratista de obra durante el mes no realizó algunas actividades contempladas en la programación, se tiene un avance programado del 1,62% y un avance ejecutado del 2,4% con un adelanto del 0,78 %, esto obedece a que el contratista ejecuto mayor cantidades de obras en algunos ítems programados y ejecutados.

En recorrido realizado el día 8 de febrero 2023 en conjunto Interventoría y contratista, se revisaron las características del corredor vial a intervenir, en este se verificaron las estructuras hidráulicas existentes, las proyectadas según diseño, anchos de calzadas y demás, en este recorrido se evidenciaron varias situaciones.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE

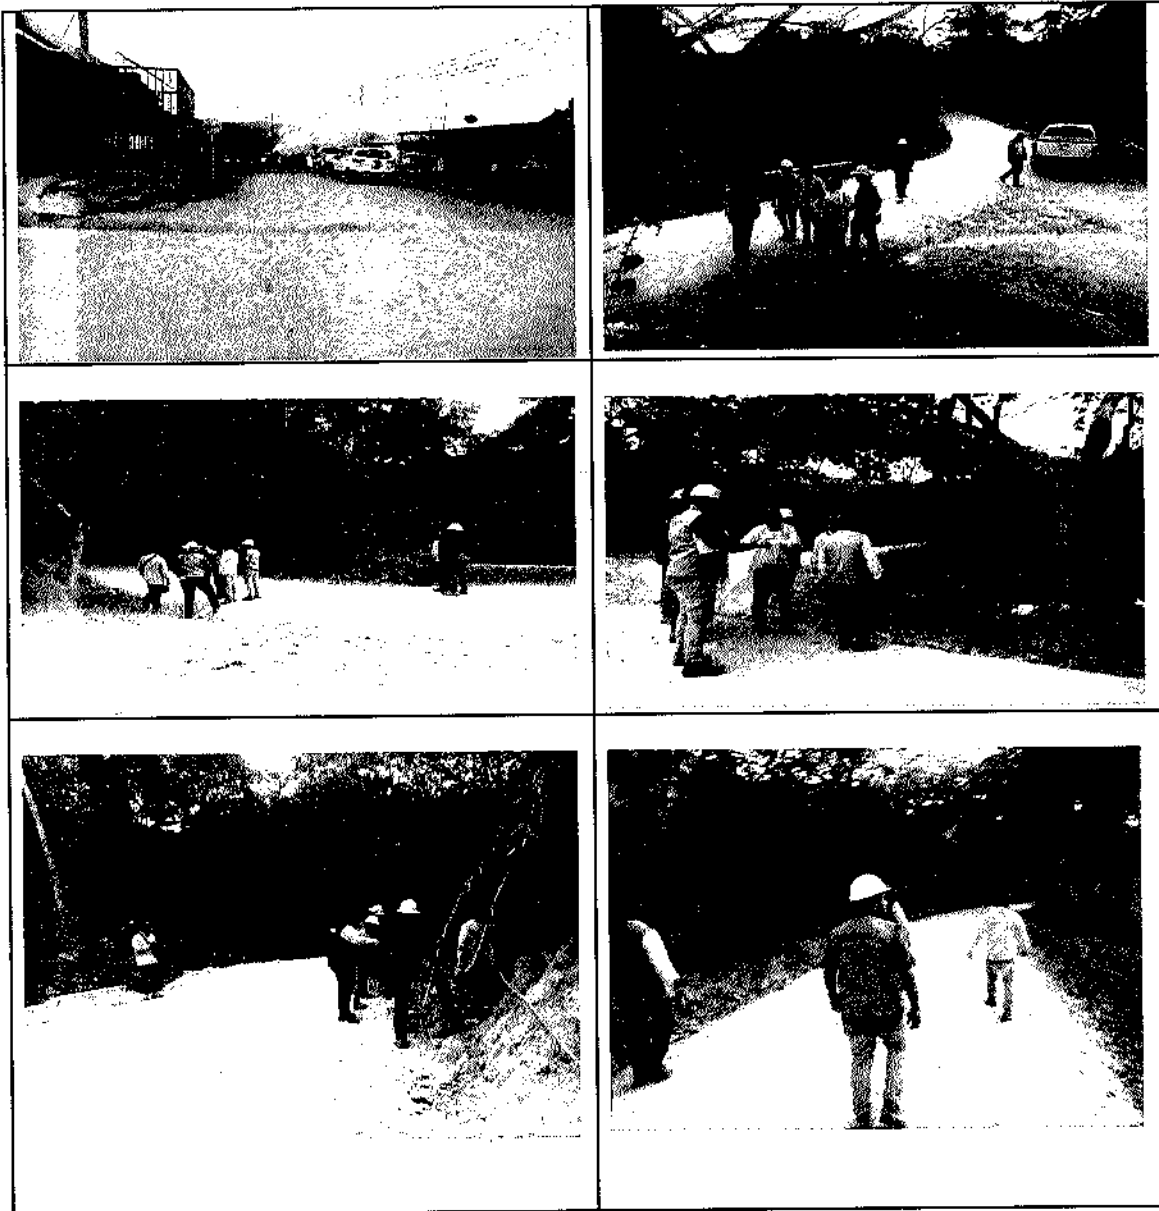


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA



- En el diseño aparece la construcción de nueve alcantarillas las cuales se encuentran ubicadas en sectores de estructuras ya existentes y un box Culvert,

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

pero en el recorrido se localizaron doce, que reciben tanto la escorrentía de la nueva calzada a construir en concordancia con su diseño geométrico y otras que encauzan drenajes naturales que vienen de las zonas altas de la montaña.

Se presenta estado y características de las estructuras encontradas:

ABS	Comentarios	Registro fotográfico	
		Encole	Descole
K20+736	Se establece suspender la construcción o restitución de la alcantarilla existente, debido a que esta se conecta con una línea de tubería de 24" paralelo a la vía, se establece en este punto implementar una placa en concreto reforzado sobre la caja existente y en la margen derecha implementar un sumidero lateral.		
K20+800	Se define construir un sumidero en ambos costados de la vía para ayudar encausar las aguas que siguen sobre la vía, a una caja existente que conecta con la tubería de 24"		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila




CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022

CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

K21+051	Se observo que la alcantarilla que se describe en los documentos técnicos no se observa a simple vista, lo que implica una nueva reubicación y pedir el permiso a un propietario para el descole		
K21+151	Encole y descole con aleta, tubo de 24" totalmente colmatadas, con poca capacidad y funcionalidad hidráulica. Se requiere restitución por una alcantarilla de 36"		
K21+232	Se define ampliar solo con dos tubos la margen derecha debido a que la alcantarilla existente se encuentra en tubería de 36" y en buenas condiciones.		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

K21+350	Demoler y restituir con construcción de aleta encole y pantalla en descole.		
K21+ 520	Construcción de Box Coulvert.		
K21+578	Esta alcantarilla no hace parte del inventario inicial del proyecto, se debe ampliar en el costado izquierdo se propone demoler cabezal y extender la losa sobre la caja unos 50 cm, para no demoler la caja debido a que es una obra nueva con tubería de 36".		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

K21+623	Encole y descole con aleta, tubo de 24" totalmente colmatadas, con poca capacidad y funcionalidad hidráulica. Se requiere restitución por una alcantarilla de 36"		
K21+800	Encole y descole con aleta, tubo de 24" totalmente colmatadas, con poca capacidad y funcionalidad hidráulica. Se requiere restitución por una alcantarilla de 36"		
K21+965	Encole y descole con aleta, tubo de 24" totalmente colmatadas, con poca capacidad y funcionalidad hidráulica. Se requiere restitución por una alcantarilla de 36"		
K22+005	Encole y descole con aleta, tubo de 24" totalmente colmatadas, con poca capacidad y funcionalidad hidráulica. Se requiere restitución por una alcantarilla de 36"		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

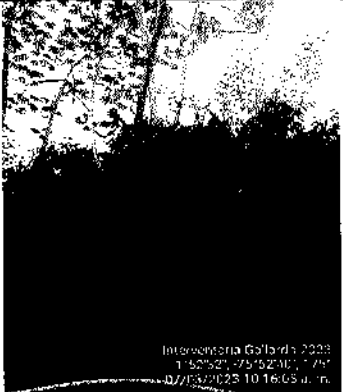
Neiva – Huila

<p>ENTIDAD CONTRATANTE</p> <div data-bbox="138 220 406 378">   </div> <p>Gobernación del Huila</p>	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No.1</p> <p align="right">LUIS MIGUEL PERDOMO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
---	---	---

K22+086	Alcantarilla existente en buen estado con tubería de 36" se requiere ampliar la margen izquierda con dos tubos y construir aleta en el encole.		
---------	--	--	---

cómo se realizó la actividad de localización y replanteo de la vía se evidencio que dentro de la ampliación que se debe realizar existen individuos arbóreos que se encuentran dentro del sector vial y que interfieren en la construcción, en visita el día 8 de febrero de 2023 con el especialista ambiental de la interventoría se solicitó al equipo de topografía la identificación de cada uno de estos.

Identificación de los arbóreos que se encuentran dentro la ampliación de la vía.

		
Árbol No. 1 abscisa 21+160	Árbol No. 2 abscisa 21+ 247	Árbol No. 3 abscisa 21+250

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila




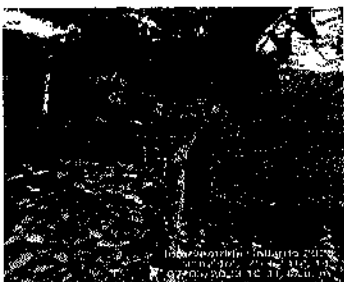
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022

CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

		
Árbol No. 4 abscisa 21+457	Árbol No. 5 abscisa 21+283	Árbol No.6 abscisa 21+295
		
Árbol No.7 abscisa 21+410	Árbol No. 8 abscisa 21+470	Árbol No. 9 abscisa 21+496
		
Árbol No.10 abscisa 21+535		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

- se realizó cortes de talud para la ampliación de la vía y así cumplir con el ancho de vía que esta estipulo dentro el diseño, que es de 6,4 m incluyendo bordillos. Por otra parte se hace necesario evaluar el estado de las zonas donde se va a realizar las ampliaciones de la vía, por lo tanto se debe hacer ensayos de cbr .



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

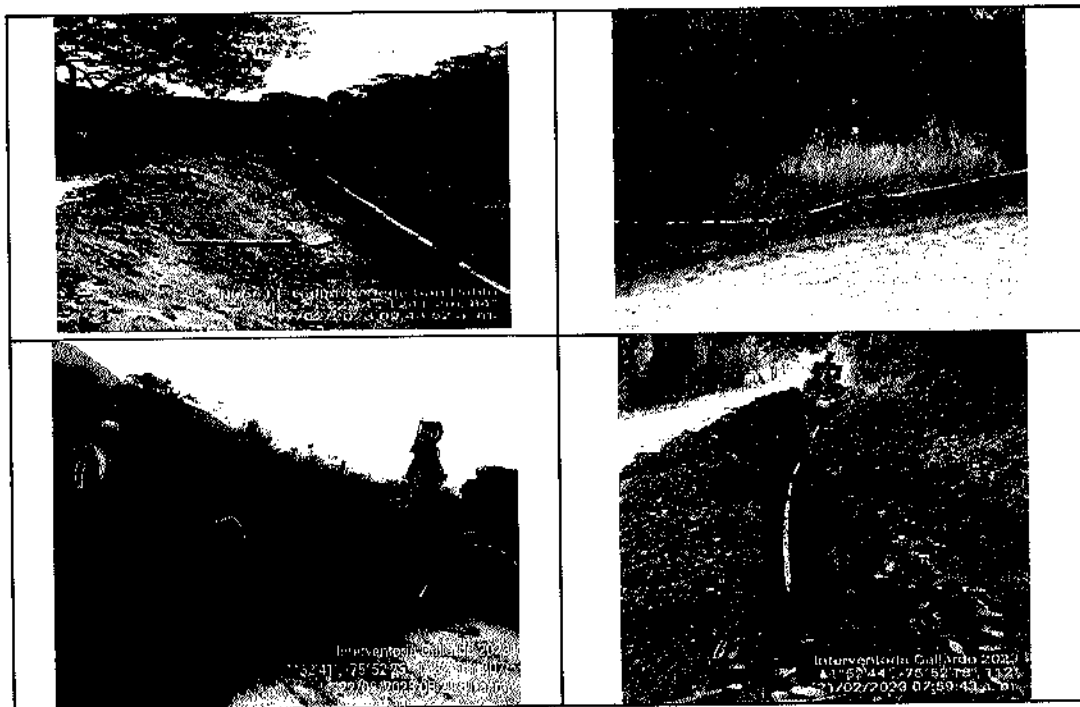
 INFORME MENSUAL
 No.1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila"

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA
Abscisa de los cortes para las ampliaciones

- DESDE LA ABCISA 22+120 HASTA LA 21+940
- DESDE LA ABCISA 21+770 HASTA LA 21+600
- DESDE LA ABCISA 21+590 HASTA LA 21+400
- DESDE LA ABCISA 21+390 HASTA LA 21+200
- DESDE LA ABCISA 21+190 HASTA LA 21+100

- se hace necesario la extracción de la tubería de gas por parte del contratista de obra, ya que esta se encuentra en dentro el área de intervención de la vía. Igualmente, ya se le informo a SURGAS, para que realicen la respectiva reubicación de la tubería de 2".



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

<div>ENTIDAD CONTRATANTE</div> <div><div>Gobernación del Huila</div></div>	<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022</div> <div>CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</div> <div>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA</div>	<div>INFORME MENSUAL</div> <div>No.1</div> <div>LUIS MIGUEL PERDOMO</div> <div>INTERVENTORIA EXTERNA</div>
--	--	--

Teniendo en cuenta todo lo anterior la interventoría solicita al contratista se presente el balance del proyecto para poder determinar el alcance del mismo.

- En el periodo del presente informe se realizaron distintos comités y reuniones, que se referencian a continuación:

- Se realizo reunión de socialización el día 31 de enero 2023 en el centro poblado de Gallardo municipio de Suaza, en compañía de la supervisión del contrato, delegados del municipio, interventoría, contratista, alcalde del Municipio de suaza, Secretario de Planeación del Municipio de Suaza y comunidad. (*ver anexo 5-listado asistencia socialización*)
- Acta de seguimientos a los trabajos realizados el día 8 de febrero de 2023, recorrido a los 1.5 km de vía a intervenir, revisando las obras a ejecutar a lo largo del tramo, verificando ancho de vía, desplazamiento del eje de la vía, nivel de rasante y alcantarillas.
- Comité técnico No.1 realizado el día 20 de febrero a las 10 am, en la secretaria de Vías e infraestructura para el seguimiento y avance del contrato de obra 1354 de 2023, donde asistieron personal de obra e interventoría y la supervisión.
- Acta de comité en obra, realizado el 23 de febrero de 2023, con el fin de socializar unas actividades que estaban pendientes en entrega por parte del contratista de obra.

MES	% ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO MES	% ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO MES	INDICADOR / ATRASO (-) O ADELANTO (+)
1	1,62 %	1,62%	2,40%	2,40%	+ 0.78%

Tabla 2. Valor Cuadro de control de programación y avance físico de obra

NOTA : El porcentaje programado acumulado y el porcentaje programado para el presente mes está correlacionado a la programación aprobada por interventoría el día 9 de febrero de 2023. Sin embargo aunque no se ejecutaron items que estaban contemplados para el mes de febrero, se puede observar que se lleva un adelanto de 078% , esto obedece a que el contratista ejecuto mayor cantidades de obras en algunos items programados.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 - 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

A continuacion presentamos el programa de inversion y flujo del proyecto, con el cual se hizo el seguimiento una vez iniciada la ejecución.

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FLUJO DEL PROYECTO									
ORDEN	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	FECHA
1	01/01/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/01/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/01/2022
2	01/02/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/02/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/02/2022
3	01/03/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/03/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/03/2022
4	01/04/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/04/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/04/2022
5	01/05/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/05/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/05/2022
6	01/06/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/06/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/06/2022
7	01/07/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/07/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/07/2022
8	01/08/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/08/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/08/2022
9	01/09/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/09/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/09/2022
10	01/10/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/10/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/10/2022
11	01/11/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/11/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/11/2022
12	01/12/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/12/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/12/2022

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FLUJO DEL PROYECTO									
ORDEN	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	FECHA
1	01/01/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/01/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/01/2022
2	01/02/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/02/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/02/2022
3	01/03/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/03/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/03/2022
4	01/04/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/04/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/04/2022
5	01/05/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/05/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/05/2022
6	01/06/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/06/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/06/2022
7	01/07/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/07/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/07/2022
8	01/08/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/08/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/08/2022
9	01/09/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/09/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/09/2022
10	01/10/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/10/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/10/2022
11	01/11/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/11/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/11/2022
12	01/12/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/12/2022	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO	COP	150000000	01/12/2022

ACORDADO 3/01/2023

[Handwritten signature]

Tabla 3. Flujo del proyect

Dirección: Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva - Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

3.3. PROGRAMACION DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona cronologicamente el inicio de cada una de las actividades del proyecto según programación aprobada. (ver anexo 3-programación)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	INICIO	FIN	DURACION
1	PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m	1500	01/02/2022	18/02/2023	45
2	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	10217,40	11/02/2023	11/05/2023	89
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (NO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	m3	90,00	03/05/2023	20/07/2023	78
2.3	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.(NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	746.00	29/03/2023	21/06/2023	84
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	9600.00	11/03/2023	12/06/2023	93

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

3.2	PAVIMENTO RIGIDO MR-40, ESPESOR (0,20) M, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,20 M, CURADO CON ANTISOL. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	1884.00	13/04/2023	25/07/2023	103
3.3	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR ESP. 330-13 INV.(NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	1503.00	05/04/2023	19/07/2023	105
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'c=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE BORDILLO. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m	3000,00	23/05/2023	24/07/2023	62
4	TRANSPORTE					
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3-Km	67.427,04	11/022023	18/06/2023	127
4.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (CONCRETOS). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3-Km	267.425.60	22/022023	04/07/2023	132

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

4.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y/O GRANULARES (MEJORAMIENTO Y/O SUBBASE Y/O BASE Y/O ASFALTO). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	320.697.83	22/02/2023	04/07/2023	114
5	OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (9)					
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	20.00	28/02/2022	20/05/2023	81
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE ENCOLES, DESCOLES, PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS Y BORDILLO. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	M3	74.00	21/03/2023	11/06/2023	82
5.3	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	63.00	6/03/2023	13/05/2023	68
5.4	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM ² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA	Kg	11544.00	9/03/2023	1/06/2023	84

 Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

5.5	EXCAVACIÓN MECÁNICA NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	577.00	22/02/2023	23/05/2023	90
5.6	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.(NO INCLUYE TRANSPORTE).	M3	296.00	16/04/2023	11/06/2023	56
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	M3	432.00	12/03/2023	19/05/2023	68
5.8	DEMOLICION DE CONCRETOS DE EXISTENTES, INCLUYE RETIRO.	M3	66.00	20/02/2023	1/05/2023	70
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE C- (F'C=280 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	M3	93.00	20/03/2023	11/06/2023	83
6	SEÑALIZACIÓN					
6.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO. ESP. 700-13 INV.	m	4500.00	26/07/2023	30/07/2023	4
6.2	TACHAS REFLECTIVAS 701-13 INV.	Unidad	564.00	29/07/2023	1/08/2023	3

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

 INFORME MENSUAL
 No.1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,62%	1,62%	Obra programada (%)	2,4 %	2,4 %
Valor obra programada	\$ 55.929.040,00	\$ 55.929.040,00	Valor obra programada	\$ 82.756.880,00	\$ 82.756.880,00
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA		CONTRATISTA:	LUIS MIGUEL PERDOMO	
CONTRATO No. :	1354 DE 2022		CONTRATO No. :	1464 DE 2022	
VALOR INICIAL:	3.450.118.172		VALOR INICIAL:	280.602.000	
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
PLAZO DE INICIACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2023		PLAZO DE INICIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2023	
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2023		FECHA TERMINACIÓN:	LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA	

Tabla 4. Control de inversión ejecutado y programado

Las fechas presentadas anteriormente corresponden a la programación aprobada inicialmente, el avance programado y ejecutado

3.4. PROYECCIONES PARA EL PROXIMO PERIODO

Conforme a lo manifestado en las revisiones en la implementación de diseño a las condiciones actuales de la vía, a la programación de obra y a espera que se siga adelantando los tramites y procesos correspondientes para seguir avanzando en la ejecución del contrato:

- Entrega la cartera topográfica de los ajustes a los diseños por parte de Contratista par su respectiva aprobación.
- Excavación de la sección de la vía y nivelación y conformación de la calzada existente.
- Inicio de construcción de alcantarillas, según los diseños.
- Continuar con el trámite forestal con la entidad correspondiente.
- Continuar con el trámite de intervención del cauce, para la construcción del Box Culvert.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

 INFORME MENSUAL
 No.1

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
 CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
 "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
 DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA
 CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO
 CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA,
 DEPARTAMENTO DEL HUILA

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

3.4.1. Proyecciones Del Primer Periodo Del Contrato – Cumplidas/No Cumplidas

El contratista e interventoría han adelantado las revisiones necesarias cumpliendo con la programación aprobada el 9 de febrero 2022, se ha cumplido con las actividades de topografía en el replante y localización, cortes de talud para la ampliación de la vía, además de eso se han adelantado actividades adicionales con el fin de adelantar procesos y así buscar que la ejecución de la obra siga su curso..

3.5. CANTIDADES DE OBRA Y VALOR REVISADO
3.5.1. Estado De Las Actas De Pago Parcial Del Contratista

- Se encuentra en proceso el trámite del anticipo de un 30% correspondiente a un valor de \$ 1.035.035.451,60. (ver anexo 2-plan de inversión anticipo).

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
DATOS GENERALES			
 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL C. NACIONAL DEL COLOMBIA ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS <small>Unidad Ejecutora: Gobernación del Huila, Contratación Interventoría de Obra de Pavimento Rígido</small>			
CONTRATO No. 1354 de 2022		PROGRAMACION INICIAL ☒ REPROGRAMACION ☐	
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
VALOR CONTRATO:		\$ 3.450.118.172	
ANTICIPO 30%:		\$ 1.035.035.451,60	
CONTRATISTA:		FERNANDO JIMENEZ ROA	
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de Salarios, Jornales y aportes del personal	\$ 144.971.000,00	14,00%
2	Transporte y Alquiler de Maquinaria	\$ 400.064.451,60	38,85%
3	Compra de Materiales y Accesorios	\$ 400.000.000,00	38,65%
4	Compra de combustible	\$ 90.000.000,00	8,70%
TOTAL		\$ 1.035.035.451,60	100,00%
NOTA: Los Porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.			
 FERNANDO JIMENEZ ROA <small>C.C. 12.182.340 de Qarzon (Huila)</small>		Aprobado 9/07/2023  Vo. Bo. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	

Tabla 5. Plan de inversión del anticipo

- No se ha ejecutado obra física relevante por lo tanto aun no es posible el trámite de actas parciales.
- A la fecha del presente informe a un no se realizado el desembolso del anticipo.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

3.5.2. Valor De Las Actas Pagadas

- Se encuentra en trámite el anticipo, en espera de los procesos en la entidad para pago.

Contractualmente se deben tramitar actas mensuales, hasta la fecha no se tiene ejecución de obra física.

Acta No.	Valor de acta	Valor a pagar

Tabla 6. Resumen actas

3.5.3. Valor De Las Actas En Tramite

Solo se encuentra en proceso el trámite el anticipo de un 30% correspondiente a un valor de \$ 1.035.035.451,60

3.5.4. Estado De Las Actas De Pago Parcial A Interventoría

- Se encuentra en proceso el trámite el anticipo de un 30% correspondiente a un valor de \$ 84.180.600 (*ver anexo 2-plan de inversión anticipo*).
- No se ha ejecutado obra física por lo tanto aun no es posible el trámite de actas parciales
- A la fecha del presente informe aún no se realizado el desembolso del anticipo.

3.5.5. Valor De Las Actas En Tramite

Solo se encuentra en trámite el anticipo de \$ 84.180.600

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022

CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

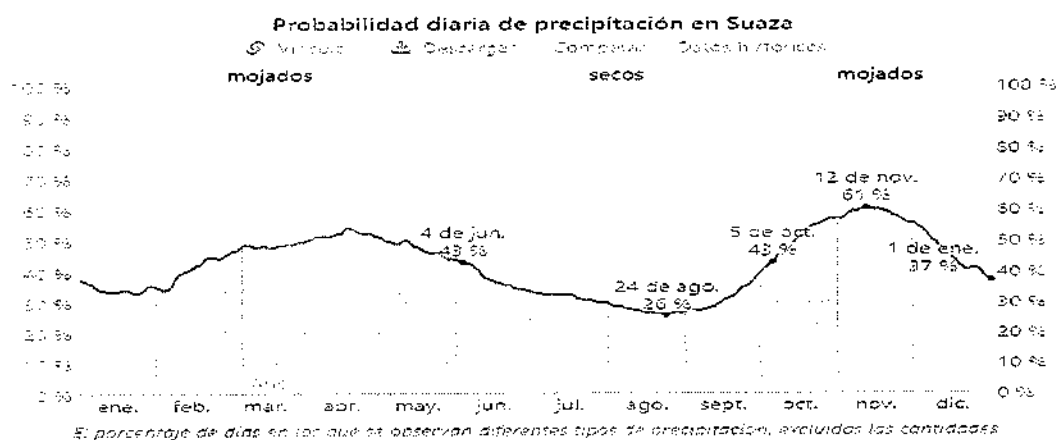
LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

3.6. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo del presente informe se realizaron las actividades de localización y visita de los tramos a intervenir, estos días fueron soleados sin presencia de precipitaciones. Solo se han presentado lluvias aisladas que no han interferido con las actividades de ampliación y definición del ancho de la calzada correspondiente a siete (6,40) metros.

[illegible]

Tabla 7. Estado del tiempo



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

3.7. CONTROL ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

- Por parte de interventoría se ha solicitado la documentación concerniente a los diferentes permisos de canteras y disposición de RCD así como los resultados de los ensayos de caracterización de los materiales a utilizar, diseños de mezcla y demás, según las especificaciones técnicas del contrato, documentos previos al inicio de obra.
- Como se ha se realizó la revisión del presupuesto conforme a los diseños donde se encontraron las siguientes observaciones:

Diseño Geométrico:

- Una vez realizada localización, replanteo de ejes y ubicación de chaflanes por parte de la topografía del contratista de obra, deberá entregar a la interventoría para su revisión y aprobación las carteras de volúmenes y secciones de la vía, igualmente en el diseño inicial, no están contemplado los sobre anchos de la vía.

Obras de drenaje:

- Conjuntamente se realiza un inventario de las estructuras de drenaje actual en donde se encuentran 12 alcantarillas y 1 Box Culvert, adicional a esto y conforme al diseño geométrico de la vía, es necesario la demolición, construcción y ampliación de algunas alcantarillas las cuales se relacionan a continuación:

K21 +578, Esta alcantarilla no hace parte del inventario inicial del proyecto, se debe ampliar en el costado izquierdo se propone demoler cabezal y extender la losa sobre la caja unos 50 cm, para no demoler la caja debido a que es una obra nueva con tubería de 36".

K21 + 623 no se encuentra contemplada dentro del inventario del proyecto, pero se hace necesario su demolición y construcción.

K 21+051 Se observo que la alcantarilla que se describe en los documentos técnicos no se observa a simple vista, lo que implica una nueva reubicación y pedir el permiso a un propietario para el descole

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

Interferencia de individuos arbóreos:

- Dentro de la afectación del corredor vial se encuentran ubicados 10 individuos arbóreos que interfieren con el trazado de la vía y los cuales no se encuentra ninguna referencia dentro de los estudios del contrato. En visita realizada por el residente ambiental de la interventoría se revisaron el estado de cada uno y se dio la indicación de dejar los sectores aledaños a estos sin ejecución mientras se define el trámite y tratamiento de cada uno.

3.8. EVALUACION DE ESTADO DE LA OBRA

El porcentaje programado acumulado y el porcentaje programado para el presente mes está correlacionado a la programación aprobada por interventoría el día 9 de febrero de 2023. Sin embargo aunque no se ejecutaron ítems que estaban contemplados para el mes de febrero, se puede observar que se lleva un adelanto de 078% , esto obedece a que el contratista ejecuto mayor cantidades de obras en algunos ítems programados.

MES	% ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO MES	% ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO MES	INDICADOR / ATRASO (-) O ADELANTO (+)
1	1,62 %	1,62%	2,40%	2,40%	+ 0.78%

Por otra parte, es bueno resaltar que la obra se inicio en el k 20+100 debido a que la alcaldía de Suaza se comprometio a realizar el alcantarillado de la parte urbana llegando al centro el poblado en unos 400 mts aproximadamente , lo cual se realizara con recursos del municipio de suaza , por lo anterior hasta tanto no se realice el alcantarillado no se podra intervenir este tramo.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

4.1. RESUMEN DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y OTROS RELEVANTES

1. Se realizo reunión de socialización el día 31 de enero 2023 en el centro poblado gallardo del municipio de suaza.
 2. Acta de seguimientos a los trabajos realizados el día 8 de febrero de 2023, recorrido a los 1.5 km de vía a intervenir, revisando las obras a ejecutar a lo largo del tramo, verificando ancho de vía, desplazamiento del eje de la vía, nivel de rasante y alcantarillas.
 3. Comité técnico No.1 realizado el día 20 de febrero a las 10 am, en la secretaria de Vías e infraestructura para el seguimiento y avance del contrato de obra 1354 de 2023, donde asistieron personal de obra e interventoría y la supervisión.
 4. Acta de comité en obra, realizado el 23 de febrero de 2023, con el fin de socializar unas actividades que estaban pendientes en entrega por parte del contratista de obra.
- En el periodo se realizaron solicitudes, aclaraciones y se resolvieron inquietudes, plasmadas en correos y oficios de requerimientos al contratista los cuales se incluyen en este informe en anexos de correspondencia.

Comité Veeduría

En el periodo del presente informe ya se cuenta conformado el comité de veeduría con reconocimiento de la personería del Municipio de Suaza.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA
4.2. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.
4.2.1. Informe De Equipo Del Contratista

En el periodo del presente informe se contaron en obra con maquinaria pesada y de transporte para la ejecución de la actividad de excavaciones para la ampliación de la vía, no se cuenta por el momento con equipo menor:

MAQUINARIA PESADA				
CLASE	RODAJE	MARCA	AÑO MODELO	PESO
Excavadora.	Orugada	Caterpillar	2009	22.5 Ton
Retroexcavadora	Llantas	Case	2019	7.3 Ton
Volqueta	Llantas	International	2013	8.8 Ton
Volqueta	Llantas	Kodiak	2007	6.5 Ton
Volqueta	Llantas	International	2015	8.8 Ton

Se presenta por parte del contratista los documentos de la maquinaria exigida en pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos. (*ver anexo 8–documentos equipo requerido*).

MAQUINARIA Y EQUIPO VINCULADA AL PROYECTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO	MARCA	LINEA	CAPACIDAD Y/O POTENCIA	NUMERO DE SERIAL O PLACA	AÑO VERIFICACION Y/O MODELO
VOLQUETA DOBLE TROQUE	FREIGHTLINER	M2106	16780 kg/psj	SQW 249	2012
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	7600 SBA	16589 kg/psj	SZS 298	2013
VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA	16500 kg/psj	THR 903	2014
RETROCARGADOR	CASE	580N	85HP	JJGN58NRPKC761568	2019
EXCAVADORA	KOMATSU	PC200-7	143 HP	250577	2004
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	12H	145 HP	CATOC12HAAMZ00862	2006
VIBROCOMPACTADOR	HYPAC	C840C	12 TON	9015808611452	2006
CARROTANQUE	FORD	F700	N/A	FLA 190	Repotenciado/2017
COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)	ROBIN	EH12 4T	N/A	500517003	2011
COMPRESOR DE AIRE CON MARTILLO	SULLAR	N/A	185CFA	N/A	2018
CARGADOR	CATERPILLAR	936F	140HP	4TK00578	Repotenciado/2019
CORTADORA DE CONCRETO	KOMAX	10 HP	N/A	N/A	2017
RODILLO USO	HITACHI DYNAPAC	RC45	N/A	N/A	Repotenciado/2006
RODILLO VIBRANTE	INGERSOL RAND	SD700	N/A	N/A	Repotenciado/2006
CAMIONETA	VOLSKWAGEN	AMAROK	N/A	N/A	2011

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE

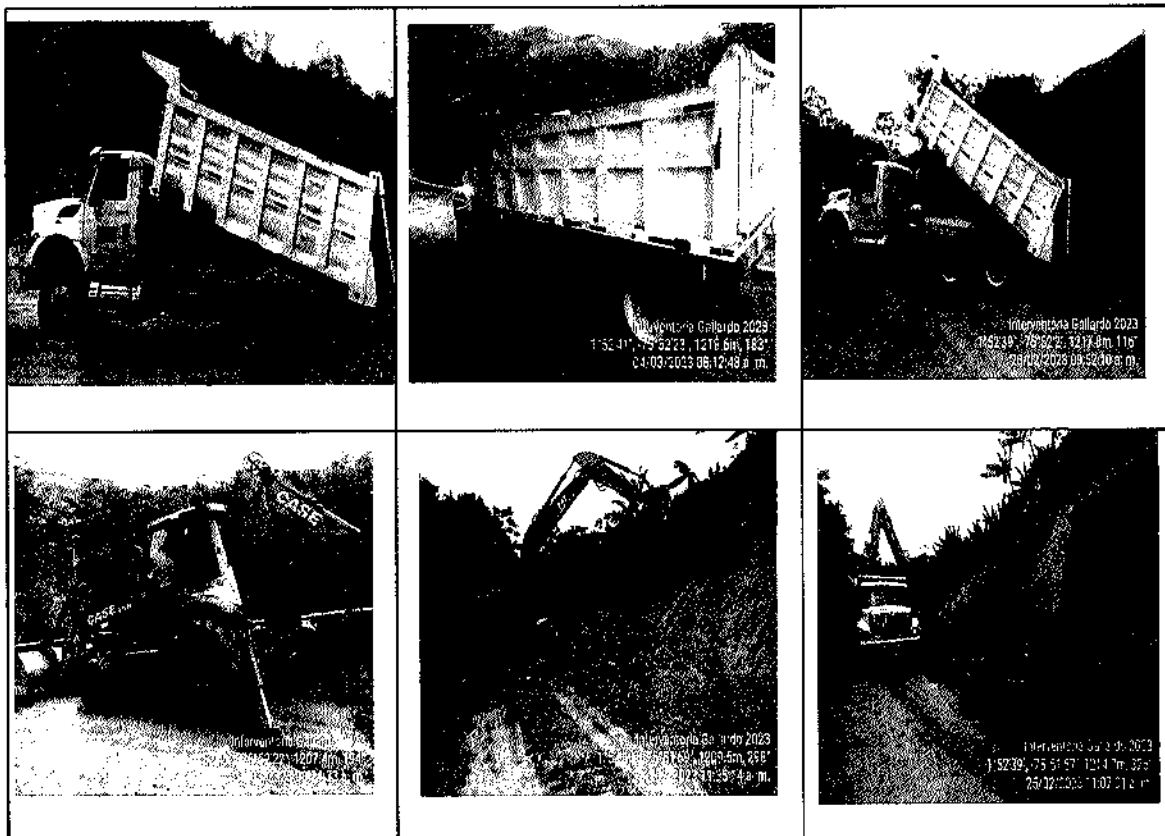

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA
4.2.2. Inspecciones

- Se realizó por parte de interventoría la verificación de la documentación de la maquinaria y volquetas que hasta la fecha del presente informe se encontraban en obra, debido a las actividades realizadas de ampliación en ciertos puntos de la vía, se tiene en obra 1 retroexcavadora de llanta; 1 excavadora de oruga y 3 volquetas.



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

HUILA
CRECE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA
Informe De Personal

- En el presente periodo ya se tienen revisadas y aprobadas las hojas de vida del personal mínimo requerido envidas por el contratista, igualmente el contratista ya entrego la documentación del personal operativo de la obra. (ver anexo 6–documentos equipo requerido);

PERSONAL VINCULADO EN EL PROYECTO

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	FERNANDO JIMENEZ ROA	12.192.340	DIRECTOR DE OBRA
2	LEONARDO ANDRES RUIZ M.	12.284.240	RESIDENTE DE OBRA
3	EDISON LEONARDO OVIEDO MONTES	1.077.853.838	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
4	EDISON MORA MOTA	1.061.707.600	ESPECIALISTA EN VIAS
5	JUAN CARLOS CABALLERO ANDRADE	12.195.192	INGENIERO INDUSTRIAL/SISOMA
6	FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	1.007.605.211	INSPECTOR DE OBRA
7	JAIR QUIROGA MARTINEZ	12.193.311	TOPOGRAFO
8	CARLOS JAVIER HERRAN TRUJILLO	12.197.309	CADENERO
9	RUBEN JOVEN PEÑA	83.252.214	CADENERO
10	EDER SAMIR ALDANA BARCINILLA	1.102.805.593	ESPECIALISTA GERENCIA

Personal en obra

NOMBRE COMPLETO	Cargo	CEDULA
LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO	Ingeniero Residente	12.284.240
JAIR QUIROGA PENAGOS	Topógrafo	12.193.311
FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	Inspector de Obra	1007.605.211
CARLOS HERRAN TRUJILLO	Cadenero 1	12.197.309
RUBEN JOVEN PEÑA	Cadenero 2	83.252.214
LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	Ingeniera Ambiental	1.075.265.994
EDWINARLEY TOLEDO PAIBA	Operador de Maquinaria	83.182.410
SEBASTIAN POLO GOMEZ	Operador de Maquinaria	1.077.873.988
SEBASTIAN CLAROS	Conductor de Volqueta.	1.077.866.257
LEONARDO PEÑALOSA RAMIREZ	Conductor de Volqueta	1.077.859.432

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
 No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

NATALIA ALEJANDRA DUARTE	Controladora Vial	1.004.158.514
LEONILDE DORADO	Controladora Vial	36288084
DUNKAN VERGARA	Conductor de Volqueta	1.077.869.634

Personal Interventoría

CARGO	CANITIDAD	%	PERSONAL
DIRECTOR DE OBRA	1	50	DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE C.C. 1.075.227.937 DE NEIVA
INGENIERO RESIDENTE	1	100	JHON FREDY MAYUNGO CUELLAR C.C. 7.687.433 DE NEIVA (H)
INSPECTOR DE OBRA 1	1	100	JHONATAN ADOLFO DURAN CANO C.C. 1.110.591.385 DE IBAGUE (T)
INGENIERO AMBIENTAL	1	100	CARLOS EDUARDO GARCIA RUIZ C.C. 1.054.226.415 DE SAN MATEO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL	1	50	JAIME ANDRES HENAO MELO C.C. 93.413.162 DE IBAGUE
ESPECIALISTA EN VIAS	1	100	JORGE HERNAN BARRERA ARIAS C.C. 14.322.965 DE HONDA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA N° 2	1	100	LUIS ERNEY GALINDO LAVAO C.C. 1.080.292.763 DE PALERMO
TOPOGRAFO	1	50	FRANCISCO JAVIER ARIAS SOLORZANO C.C. 4.377.250 DE ARMENIA
CADENERO	1	50	JUAN SEBASTIAN HERMOSA TOVAR C.C. 1.075.247.916 DE NEIVA (H)

4.3. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a la obligación de la interventoría, según el pliego de condiciones se estipula verificar y certificar la afiliación del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud) e informar si el pago se realizó mensualmente, el cual se acreditara mediante recibo de pago efectuado por el Contratista (planilla de seguridad social)
- El Contratista a la fecha del presente informe presentó las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores, se efectuará el pago de las planillas mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización".

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

 INFORME MENSUAL
 No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

- Se anexan planillas de afiliación del personal que a la fecha se encuentran vinculados al proyecto.

Anexo 7 Control de seguridad social

4.4. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría registra en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades. En el presente periodo se consignan las visitas y demás recorridos realizados en la localización de los b tramos, **Anexo 4** Copia libro de bitácora.

4.5. REGISTRO FOTOGRAFICO

En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente periodo.

Anexo 9 Registro fotográfico.

4.6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoría ha requerido al Contratista para el cumplimiento de las actividades presentadas en el cumplimiento de las obligaciones SST con la presentación de afiliaciones y documentos de los vehículos y maquinaria.

4.6.1. Entrega De Elementos De Protección Personal Y Dotación

- De acuerdo con lo establecido en la Ley 09 de 1979, Art. 85, Lit. b; todos los trabajadores están obligados a usar y mantener adecuadamente, los equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Los EPP Casco, Guantes, gafas, protectores para los oídos, barboquejos camisas de identificación se han ido entregando gradualmente desde el inicio de ejecución de las obras físicas.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 - 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022


 INFORME MENSUAL
 No.1

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
 CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
 "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción
 de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada
 con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce
 al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza,
 Departamento del Huila

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

5 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE
5.1 CONTROL DE LA INVERSIÓN DE LA OBRA

Se encuentra en proceso el trámite del anticipo de un 30% correspondiente a un valor de \$ 1.035.035.451,60.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
DATOS GENERALES			
 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL E. NACIONAL DE COLOMBIA ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS <small>Asesoría y Consultoría en Ingeniería Civil y Construcción de Vías</small>			
CONTRATO No. <u>1354</u> de <u>2022</u>		PROGRAMACION INICIAL ☒ REPROGRAMACION ☐	
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila.			
VALOR CONTRATO: <u>\$ 3.450.118.172</u>			
ANTICIPO 30%: <u>\$ 1.035.035.451,60</u>			
CONTRATISTA: <u>FERNANDO JIMENEZ ROA</u>			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de Salarios, Jornales y apenes del personal	\$ 144.971.000,00	14,00%
2	Transporte y Alquiler de Maquinaria	\$ 400.084.451,60	38,65%
3	Compra de Materiales y Accesorios	\$ 400.000.000,00	38,65%
4	Compra de combustible	\$ 90.000.000,00	8,70%
TOTAL		\$ 1.035.035.451,60	100,00%
NOTA: Los Porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.			
 FERNANDO JIMENEZ ROA C.C. 12.192.340 de Garzon (Huila)		APROBADO 9/02/2023  Vo. Bo. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	

5.1.1. Entrega De Elementos De Protección Personal Y Dotación

- Garantizar que los elementos de EPP, se han suministrados por la empresa a los trabajadores.
- Capacitación y conversación con el personal de obra sobre los elementos de protección y seguridad en obra.

 Dirección: Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva - Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

 INFORME MENSUAL
 No.1

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
 CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
 "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
 DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA
 CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO
 CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA,
 DEPARTAMENTO DEL HUILA

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

6 ASPECTO JURÍDICO

La Interventoría externa realizó seguimiento al contrato de obra No.1354-2022.

6.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

6.1.1. Condiciones Contractuales Iniciales

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
C.C.:	12.192.340 Garzón -Huila
CONTRATO No.:	1354 DE 2022
OBJETO.:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	\$3.450.118.172
ANTICIPO (30%)	\$1.035.035.452,60
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA APROBACION POLIZA:	19/12/2022
ACTA DE INICIO:	1 DE FEBRERO 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JULIO DE 2023

Tabla 8.Condiciones iniciales contrato de obra

La Interventoría externa realizó el seguimiento al contrato de Interventoría No. 1464 – 2022, de la siguiente manera:

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE 	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	INFORME MENSUAL No.1 LUIS MIGUEL PERDOMO INTERVENTORIA EXTERNA
---	---	--

6.2 ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1. Condiciones Contractuales Iniciales

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C.:	7.697.592 DE NEIVA
CONTRATO No.:	1464 – 2022
OBJETO.:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL HUILA
VALOR INICIAL:	\$ 280.602.000,00
ANTICIPO (30%)	\$84.180.600,00
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA APROBACION POLIZA:	17/11/2022
ACTA DE INICIO:	20 DE ENERO 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 9. Condiciones iniciales contrato de interventoría

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ENTIDAD CONTRATANTE </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> </div>	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INFORME MENSUAL No.1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 20px;"> LUIS MIGUEL PERDOMO INTERVENTORIA EXTERNA </div>
<small>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA</small>		

6.3 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial. **Anexo 1** Pólizas.

Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 560-74-994000028832, póliza cumplimiento entidades estatales No. 560-47-994000156756

CONTRATO DE OBRA – PÓLIZAS INICIALES			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-10-2022	07-09-2023	\$ 690.023.634,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	28-10-2022	30-05-2023	\$ 400.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28-10-2022	08-07-2026	\$ 345.011.817,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28-10-2022	27-10-2027	\$ 690,023.634,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	28-10-2022	07-09-2023	\$ 1.035.035.452

Tabla 10.Control de pólizas contratista

6.4 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- A continuación, se presenta el control de pólizas del Contrato de Interventoría, con base en el Acta de Inicio y plazo inicial **Anexo 1** Pólizas:
- Aseguradora: Mundial de seguros.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

otros. El Contratista entrega al personal de obra los estos elementos de protección personal para su uso dentro de la obra

7.1.4. Manejo y control de emisiones de partículas

El personal cuenta con la dotación pertinente y entregada por el contratista, para la mitigación de las partículas emitidas por las actividades desarrolladas en la obra.

La maquinaria y equipo empleado, durante el periodo evaluado se encontró en buen estado y trabajó dentro de la jornada laboral permitida.

7.2. PERMISOS AMBIENTALES

- Interventoría solicito al Contratista de obra, gestionar y cumplir con la normatividad ambiental vigente respecto al aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para la ejecución de las obras.
- Sobre el trámite de las especies arbóreas, se está a la espera de la visita por parte de un funcionario de la CAM.
- Sobre el permiso de ocupación del cauce para la construcción del Box coulvert, ya se realizó el trámite correspondiente ante la Corporación del Alto Magdalena CAM.

7.3. LIMPIEZA DE LA OBRA (residuos convencionales y especiales)

No se ha generado ningún residuo al no haber iniciado la ejecución de actividades con insumos o materiales de construcción.

8. INFORMES DE OBRA

El contratista de obra presento informe de obra el cual se anexa.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022

CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA**9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES****9.1. RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA**

- Dar cumplimiento estricto a la entrega de la documentación solicitada en los plazos requeridos en el contrato de obra.
- Cumplir con los perfiles y dedicaciones de los profesionales ofertados cumpliendo con el pliego de condiciones.
- El personal en obra debe contar con todos los EPP.
- Los tramos a intervenir debe contar con la señalización adecuada
- Implementar de forma inmediata el programa de gerencia de proyectos, requerido en el factor de calidad, para tener los rendimientos esperados y cumplir con la programación de obra.
- Presentar el balance del proyecto para poder determinar el alcance del mismo.
- Cumplir con la programación aprobada; en tal sentido si no se cumple de manera mensual; se le comunicará a la Gobernación del Huila; para que adelante los trámites administrativos y jurídicos de un presunto incumplimiento de la programación aprobada.

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

9.2. CONCLUSIONES

El porcentaje programado acumulado y el porcentaje programado para el presente mes está correlacionado a la programación aprobada por interventoría el día 9 de febrero de 2023. Sin embargo aunque no se ejecutaron ítems que estaban contemplados para el mes de febrero, se puede observar que se lleva un adelanto de 078% , esto obedece a que el contratista ejecuto mayor cantidades de obras en algunos ítems programados.

Para el periodo (1 a 28 de febrero de 2023), en obra física se adelantó las labores de topografía, localización y replanteo de la vía, así como el descapote y ampliación en unos sectores específicos, igualmente la extracción de la tubería del gas.

En el diseño aparece la construcción de nueve alcantarillas las cuales se encuentran ubicadas en sectores de estructuras ya existentes y un box Calvert, pero en el recorrido se localizaron doce, que reciben tanto la escorrentía de la nueva calzada a construir en concordancia con su diseño geométrico y otras que encauzan drenajes naturales que vienen de las zonas altas de la montaña.

la obra se inicio en el k 20+100 debido a que la alcaldía de Suza se comprometio a realizar el alcantarillado de la parte urbana llegando al centro el poblado en unos 400 mts aproximadamente , lo cual se realizara con recursos del municipio de suza , por lo anterior hasta tanto no se realice el alcantarillado no se podra intervenir este tramo.

ING. LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INTERVENTOR

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 1. POLIZAS

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

POLIZAS APROBADAS OBRA

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607076055

PÓLIZA No: 560-47-994000156756 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA MES AÑO
16 12 2022
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
16 12 2022
FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340

DIRECCIÓN: KR 7 N 9 47 CA 2

Ciudad: GARZON, HUILA

TELÉFONO: 6088332529

ASEGURADO: GOBERNACION DEL HUILA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL HUILA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

FIRMA DEL RESPONSABLE

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
28/10/2022	07/09/2023	690,023,634.40
28/10/2022	07/09/2023	1,035,035,452.00
28/10/2022	08/07/2026	345,011,817.20
VER NOTA ACLARATORIA		690,023,634.40

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA,

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION

SEGUN CONTRATO SE HACE NECESARIO HACER PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE VIGENCIA DE GARANTIA PAGO DE SALARIO PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR (60) DIAS, LAS DEMAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION ALGUNAS.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *2,760,094,538.00	\$ *****403,617	\$*****5,000.00	\$ *****77,637	\$ *****486,254

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CENDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ	8959	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARQUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADERO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX>

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)770186100019(020)0000000007000560707605

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207E02DFC775A



19-12-2022

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD.AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000156756 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340
ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4
BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

TEXTO ITEM 1

SE ADJUNTA CLAUSULADO GENERAL No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020617005018000 V.4.QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA.

APLICAN LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015 No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020617005018000 V.4.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607076055

PÓLIZA No: 560-47-994000156756 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA	COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION
DIA 08 MES 11 AÑO 2022	DIA 08 MES 11 AÑO 2022
FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340
DIRECCIÓN: KR 7 N 9 47 CA 2	CUIDAD: GARZON, HUILA TELEFONO: 6088332529

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4
BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

AMPAROS			
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/10/2022	07/09/2023	690,023,634.40
ANTICIPO	28/10/2022	07/09/2023	1,725,059,086.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/10/2022	07/03/2026	345,011,817.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	690,023,634.40
BENEFICIARIOS			
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA,			

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SE ADJUNTA CLAUSULADO GENERAL No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4. QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA.
APLICAN LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015 No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	
\$ *3,450,118,172.00	\$ *****26,837,193	\$*****9,000.00	\$ ****5,100,777	\$ *****31,946,970	
NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ	8958	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.asp>

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

CBDE207F0F08FA7E5A

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5607076055

**COMPROBANTE DE PAGO
INDIVIDUAL**

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO.
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: NEIVA AG. RAM. POL: 560 47 994000166756	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: \$ 31,946,970.00	DIA MES AÑO 08 11 2022 FECHA DE IMPRESIÓN
NOMBRE: JIMENEZ ROA FERNANDO	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340	

FORMA DE PAGO COD. BANCO No. CHEQUE	CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐	VALOR PAGADO \$
--	---	--------------------



(415)7701861000019(0020)00000000007000560707605

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito
RECAUDO VERDE	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir.
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(1) 3849444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco Davivienda convenio banco # 1040955 o DNR 1004050 Ref. 1 No. Documento, Ref. 2 No. electrónico 10 dígitos, Banco de Occidente Banco de Bogotá	Efectivo ó Cheque
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo

* CORRESPONSALES DE RECAUDO		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO EXITO	Carulla, Surtimax, Pemonza y Almacenes Exit	\$9.999.999
2) LA 14	Supermercados	\$9.999.999
3) PUNTO DE PAGO Grupo Aval	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$4.000.000
4) MOVIRED	Tiendas y puntos autorizados	\$1.500.000
5) EFECTY	Convenio No. 6792 y Número electrónico	\$ 500.000
6) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	\$ 500.000
7) COPIROGAS	Droguerías afiliadas	\$ 300.000
8) CONRED	Monto máximo \$1.000.000 Convenios No. 1040955 y/o 1004050 Referencia: Número electrónico para pagos	
9) PUNTORED		

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:
www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5607076055

NOMBRE: JIMENEZ ROA FERNANDO	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340	DIA MES AÑO 08 11 2022 FECHA DE IMPRESIÓN
FORMA DE PAGO COD. BANCO No. CHEQUE	CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐	VALOR PAGADO \$



(415)7701861000019(0020)00000000007000560707605

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 3A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

[Handwritten signature]

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5607078481

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000028832 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA				COO. AGE: 560				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
09	11	2022	23:59	28	10	2022	23:59	30	05	2023	23:59	214	09	11	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
28	10	2022	23:59	30	05	2023	23:59	214							

DATOS DEL TOMADOR				IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340			
NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA				CIUDAD: GARZON, HUILA			
DIRECCIÓN: KR 7 N 9 47 CA 2				TELÉFONO: 6088332529			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO				IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340			
ASEGURADO: FERNANDO JIMENEZ ROA				CIUDAD: GARZON, HUILA			
DIRECCIÓN: KR 7 N 9 47 CA 2				TELÉFONO: 6088332529			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS				IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS				FECHA DE APROBACIÓN: 19 DIC 2022			
ASEGURADO: FERNANDO JIMENEZ ROA				CIUDAD: SUAZA			
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA				FIRMA DEL RESPONSABLE: MANZANA			
DIRECCIÓN: SEGUN CONTRATO							
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA							
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO				TIPO DE RIESGO: ESTATAL			

DESCRIPCION		AMPAROS		SUMA ASEGURADA		INVAR		SUBLIMITE	
CONTRATO		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		\$ 400,000,000.00		400,000,000.00			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES									
BENEFICIARIOS									
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS									

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: FERNANDO JIMENEZ ROA C.C. 12.192.340 Y/O GOBERNACION DEL HUILA NIT: 800.103.913-4
BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL HUILA NIT: 800.103.913-4 Y/O TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****400,000,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****703,562	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****133,677	TOTAL A PAGAR: \$ *****837,238
--	--	---	--------------------------------	--

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ	CLAVE 8958	%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	FIRMA TOMADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá	MACUNARPATRI 0

CBDE207F0F08F47A57 CLIENTE 19-12-2022

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2500 DIO93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5607078481

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO.
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: NEIVA	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:	DIA MES AÑO 09 11 2022
AG. RAM. POL.: 560 _74 _ 994000028832	\$ 837,238.00	FECHA DE IMPRESIÓN
NOMBRE: JIMENEZ ROA FERNANDO	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340	
FORMA DE PAGO	CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐	VALOR PAGADO
COD. BANCO No. CHEQUE		\$



(415)7701861000019(8020)000000000007000560707848

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito
RECAUDO VERDE	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir.
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(1) 3849444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco Davivienda convenio banco # 1040955 o CNR 1004050 Ref. 1 No. Documento, Ref 2 No. electrónico 10 dígitos. Banco de Occidente Banco de Bogotá	Efectivo ó Cheque
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo

* CORRESPONSALES DE RECAUDO		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Éxito	\$9.999.999
2) LA 14	Supermercados	\$9.999.999
3) PUNTO DE PAGO Grupo Aval	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$4.000.000
4) MOVIRED	Tiendas y puntos autorizados	\$1.500.000
5) EFECTY	Convenio No. 6792 y Número electrónico	\$ 500.000
6) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	\$ 500.000
7) COPIDROGAS	Draguerías afiliadas	\$ 300.000
8) CONRED	Monito máximo \$1.000.000 Convenios No. 1040955 y/o 1004050 Referencia:	
9) PUNTORED	Número electrónico para pagos	

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque).
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, balcón y por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:
www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

5607078481

NOMBRE: JIMENEZ ROA FERNANDO	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340	DIA MES AÑO 09 11 2022
		FECHA DE IMPRESIÓN
FORMA DE PAGO	CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐	VALOR PAGADO
COD. BANCO No. CHEQUE		\$



(415)7701861000019(8020)000000000007000560707848


DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

OP

POLIZA INTERVENTORIA 1

GALLARDO



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2022.11.11 12:03:38 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
INTERCOMUNICACIONES EN INTERNET Y VOZ
TELÉFONO 0202 4712321 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VIAJES CLASIFICADO 30-07-2021-3317-P-06-PPS/SEGUROS/0001-0001

100 800 027 013-6
SOMOS CAMIONES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTOMATIZADOS

Código de Seguridad: XvEz65YvWVzPR0qCsBQ==

No. PÓLIZA	IV-180814452	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34261082	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN		11/11/2022		SUC. EXPEDIDORA		AGENCIA RESNA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 horas Del		28/10/2022		21:00 horas Del		28/04/2023	
TOMADOR		PERDOMO VELASCO, LUIS		No. DOC. IDENTIDAD		7.697.592	
DIRECCIÓN		CALLE RMO.34-92		TELÉFONO		3168641874	
ASEGURADO		PERDOMO VELASCO, LUIS		No. DOC. IDENTIDAD		7.697.592	
DIRECCIÓN		CALLE RMO.34-92		TELÉFONO		3168641874	
BENEFICIARIO		TERCEROS AFECTADOS		No. DOC. IDENTIDAD			
DIRECCIÓN				TELÉFONO			

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.1464 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H118 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDENIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA LUIS PERDOMO VELASCO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL HUILA

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	199.452,00
PATRIONAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,28
GOBERNACION DEL HUILA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION FECHA DE APROBACION 17 NOV 2022				
INTERMEDIARIOS			TOTAL ASEGURADO	\$ 200.000.000,00
ARTICULO PERDOMO ASESORES DE SEGUROS			% PARTICIPACION	
AGENCIAS			100,00	
DISTRIBUCION COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/11/2022				
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA				
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y VERIFICAR AUTENTICIDAD DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2006 SUMIN. FINANCIERA).				
CUMPLIDA LA OBLIGACION DE ESTA POLIZA INCLUIDO EL SEGURO POR MUNDIAL SEGUROS S.A. EN LA FORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ANTERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIGILA LA EFECTUACION DE ESTE SEGURO CON EL PAGO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712/3				
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍAS DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA, EN LA CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADICIONAL, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AGO INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACUPO Y DEJEO TANTO LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.				

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reduciendo responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

17-11-2022



su compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

No. PÓLIZA	IV-100034452	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34201002	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA SETVA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 28/10/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 28/04/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DEL HUILA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL


DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV





Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2022.11.11 11:45:30 -06:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
EXPOSICIÓN CENTRAL CALLE 12A N° 14-1000000-1-1-950771
TELÉFONO 2820000 FAX 2821770 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

HIT 000027.913-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KKH1P4MK8MCLrs70btp0A==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1802

VERSION CLASIFICADA 06-04-2021-1317-P-05-PPC-SEGUROS000059-COMI

No. PÓLIZA	NV-108077104	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34261593	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA RETVA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 28/10/2022		24:00 Horas Del 28/04/2023		N/A		N/A	
TOMADOR		PERDOMO VELASCO, LUIS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A	
DIRECCIÓN		CALLE BND 34-92		No. DOC. IDENTIDAD		7.057.592	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL HUILA		TELÉFONO		316641874	
DIRECCIÓN		CALLE 8 CRA 4 ESQUINA		No. DOC. IDENTIDAD		880.183.913-4	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL HUILA		TELÉFONO		8713281	
DIRECCIÓN		CALLE 8 CRA 4 ESQUINA		No. DOC. IDENTIDAD		880.183.913-4	
				TELÉFONO		8713281	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIANO, 1463 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 3.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H18 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

NOTA: "CALIDAD DEL SERVICIO"

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA INTERVENTORIA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA ASEGURADORA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/10/2022	24:00 Horas Del 28/10/2023	\$6.120.400,00	193.017,00
BUEN RANEO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 28/10/2022	24:00 Horas Del 28/10/2023	\$4.180.600,00	151.525,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/10/2022	24:00 Horas Del 28/04/2023	\$6.120.400,00	794.747,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/04/2023	24:00 Horas Del 28/04/2023	\$6.120.400,00	585.637,00
GOBERNACION DEL HUILA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION			TOTAL ASEGURADO	\$ 252.541.800,00
INTERMEDIARIOS ARCELA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS			PRIMA BRUTA	\$ 1.052.926,09
FECHA DE APROBACION 17 NOV 2022			DESCUENTOS	\$
DISTRIBUCION DE SEGUROS			EXTRA PRIMA	
COMPAÑIA			PRIMA NETA	\$ 1.052.926,09
TIPO COASEGURO			GASTOS EXP.	\$ 7.830,00
POLIZA LIDER			IVA	\$ 281.537,94
CERTIF. LIDER			TOTAL A PAGAR	\$ 1.362.293,98
% PARTICIPACION				

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2000 SUPERINTENDENCIA).

CONFIRMAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A: PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARÁ EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO Y VIVA LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712/73

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍAS DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AGES INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.	TOMADOR	Líneas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713
---	---------	--

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

17-11-2022

TRAMITE

 GOBERNACION DEL HUILA HUILA CRECE SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL			
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - ARDA-20221106: 111039HDA-DT-CONT22			
Contribuyente:	C 7697592	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO	Fecha Expedicion: 06-11-2022
Direccion:	CALLE # 34-82 CASA 5-1	Telefono: 8705615	No. Recibo Pago
Asociado:	CONTRATO	1464-2022	Fecha Limite Pago: 30-11-2022
		Impuesto: 27 CONTRATOS	202200079863
			Base Gravable 235,800,000
Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Total Concepto
013	CONTRATOS CON GACETA ORDENANZA 04 FEBRERO 17 DE 2021	180000/100	\$180,000
015	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2/100	\$4,716,000
016	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	1.5/100	\$3,537,000
017	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4/500/100	\$4,236
187	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	.5/100	\$1,179,000
		Total a Pagar	\$9,616,200

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 2. FINANCIERO Y CONTABLE

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

**PLAN DE INVERSION
ANTICIPO APROBADO
09-02-2023**



GOBERNACIÓN DEL HUILA

Hoja 1 de 1

Fecha:
01-ene-23

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

DATOS GENERALES



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE VIAS
Dibujos elaborados en el estudio de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia

CONTRATO No. 1354 de 2022 PROGRAMACIÓN INICIAL ☒ REPROGRAMACIÓN ☐

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALOR CONTRATO: \$ 3.450.118.172
ANTICIPO 30%: \$ 1.035.035.451,60

CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de Salarios, Jornales y aportes del personal	\$ 144.971.000,00	14,00%
2	Transporte y Alquiler de Maquinaria	\$ 400.064.451,60	38,65%
3	Compra de Materiales y Accesorios	\$ 400.000.000,00	38,65%
4	Compra de combustible	\$ 90.000.000,00	8,70%
TOTAL		\$ 1.035.035.451,60	100,00%

NOTA: Los Porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Aprobado 9/01/2023

FERNANDO JIMENEZ ROA
C.C. 12.192.340 de Garzon (Huila)

Vo. Bo. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

46

ANEXO 3 PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA SEMANAL

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

CRONOGRAMA APROBADO

09-02-2023

[illegible]

APR 08 2023
Fecha: 9/02/2023

**PROGRAMA FLUJO DE
FONDOS APROBADO
09-02-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022**
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1**LUIS MIGUEL PERDOMO**
INTERVENTORIA EXTERNA**ANEXO 4 BITACORA**

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

01/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

El día anterior se llevó a cabo la socialización del proyecto ante la comunidad con la participación del personal profesional del contratista, interventoría y supervisión. Finalizada la socialización se procedió a continuar la veeduría del proyecto.


Actividades realizadas en la jornada

- Calibración de los equipos de topografía.
- Cheques de mojoneros y ubicación de deltas.
- Ubicación del abscisado y replanteo de ejes del tramo K20+620 - K20+860.
- Radicación de la Solicitud de la Veeduría ante personería del municipio de Sucre.


Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:
Director de obra, Topógrafo, inspector de obra y cadeneros.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:
Director de interventoría, Residente de interventoría e inspector de interventoría.

Materiales y equipos empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, nivel topográfico, herramienta menor y camioneta.



Residente de obra



Residente de interventoría

00 00 1-23

Elaboración de la memoria

Elaboración de la memoria


- Elaboración de la memoria
- Elaboración de la memoria

Elaboración de la memoria

Elaboración de la memoria

Elaboración de la memoria


Resolución de la memoria


Resolución de la memoria

Viernes 03/02/2023

Estado del tiempo: Sin Sol

Actividades realizadas en la jornada:

- Desplazamiento del material de obra a la obra, transporte de materiales y mano de obra.
- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.
- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.
- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.
- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.
- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.
- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.


Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:


Director de obra, ingeniero, Inspector de obra, conductor, conductor de tractor, excavadora y conductor de tractor.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

- Director de interventoría, Inspector de obra, conductor de tractor, conductor de tractor.

Equipos e maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades: Estación total, Nivel alfiler, Herramienta manual, Yunque, Excavadora, Camión de obra y Camioneta.


Ing. Residente de obra



Sábado 04/02/2023

Estado del tiempo: Lluvias intensas

Actividades realizadas en la jornada:

- Ingreso de 22 m³ de piedra al concremento.

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:


Residente de obra, Inspector de obra y Conductor de tractor.


Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Residente de interventoría e Inspector de obra.

Equipos e maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Yunque, Camión de obra


Ing. Residente de obra



Lunes 06/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Trabajos realizados en la jornada:

- Desplazamiento del eje obra en el terreno y toma de topografía inicial del tramo K21+420 - K21+520.
- Releante de ejes del tramo K21+400 - K21+420.
- Ubicación y contranivelación de los deltas del tramo K21+400 - K21+420.
- Ingreso de 30 m³ de piedra filtro al campamento.
- Ingreso de 8 m³ de piedra filtro al campamento.
- Ingreso al campamento de 10 tubos de concreto de 36".

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, inspector de obra, topógrafo, operador de retroexcavadora y conductor de volquete.


Personal de interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de intervención y topógrafo.

Maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estado del nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volquete, picos y camoneta.


Ing. Residente obra



MAIPES 07/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Trabajos realizados en la jornada:

- Desplazamiento del eje del tramo K21+690 - K22+000
- Ubicación y contranivelación de los ejes y deltas del tramo K21+800 - K22+000
- Ubicación de choffones y toma de topografía inicial del tramo K21+700 - K22+000
- Ingreso de 70 m³ de piedra filtro al campamento.
- Ingreso al campamento de 8 tubos de concreto de 36".

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, inspector de obra, topógrafo, operador de retroexcavadora y conductor de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de intervención y topógrafo.

Lunes 06/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.

Actividades realizadas en la jornada:

- Desplazamiento del eje, ubicación de chafones y toma de topografía inicial del tramo K21+40 - K21+50.
- Replanteo de ejes del tramo K21+60 - K21+70.
- Nivelación y contranivelación de los deltas del tramo K21+60 - K21+70.
- Limpieza de la zona del campamento.
- Ingreso de 50 m³ de piedra filtro al campamento.
- Ingreso al campamento de 6 tubos de concreto de 36".

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductor de volquete.

Personal de interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría y topógrafo.

Maquinaría empleada en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volquete, bombeo y camioneta.


Ing. Residente obra

Martes 07/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:

- Desplazamiento del eje del tramo K21+60 - K22+00.
- Nivelación y contranivelación de los ejes y deltas del tramo K21+80 - K22+10.
- Ubicación de chafones y toma de topografía inicial del tramo K21+70 - K21+80.
- Ingreso de 70 m³ de piedra filtro al campamento.
- Ingreso al campamento de 8 tubos de concreto de 36".

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductor de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría

topografía.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora,
Volqueta doble tiro y Camioneta.



Ing. Residente obra

Miércoles 08/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.

Actividades realizadas en la jornada: _____

- Desplazamiento del eje del tramo K21+790 - K22+120.
- Ubicación de chafalanes y toma de topografía inicial del tramo K21+810 - K22+000.
- Ingreso de 30 m³ de piedra filita al campamento.
- Ingreso de 42 m³ de base granular al campamento.
- Recorrido por el tramo vial con la participación del personal profesional del Contratista y la interventoría.


Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:

- Director de obra, Residente de obra, Inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductor de Volqueta.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

- Director de interventoría, Residente de interventoría, Ingeniero ambiental, Inspector de topografía y topógrafo.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora,
Volqueta doble tiro y Camionetas.




Ing. Residente obra

Jueves 09/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada: _____

- Nivelación del eje del tramo K21+490 - K21+790.
- Toma de topografía inicial del tramo K21+510 - K21+690.
- Replanteo de los ejes desplazados y ubicación de los chafalanes del lado derecho en el tramo K21+970 - K22+040.
- Ingreso de 42 m³ de base granular al campamento.



• Construcción y adecuación del Campamento.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, Inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora, conductor de volqueta.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:


Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría y topógrafo.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volqueta, doble traque y camioneta.



ing. Residente de obra



Viernes 10/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:

- Ubicación de los chaflanes del lado derecho en el tramo K21+920 - K22+000.
- Ingreso de 56 m³ de base granular al Campamento.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductor de volqueta.

Personal de interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría e inspector de interventoría.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volqueta doble traque y camioneta.



ing. Residente obra



Sábado 11/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.

Actividades realizadas en la jornada:

- Toma de topografía inicial en el tramo K21+920 - K22+120.
- Ubicación de los chaflanes del lado izquierdo K22+020 - K22+120.
- Ingreso de 14 m³ de base granular al Campamento.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Proyecto

Director de obra, Residente de obra, Inspector de obra, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductor de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:


Director de interventoría, Residente de interventoría e inspector de interventoría.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volquete, doble trazo y camioneta.



Ing. Residente de obra



Lunes 13/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:

- Ingreso de 28 m³ de arena al lote de acopio.
- Desdoblamiento del eje a la derecha en el tramo K21+230 - K21+270.
- Colocación de Choflanes del lado izquierdo y derecho del tramo K21+230 - K21+270.
- Toma de topografía inicial del tramo K20+620 - K21+100.
- Inicio de levantamiento de actas de vecindad.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:


Director de obra, Residente de obra, Inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductor de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, Residente de interventoría e inspector de obra.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volquete, doble trazo y camioneta.



Ing. Residente obra



Martes 14/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:

- Ampliación, Corte de talud y cargue de material en el tramo K21+100 - K21+430.

Jueves 16/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado


Actividades realizadas en la jornada:

- Cajeo de la vía K21+160 - K21+175.
- Ingreso de 28 m³ de base granular al campamento.
- Levantamiento de actas de vecindad.


Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:
Residente de obra, inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductores de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:
Director de interventoría, residente de interventoría e inspector de interventoría.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volquetes doble troque y camioneta.



ing. Residente de obra.



Viernes 17/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado


Actividades realizadas en la jornada:

- Ingreso de 28 m³ de base granular al campamento.
- Excavación y extracción de gasoducto en el tramo K21+151 - K21+260.

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:
Director de obra, residente de obra, inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductores de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:
• Director de interventoría, residente de interven, topógrafo e inspector de (e resid) interventoría.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retroexcavadora, volquetes doble troque y camioneta.



ing. residente obra



Sábado 18/02/2023

Estado del tiempo: Lluvia intensa durante toda la mañana.

Actividades realizadas en la jornada:

• Ingreso de 14 m³ de base granular al campanelo.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, inspector de obra y conductor de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría y topógrafo.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Volquete doble troque.



ing. Residente de obra



Lunes 20/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:

• Ingreso de 20 m³ de base granular al campanelo.

• Excavación y extracción de gasoducto en el tramo K21+260 - K21+350.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:

Director de obra, residente de obra, inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora y conductores de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría y topógrafo.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, retro excavadora, volquetas doble troque y camioneta.



ing. Residente obra



Martes 21/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:


• Excavación y extracción de gasoducto en el tramo K21+420 - K21+520.


• Señalización del área intervenida por la extracción del gasoducto en el

Tramo K21+420 - K21+325.

- Ingreso de 14 m³ de base granular al campamento.
- Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades: Residente de obra, ingeniero industrial, inspector de obra, topógrafo, operador de retroexcavadora, conductor de camión.
- Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades: Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría, topógrafo.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, Nivel topográfico, Herramienta menor, Retroexcavadora, Camión, doble trazo y camioneta.


ing Residente obra



22/02/2023 Miércoles

Estado del tiempo: Día Soleado

Actividades realizadas en la jornada:

- Excavación y extracción de la tubería de gas en el tramo K21+420 - K21+325.
- Ingreso de 14 m³ de base granular al campamento.
- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y carga de material proveniente de la excavación del tramo K21+395 - K21+405.
- Perfilado del talud del tramo K21+395 - K21+405.
- Transporte del material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K21+395 - K21+405.
- Durante el desarrollo de la excavación y extracción de tubería en el tramo K21+420 - K21+325, se causó un corte accidental en la tubería debido a las diferentes profundidades de la tubería, dicho daño se informó a la empresa Surgas quien es la firma que proporciona e instala el gas a centro cerrado de galardo para que realicen la recuperación. Debido al diámetro, la empresa dispuso personal de corte galardo, con el cual se realizó la actividad con éxito se solucionó el problema.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:


Residente de obra, ingeniero industrial, inspector de obra, topógrafo, operador de retroexcavadora, conductor excavadora y conductor de camión.

Personal de interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría,

y topografía.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
Estación total, nivel topográfico, herramientas menor, excavadora, retroexcavadora,
volquetes, dorso trípode y camioneta.



Ing. Residente obra



Jueves 23/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.

Actividades realizadas en la jornada:

- Limpieza de la zona de base granular al campamento.
- Ampliación del ancho de vía mediante excavación mecánica y cargue del material proveniente de la excavación del tramo K22+060 - K22+080.
- Perfilado de talud del tramo K22+060 - K22+080.
- Transporte de material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K22+060 - K22+080.

Personal de Asistatista presente en el desarrollo de las actividades:

Supervisor de obra, Ingeniero industrial, inspector de obra, topógrafo, cadeneras,
operador de retroexcavadora, operador de excavadora y conductores de Volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:


Director de interventoría, residente de interventoría, inspector de interventoría
y topógrafo.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramientas menor, excavadora, retroexcavadora,
volquetes, dorso trípode y camioneta.



Ing. Residente obra



Viernes 24/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.


Actividades realizadas en la jornada:

- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y cargue del material proveniente de la excavación del tramo K22+030 - K22+060.
- Perfilado del talud del tramo K22+030 - K22+060.
- Transporte de material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K22+030 - K22+060.

- Charla / Capacitación Sobre Salud y Seguridad en el trabajo.
- Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:
- Director de obra, Residente de obra, Inspector de obra, Cadeneros, Operador de retroexcavadora, operador de excavadora y conductores de volquete.
- Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:
- Director de interventoría, Residente de interventoría, Inspector de interventoría y topógrafo.
- Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
- Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, excavadora, retroexcavadora, Volquetes doble troque y Camioneta.



ing. Residente obra



Sábado 25/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.

Actividades realizadas en la jornada:

- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y Cargue del material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K22+030 - K22+030.
- Perfilado del talud del tramo K22+020 - K22+030.
- Transporte de material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K22+020 - K22+030.

- Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:
- Residente de obra, Ingeniero auxiliar, Inspector de obra, Topógrafo, Cadeneros, Operador de retroexcavadora, Operador de excavadora y Conductores de volquete.
- Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:
- Director de interventoría, Residente de obra, Ingeniero auxiliar, Topógrafo, Inspector de interventoría.
- Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:
- Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, excavadora, retroexcavadora, volquetes doble troque y Camioneta.



ing. Residente obra



27/02/2023

Estado del tiempo: Día Soleado.

Actividades realizadas:

- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y cargue de material proveniente de la excavación del tramo K21+970 - K22+000.

- Perfilado del talud del tramo K21+970 - K22+000.

- Transporte de material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K22+000 - K22+020.

Personal del contratista presente en el desarrollo de las actividades:

- Residente de obra, ingeniero industrial (Sisuma), Inspector de obra, toreros, operadores de retroexcavadora, operador de excavadora y conductores de volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría y topógrafo.

Equipos e maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, excavadores, retroexcavadora, Volquetes doble tiro y Camioneta.



ing. Residente obra

Mañes 28/02/2023

Estado del tiempo: Nublado con presencia de lluvia leve en la mañana y totalmente nublado en la tarde.

Actividades realizadas en la jornada:

- Ingreso de 24 m³ de base granular al campamento.

- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y cargue del material proveniente de la excavación del tramo K22+080 - K22+120.

- Perfilado del talud del tramo K22+080 - K22+120.

- Transporte de material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K22+080 - K22+120.

- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y cargue del material proveniente de la excavación del tramo K21+940 - K21+970.

- Perfilado del talud del tramo K21+940 - K21+970.

- Transporte de material proveniente de la excavación a disposición final del tramo K21+940 - K21+970.

- Ampliación del ancho de la vía mediante excavación mecánica y cargue del material proveniente de la excavación del tramo K21+650 - K21+690.

• Pags. 82

• Trans.

• Pags.

• Diver

de st.

• Co

• Pags.

• D

• Es

• Es

• vo

- Perfilado del talud del tramo K21+650 - K21+690.

- transporte de material proveniente de la excavación y disposición final del tramo K21+650 - K21+690.

Personal del Contratista presente en el desarrollo de las actividades:


Director de obra, residente de obra, ingeniero industrial (SISOMA), inspector de obra, topógrafo, cadeneros, operador de retroexcavadora, operador excavadora y conductores de Volquete.

Personal de la interventoría presente en el desarrollo de las actividades:

- Director de interventoría, residente de obra e inspector de obra.

Equipos y maquinaria empleados en el desarrollo de las actividades:

Estación total, nivel topográfico, herramienta menor, excavadora, retroexcavadora, Volquetas doble tiro que y Camioneta.



Ing. Residente obra



ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 5 COMITES DE OBRA

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

02-08-2023

 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
		Código: SIG-GE-F-10
	ACTA DE REUNION EXTRAOFICIAL ASISTENCIA Y PARTICIPACION	

26

FECHA: 08 de Febrero 2023.	LUGAR DE REUNION: Frente de obra
TIPO DE REUNION: SSL ☐ ADMINISTRATIVA ☐ GERENCIAL ☐ OPERATIVA ☒ TERCEROS Y/O COMUNIDAD ☐	

ASISTENTES:

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	Leonardo A. Ruiz Maldonado	Ing. Residente de obra
2	Jhon Fredy Mayunga Cuellar	Ing. Residente interventoria
3	Francisco Javier Arias	Topógrafo interventoria
4	Luis Manuel Polania	Ing. ambiental interventoria
5	Jhonathan Duran	Inspector obra interventoria
6	Fernando Jimenez Martinez	Inspector de obra
7	Jairo Quiruga	Topógrafo
8		
9		
10		

ORDEN DEL DIA

1	Recorrido de obra para evaluar sitios críticos.	
2	Definir actividades por ejecutar.	
3	Hacer seguimiento a las actividades ejecutadas a la fecha	

DESARROLLO

El día 08 de Febrero de 2023, nos reunimos en el Frente de obra los abajo firmantes, con el objetivo de hacer seguimiento a los trabajos que adelanta el contratista en obra. Se realiza recorrido de los 1,5 km de vía a intervenir revisando las obras a ejecutar a lo largo del tramo, verificando anchos de vía, desplazamiento del eje de la vía y el nivel de la rosante. Durante este recorrido se define lo siguiente:

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA DE REUNION EXTRAOFICIAL ASISTENCIA Y PARTICIPACION

Versión: 001

Código:
SIG-GE-F-10

Página:
2 de 4

87

- En sitio a k20+936 del contrato, se establece suspender la construcción o restitución de la alcantarilla existente, debido a que esta se conecta con una línea de tubería existente de 24" (paralela a la vía), debido a lo que técnicamente no sería viable. solo ampliar el diámetro de una parte del tramo de tubería. Por lo anterior se establece en este punto implementar una placa en concreto reforzado sobre la caja y en la margen derecha implementar un sumidero lateral.
- en el k20+800 se define construir un sumidero en ambos costados para ayudar a encausar las aguas que siguen sobre la vía, a una caja existente que conecta con la Tubería de 24" que existe (paralelamente a la vía).
- se observa que la alcantarilla del k21+051, que se describe en los documentos técnicos del contrato no está a simple vista, lo que supone que está enterrada lo que implica una nueva ubicación y definir el permiso del Propietario para el descole.
- la alcantarilla a restituir del k21+151 (no hay problema)
- la Alcantarilla del k21+232 se define ampliar solo con 2 tubos en la margen derecha debido a que la obra existente está en buenas condiciones y con tubería de 36" (se define construcción de aleta en el encoche)
- Alcantarilla k21+350 → Demoler y restituir con construcción de aleta en encoche y Pantalla en descole.
- Anx culvert. k21+520 se establece su construcción de forma desgada.
- entre los abscisas k21+520 y k21+578 se establece correr el eje al costado derecho con el objetivo de reducir los cortes
- existe una alcantarilla en el k21+578 que no hace parte del inventario inicial que debe ampliarse en el costado izquierdo (se propone demoler aletas y extender la losa sobre la caja (alrededor de 50cm) para no demoler la caja debido a que es una obra nueva.
- Alcantarilla del k21+623 tampoco está inventariada en el Proyecto pero se debe demoler y reemplazar (hacer caja en encoche y descole aletas)
- Alcantarilla k21+800 se debe demoler y reemplazar (hacer caja en encoche y Aletas en descole)
- Alcantarilla k21+950 → Restituir (construir aletas en encoche y descole)
- Alcantarilla k22+000 → Restituir (aleta en encoche y cortina en descole)
- Alcantarilla k22+083 → obra existente en buen estado con tubería 36"

Fecha:
01-09-2017

Elaboró:
Profesional HSEQ

Revisó:
Gerente

Aprobó:
Gerente

DOCUMENTO CONTROLADO



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA DE REUNION EXTRAOFICIAL ASISTENCIA Y PARTICIPACION

Versión: 001

Código: SIG-GE-F-10

Página: 3 de 4

BB

se requiere ampliar en la margen izquierda con 2 tabos y construcción de
aletas en el es: encole.
- se solicita evaluar en el k22740 si es necesario construir un muro
o cortina en el costado derecho, debido a que el ancho de la vía es insuficiente
y si se realiza el corte en la ampliación se pondría en riesgo la estabilidad
del talud.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA
- Revisor Permiso para alcantarilla k22740			
- Entrega de las carteras de volúmenes, secciones, de la vía para revisión	Fernando Jimenez	20/ Feb/ 2017	
Entrega de diseño de la valla contrata.	interventoria.		
entrega del Paga, PMT. y PASO.	Fernando Jimenez		


Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNION EXTRAOFICIAL ASISTENCIA Y PARTICIPACION	Código: SIG-GE-F-10
		Página: 4 de 4


89


CIERRE

FIRMA: 
 CARGO: Ing. Residente de obra

FIRMA: 
 CARGO: RESIDENTE INTERVENCIÓN

FIRMA: 
 CARGO: Topógrafo

FIRMA: 
 CARGO: Apoyo Interventoría

FIRMA: 
 CARGO: Inspector Interventoría

FIRMA: 
 CARGO: Inspector Construcción

FIRMA: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

CARGO: _____

FIRMA: PRESIDENTE INTERVENCIÓN

CARGO: _____

FIRMA: _____

CARGO: _____

FIRMA: Asesor Ambiental

CARGO: _____

FIRMA: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

ACTA DE COMITÉ

23-02-2023



GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA

Fecha: 23 de FEBRERO de 2023 HOJA: 1 de 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO 1464 ORDEN CONVENIO
Contrato número: 1464 de 2022
Objeto del Contrato/Convenio:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES

Laura Polo 314 347 1684
Jhonatan Durán
Luis Manuel polania Suarez
Daniel Alberto polania A.
Jhon fredy Mayungo

ENTIDAD

Ing. Ambiental
Contratista
Ing. Inspector
Interventoria
A. Intervent
A. Intervent
Residente
Interventoria

FIRMA

[Firmas manuscritas de los asistentes]





GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACION

ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socializar con la Ingeniera Ambiental del Contratista, sobre unas actividades pendientes y concertada el día lunes 20 de febrero de la Secretaría de Infraestructura y vías del Departamento.

DESARROLLO DE LA REUNION

El día Jueves 23 de febrero 2029. Se solicita a la Ing. Ambiental Laura pdp, los Ingenieros Luis Manuel pelonia, Jhon freddy Mayunge, apoyo interventoria Jhonatan Duran. Tener listo la seguridad social de todo el personal, entregar actas de verificación, entregar el Plan de Adaptación del medio Ambiente, P.M.T, dotación de los EPP, armar el personal de obra, actualización de la Bitácora hasta la fecha, solicitar puntos ecológicos, Señalizaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra.



**ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA**

94

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. On the left side, there is a vertical margin line, creating a narrow left margin. The paper appears to be slightly aged or off-white. There is no handwriting or other markings on the page.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300 ext 1400
FAX 8712767 e-mail: seducacion@huila.gov.co, serchhila@sedhuila.gov.co
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACION

ACTA DE COMITE VISITA DE OBRA

Actividad Compromiso <small>De acuerdo al cronograma de trabajo</small>	Estado de avance de la actividad / Compromiso <small>en porcentaje</small>	Justificación / Observacion <small>Relacionada con el estado de avance de la actividad</small>
Entregar las Actas de Verindad forma parcial para el día 28 de febrero.	60%	No está cumplido ya que se encuentran el propio texto de la Compro y tiene que haberse verificado el proceso de presentación de la Afiliación a la Interventoría.
Entregar el día 25 de febrero las Planillas de Seguridad Social (afiliaciones a seguridad social)	85%	
Tramitar los EPP de todo el personal en formato.	100%	para el 28 de febrero, entregar registro o formato de los EPP.
Entregar reportes de tramites de permisos Ambientales para el 28 de febrero.	30%	se está en espera de respuesta de la Corporación Ambiental (Trámite).
Entregar el día de primeros Auxilio en obra, punto ecológico en la obra Hidroeléctrica para el personal técnico y de obra.	90%	obrar en campo.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Actas de verindad (forma parcial)	28 febrero	Ing. Laura Polo Guzmán
Afiliaciones Seguridad Social	25 febrero	Ing. Laura Polo Guzmán
Permisos Ambientales (Trámite)	Trámite	Ing. Laura Polo Guzmán
Reportes primeros Auxilios	25 febrero	Ing. Laura Polo Guzmán
Hidroeléctrica personal	25 febrero	Ing. Laura Polo Guzmán
EPP personal	28 febrero	Ing. Laura Polo Guzmán

Fecha de la próxima reunión: Jueves 16 de Mar 20 de 2023



ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA


ANEXO 6. CONFORMACION DE VEEDURIA Y ACTA DE SOCIALIZACION

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

CONFORMACION DE VEEDURIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO – PERSONERIA
NIT: 891180191-2



08 de febrero de 2023, Suaza Huila

Señores,
VEEDORES COMUNITARIOS
FERNANDO JIMENEZ MARTINES
fernandojimenezroa1@gmail.com
Suaza Huila

Oficio No. 020-2023

Ref: RECONOCIMIENTO VEEDURIA CIUDADANA.

Cordial saludo

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacerle entrega de copia autentica de la Resolución No.004 del 08 de febrero de 2023, Por medio de la cual, se reconoce la inscripción en el registro público de La Personería Municipal de Suaza, veeduría ciudadana del CONTRATO N° 1354 DE 2022, denominada "VEEDURIA AL CONTRATO N° 1354 DE 2022".

Lo anterior, de acuerdo a lo solicitado por usted mediante oficio de fecha 01 de febrero de 2023, para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo dos (2) folios

Atentamente,

DIONEL MARIA VARGAS CASTRO
Personero Municipal



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO – PERSONERÍA
NIT: 891180191-2



RESOLUCIÓN No.004
(08 Febrero de 2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE VEEDURIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SUAZA HUILA"

EL PERSONERO MUNICIPAL DE SUAZA HUILA,

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003 y,

CONSIDERANDO:

Que el día primero (01) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), fue presentado ante esta personería el acta de constitución de Veeduría ciudadana denominada "VEEDURIA AL CONTRATO N° 1354 DE 2022", cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL101 QUE DEL CENTRO POBLADO GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20° EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, con el fin de solicitar la inscripción, constituida dentro de la organización civil.

Que una vez revisada el acta de constitución cuya inscripción se solicita, se establece que se encuentran reunidos los requisitos señalados en el artículo 3 de la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Inscribir el acta de constitución de Veeduría ciudadana, denominada "VEEDURIA AL CONTRATO N° 1354 DE 2022", constituida dentro de la organización civil plural de personas, en el registro Público bajo el número 2023-03.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer Personería para los efectos propios de la Ley 850 de 2003, en calidad de veedores comunitarios del contrato N° 1354 de 2022", cuyo objeto es mantenimiento de vías terciarias mediante la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO – PERSONERIA
NIT: 891180191-2



construcción de 1.5 KM de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del Centro Poblado Gallardo conduce al cruce ruta 20ª en el municipio de Suaza, Departamento del Huila a:

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
GUILLERMO MEDINA CERQUERA	4.881.107	GALLARDO/3115313181
MOISES QUESADA QUINTERO	83.056.559	GALLARDO/3188856827
ORLANDO PEREZ	17.640.694	GALLARDO/3107620375
MIGUEL MEDINA ANTURI	83.182.312	GALLARDO/3203869850

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha, con una vigencia de seis meses o la duración del contrato de obra N°1354 de 2022 sin exceder el término de un (1) año y contra ella procede por vía gubernativa el recurso de reposición. En firme remítase copia a las autoridades administrativas encargadas de la vigilancia del Proyecto.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del Señor Personero Municipal de Suaza Huila, el ocho (08) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023).

DIONEL MARIA VARGAS CASTRO
Personero Municipal

Suaza - Huila, 31 de enero de 2023


01/02/23 09:39 am
16 fo 1101

Señores
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SUAZA
Aten. DIONEL MARÍA VARGAS CASTRO
Personero Municipal
Calle 7a No 3-07
Ciudad

Asunto: Solicitud inscripción de Veeduría Ciudadana.

Cordial saludo.

Adjunto a la presente comunicación el Acta mediante la cual los abajo firmantes solicitamos sea inscrita veeduría denominada: VEEDURÍA AL CONTRATO No.1354 DE 2022, con el objeto de ejercer la vigilancia y control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila, en el registro de veedurías de la Personería de Suaza, conforme a lo consagrado en la ley 850 de 2003.

Agradecemos nos sea notificado el registro solicitado en:

Correo electrónico: fernandojimenezraa@gmail.com

Teléfono: 313 297 3657

Atentamente,

Firma: 

Nombre: Fernando Jimenez Martinez -

CC. 1.007.609.211 de Garzon

ACTA NÚMERO 01
CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Suaza- Huila, a los (31) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en asamblea general las personas abajo firmantes en el corregimiento de Gallardo; quienes manifestaron su intención de conformar una veeduría ciudadana y ejercer vigilancia sobre la gestión pública, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes sobre participación ciudadana.

Para presidir la asamblea fue elegido(a) Guillermo Medina Ceguera.
, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.881.107- de Acuerdo

En desarrollo de la reunión, se acuerdan los siguientes puntos:

1. Los aquí presentes se constituirán de manera autónoma e independiente en una veeduría ciudadana denominada: VEEDURIA AL CONTRATO No.1354 DE 2022 y conformada por habitantes del municipio de Suaza, Departamento del Huila con el objeto de ejercer la vigilancia y control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
2. Se ha dispuesto elegir como integrantes de la veeduría a los siguientes ciudadanos:

NOMBRE COMPLETO	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN COMPLETA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Guillermo Medina C.	CC-4.881-707-	Gallardo	3115313181	—
Moses Quesada G.	CC-83.096-559	Gallardo.	3168856827	—

NOMBRE COMPLETO	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN COMPLETA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Orlando Perez-	Cc. 17.640.674.	Gallardo	3107620375	—
Miguel Medina	Cc. 83.182.312	Gallardo	3203669850	—

3. Se ha acordado que la Veeduría aquí solicitada, se constituirá por un periodo de seis 6 meses o la duración del contrato de obra No. 1354 de 2022, contados a partir de la inscripción de la misma ante la Personería Municipal de Suaza.
4. La Veeduría citada tendrá como domicilio principal la siguiente dirección Cruce Timaná - Diagonal Iglesia Gallardo del municipio de Suaza, Departamento del Huila, con Correo electrónico maiscquesadaquintero@gmail.com
5. El ámbito de ejercicio o nivel de vigilancia de la veeduría será en la vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de suaza, Departamento del Huila.
6. Manifestamos de manera libre y espontánea que SI (X) NO () aceptamos ser notificados por medio del Correo electrónico:
7. Como soporte del debido registro de los veedores, anexamos las respectivas aceptaciones individuales de su designación como veedor y las fotocopias del documento de identificación de cada uno de ellos.
8. Nuestra acción en el ejercicio constitucional de participar en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública se regirá por los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad política y legalidad.
9. Nuestros actos serán públicos y con carácter propositivo y preventivo para evitar la desviación de las acciones y demás aspectos relacionados con esta veeduría y colaborar así en asegurar la eficacia social.

10. La función de esta veeduría será autónoma y su finalidad lograr la mayor eficacia y control ciudadano; y el ejercicio de las funciones como veedores no generará para los integrantes de la veeduría ninguna contraprestación económica por parte del Estado.

11. Los resultados de nuestra gestión serán periódicamente informados a la comunidad y a los organismos de control.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 11:50 AM. del día 31 de enero de 2023, y para constancia se firma por quienes participaron en la conformación y constitución de la Veeduría Ciudadana.

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
GUILLEN MEDINA CERQUEZA	9881107	<i>G. Medina Cerqueza</i>
MOISES QUESADO QUINTANA	83056559	<i>M. Quesado</i>
ORLANDO PEREZ	17640694	<i>Orlando Perez</i>
MIGUEL MEDINA ANTUN	83182312	<i>Miguel Medina</i>

Anexos:

- Formatos de aceptación del cargo
- Copia documentos de identidad

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 4.881.107
MEDINA CERQUERA

APELLIDOS
GUILLERMO

HOMBRES

Guillermo Medina Cerquera
FIRMA



NO CE DEBECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1957

TELLO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

17-ENE-1978 ACEVEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amiel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMIEL SANCHEZ TORRES



A 1507600 00135410 M-0004881107-20081209 0007823847A J 21034881

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo MOISES QUESADA QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 83056559 de Compiques, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.

Moisés Quesada

Nombre: Moises Quesada

C.C. No. 83056559

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

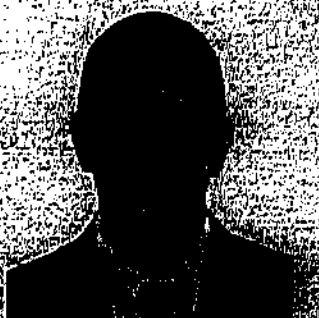
NUMERO: 83.056.559

QUESADA QUINTERO

APELLIDOS
MOISES

NOMBRES

Moises Quesada




FECHA DE NACIMIENTO: 20-ABR-1966

GUADALUPE

(HUICA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-1986 GUADALUPE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL RIVERA TORRES



A-1907600-00213554-M-0083056559-20100208 0020750356A 2 -28296454

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo ORLANDO PEREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 17640694 de FLORENCIA, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.



Nombre: Orlando Perez
C.C. No. 17640694

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
17.640.694

PEREZ

APELLIDOS
ORLANDO

NOMBRES
Orlando Perez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-OCT-1964

FLORENCIA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

28-ENE-1985 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES

INDICE DERECHO



A-4400100-00648345-11-0017640094-20141120 0041481100A 8083164920

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo MIGUEL MEDINA ANTONI, identificado con cedula de ciudadanía No. 83182312 de ACUESO, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA; DEPARTAMENTO DEL HUILA, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.

Miguel Medina
Nombre: Miguel Medina
C.C. No. 83182312

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 83182312

APELLIDOS: MEDINA ANTURI

NOMBRES: MIGUEL

Miguel Medina





FECHA DE NACIMIENTO: 17-SEP-1974

ACEVEDO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO: 1.71 O+ M

ESTATURA: 1.71 G.S. RH: O+ SEXO: M


20-JUN-1994 ACEVEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 20-JUN-1994 ACEVEDO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL BLANCHET TORRES



A-1800100-00195470-M-0083182312-20091110 0017884649A 1 6700471021

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 4 de 9

ASISTENTES:

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	José Eissenhoffer Velasco	José E. Velasco
2	Guillermo M. Soria	Guillermo M. Soria
3	Encarnación Ruesada	ER/Ruesada
4	Orlando Pérez	OP
5	M. Ruby Rivera	M. Ruby Rivera
6	Alvaro	Alvaro
7	Luzmarina	Luzmarina Araveno
8	ARMANDO VARGAS PIAZAS.	ARMANDO VARGAS PIAZA
9	Gilberto Silva	Gilberto Silva
10	Edgar Plaza V.	Edgar Plaza V.
11	ISIDORO	B
12	Luis Eduardo Plaza V.	LEP

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001 Código: SIG-GE-F-01 Página: 5 de 9
	ACTA DE REUNIÓN	

13	José A. Rivera	JAR
14	Adelson Silva	Adelson
15	Eduardo Ramírez	Eduardo
16	Edilberto Ramírez	Edilberto Ramírez
17	Miguel Medina	Miguel Medina
18	Olivia Ramos Silva	Olivia R
19	JOHN CAPUATAI	JA
20	Luis	Luis
21	Lucila Plaza	Lucila Plaza
22	Guillermo Plazas	Guillermo P
23	Edgar Sotomayor	Edgar Sotomayor
24	Carlos Alvaro Anaya	Carlos
25	Tulio Gillo	Tulio Gillo
26	Luis Emilio Correa	Luis Correa

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 6 de 9

NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA
27	<i>Arturo B. Bermudez</i>	<i>Arturo B. Bermudez</i>
28	<i>CRISTIAN ANDRES ORTIZ</i>	
29	<i>Wilson Rojas N</i>	
30	<i>DURAN DURAN</i>	
31	<i>Anibal Valenzuela</i>	<i>Anibal Valenzuela</i>
32	<i>Juan Sebastian Cuellar Valenzuela</i>	<i>Juan Sebastian Cuellar</i>
33	<i>Olmedo Porza</i>	<i>Olmedo Porza</i>
34	<i>Maria Adela Castro</i>	<i>Maria Adela Castro</i>
35	<i>Arturo B. Bermudez P.</i>	<i>Arturo B. Bermudez P.</i>
36	<i>Marcelo Silva E.</i>	<i>Marcelo Silva E.</i>
37	<i>Ricardo Silva</i>	<i>Ricardo Silva</i>
38	<i>José Angel Vieda Rado</i>	<i>José Angel Vieda Rado</i>
39	<i>SHAN FREDY MAYORCA WELLMAN</i>	<i>Shan Fredy Mayorca Wellman</i>

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 7 de 9

40	Wils Pailys Fariña	<i>[Signature]</i>
41	Jonathan Aldo 150 Duran	<i>[Signature]</i>
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

SOCIALIZACION DEL PROYECTO

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 1 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
ING. DIEGO VARGAS	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA -GOBERNACION DEL HUILA
DR. MOISESE ORTIZ ALARCON	ALCALDE DE SUAZA
DR. DUBER ALEXANDER RAMOS C.	SECRETARIO PLANEACION MUNICIPIO DE SUAZA
ING. FENANDO JIMENEZ ROA	R.L. DEL CONTRATO DE OBRA
ING. LEONARDO RUIZ MALDONADO	RESIDENTE DE OBRA
FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	INSPECTOR DE OBRA
LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	APOYO AMBIENTAL Y SISO
ING . LUIS MIGUEL PERDOMO V.	CONTRATISTA - INTERVENTOR
ING. LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO	CORDINADOR DE INTERVENTORIA
ING. JHON FREDY MAYUNGO CUELLAR	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. JHONATAN ADOLFO DURAN	INSPECTOR DE INTERVENTORIA
	COMUNIDAD DEL CENTRO POBLADO GALLARDO

Nota: Se adjunta listados de asistentes a socialización

OBJETO DE LA REUNION:

Socialización por parte de la Gobernación del Huila del contrato de obra No. 1354 de 2022 que tiene por objeto: **MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza. DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 2 de 9
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila	FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

A las 10:00 A.M del día 31/01/2023; como se tenía programado se da inicio a la socialización de proyecto en el centro poblado Gallardo en el Municipio de Suaza; Toma la palabra el Ing. DIGO VARGAS por parte de la Gobernación del Huila – Secretaria de vías E infraestructura, quien agradece la asistencia del equipo de obra e interventoría, señor alcalde del Municipio de Suaza, Secretario de Planeación del Municipio de Suaza y de la comunidad en general que hace presencia en el polideportivo cubierto del centro poblado.

Toma la palabra el Ing. LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO, para hacer la presentación del contratista de obra con su equipo de apoyo; como también hace la presentación del equipo de apoyo de la interventoría encabezado por su coordinador general el Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO.

Posteriormente le seden la palabra al contratista de obra e interventoría quienes hacen la presentación de sus equipos de trabajo quienes van estar a cargo del proyecto.

Seguidamente toma la palabra el ingeniero FERNANDO JIMENEZ ROA, contratista de obra quien explica el alcance del proyecto y manifiesta que los trabajos que se van a realizar son los siguientes:

- Tramo a intervenir 1.5 km
- Conformación de calzada existente.
- Suministro e instalación de base granular de 0,15 m.
- Pavimento Rígido MR-40, espesor (0,20) m, juntas de dilatación selladas, texturizado, pasadores transversales en hierro liso de 1" de diámetro, longitud 0,35 m, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0,85 m separadas 1,20 m, curado con antisol.
- Construcción de Bordillo
- Reposición de 9 alcantarillas.
- Construcción de un Box Culvert.
- Línea de demarcación.
- Tachas reflectivas.

Toma la palabra el señor alcalde del Municipio de Suaza, quien da un cordial saludos a los asistentes, seguidamente argumenta que el tramo en 300 ml llegando al centro el poblado requiere el cambio de alcantarillado, por tal motivo le pide respetuosamente al contratista de obra e interventoría, que hasta tanto no se haga el cambio de alcantarillado, no se intervenga este tramo, igualmente manifiesta el compromiso de la Administración Municipal de realizar la restitución del alcantarillado con el apoyo de la comunidad en mano de obra.

Seguidamente toma la palabra el Ing. James Andrade Zambrano coordinador de la interventoría, manifiesta que el plazo de ejecución del proyecto es de 6 meses y que es importe el compromiso que deben de tener todos los partes vinculados en este proyecto para sacarlo adelante, igualmente le recomienda al señor alcalde del Municipio de Suaza gestionar los recursos lo más pronto posible para poder realizar el cambio de alcantarillado y así poder intervenir el tramo de 300 ml a que hizo referencia. Agrega el Ing. Andrade

	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 3 de 9
GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila	FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

Zambrano que para tener la claridad para la inversión de los recursos públicos en el objeto del contrato de obra No. 1354 de 2022; solicitara mediante comunicación escrita a la Alcaldía de Suaza el estado de las redes secas y húmedas del corredor objeto del mejoramiento. Dejando claro en esta acta de socialización que los recursos destinados por el contrato de obra No. 1354 de 2022; no se utilizaran para adelantar trabajos de redes de infraestructura de dicho corredor vial. Concluye el Ing. Andrade Zambrano la importancia para la comunidad crear la veeduría ciudadana para la vigilancia de los trabajos que se van a ejecutar, al mismo tiempo hace las aclaraciones a las dudas correspondientes que manifiesta la comunidad.

Toma la palabra el señor Alcalde para manifestar que una vez termine la socialización del proyecto se reunirá con la comunidad para abordar el tema del alcantarillado a restituir; mirando lo más conveniente para la ejecución del mismo; una propuesta rápida sería abordar la compra de la tubería como un suministro y mirarían la forma para su instalación.

Toma la palabra el fontanero para comunicar a los asistentes que se debe tener cuidado con una algunas tuberías que se encuentran superficiales en el tramo del proyecto a intervenir; como también hay que tener cuidado con la red eléctrica que surte la energía eléctrica al Colegio; red que se encuentra superficial al momento de cruzar la vía en la cual se realizaran los trabajos.

La comunidad en general agradece la disposición por parte de la Gobernación del Huila por adelantar los trabajos en este sector del municipio; solicitando que ojalá la obra se construya dentro del tiempo estipulado en el contrato; el cual corresponde a seis (6) meses.

Una vez terminada la intervención de todas las personas vinculadas en el proyecto, se procede a conformar el comité de veeduría ciudadana por parte de la comunidad que asisten a la socialización.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1354 de 2022:

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FERNANDO JIMENEZ ROA		
	NIT / C.C.:	12.192.340		
	DIRECCIÓN:	Carrera 7 No. 9-47 Casa 1	TEL:	8332529
	CIUDAD:	Garzón -Huila		
	REPR. LEGAL	FERNANDO JIMENEZ ROA		
	C. C. No. :	12.192.340 de Garzón – Huila		

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 4 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.		
VALOR DE CONTRATO:	\$ 3.450.118.172 VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO:	Se acordó que será el 1 de febrero siempre y cuando el contratista de obra presente toda la documentación solicitada por parte de la interventoría.		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	DICIEMBRE 19 de 2022	No. Póliza:	560-74-994000028832
		No. Póliza:	560-74-9940000156756
		Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:	DICIEMBRE 7 de 2022		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 DE 2022:

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA O CONVINIENIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO	
	NIT / C.C.:	7697592	
	DIRECCIÓN:	CARRERA 10 A 134B 82 AP 303	TEL: 31558641874
	CIUDAD:	Neiva	
	REPR. LEGAL	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO	
	C. C. No. :	7.697.592 de Neiva	

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 6 de 9
	<p>- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022</p> <p>OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila</p>		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023


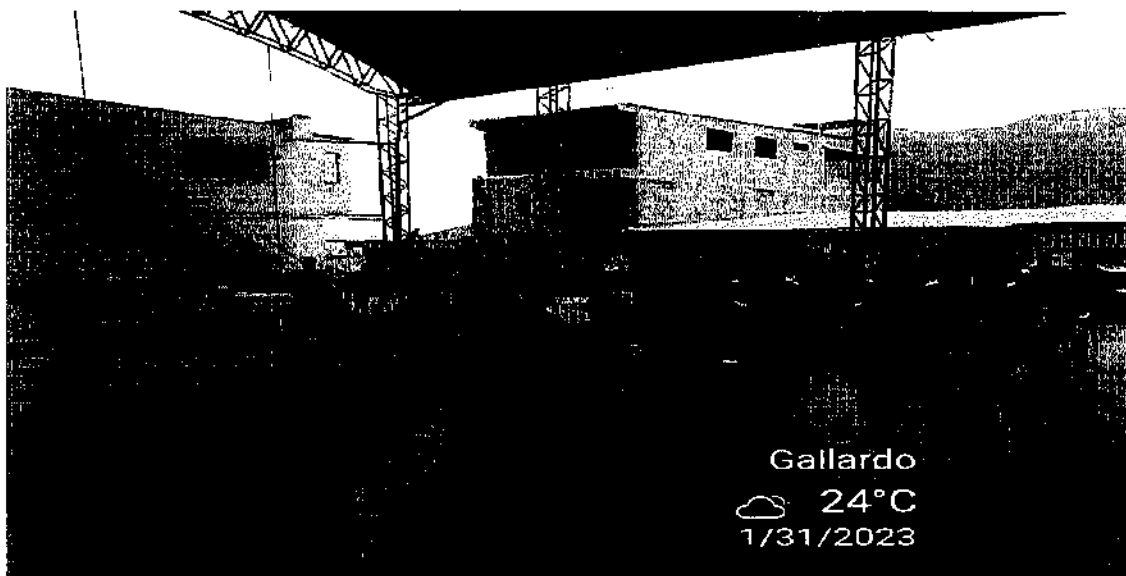
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.



SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 7 de 9
GOBERNACION DEL HUILA	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO	FECHA: Día: 31 Mes:01 Año: 2023
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	




GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 8 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023



GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	SOCIALIZACION DEL PROYECTO - CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	Página 9 de 9 FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023
--	--	--




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 4 de 9

ASISTENTES:


	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	José Essenhöfer Velasco	José E Velasco
2	Guillermo Al. Sison	Guillermo Al. Sison
3	Armando PucBano	Armando PucBano
4	Edmundo Perez	Edmundo Perez
5	M. R. R. R.	M. R. R. R.
6	Alvaro	Alvaro
7	LUZMARINO	LUZMARINO
8	ARMANDO VARGAS PLAZAS	ARMANDO VARGAS PLAZAS
9	Gilberto Silva	Gilberto Silva
10	Edgar Plaza	Edgar Plaza
11	Isidoro	Isidoro
12	José Eduardo Plaza Y.	José Eduardo Plaza Y.

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 5 de 9

13	José A. Ríos	JAR
14	Adolfo Silva	Adolfo
15	Eduardo Ramírez	Eduardo
16	Eduardo Ramírez	Eduardo Ramírez
17	Nicol Medina	Nicol Medina
18	Alba Ramos Silva	Alba RS
19	JHON CARVAJAL	JA
20	Rodrigo	Rodrigo
21	Luis Plaza	Luis Plaza
22	Guillermo Flores	Guillermo F.
23	Edgardo Martínez	Edgardo Martínez
24	Carlos Alvarado	CA
25	Tulio Gillo	Tulio Gillo
26	Luis Emilio Correa	Luis Correa

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
		Código: SIG-GE-F-01
	ACTA DE REUNIÓN	Página: 6 de 9

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
27	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
28	CRISTIAN ANDRES GONZALEZ	
29	WILSON ROSAS M	
30	<i>[Handwritten signature]</i>	
31	Anibal Valenzuela	<i>[Handwritten signature]</i>
32	Juan Sebastian Cuellar Valenzuela	<i>[Handwritten signature]</i>
33	Olmedo POZA	<i>[Handwritten signature]</i>
34	Maria Leda Castro	Maria Leda Castro
35	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
36	Marcelo Silva E.	Marcelo Silva E.
37	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
38	José Angel Nieto Bardo	<i>[Handwritten signature]</i>
39	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

50

ANEXO 7. CONTROL DE PERSONAL

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

CONTROL PERSONAL DE OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5K. DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES FEBRERO CONTRATO No. K204520 AL K224120 SECTOR

CONTRATISTA FERNANDO JIMENEZ ROA

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PERSONAL																												
LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO - RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ INSPECTOR DE INTERVENTORIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
FERNANDO JIMENEZ ROA DIRECTOR DE INTERVENTORIA																												
JAIR QUIROGA PENAGOS TOPOGRAFO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
CARLOS HERRAN TRUJILLO CADENERO 1	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
RUBEN JOVEN PENA CADENERO 2	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
LAURA NATALIE POLO CUEMAN INGENIERA AMBIENTAL																												
EDWIN ARLEY TOLEDO PAIDA OPERADOR DE MAQUINARIA																												
SEBASTIAN POLO GOMEZ OPERADOR DE MAQUINARIA																												
SEBASTIAN CLAROS OPERADOR DE VOLQUETA																												
LEONARDO FERNALOSA RAMIREZ OPERADOR DE VOLQUETA																												
DANIAN VERGARA OPERADOR DE VOLQUETA																												
NATALIA ALEJANDRA DUARTE CONTROLADORA VIAL																												
NATALIA ALEJANDRA DUARTE CONTROLADORA VIAL																												

Firma Nombre Residente de Obra

Firma Nombre Residente de Interventoria

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022**
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1**LUIS MIGUEL PERDOMO**
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 8 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

CONTROL EQUIPO Y MAQUINARIA CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5K. DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA."

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA
MES FEBRERO CONTRATO No. 1354 DE 2022 SECTOR K20+620 AL K22+120
CONTRATISTA FERNANDO JIMENEZ ROA

MAQUINA		DIA																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
EXCAVADORA DE ORUGA- CATERPILLAR -22.5 TON	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
VOLQUETA INTERNATIONAL 8.8 TON	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
VOLQUETA INTERNATIONAL 8.8 TON	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
VOLQUETA KODIAK 6.5 TON	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
VIBROCOMPACTADOR INGERSON	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	
CARROTANQUE	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	
																						</							

CONVENIO-RES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma Nombre: Residente de Obra

Firma Nombre: Residente de Interventoria

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022**
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 4SHL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila"

INFORME MENSUAL
No.1**LUIS MIGUEL PERDOMO**
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 9. CONTROL DEL TIEMPO

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

CONTROL DEL TIEMPO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5K, DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA."

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHAS	CONTRATO No.	SECTOR	SECTORES
1354 DE 2022		K20+620 AL K22+120	

FERNANDO JIMENEZ ROA

[illegible]

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

Firma
Nombre:

Residente de Odra

Firma
Nombre:

Residente de Interventoria

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO10 CONTROLIMPLEMENTACION PMT

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

CONTROL IMPLEMENTACION PMT

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5K. DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA."

CONTROL DIARIO DE IMPLEMENTACION PMT
MES FEBRERO CONTRATO No. 1354 DE 2022 SECTOR K20+620 AL K22+120

CONTRATISTA		FERNANDO JIMENEZ ROA																											
SEÑAL	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
6 MALETINES		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
12 COLOMBINAS		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
3 CONOS		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
TRABAJADOR EN LA VIA		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
CINTA DE PELIGRO		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
VIA CERRADA								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	

Firma	Firma
Nombre:	Nombre:
	Residente de Obra
	Residente de Interventoria

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 11. CONTROL SS

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS DE OBRA



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 04/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario: CC 12192340
Nombres y Apellidos del Usuario: FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 11	06/02/2023	CC 83182410	TOLEDO PAIVA EDWIN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CEE79C45612C855D65AB79054E0FEF17

Certificado impreso el día 2/4/2023 9:42:02 AM por el portal de empresas Edesk




Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros
 @PositivaCol
 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mi emprendimiento



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

EDWIN ARLEY

TOLEDO PAIVA

83192410

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



147



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del
FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

EDWINARLEY TOLEDO PAIVA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **83.182.410**, se encuentra afiliado(a)
al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes





NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 07/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5388835	07/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	83182410	EDWINARLEY TOLEDO PAIVA	1732828	OPERADOR DE CARGADORA,	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
 Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
 Dirección: KR 7 9 47
 Departamento: HUILA Municipio: GARZON
 Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
 Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
 CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 23	09/02/2023	CC 1077869634	VERGARA QUINTERO DUNKAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:35:49 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01-8000-111-170.
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros
 @PositivaCol
 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Proveedor de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

DUNKAN

VERGARA QUINTERO

1077069634

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 600.224.808-6

CERTIFICA QUE:

DUNKAN VERGARA QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.869.634**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario: CC 12192340
Nombres y Apellidos del Usuario: FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1.20	09/02/2023	CC 1075265954	POLO GUZMAN LAURA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:09:23 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros
 @PositivaCol
 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Proveedor de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

LAURA NATHALIE

POLO GUZMAN

1075265994

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.838-9

CERTIFICA QUE:

LAURA NATHALIE POLO GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.075.265.994**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400643	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE/COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1075265994	LAURANATHALIE POLO GUZMAN	1500000	INGENIERO AMBIENTAL	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZON
Correo electrónico: FERNANDJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario: CC 12192340
Nombres y Apellidos del Usuario: FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 25	09/02/2023	CC 1077859432	PEÑALOZA RAMIREZ LEONARDO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:41:34 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros
 @PositivaCel
 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Proveedor de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

LEONARDO FABIO

PEÑALOZA RAMIREZ

1077859432

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.908-8

CERTIFICA QUE:

LEONARDO FABIO PENALOZA RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.859.432**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400676	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1077859432	LEONARDO FABIO PEÑALOZA RAMIREZ	1382828	CONDUCTOR VOLQUETA	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 13/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
 Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
 Dirección: KR 7 947
 Departamento: HUILA Municipio: GARZON
 Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
 Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
 CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 26	14/02/2023	CC 36288084	DORADO VIVEROS LEONILDE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

B63B2BAA8FFCDE0A9E51617F041C751B

Certificado impreso el día 2/13/2023 3:04:30 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
 es de todos



**EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO**

Diríjase a la Institución Proveedor de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

LEONILDE**DORADO VIVEROS**

36288004

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5415516	13/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	36288084	LEONILDE DORADO VIVEROS	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-02-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 13/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA Municipio: GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 27	14/02/2023	CC 1004158514	CUELLAR DUARTE NATALIA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B63B2BAA8FFCDE0A9E51617F041C751B

Certificado impreso el día 2/13/2023 3:08:17 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. - Nit: 860.011.153-6 - Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Economía



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

**NATALIA ALEJANDRA
CUELLAR DUARTE**

1004158514

FERNANDO JIMENEZ ROA
12192340

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) CUELLAR DUARTE NATALIA ALEJANDRA identificado(a) con CC número 1.004.158.514 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de noviembre de 2022 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 13 de febrero de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com

00000000000000000000



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5415497	13/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1004158514	NATALIA ALEJANDRA CUELLAR DUARTE	1160000	OBRAERO DE CONSTRUCCION	2023-02-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA Municipio: GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJ.MENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 22	09/02/2023	CC 1077566257	CLAROS ESPINOSA SEBASTIAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:33:52 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la
Unica Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

SEBASTIAN
CLAROS ESPINOSA
1077866257

FERNANDO JIMENEZ ROA
12192340



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-6

CERTIFICA QUE:

SEBASTIAN CLAROS ESPINOSA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.077.866.257, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400855	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1077866257	SEBASTIAN CLAROS ESPINOSA	1382828	CONDUCTOR VOLQUETA	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZÓN
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario: CC 12192340
Nombres y Apellidos del Usuario: FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1-19	09/02/2023	CC 1077873988	POLO GOMEZ JUAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 11:01:31 AM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170, Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

① Positiva Compañía de Seguros ② @PositivaCol ③ PositivaColombia



El emprendimiento es de todos





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JUAN SEBASTIAN

POLO GOMEZ

1077873986

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400496	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1077873988	JUANSEBASTIAN POLO GOMEZ	1500000	OPERADOR DE CARGADORA,	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIAN POLO GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.873.988**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

SEGURIDAD SOCIAL

Cargo: INGENIERO AMBIENTAL
EPS: NUEVA EPS
ARL: SORA
APP: COLPENSIONES
DIRECCION: CALLEGA 1 # 39-12

177
Correo electronico: Carlosgarcia0907@gmail.com
Celular: 3115787331
Paguar por: \$ 1.800.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 1.054.226.415

GARCIA RUIZ
ATILIO


CARLOS EDUARDO
RUIZ

Carlos Eduardo Garcia Ruiz
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO: 09-JUL-1989
SAN MATEO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO:
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-AGO-2007 SAN MATEO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VARGAS

INDICE DERECHO



P:0724700-3416-1041-M-1054226415-20071115 017310731BN 02 277148273



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

198

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/01/2023

REGISTRADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 7697592 **Cédula Usuario:** CC 7697592
Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
Dirección: CL 8 34 92
Departamento: HUILA **Municipio:** NEIVA
Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
Teléfono: 8700515 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES. INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
CC 7697592

Nombres y Apellidos del Usuario
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 56	17/01/2023	CC 1054226415	GARCIA RUIZ CARLOS	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

7EBAE5BBC4CDE513D2C1524D03803827

Certificado impreso el día 1/16/2023 10:45:28 AM por el portal de empresas Edesk


Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mintadencia



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

CARLOS EDUARDO

GARCIA RUIZ

1054226415

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7897592

119



180

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/01/2023, el empleador PERDOMO VELASCO LUIS MIGUEL identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 7697592 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5262437	16/01/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1054226415	CARLOSEDUARDO GARCIA RUIZ	1800000	INGENIERO AMBIENTAL	2023-01-17

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Enero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE


Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS EDUARDO GARCIA RUIZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1054226415**, se encuentra afiliado/a desde **16/04/2012** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de enero de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO identificado(a) con CC 7697592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PERDOMO VELASCO LUIS MIGUEL CC 7697592																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-12	2022-12	1871838361	9445593489	I	2023-01-19																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$4,000,000					\$640,000											
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$4,000,000					\$20,000											
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$4,000,000					\$20,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$4,000,000					\$278,400											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$4,000,000					\$500,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-11	2022-11	1832295922	9444622243	I	2022-12-26																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$4,000,000					\$640,000											
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$4,000,000					\$20,000											
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$4,000,000					\$20,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$4,000,000					\$278,400											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$4,000,000					\$500,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-10	1761706160	9442781887	I	2022-11-17							X										
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$4,000,000					\$640,000											
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$4,000,000					\$20,000											
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$4,000,000					\$20,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$4,000,000					\$278,400											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$4,000,000					\$500,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-09	1705551396	9441398197	I	2022-10-14									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$8,084,500					\$1,293,600											


 aportes
en línea

Certificado de Aportes

PERDOMO VELASCO LUIS MIGUEL CC 7697592

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-09	1705551396	9441398197	I	2022-10-14									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$8,084,500					\$40,500											
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$8,084,500					\$40,500											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$8,084,500					\$562,700											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$8,084,500					\$1,010,600											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-08	1688650924	9439748018	I	2022-10-04																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-07	1601761555	9438473743	I	2022-08-16																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-06	2022-06	1547285256	9437175097	I	2022-07-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-05	2022-05	1547272117	9435857826	I	2022-07-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											

184

PERDOMO VELASCO LUIS MIGUEL CC 7697592

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-05	2022-05	1547272117	9435857826	I	2022-07-11																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-04	2022-04	1463719659	9434918023	I	2022-05-18																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-03	2022-03	1463691198	9433732962	I	2022-05-18																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-02	2022-02	1349369487	9431783187	Y	2022-03-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		MEDIMAS EPS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-01	2022-01	1320831274	9430591784	I	2022-02-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,500,000					\$560,000											
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	6.96%	\$3,500,000					\$243,600											
EPS		MEDIMAS EPS		30	12.5%	\$3,500,000					\$437,500											

Este certificado se expide el día 2023-02-06 a las 03:04.

ARL = SULA Riesgo 5
EPS = SANITAS

Dirección: Calle 70 #242-02¹⁸⁵
Torre 11 Arto. 602
Balcones de los Hoyuelos

Fondo de pensión: Colfondos

Celular: 316 616 8791

Cargo: Director de intervención
Correo: diegomauricio456@hotmail.com

Afiliación por: \$ 1.900.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.227.937

POLANIA ANDRADE
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1988

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

26-ABR-2006 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALBERTO FERNANDO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-1900100-50150211-AI-1075227937-20060809

0040200221A 02 Z10481725

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 02/02/2023**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento: NI **Número de documento:** 7697592 **Cédula Usuario:** CC 7697592
Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
Dirección: CL 8 34 92
Departamento: HUILA **Municipio:** NEIVA
Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
Teléfono: 8700515 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
CC 7697592

Nombres y Apellidos del Usuario
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 60	03/02/2023	CC 1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE62B2C8C15E839CCA431D86B279888E

Certificado impreso el día 2/2/2023 1:36:18 PM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Ni: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol


 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mi negocio





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

DIEGO MAURICIO

POLANIA ANDRADE

1075227937

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7697592

128

Cargo: Topografo

EPS: Sanitas

AEL: SUBA 21050 5

AFP: Colpensiones

Dirección: Calle 7 nº 2-07 Barrio Lucero Alto Primer Piso.

Correo electronico: Pachox98@gmail.com
Celular: 3203410100

Afiliar por: El mínimo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CIUDAD DE BOGOTÁ

4.377.250

ARIAS SOLORZANO

FRANCISCO JAVIER



06-JUN-1978

ARMENIA
(CIUDAD)

1.71

A+

M

ARMENIA



0007015841

Nombre : Francisco Javier Arias solorzano

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): FRANCISCO JAVIER ARIAS SOLORZANO identificado con Cédula Ciudadanía No. 4377250, de la empresa LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 17/01/2023 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301011235832.

Dada en Bogotá, a los 16 días del mes de enero de 2023

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.





FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

FUA Digital No. 750123459

Página 1 de 2

CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Proceso Formulario con Firmas

Fecha de Radicación					

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite		2. Tipo de Afiliación		3. Régimen	
A. Afiliación ☐		A. Individual ☐		A. Contributivo ☒	
B. Reporte de Novedades ☒		B. Colectiva ☐		B. Subsidado ☐	
C. Beneficiario ☐		C. Institucional ☐			
4. Tipo de afiliado		5. Tipo de cotizante		Código (a registrar por la EPS)	
A. Cotizante ☒		A. Dependiente ☐			
B. Cabeza de Familia ☐		B. Independiente ☐			
C. Beneficiario ☐		C. Pensionado ☐			

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres		7. Tipo de documento de identidad		8. Número del documento de identidad		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento	
ARIAS		CC		4377250		Femenino ☐ Masculino ☐			
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre			
SOLORZANO		FRANCISCO		JAVIER					

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia		12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
		Tipo ☐ Condición ☐					
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL		16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso Base de Cotización - IB C		1,160,000	
18. Residencia		Teléfono Fijo		Teléfono Celular		Correo Electrónico	
CL 7207		(320) 341-0100		(320) 341-0100		pachok39@gmail.com	
Municipio / Distrito		Zona		Localidad / Comuna		Departamento	
NEIVA-HUILA		Urbana ☐ Rural ☐					

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres		20. Tipo de documento de identidad		21. Número del documento de identidad		22. Sexo		23. Fecha de nacimiento	
						Femenino ☐ Masculino ☐			
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres		25. Tipo de documento de identidad		26. Número documento de identidad		27. Sexo		28. Fecha de nacimiento	
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre			
B1						Femenino ☐ Masculino ☐			
B2									
B3									
B4									
B5									

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad		Tipo		Condición	
						F N M		T P	
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

32. Datos de residencia

Municipio / Distrito		Zona		Departamento		Teléfono fijo y/o Celular		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.)	
		Urbana ☐ Rural ☐							
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

Selección de la I.P.S. Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (A registrar por la EPS.)	
C			
B			
B			
B			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre del empleador		36. Tipo de documento de identificación		37. Número del documento de identificación		38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS.)	
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO				CC-7697592			
39. Ubicación		Dirección		Teléfono Fijo		Correo Electrónico	
Municipio / Distrito		Departamento					

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad		☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidado ☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado	
☐ 1. Modificación datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código <input type="text"/>			
☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando			



VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación		42. Fecha 17/01/2023	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino	Fecha de Radicación
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código <input type="text"/>	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
☐ 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud
☐ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
☐ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
☐ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☐ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
	
CC-177750-ARIAS FRANCISCO	CC-76975927-MIGUEL PERDOMO VECASCO

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo copia del documento de identidad	CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ SC ☐	Cantidad <input type="text"/> Total <input type="text"/>
☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente		
☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital		
☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital		
☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor		
☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia		
☐ 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres		
☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud		
☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas		
☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Provisión de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio		

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio <input type="text"/> Código del Departamento <input type="text"/>	67. Datos del SISBEN Número de Ficha <input type="text"/> Puntaje <input type="text"/> Nivel <input type="text"/>	68. Fecha de Radicación <input type="text"/>	69. Fecha de Validación <input type="text"/>
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido <input type="text"/> Segundo apellido <input type="text"/> Primer nombre <input type="text"/> Segundo nombre <input type="text"/>			
Tipo de documento de identidad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Número del documento de identidad <input type="text"/>	71. Firma del funcionario	

Observaciones:

APLICAR FECHA DE RETIRO A:		
Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial Caviedes Diaz Andres Mauricio C.C. No. <input type="text"/>	Sello de radicación	Sticker procesamiento 

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

enero 17, 2023 14:07

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **FRANCISCO JAVIER ARIAS SOLORZANO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **4377250**, se encuentra afiliado/a desde **09/02/2009** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de enero de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Agilizar por: \$ 1.750.000

193


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979
ARMERO (GUAYABAL)
(TOLIMA)

1.67 O+ M
SEXO

04-SEP-1997 IBAGUE

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARTURO SANCHEZ TORRES



A-2900100-00210760-M-0093413162-20100127 0020339948A 1 6370563105

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CENTRO DE REGISTRO

93.413.162
HENAO MELO
JAIME ANDRES
NACIONAL



Cargo: Especialista en Geotecnia Vial

Celular: 3112115677

EPS: Salud Total

AEL: SOEA

AFP: POLUGU12

Correo electronico: jaima.413@hotmail.com

Direccion: Calle 78 # 19-251 Casa no 1 Man2. 1 Popayan

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/01/2023
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 7697592 **Cédula Usuario:** CC 7697592
Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
Dirección: CL 8 34 92
Departamento: HUILA **Municipio:** NEIVA
Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
Teléfono: 8700515 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
 CC 7697592

Nombres y Apellidos del Usuario
 LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 50	17/01/2023	CC 93413162	HENAO MELO JAIME	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

7EBAE5BBC4CDE513D2C1524D03803827


Certificado impreso el día 1/16/2023 10:19:56 AM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

El emprendimiento es de todos

Mintado

**EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO**

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JAIME ANDRES**HENAO MELO**

93413162

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7697592

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

No de Radicación

4009634957

Fecha de Radicación

21/01/2013

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒	2. Tipo de afiliación A. Individual ☒ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado A. Colizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de colizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	6. Código (a registrar por la EPS) <input type="text"/>

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del colizante o cabeza de familia)

7. Apellidos y nombres HENAO Primer apellido	MELO Segundo apellido	JAIME Primer nombre	ANDRES Segundo nombre
8. Tipo documento de identidad CC	9. Número del documento de identidad 93413162	10. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	11. Fecha de nacimiento 01/01/1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

12. Discapacidad Tipo FPM	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	16. Administradora de Pensiones PORVENIR FPC	17. Ingreso base de colización - IBC 1750000
18. Residencia CL 8 10 78, Dirección CALI Municipio/Distrito	3112939307 Teléfono celular Urbano ☒ Rural ☐	ILMACHAVARRO.CONTADOR@GMAIL.COM Correo electrónico VALLE Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

V. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento

29. Parentesco		30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F N M	Condición I P
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				
32. Datos de residencia		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)		
Municipio/Distrito	Zona Urbana Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS VS UAB UNICENTRO CALI - VS VERSALLES		Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSUNICENTR - VSVERSALLE	
B			
B			
B			

35. Nombre o razón social LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO		36. Tipo de identificación CC	37. Número de documento de identificación 7697592	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
39. Ubicación CR 10 A 134B 02 AP 303 ED LISBOA Dirección		3714432 Teléfono	ILMACHAVARRO.CONTADOR@GMAIL.COM Correo electrónico	IBAGUE Municipio/Distrito TOLIMA Departamento

No de Radicación

4009634957

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
- ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
- ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado


VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación		Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo		Fecha de nacimiento		42. Fecha			
☐	☐	Femenino ☐ Masculino ☐		☐		1/7/01/12/01/23			
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones					
☐		☐		☐					

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☒ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1501 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. ☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

	
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva Institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
- Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN		68. Fecha de radicación		69. Fecha de validación	
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel			
☐	☐	☐	☐	☐			
70. Datos funcionario que realiza la validación							
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
☐		☐		☐		☐	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
☐		☐		☐			
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

M-PYG-F001 V 1.0-2018



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAIME ANDRES HENAO MELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **93.413.162**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 16 de Enero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:


Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.587.433


NUMERO
MAYUNGO CUELLAR

APELLIDOS
JHON FREDY

NOMBRES




FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1969
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ABR-1989 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADORA NACIONAL
ALVARO RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-1900100-50141001-M-0007687433-20060521 0357600140C 02 176029113

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 31/01/2023

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA

VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 7697592 Cédula Usuario: CC 7697592
 Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
 Dirección: CL 8 34 92
 Departamento: HUILA Municipio: NEIVA
 Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
 Teléfono: 8700515 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA; DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

 Cédula Usuario
 CC 7697592

 Nombres y Apellidos del Usuario
 LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 59	01/02/2023	CC 7687433	MAYUNGO CUELLAR JHON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

I.3.FRIS v.04

Cordial saludo,

 Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

21C357A50C9C76B23FF37D41CA75F89B


Certificado impreso el día 1/31/2023 4:51:24 PM por el portal de empresas Edesk


 Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia


 El emprendimiento
 es de todos

Afiliaciones



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JHON FREDY

MAYUNGO CUELLAR

7687433

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7687592

2a



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

FUA Digital No. 750142757

Página 1 de 2

CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Proceso Formulario con Firmas

Fecha de Radicación

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	A. Afiliación ☐	2. Tipo de Afiliación	- Colizante o Cabeza de Familia ☐	B. Colectiva ☐	D. De Oficio ☐	3. Régimen	A. Contributivo ☒
B. Reporte de Novedades ☒	A. Individual	- Beneficiario o Afiliado adicional ☐	C. Institucional ☐	B. Subsidio ☐			
4. Tipo de afiliado	A. Colizante ☒	B. Cabeza de Familia ☐	C. Beneficiario ☐	5. Tipo de colizante	A. Dependiente ☐	B. Independiente ☐	C. Pensionado ☐
				Código (a registrar por la EPS)			

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del colizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	MAYUNGO	CUELLAR	JHON	FREDY
7. Tipo de documento de identidad	CC	8. Número del documento de identidad	7687433	9. Sexo
				Femenino ☐ Masculino ☐
				10. Fecha de nacimiento

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia				12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
				Tipo ☐	Condición ☐	
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL		16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso Base de Cotización - IBC 2,500,000		
18. Residencia		Teléfono Fijo		Teléfono Celular		Correo Electrónico
Calle 32 6 75		(312) 309-5229		(312) 309-5229		plumiv@hotmail.com
Municipio / Distrito		Zona		Localidad / Comuna		Departamento
NEIVA-HUILA		Urbana ☐ Rural ☐				

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente colizante)

19. Apellidos y nombres			
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento
B1			Femenino ☐ Masculino ☐	
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	32. Tipo	33. Condición
B1			F N M T P	
B2				
B3				
B4				
B5				

32. Datos de residencia	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.)
Municipio / Distrito	
Zona Urbana ☐ Rural ☐	
Departamento	
Teléfono fijo y/o Celular	
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	

Selección de la EPS: Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la EPS.)
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO	
C	
B	
B	
B	

V - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS.)
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO		CC-7697592	
39. Ubicación	Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico
Municipio / Distrito		Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
- Código
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo Régimen
☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pro-pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino	Fecha de Radicación 42. Fecha 01/02/2023
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

43. EPS Anterior

44. Motivo de Traslado Código

45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- ☐ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☐ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

Thon Fredy Cuellar M.
CC-7687433-MAXIMILIANO THON

55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

CC-7697592-LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad
- Cantidad ☐ CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CO ☐ SC Total
- ☐ 57. Copia del documento de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- ☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- ☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- ☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- ☐ 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

71. Firma del funcionario

Observaciones:

APLICAR FECHA DE RETIRO A:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial

Caviedes Diaz Andres Mauricio

C.C. No.

Sello de radicación

Sticker procesamiento



Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

febrero 1, 2023 08:31



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHON FREDY MAYUNGO CUELLAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7.687.433, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 2 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.110.591.385**
DURAN CANO

APELLIDOS

JHONATAN ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUN-1998**
IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

28-JUN-2018 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA GARCIA



A-2900100-01032028-M-1110591385-20180818

0062310324A.1

57014040

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 25/01/2023**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento: NI **Número de documento:** 7697592 **Cédula Usuario:** CC 7697592
Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
Dirección: CL 8 34 92
Departamento: HUILA **Municipio:** NEIVA
Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
Teléfono: 8700515 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA. INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario CC 7697592 **Nombres y Apellidos del Usuario** LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 58	26/01/2023	CC 1110591385	DURAN CANO JHONATAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD0F269D673ED42C3661A49F6E6F9A21

Certificado impreso el día 1/25/2023 4:15:19 PM por el portal de empresas Edesk


Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

 Positiva Compañía de Seguros  @PositivaCol  PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111770**, en Bogotá (601) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JHONATAN ADOLFO

DURAN CANO

1110591385

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7697592



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

FUA Digital No. 750136550

Proceso Formulario con Firmas

Página 1 de 2

Fecha de Radicación

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)			
1. Tipo de trámite	A. Afiliación ☐	2. Tipo de Afiliación	A. Individual ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De Oficio ☐
B. Reporte de Novedades ☒		3. Régimen A. Contributivo ☒ D. Subsidiado ☐	
4. Tipo de afiliado	A. Colaborador ☐ D. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante	A. Dependiente ☐ D. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (a registrar por la EPS)			

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	DURAN	CANO	JHONATAN	ADOLFO
7. Tipo de documento de identidad	CC	8. Número del documento de identidad	1110591385	9. Sexo
				10. Fecha de nacimiento

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales			
11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
	Tipo ☐ Condición ☐		
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC	1,500,000
18. Residencia	Calle 14 N 6-47	Teléfono Fijo	(301) 686-9206
Municipio / Distrito	IBAGUE-TOLIMA	Localidad / Comuna	Departamento
Urbana ☐	Rural ☐		

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Datos complementarios

29. Parentesco		30. Etnia	31. Discapacidad	32. Tipo	33. Condición
				F N M	T P
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					
32. Datos de residencia		33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.)			
Municipio / Distrito	Urbana ☐ Rural ☐	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular		
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Selección de la I.P.S. Primera

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		35. Código de la EPS (A registrar por la EPS.)
EPS SANITAS CENTRO MEDICO IBAGUE		10312
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

36. Nombre o razón social	37. Tipo de documento de identificación	38. Número del documento de identificación	39. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS.)
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO		CC-7697592	
39. Ubicación	Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico
Municipio / Distrito		Departamento	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad	11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
☐ 1. Modificación datos básicos de identificación	☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación	13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo
☐ 3. Actualización del documento de identidad	☐ B. Régimen Subsidado
☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios	14. Traslado ☐ A. Mismo Régimen
☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS	☐ D. Diferente Régimen
Código <input type="text"/>	15. Reporte de fallecimiento
☐ 6. Reinscripción en la EPS	16. Reporte del trámite de protección al cosante
☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales	17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales	18. Reporte de la calidad de Pensionado
☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar	
☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando	

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo ☐ Femenino ☐ Masculino	Fecha de Radicación
<input type="text"/>	<input type="text"/>		42. Fecha 26/01/2023
43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	
	Código <input type="text"/>		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
☐ 49. Declaración de NO información del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
☒ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
☒ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
☒ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☒ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, representante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
 CC 111501355 DURAN JHONATAN	 CC 267073051 LUIS MIGUEL PARDON VELASCO

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo copia del documento de identidad	CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ SC ☐	Cantidad <input type="text"/>	Total <input type="text"/>
☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente			
☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital			
☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital			
☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor			
☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia			
☐ 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración susrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres			
☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud			
☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas			
☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio			

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBEN	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
Código del Municipio	Número de Ficha		
Código del Departamento	Puntaje		
	Nivel		
70. Datos funcionario que realiza la validación	71. Firma del funcionario		
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad		
<input type="text"/>			

Observaciones:

TIPO DE NOVEDAD RADICADA: Cambio Beneficiario Diferente a Cónyuge a Cotizante.
--

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Seller procesamiento
Caviedes Diaz Andres Mauricio		
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

enero 26, 2023 14:17



FORMATO DE ENTREGA DE CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS SAS

Nombre del Afiliado: JHONATAN ADOLFO DURAN CANO

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	SI	NO
Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SI	NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	SI	NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	SI	NO
Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SI	NO
¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con afiliación y prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular?	SI	NO

Jhonatan Adolfo Cano D.
Firma del Afiliado y Documento de Identidad 1110591385

26/01/2023
Fecha de Diligenciamiento

Firma a Ruego

A ruego del señor (a) JHONATAN ADOLFO DURAN CANO, quien se identifica con el documento CC-1110591385 quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo. Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor (a) JHONATAN ADOLFO DURAN CANO

El firmante a ruego

Huella Índice

Nombres y Apellidos: _____
Documento de Identidad: _____
Dirección de Domicilio: _____

Nombre del Afiliado: JHONATAN DURAN CANO

FORMATO DE AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS

JHONATAN ADOLFO DURAN CANO, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S, en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada en EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de comercialización, petición, recaudo, cobranza entre contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales: crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi estado de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en www.epssanitas.com. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico. La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Nombre Usuario: JHONATAN ADOLFO DURAN CANO

Identificación: CC - 1110591385

Fecha: jueves, enero 26, 2023

Jhonatan Adolfo Cano D.
Firma del Afiliado y Documento de Identidad
1110591385

BOGOTÁ, D.C., 27 de Enero de 2023

2023_1385984-34501110

Señor (a):

JHONATAN ADOLFO DURAN CANO

DURANCANOJHONATANDOLFO@GMAIL.COM

IBAGUE-TOLIMA

Referencia: Radicado No. 2023_1385984 del 27 de Enero de 2023

Ciudadano: JHONATAN ADOLFO DURAN CANO

Identificación: C.C. 1110591385

Tipo de Trámite: AFILIACIONES - Vinculación Inicial

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en la referencia, ha sido aceptada.


En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros Puntos de Atención Colpensiones (PAC); comunicarse con la línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, o con la línea gratuita nacional al 018000 41 0909, en donde estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.

Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle.

Documentos que anexó el usuario:

Tipo de documento	Cantidad folios
Formulario de afiliación al Sistema General de Pensiones.	1

Cordialmente,

LUIS GABRIEL REYES ESCOBAR
Director de Atención y Servicio (A)

Cargo: Especialista en Vías.
EPS: Sanitas
AEL: Sura
APP: Skandia


212
Direccion: Calle 18 #6-45
Correo electronico: joba10@hotmail.com
Celular: 3174016845



INDEX DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-1973
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1992, HONDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Asesoría
REGISTRADORIA NACIONAL
ALFABETIZACION LÓPEZ



A-2600100-58138884-M-0014322965-20051028 02152053010 02 196503134

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
74.322.965

BARRERA ARIAS
APELLIDOS

JORGE HERNAN
NOMBRE

[Signature]
FIRMA



Añalar Per: 3.500.000

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 16/01/2023
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 7697592 **Cédula Usuario:** CC 7697592
Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
Dirección: CL 8 34 92
Departamento: HUILA **Municipio:** NEIVA
Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
Teléfono: 8700515 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario **Nombres y Apellidos del Usuario**
 CC 7697592 LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 49	17/01/2023	CC 14322965	BARRERA ARIAS JORGE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

7EBAE5BBC4CDE513D2C1524D03803827

Certificado impreso el día 1/16/2023 10:14:25 AM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co


 Positiva Compañía de Seguros
  @PositivaCol
  PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Ministerio del Trabajo





EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JORGE HERNAN

BARRERA ARIAS

14322965

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7697592

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas

FUA Digital No. 750123450

Proceso Formulario con Firmas

Página 1 de 2

CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades ☐

2. Tipo de Afiliación: A. Individual ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De Oficio ☐

3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Colizante ☐ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de colizante: A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del colizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: **BARRERA** (Primer apellido) **ARIAS** (Segundo apellido) **JORGE** (Primer nombre) **HERNAN** (Segundo nombre)

7. Tipo de documento de identidad: **CC**

8. Número del documento de identidad: **14322965**

9. Sexo: **Masculino**

10. Fecha de nacimiento:

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales:

11. Etnia:

12. Discapacidad: Tipo Condición

13. Puntaje SISBEN:

14. Grupo de población especial:

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL:

16. Administradora de Pensiones:

17. Ingreso Base de Cotización - IBC: **3,500,000**

18. Residencia: Dirección **CL 18 6 45** Teléfono Fijo Teléfono Celular **(317) 401-6845** Correo Electrónico **joba10@hotmail.com**

Municipio / Distrito: **NEIVA-HUILA** Zona: Urbana ☐ Rural ☐ Localidad / Comuna: Departamento:

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente colizante)

19. Apellidos y nombres:

20. Tipo de documento de identidad:

21. Número del documento de identidad:

22. Sexo:

23. Fecha de nacimiento:

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres:

25. Tipo de documento de identidad:

26. Número documento de identidad:

27. Sexo:

28. Fecha de nacimiento:

Datos complementarios

29. Paremosco:

30. Etnia:

31. Discapacidad: Tipo Condición

32. Datos de residencia:

Municipio / Distrito: Zona: Urbana ☐ Rural ☐ Departamento: Teléfono fijo y/o Celular:

33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.):

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS:

Código de la IPS (A registrar por la EPS.):

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre: **LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO**

36. Tipo de documento de identificación:

37. Número del documento de identificación: **CC-7697592**

38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS.):

39. Ubicación: Dirección Teléfono Fijo Correo Electrónico Municipio / Distrito Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES**40. Tipo de Novedad**

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
Código
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidado
- ☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo Régimen
☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**41. Datos básicos de identificación**

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		Sexo Femenino ☐ Masculino ☐		Fecha de Radicación	
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						42. Fecha 17/01/2023	
43. EPS Anterior		44. Motivo de Traslado Código <input type="text"/>		45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones			

II. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- ☐ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☐ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

64. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
 CC-13322965-BARRERA JORGE	 CC-76975923-LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad
- Cantidad ☐ CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ SC ☐ Total
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- ☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- ☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- ☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- ☐ 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio <input type="text"/> Código del Departamento <input type="text"/>		67. Datos del SISBEN Número de Ficha <input type="text"/> Puntaje <input type="text"/> Nivel <input type="text"/>		68. Fecha de Radicación <input type="text"/>		69. Fecha de Validación <input type="text"/>	
70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido <input type="text"/> Segundo apellido <input type="text"/> Primer nombre <input type="text"/> Segundo nombre <input type="text"/>							
Tipo de documento de identidad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Número del documento de identidad <input type="text"/>		71. Firma del funcionario <input type="text"/>			

Observaciones:

APLICAR FECHA DE RETIRO A:


Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial

Caviedes Diaz Andres Mauricio

C.C. No.

Sello de radicación

Sticker procesamiento



Recuerdo que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

enero 17, 2023 14:33



**Skandia Pensiones y Cesantías S.A. con Nit. 800.148.514-2 como administradora
Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias**

Certifica

A Quien interese

Que JORGE HERNAN BARRERA ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número 14322965 se encuentra afiliado(a) a SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS bajo la afiliación número 700001154682, vigente desde el 1 de Abril de 2008.

La anterior certificación se expide por solicitud del afiliado en Bogotá el 16 de Enero de 2023.

Atentamente,

WALTER VALENZUELA CALDERON
Director de Servicio al Cliente

PORTAL-20221121-13:13-19361009

Bogotá
658 4000
484 1300

Resto del País
01 8000 517 526

Dirección
Av 19 # 109a - 30
Bogotá, Colombia

Correo
cliente@skandia.com.co

www.skandia.com.co



/SkandiaCol

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.075.447.916

HERMOSA TOVAR

APPELLIDO:

JUAN SEBASTIAN

RECONOCER:

JUAN Sebastian H.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

19-OCT-1989

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

23-OCT-2008 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amiel Sánchez Toimés
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMIEL SÁNCHEZ TOIMÉS



P 1900100-00205911-M 1075247916-20091223

0019294933G 1

20257543

Cargo: Cadenero
GPS: Sanitas

AFP: Porvenir

Dirección: Calle 17A #47A-21

Celular: 3138092298

Correo electrónico: sebashato@gmail.com

Afiliar por: El mínimo



POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA

VIGILADO

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): JUAN SEBASTIAN HERMOSA TOVAR identificado con Cédula Ciudadanía No. 1075247916, de la empresa LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 26/07/2022 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301011238546.

Dada en Bogotá, a los 16 días del mes de enero de 2023

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

ML_4_L_3_HRIS_V_04



Positiva Compañía de Seguros S.A. - N.I.T 860.011.153-6 - línea gratuita: 01-8000-111-170.
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
 es de todos

Mi emprendimiento



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIAN HERMOSA TOVAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.075.247.916**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 16 de Enero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

221

EPS: NUEVA EPS

Dirección: Carrera 6 #6-54 Barrio Loma Linda Palermo-Hula


Correo electrónico: lugar027@gmail.com

[illegible]

0-36-2987-7

UNCLASSIFIED

06/27/2011



27-105-1569

PALESTINE

173

Figure 1

11

CONCEPTS





POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

22

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DÍA 16/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 7697592 **Cédula Usuario:** CC 7697592
Nombre: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
Dirección: CL 8 34 92
Departamento: HUILA **Municipio:** NEIVA
Correo electrónico: pluismiv@hotmail.com
Teléfono: 8700515 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
CC 7697592

Nombres y Apellidos del Usuario
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 52	17/01/2023	CC 1080292763	GALINDO LAVAO LUIS	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

7EBAE5BBC4CDE513D2C1524D03803827

Certificado impreso el día 1/16/2023 10:26:16 AM por el portal de empresas Edesk

Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mi negocio



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (601) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

LUIS ERNEY

GALINDO LAVAO

1080292763

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

7697592



223

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/01/2023, el empleador PERDOMO VELASCO LUIS MIGUEL identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 7697592 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5262291	16/01/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1080292763	LUISERNEY GALINDO LAVAO	1500000	INSPECTOR DE OBRAS	2023-01-17

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Enero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección


NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GALINDO LAVAO LUIS ERNEY** identificado(a) con CC número **1.080.292.763** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 31 de julio de 2010 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de enero de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

00000000000000000000

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 - 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

Dirección: Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva - Huila

ENTIDAD CONTRATANTE

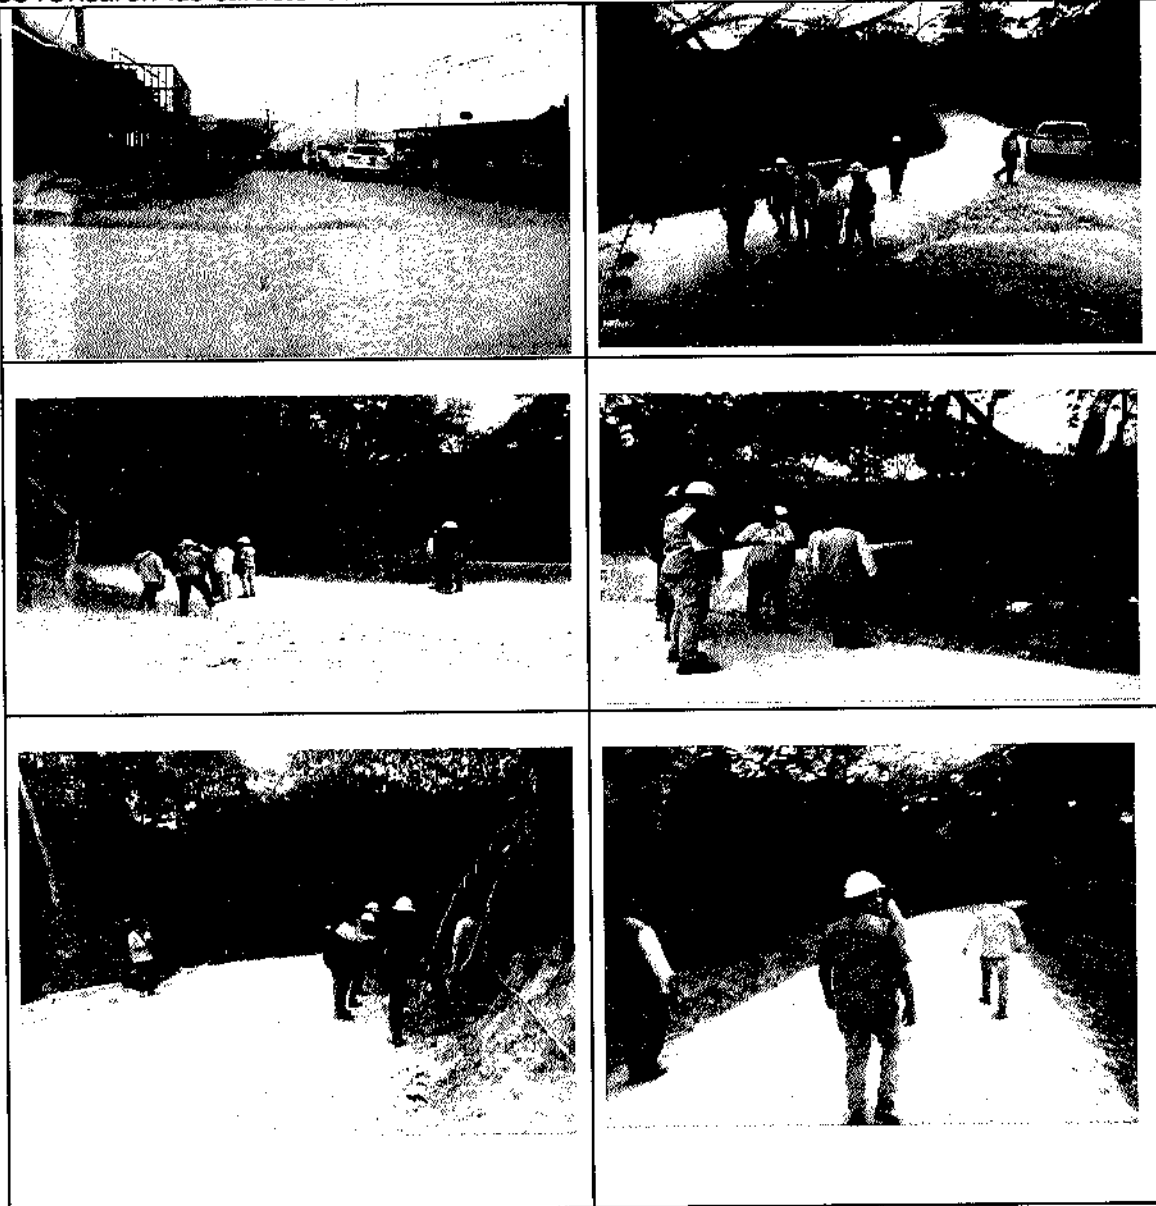

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

En recorrido realizado el día 8 de febrero 2023 en conjunto Interventoría y contratista, se revisaron las características del corredor vial a intervenir.



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
 No.1

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
 INTERVENTORIA EXTERNA

Estructuras encontradas. (Alcantarillas y Box Couvert)

ABS	Registro fotográfico	
	Encole	Descole
K20+736		
K20+800		
K21+051		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE




Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila"

INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

K21+151		
K21+232		
K21+350		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE


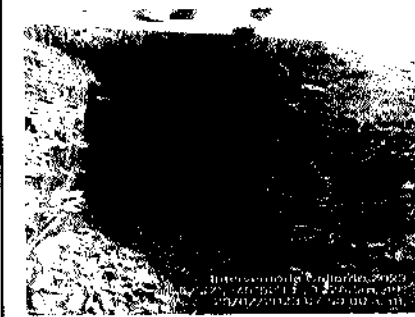
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
No.1


Gobernación del Huila



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA
K21+ 520
BOX COULVERT

K21+578

K21+623


Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

K21+800		
K21+965		
K22+005		
K22+086		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

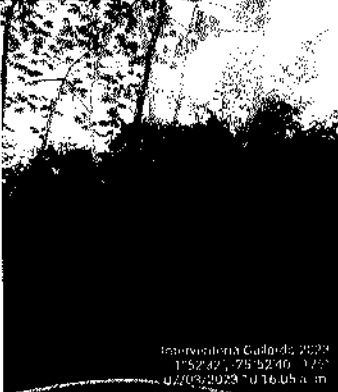
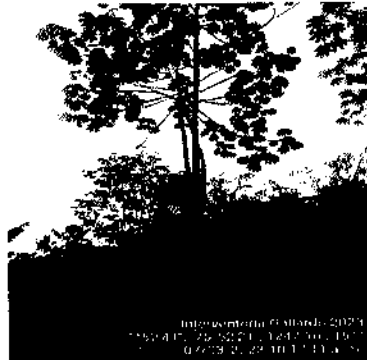

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022
INFORME MENSUAL
No.1


INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

Identificación de los arbóreos que se encuentran dentro la ampliación de la vía.

		
Árbol No. 1 abscisa 21+160	Árbol No. 2 abscisa 21+ 247	Árbol No. 3 abscissa 21+250
		
Árbol No. 4 abscisa 21+457	Árbol No. 5 abscisa 21+283	Árbol No.6 abscissa 21+295

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez

Celular: 3168641874

Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com

Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE

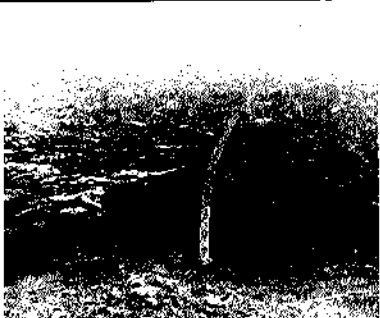




CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

		
Árbol No.7 abscisa 21+410	Árbol No. 8 abscisa 21+470	Árbol No. 9 abscissa 21+496
		
Árbol No.10 abscisa 21+535		

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
 Celular: 3168641874
 Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
 Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

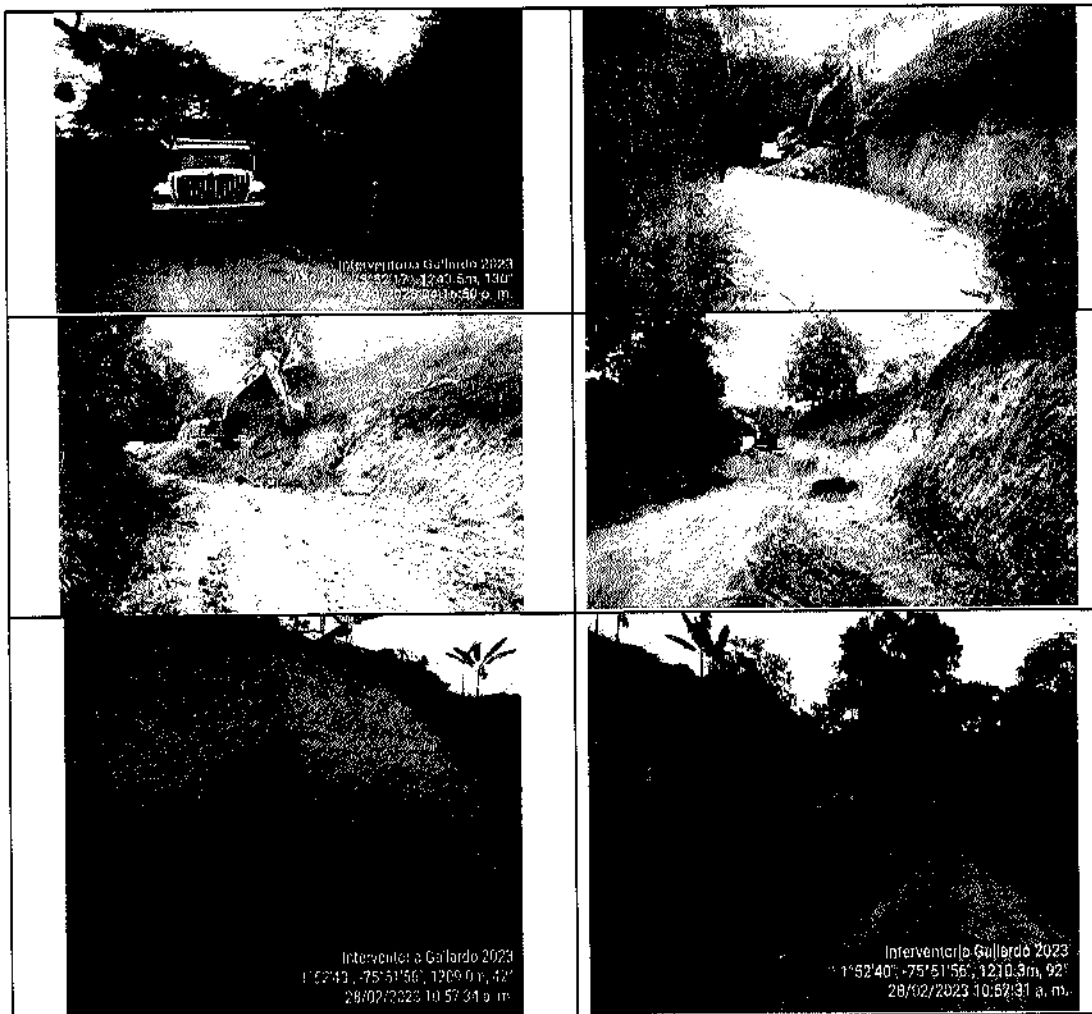
INFORME MENSUAL
No.1



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

Cortes de talud para la ampliación de la vía



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

237

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INFORME MENSUAL
No.1



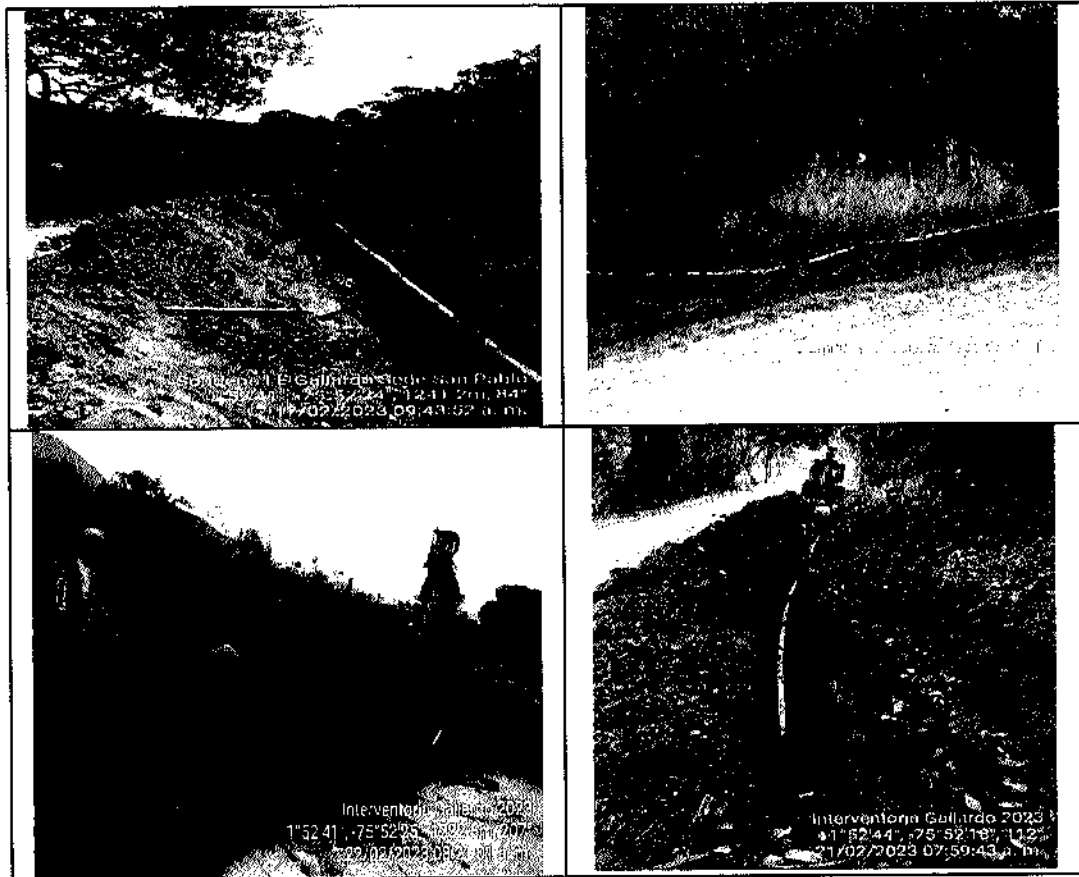
Gobernación del Huila



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

extracción de la tubería de gas, que se encuentra dentro el área de intervención de la vía



Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022**
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suza, Departamento del Huila

INFORME MENSUAL
No.1**LUIS MIGUEL PERDOMO**
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 13. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

CORRESPONDENCIA ENVIADA

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

237

Neiva 19 de enero de 2023

Señor:

ING FERNANDO JIMÉNEZ ROA
C.C. 12192340 de Garzón (H)
CONTRATISTA DE OBRA

Señora:

REFERENCIA: Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 1.5k, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20ª en el municipio de suaza departamento del huila."

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA NO 1354 DEL 2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5K, DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20ª EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Cordial saludo,

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1464 de 2022, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5K, DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20ª EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA." me permito solicitarle en forma urgente dentro de los cinco (5) días la documentación siguiente:

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

✉️ Pluismiv@hotmail.com

☎️ 316 864 18 74

A- Presentar toda la documentación solicitada en el anexo técnico del proceso de la licitación pública No. SVLPOB0014-22

- Hojas de vida del personal profesional
 1. Ingeniero director de obra
 2. Ingeniero civil residente de obra
 3. Especialista en Geotecnia Vial y/o Pavimentos
 4. Especialista en Vías
 5. Ingeniero Industrial (SISOMA)
 6. Inspector de Obra
 7. Topógrafo
 8. Cadenero
- Relación y documentación de maquinaria y equipo mínimo obligatorio
 1. Tres (3) Volquetas igual o mayor a 6 m³
 2. Una (1) Retro excavadora sobre llantas
 3. Una (1) Retro sobre oruga
 4. Una (1) Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27, peso 18 ton.
 5. Un (1) Vibro compactador potencia 153HP, peso 10 Ton.
 6. Un (1) Carro Tanque
 7. Un (1) Compactador Manual (Saltarín)
 8. Un (1) Compresor 120 HP, con martillo.
 9. Un (1) Cargador: Potencia en el voltaje 125 HP, Clasificación de RPM de motor 2300
 10. Una (1) Cortadora de pavimentos, Máxima profundidad de corte 160mm.
 11. Un (1) Rodillo Tambor liso RD 7H WACKER o similar.
 12. Un (1) Rodillo Vibrante DYNAPAC LP 650 O 750 o similar.
 13. Una (1) Camioneta D-300
 14. Un (1) Vehículo delineador demarcador de vías
- Cronograma de obra o programación actualizada de los trabajos e inversión según acta de inicio, en la que indique la fecha de iniciación, duración y terminación de cada actividad, para cada frente de trabajo.
- Flujo de caja, Plan de inversión y anticipo
- Factor de calidad- Programa de gerencia de proyectos
- Certificado de calibración de los equipos de laboratorio toma control de calidad.
- Certificado de calibración de los equipos de topografía
- Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra el cual deberá incluir como mínimo:
 1. Programas de trabajo
 2. Controles de los procesos
 3. Plan de medidas necesarias para evitar futuros daños a terceros.

4. Plan de compras
5. Plan de almacenamiento
6. Plan de inspecciones control y ensayos
7. Plan de demarcación y señalización de la obra según normatividad vigente
8. Control de Equipos de Seguimiento y Medición
9. Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
10. Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos
11. Control de No Conformidades
12. Acciones Correctivas y Preventivas
13. Control de Registros de Calidad
14. Control de Documentos
15. Auditorías Internas de Calidad
16. Procedimientos de Trabajo
17. Informe Final

- Caracterización de los materiales granulares cumpliendo con las especificaciones exigidas
- Diseños de mezcla de concretos para las diferentes resistencias exigidas en el contrato
- Plan de Manejo de Tránsito - PMT documento y presupuesto
- Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA documento y presupuesto
- Implementación del plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra – PAPSO, documento, aprobación de la ARL y presupuesto.
- Pólizas debidamente aprobadas por la entidad contratante.
- Todos los documentos exigidos en el pliego de condiciones.
- Si es el caso, tramitar la licencia y/o permisos necesarios para la ejecución de la obra, ante las entidades pertinentes.
- Instalación de valla informativa en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que serán suministradas por la entidad contratante, al momento de iniciar el contrato.

1) Según **CLAUSULA DECIMA TERCERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: B. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL: 4.**

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. **5.** Cumplir con los pagos frente al sistema de seguridad social integral, así como los propios al servicio Nacional de aprendizaje – SENA, instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas. Copia de las

afiliaciones de seguridad social integral de la parte administrativa y los trabajadores que vinculara a la obra.

2) Según **CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:** **2.** Presentar informes mensuales y final que contenga como

mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el interventor. **3.** Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra. **4.** Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias q haga el interventor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que pueden suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo. Avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del contratista y del interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra.

- 3) Presentar los análisis de precios unitarios para la aprobación respectiva.
- 4) Dotar a todo el personal de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad ejecutada y la dotación correspondiente.
- 5) Presentar la documentación correspondiente de los permisos ambientales de las canteras que suministrarán los materiales pétreos necesarios para la ejecución del contrato.
- 6) Es importante tener en cuenta que el contratista debe conformar EL COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA, así como el PROGRAMA DE SOCIALIZACION con la participación del interventor, antes de iniciar la obra.
- 7) Es de mencionar que una vez aprobada toda la documentación que se requiere en cumplimiento del anexo técnico del contrato referido; deberá entregar toda la documentación que regla el contrato No. 1354 de 2022 para tramitar los recursos que se entregaran como anticipo.



LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

241

El correo electrónico de la Interventoría a cargo del ING. **LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO** será: pluismiv@hotmail.com; ubicado en la dirección es: carrera 8 No 17 - 02, Tel: 3168641874 de la ciudad de Neiva.

Es de mencionar que de acuerdo al correo que se reporta en el contrato de obra No. 1354 de 2022 corresponde a los datos siguientes:

CONTRATISTA: **FERNANDO JIMENEZ ROA C.C. 12192340 DE GARZON (H)**
CEL: 3202317459

CORREO CONTRATISTA: fernandojimenezroa1@gmail.com
DIRECCION: Carrera 7 No. 9 – 47 casa 1 – Garzón (Huila)

A la espera de la documentación correspondiente

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva

C.C Supervisora Gobernacion del Huila

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

✉ Pluismiv@hotmail.com

📞 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

242

Neiva, enero 25 de 2023

Ingeniera
BEATRIZ EUGENIA LUNA
Supervisora Contrato Interventoría 1464 de 2022
Secretaria de Vías e Infraestructura
GOBERNACION DEL HUILA
Cra. 4 Calle 8 (esquina)
Ciudad

GOBERNACION DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas

Recibido No. 02639 ☒ POR ☒ COM
Reclasificación No. ☐ POR ☐ COM
Fecha Rec. 26 Mes 01 Año 2023
Hora: 9 48 AM ☒ PM ☐
Original: ☐ Copia: ☒
Exhibición: ☐ Módulo PRO:
Firma: Claudia

Ref: Contrato de interventoría No. 1464/2022.

Asunto: PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES
Y DETERMINACIONES contrato de Interventoría No. 1464 de 2022.

Cordial saludo:

El suscrito Ingeniero LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.697.592 de Neiva (H); adjudicatario del contrato de interventoría No. 1464 de 2022 con la Gobernación del Huila; y cuyo objeto corresponde a: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CONDICO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20ª EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA", otorgo PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE, al Ingeniero JAMES ANDRADE ZAMBRANO, identificado con la C.C. No. 12.121.543 de Neiva y Tarjeta Profesional como ingeniero civil No. 25202-2798 CND, para que en mi nombre y a partir de la fecha tome todas las decisiones y determinaciones con amplias y suficientes facultades para el cumplimiento del objeto del contrato referido en cualquier reunión, comités técnicos, y en general cualquier reunión que se requiera para el desarrollo del contrato de interventoría No. 1464 de 2022.

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 de Neiva (H)
Contratista contrato 1464 de 2022



ACEPTO:


JAMES ANDRADE ZAMBRANO
C.C. 12.121.543 de Neiva (H)



📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

✉ Pluismiv@hotmail.com

☎ 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

243

Neiva 26 de enero de 2023

Ingeniero
Fernando Jiménez Roa
C.C. 12192340 de Garzón (H)
CONTRATISTA DE OBRA

Señora:

REFERENCIA: Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 1.5k, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20 A en el municipio de suaza departamento del huila."

ASUNTO: SOLICITUD NUEVAMENTE DE DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA No. 1354 DEL 2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5K, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20ª en el municipio de suaza departamento del huila."

Cordial saludo,

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1464 de 2022, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5K, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20ª en el municipio de suaza departamento del huila." me permito informarle que solamente allegaron la documentación del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y la documentación de maquinaria y/o equipo mínimo requerido; así las cosas, se les reitera nuevamente que alleguen la documentación solicitada en el oficio de fecha 19 de enero de 2023. A continuación, se relaciona la documentación solicitada y que a la fecha no la han allegado.

- Programación de obra
- Flujo de caja, Plan de inversión y anticipo
- Factor de calidad- Programa de gerencia de proyectos
- Certificado de calibración de los equipos de laboratorio toma control de calidad.
- Certificado de calibración de los equipos de topografía
- Plan de calidad

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

Interventoría gallardo2023@gmail.com

📞 316 864 18 74

- Caracterización de los materiales granulares cumpliendo con las especificaciones exigidas
- Diseños de mezcla de concretos para las diferentes resistencias exigidas en el contrato
- Plan de Manejo de Tránsito - PMT documento y presupuesto
- Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA documento y presupuesto
- Implementación del plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra – PAPSO, documento, aprobación de la ARL y presupuesto.
- Garantías ampliadas en los porcentajes y vigencias exigidas.
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.
- Instalación de valla informativa en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que serán suministradas por el interventor, al momento de iniciar el contrato.
- Protocolos de Bioseguridad para la mitigación de contagio por covid-19 en la obra.
- Certificado de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo expedido por la ARL
- Presentar los análisis de precios unitarios para la aprobación respectiva.
- Dotar a todo el personal de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad ejecutada y la dotación correspondiente.
- Presentar la documentación correspondiente de los permisos ambientales de las canteras que suministrarán los materiales pétreos necesarios para la ejecución del contrato.
- Es importante tener en cuenta que el contratista debe conformar EL COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA, así como el PROGRAMA DE SOCIALIZACION con la participación del interventor, antes de iniciar la obra.
- Es de mencionar que una vez aprobada toda la documentación que se requiere en cumplimiento del anexo técnico del contrato referido; deberá entregar toda la documentación que regla el contrato No. 1354 de 2022 para tramitar los recursos que se entregaran como anticipo.

Por otra parte, una vez revisada la documentación allega del personal mínimo requerido, se pudo establecer que la señora LAURA NATHALIE POLO GUZMAN, es ingeniera ambiental por tal motivo, No cumple con lo que dice el ANEXO 1. – ANEXO TECNICO.

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

245

a. Requisitos del personal

Cada uno de los profesionales exigidos y requeridos anteriormente, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Director de obra de profesión Ingeniero Civil Dedicación 100%.	No menor de cinco (5) años	Mínimo dos (2) años acumulados como ingeniero director de obra o de proyectos de Infraestructura vial, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Residente de obra de profesión Ingeniero Civil Dedicación 100%	No menor cinco (5) años	Mínimo de dos (2) años de experiencia específica acumulada como ingeniero residente de obra o de proyectos de infraestructura vial, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional.
Ingeniero civil especialista en geotecnia vial y/ o pavimentos Dedicación 100%	De al menos dos (2) años	Mínimo de un (1) año de experiencia específica acumulada como ingeniero especialista en geotecnia vial y/ o pavimentos en obras o desarrollo de proyectos de infraestructura vial, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional.
Ingeniero civil especialista en vías Dedicación 100%	De al menos dos (2) años	Mínimo de un (1) año de experiencia específica acumulada como ingeniero especialista en vías en obras o desarrollo de proyectos de infraestructura vial, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional.
Ingeniero Industrial (SISOMA) Dedicación 100%	De al menos dos (2) años	Mínimo de un (1) año de experiencia específica acumulada como Ingeniero Industrial (SISOMA) en obras o desarrollo de proyectos de infraestructura vial, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional.
Inspector De Obra Dedicación 100%	NA	NA
Topógrafo Dedicación 100%	De al menos dos (2) años	Mínimo de un (1) año de experiencia específica acumulada como Topógrafo en obras o desarrollo de proyectos de infraestructura vial, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional.
Cadenero Dedicación 100%	NA	NA

Para la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir con todo el personal mínimo requerido en los documentos técnicos de los dos proyectos objeto del presente proceso de contratación.

Igualmente, una vez revisada la documentación del especialista en vías, el ingeniero CESAR JULIAN TRUJILLO JIMENEZ, se pudo establecer que el ingeniero, es el mismo que está firmando las especificaciones técnicas, estudio de tránsito, estudio de trazado y diseño geométrico, lo cual hizo parte de la formulación del proyecto, por tal motivo no puede hacer parte del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

En cuanto a la documentación de maquinaria y/o equipo de trabajo se estableció que hace falta la relación de UN (1) VEHICULO DEMARCADOR DE VIAS. Como se indica en ANEXO 1- ANEXO TECNICO.

Para tramitar cualquier documento para el Ing. LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO, actuando como contratista del contrato de interventoría se designa el email: interventoriaGallardo2023@gmail.com; y dirección contractual es: carrera 8 No 17 - 02, Tel: 3168641874 de la ciudad de Neiva.

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

246

Por otra parte, le manifiesto que mediante poder adjunto de fecha 25/01/2023; le he dado poder especial amplio y suficiente para la toma de decisiones y determinaciones al Ingeniero JAMES ANDRADE ZAMBRANO, identificado con la C.C. No. 12.121.543 de Neiva, durante el proceso o materialización del contrato de obra No. 1354 de 2022.

A la espera de la documentación correspondiente

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva

C.C. Ingeniera
BEATRIZ EUGENIA LUNA
Supervisora Contrato consultoría 1152 de 2022
Secretaria de Vías e Infraestructura
GOBERNACION DEL HUILA

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

Interventor:  allardo2023@gmail.com

📞 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 27 de enero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co

Neiva, Huila.

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: Socialización del proyecto cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cordial saludo.

Con el propósito de dar a conocer el alcance del contrato de la referencia, nos permitimos extender la invitación a la socialización de la pavimentación en concreto rígido de 1,5 Km de la vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A en el municipio de Suaza.

Esta Reunión está programada realizarse en el corregimiento de Gallardo:

Fecha: martes 31 de enero de 2023

Hora: 10:00 Am

Lugar: Polideportivo cubierto, parque central del corregimiento de Gallardo

Sin otro particular,

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva
INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022

Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

InterventoriaGallardo2023@gmail.com

316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 1 de febrero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co - beatriz.luna@huila.gov.co

Neiva, Huila.

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: SOPORTES QUE AVALAN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 1354 de 2022, COMO LO SON LA VINCULACIÓN A PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA OBRA, CONTRATOS, Y DOCUMENTACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, respecto al tema del asunto, comedidamente me permito allegar las hojas de vida, la vinculación a prestaciones sociales y los contratos de trabajo del personal vinculado en el contrato de obra No. 1354 de 2002, igualmente la documentación de maquinaria y equipo mínimo requerido, las cuales ya fueron revisadas y viabilizadas por parte de la interventoría.

Sin otro particular,

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

C.C. No. 7.697.592 Neiva

INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022


07-02-23
Diego Vivas
Recibido

Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

InterventoriaGallardo2023@gmail.com

316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 2 de febrero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co - beatriz.luna@huila.gov.co

Neiva, Huila.

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: SOPORTES QUE AVALAN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 1354 de 2022, COMO LO SON LA VINCULACIÓN A PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA OBRA, CONTRATOS, Y DEMÁS DOCUMENTOS.

Cordial saludo.

En atención a su solicitud respecto al tema del asunto, comedidamente me permito informar, que al contratista de obra el ingeniero FERNANDO JIMENEZ ROA, solo allego las hojas de vida del personal mínimo requerido y documentación de maquinaria y equipo mínimo requerido, se le solicito nuevamente la documentación y hasta la fecha no la han reportado. Se anexa copia de los oficios enviado al contratista de obra.

Por otra parte, el día 31 de enero de 2023, se realizó la socialización del proyecto en el centro poblado Gallardo, y se acordó con el contratista el ingeniero FERNANDO JIMENEZ ROA, que podría iniciar obras el 1 de febrero de 2023, una vez allegaran toda la documentación que se ha requerido por parte de la interventoría y fuera debidamente avalada. A si las cosas una vez revisado los correos electrónicos a la fecha no han allegado ninguna documentación y estamos a la espera a que la envíen.

Sin otro particular,

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva

INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022

Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez
InterventoriaGallardo2023@gmail.com

316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva, 2 de febrero de 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA
Aten. Dr. Moisés Ortiz Alarcón
Alcalde municipal
Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co
Suaza - Huila

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACION REDES HUMEDAS Y SECAS corredor vial de trabajo del contrato de obra No. 1354 de 2022.

Cordial saludo.

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales; muy respetuosamente solicito se certifique por parte del municipio de Suaza o las empresas prestadoras de los servicios públicos de las redes húmedas y secas en el tramo comprendido que es material del objeto del contrato de obra No. 1354 de 2022. Cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

A la espera que la información sea entregada lo más pronto posible; teniendo en cuenta que la obra se inicia de manera inmediata y la socialización correspondiente se realizó el día martes 31 de enero de 2023.

Sin otro particular,

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva
INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022

C.C. Ingeniera:
Beatriz Eugenia Luna Salguero
Supervisora Contrato 1464 de 2022
Secretaria de Vías E Infraestructura
Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co

Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez
InterventoriaGallardo2023@gmail.com
316 864 18 74

251

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 6 de febrero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co

Neiva, Huila.

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: Solicitud revisión y aprobación de ajuste de las vigencias de las pólizas, respecto al acta de inicio del Contrato de obra 1464 de 2022.

Cordial saludo.

Mediante el presente escrito allego las pólizas del contrato de la referencia en el asunto, con el propósito de realizar la revisión y posterior aprobación de las pólizas contractuales.

Anexo: pólizas con Catorce (14) folios

Sin otro particular,

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva
INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022

GOBERNACION DEL HUILA
Comunicación, Documentos Recibidos

04193- ☒ COR ☐ COR ☐ COR

6 2 AÑO 2023

3 09 ☐ ☒

Original: ☒ Copia: ☒

Condición: ☐ Formulario: ☐

Orlando

Carrera 8 # 17 - 02 Campo Nómez

InterventoriaGallardo2023@gmail.com

316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 10 de Febrero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero
Supervisora Contrato 1464 de 2022
Secretaria de Vías E Infraestructura

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: Solicitud Cambio de personal

Cordial Saludo

Por medio de la presente se solicita realizar cambios de personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de la referencia, los cambios a solicitar son los siguientes:

1. Director de Interventoría, será remplazado por el ingeniero DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE, con cedula de ciudadanía número 1.075.227.937 de Neiva.
2. Residente de Interventoría, será remplazado por el ingeniero JHON FREDY MAYUNGO CUELLAR, con cedula de ciudadanía número 7.687.433 de Neiva.
3. Inspector de Interventoría 1, será remplazado por el ingeniero, JHONATAN ADOLFO DURAN CANO, con cedula de ciudadanía numero 1.110.591.385 de Ibagué - Tolima.

se anexa los documentos soportes de formación y experiencia requerida.

Agradezco la atención brindada.

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva
INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022
NUMEROS DE FOLIOS (32)

SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Cedulas Oficiales Recibidas

05444

10 Feb 02 2023

3 58

Copia: ☒

Modulo No.:

Recibido: Yuly Gomez

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

📧 InterventoriaGallardo2023@gmail.com

📞 316 864 18 74

253

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 10 de Febrero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero
Supervisora Contrato 1464 de 2022
Secretaria de Vías E Infraestructura

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: Documentos legalización pago de anticipo

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la documentación para la legalización del pago del anticipo, los cuales relaciono a continuación:

- Plan de inversión del anticipo.
 - Cronograma y flujo de fondo.
 - Programa utilización de equipo.
 - Programa utilización de personal.
 - Listado de personal.
 - Cuenta bancaria en original.
 - Cuenta de cobro.
 - Contratos del personal vinculado.
 - Afiliación de Seguridad Social del personal.
 - Seguridad social del Representante Legal.
 - Copia del Contrato + RP.
 - Copia Acta de Inicio.
 - Copia de las pólizas iniciales legalizadas.
 - Copia Pago de Impuesto – Publicación en la Gaceta.
 - Dos (2) copias de la cedula de ciudadanía del Representante Legal al 150%-
- 05109 X
10 02 2023
3 52 X
YOLY GONCZ

Agradeciendo la atención prestada y quedando atento a cualquier inquietud

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva
INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022
Numero de Folios (119)

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

InterventoriaGallardo2023@gmail.com

📞 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 14 de febrero de 2023

Ingeniero
Fernando Jiménez Roa
C.C. 12192340 de Garzón (H)
CONTRATISTA DE OBRA

REFERENCIA: Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 1.5k, de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de gallardo conduce al cruce ruta 20 A en el municipio de suaza departamento del huila."

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS FALTANTE CONTRATO DE OBRA No. 1354 DEL 2022

Cordial saludo,

En estricto cumplimiento de mis funciones contractuales de acuerdo al contrato de interventoría No. 1464 de 2022, cuyo objeto corresponde a: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5K, de Pavimento Rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20 A en el municipio de Suaza Departamento del Huila." me permito informarle que una vez analizada la documentación allegada en el oficio del 9 de febrero de 2022, encontramos lo siguiente:

- En la documentación del personal de obra presentada, faltan los contratos de trabajo del Director de obra y del Especialista en Gerencia, igualmente, la afiliación a la seguridad social del especialista en gerencia.
- Falta el desglose del A.I.U.
- En los análisis de precios unitarios en los ítems 2 y 16 (excavación mecánica - explanación y excavación mecánica), se debe incluir en el equipo un bulldozer, en el ítem 5 (conformación de calzada existente) en el equipo se debe incluir el vibrocompactador, en el ítem 20 el precio unitario total aproximado al peso aparece \$ 755.797 y debe ser \$ 755.796 tal como aparece en el presupuesto que presento en la propuesta.

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

Interventoría: gallardo2023@gmail.com

📞 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

- Para los análisis de precios unitario se debe tener en cuenta los publicados por la entidad contratante.
- Falta Plan de Manejo de Tránsito - PMT documento y presupuesto.
- Falta Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA documento y presupuesto
- Implementación del plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra – PAPSO, documento, aprobación de la ARL y presupuesto.

En cuanto a la documentación de maquinaria y/o equipo de trabajo nuevamente se establece que hace falta la relación de UN (1) VEHICULO DEMARCADOR DE VIAS. Como se indica en ANEXO 1- ANEXO TECNICO.

Es de mencionar nuevamente que una vez aprobada toda la documentación que se requiere en cumplimiento del anexo técnico del contrato referido; deberá entregar toda la documentación que regla el contrato No. 1354 de 2022 para tramitar los recursos que se entregaran como anticipo.

A la espera de la documentación correspondiente

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva, 15 de febrero de 2023

Ingeniera:

Beatriz Eugenia Luna Salguero
Supervisora Contrato 1464 de 2022
Secretaria de Vías E Infraestructura

Ingeniero:

Fernando Jiménez Roa
Contratista de Obra No. 1354 de 2022
Carrera 7 No. 9-47 casa 1
Garzón - Huila
Email. Fernandojimenezroa1@gmail.com

Ref: Invitación Comité Técnico de obra No. 1

Cordial saludo:

En estricto cumplimiento a las funciones contractuales del contrato de interventoría No. 1464 de 2022; muy respetuosamente los invito a comité técnico de obra No. 1 para tratar los temas siguientes:

- 1) Llamado a lista y verificación de los asistentes.
- 2) Avance del contrato de obra No. 1354 de 2022 (informe presentado contratista de obra y el análisis por parte de la interventoría externa).
- 3) Propositiones y varios.

El comité técnico de obra No. 1 se realizará el día lunes 20 de febrero de 2023 a las 10:00 A.M. en la oficina de la secretaria de Vías e Infraestructura.

Agradecemos su puntual asistencia.

Atentamente,


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. No. 7.697.592 Neiva
INTERVENTOR

📍 Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

Interventor  allardo2023@gmail.com

📞 316 864 18 74

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL

Neiva 18 de febrero de 2023

Ingeniero:

Fernando Jiménez Roa

Contratista de Obra No. 1354 de 2022

Carrera 7 No. 9-47 casa 1

Garzón - Huila

Email. Fernandojimenezroa1@gmail.com

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: Cierre de vía.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el cierre de vía programado los días, 20, 21, 22, y 23 de febrero de 2023 por parte de su empresa; me permito informarle que la autoridad de tránsito en el Municipio de Suaza es el señor Alcalde; por tal motivo le solicitamos que antes de los cierres programados; deberá contar con el permiso correspondiente por parte del ente territorial; momento en el cual y dentro de los requisitos solicitados deberá informar a la comunidad los días y las horas del cierre autorizado.

A la espera se tramite a la mayor brevedad posible dicha autorización o permiso de cierre vial; para no tener inconvenientes con la comunidad que se afectaría con los mismos.

Teniendo en cuenta lo expresado en el presente escrito no compartimos dichos cierres hasta no contar con la autorización correspondiente por parte de la entidad territorial; como también allegar todos los soportes que garanticen cualquier tipo de movilidad vehicular ante cualquier hecho de fuerza mayor que se llegare a presentar.

Se concluye que cualquier eventualidad que se presente obedecerá única y exclusivamente a su empresa.

Sin otro particular,

Atentamente;


LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO

C.C. No. 17.097.592 Neiva

INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 1464/2022

Ingeniera Beatriz Eugenia Luna Salguero

Supervisora Contrato 1464 de 2022

Secretaria de Vías E Infraestructura

Email: beatriz.luna@huila.gov.co

Carrera 8 # 17 - 02 Campo Núñez

InterventoriaGallardo2023@gmail.com

316 864 18 74

Fecha 21 de febrero de 2023

Para:

Ing. Efraim Luna Salgado

Supervisor Contrato 1464 de 2022

Secretaría de Vías e Infraestructura

Correo: secretario.vias@huila.gov.co – Sec.vias@huila.gov.co

Bello, Huila

REFERENCIA: contrato 1464 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADOS AL CONTRATO 1354 DE 2022

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de la documentación solicitada al contrato de obra 1354 de 2022, que se relaciona a continuación, los cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría

- Programación en original de obra aprobada con fecha 9/02/2023
- Programa en original de utilización de personal y equipo aprobado con fecha 9/02/2023
- Flajo de cara en original aprobado con fecha 9/02/2023
- Plan de inversión del anticipo aprobado con fecha 9/02/2023
- Análisis de precio unitarios - No se envían hasta que el contratista arregle unas inconformidades
- Certificación de calibración de los equipos de topografía
- Licencia ambiental y registro minero de canteras que suministran materiales
- Plan de gestión del proyecto en original aprobado con fecha 9/02/2023
- Plan de calidad en original aprobado con fecha 9/02/2023
- Acta de entrega, custodia y reconocimiento por parte de la personería del Municipio de Suza

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2023CS006055-1
Fecha: 2023-01-27

2023PQR00001425

2023SAL00007483

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Vías e Infraestructura



Neiva, Enero 27 de 2023

Señor(a):
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
PARTICULAR
CALLE 8#12-02 CAMPO NUÑEZ
Tel: 3168641874
Neiva / Huila

Asunto: Reiteración en aprobación hojas de vida personal interventoría.

Cordial Saludo,


En atención al oficio radicado No. 1425 de fecha 17 enero de 2023, con asunto reiteración aprobación hojas de vida personal de interventoría, comedidamente me permito informar que las hojas de vida ya se encuentran revisadas y archivadas en el expediente del contrato de interventoría y por lo tanto ya se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría.

Atentamente,

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura

Proyectó: Beatriz Eugenia Luna Salguero





FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

Gallardo Suaza, febrero 16 de 2023

CTO-1354/2022-GAD-005

SEÑORES:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA

Dr. Moisés Ortiz Alarcón

Alcalde municipal

CIUDADANIA Y COMUNIDAD EN GENERAL

REFERENCIA: CONTRATO 1354 DE 2022: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.

Asunto: Comunicación cierre total de vía

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la realización de actividades de obra sobre la vía del asunto, me permito comunicar que durante los días lunes 20 de febrero de 2023, martes 21 de febrero de 2023, miércoles 22 de febrero de 2023 y jueves 23 de febrero de 2023 se requerirá del cierre de vía para tránsito en los siguientes horarios:

- Cierre total de vía de 7:00 am a 12:00 del medio día y de 1:00 pm a 5:00 pm

Lo anterior con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad en general (peatonal y tránsito vehicular) en los tramos de intervención. Igualmente recomendamos tomar las precauciones necesarias y medidas correspondientes en pro de su seguridad y acatar las medidas implementadas durante las jornadas de cierre de vía.

De antemano agradecemos su colaboración

Sin otro particular,

FERNANDO JIMENEZ ROA

C.C. 12.192.340 de Garzón

CONTRATISTA

Copia interventoría externa contrato

Personería Municipio de Suaza

Radicado:
2023CS016720-1
Fecha: 2023-03-02

2023PQR00005111

2023SAL00018732

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Vías e Infraestructura



Neiva, Marzo 2 de 2023

Señor(a):

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INGENIERO CIVIL
PARTICULAR
CALLE 8#12-02 CAMPO NUÑEZ
Tel: 3168641874
Neiva / Huila

Asunto: SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL

Atendiendo la iniciativa realizada mediante radicado 05111 del 10 de febrero de 2023, Esta secretaria se permite informar que, respecto al cambio de personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de la referencia, se acepta la renuncia de los profesionales:

Residente de Interventoría: LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON CC. 1.075.217, director de Interventoría: LUIS CARLOS FONSECA SANABRIA CC.1.049.626.098., Inspector de interventoría: EDILSON DAVID HERRERA PERDOMO CC. 1.075.297.956.

Y analizando cada una de las hojas de vida de los nuevos profesionales donde se verifico la documentación anexada por la Interventoría Externa se puede observar que si cumplen con los perfiles requeridos para el desarrollo del proyecto como; director de Interventoría DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE CC. 1.075227.937, Residente de Interventoría: JHON FREDY MAYUNGO CUELLAR CC. 7.687.433 e Inspector de interventoría: JHONATAN ADOLFO DURAN CANO CC. 1.110.591.385.

Por lo tanto, la secretaria de Vías e Infraestructura, avala y aprueba a los nuevos profesionales que presentan sus hojas de vida a esta dependencia.

Atentamente,

Proyectó: Beatriz Eugenia Luna Salguero

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaría de Vías e Infraestructura



SC4353-1
SGN-C054-F04

253

ENTIDAD CONTRATANTE



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 14. CONTROL DE CALIDAD


Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

ACTA DE VECINDAD Y PERMISOS CORTE DE TALUD

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MH-IN-3-FR-4	
	OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		VERSION 1 PAGINA 1 DE 5	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Acta de Vecindad de Inicial Suplemento 13 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				
Ubicación: Municipio SUAZA		Vereda GALLARDO		
Dirección N/A		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.		
Edad de la construcción		No. de pisos		
No. de Hogares		Mujeres jefes de hogar		
Niños (menores de 14 años)		Personas en situación de discapacidad		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS		Observaciones del estado de las redes: No se logró establecer si la vivienda cuenta o no con la totalidad de los servicios públicos debido a que durante los días de visita no se encontró residentes de la vivienda que aclararan la visita para el levantamiento del acta de vecindad.		
1. Acueducto		SI NO		
2. Alcantarillado		SI NO		
3. Energía		SI NO		
4. Gas		SI NO		
5. Teléfono		SI NO		
6. Televisión cable		SI NO		
7. Internet		SI NO		
8. Otros		SI NO		
DESTINACIÓN ECONOMICA		ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial		Garaje		
2. Comercial		SI NO		
3. Industrial		SI NO		
4. Minero		SI NO		
5. Agropecuario		SI NO		
6. Recreacional		SI NO		
7. Educativo		SI NO		
8. Salud		SI NO		
9. Cultural		SI NO		
10. Religioso		SI NO		
11. Institucional		SI NO		
12. Otro		SI NO		

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Comunalista	Ing. Residente Interventoria
C.C. O.NIT:	Maticula profesional No.:	Maticula profesional No.:
C.C. O.NIT:		
Notas:		
1. Se firma en conciencia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		


		DEPARTAMENTO DEL HULLA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MH-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE DALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HULLA.		FECHA	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1405 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento	
13 FEBRERO 2023		(Día / Mes / Año)			
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas ☐		1. Placa maciza de concreto ☐		1. Pórticos en concreto reforzado ☐	
2. Vigas corridas ☐		2. Placa aligerada de concreto ☐		2. Muros estructurales en concreto ☐	
3. Sistema mudo ☐		3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐		3. Sistema combinado en concreto ☐	
4. Caissons ☐		4. Vigas metálicas ☐		4. Prefabricados en concreto ☐	
5. Concreto ciclopeo ☐		5. Cerchas metálicas ☐		5. Mampostería confinada ☐	
6. Pilotes ☐		6. Enramado en madera ☐		5. Mampostería reforzada ☐	
7. Placa de cimentación ☐		7. No aplica ☐		7. Mampostería no reforzada ☐	
8. No identificada ☐		8. Otro, Cuál? ☒		8. Pórticos en acero ☐	
9. No existe ☐				9. Pórtico antisísmico en acero ☐	
10. Otro, Cuál? ☐				10. Pórticos y paneles en madera ☐	
		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		11. Pórticos y paneles en otros ☐	
		1. Reformas (s / no) ☐		12. Muros en bahareque ☐	
		2. En altura: No. de pisos adicionales ☐		13. Muros en tapia pisada ☐	
		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) ☐		14. Muros en adobe ☐	
		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) ☐		15. Construcción improvisada ☐	
		5. Otro, Cuál? GUARDA ☒		16. Mito ☐	
		6. Otro, Cuál? ☐		17. Otro, Cuál? ☐	
Observaciones: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:	
GRIETAS ☐		FISURAS ☐		FISURAS ☐	
HUMEDAD ☒		HUMEDAD ☐		HUMEDAD ☒	
DESPLAZAMIENTO ☐		DESPLAZAMIENTO ☐		DESPLAZAMIENTO ☐	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐	
BUENO ☒		BUENO ☒		BUENO ☐	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐	
REGULAR ☒		REGULAR ☒		REGULAR ☐	
MALO ☐		MALO ☐		MALO ☒	
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE LA VIVIENDA CUENTA CON UN SITIO DESTINADO A JARDIN O UN TIPO DE ALMACENAMIENTO					
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EL ACCESO A LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN TIERRA PARA EL INGRESO DE POR LO MENOS MOTO, EL ANDEN DE APROXIMADAMENTE 50 CM ES EN CONCRETO Y PRESENTE ALGUNAS FISURAS					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA ESBANADA ☐		POSTES DE CONCRETO ☐		POSTES DE MADERA ☐	
CERCA VIVA ☐		CERCA VIVA ☐		CERCA VIVA ☐	
MURO ☐		MURO ☐		MURO ☐	
REGULAR ☐		REGULAR ☐		REGULAR ☐	
MALO ☐		MALO ☐		MALO ☐	
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE ESTA VIVIENDA NO CUENTA CON CERRAMIENTO PERIMETRAL					

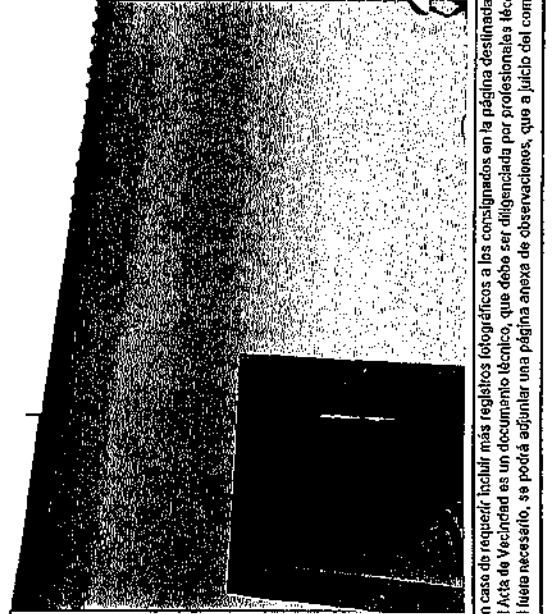
	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO		MASPS-MH-IN-3-FR-4
				VERSIÓN		1
				PÁGINA		4 DE 5
				FECHA		(Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Conflicto de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento ☒		
5. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			MASP-S-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO	VERSIÓN
	FERNANDO JIRENEZ ROA			PÁGINA	1
ACTA DE VECINDAD				5 DE S.	
OBJETO DEL PROYECTO					
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45RL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Conflicto de Interventoría No. 1465 / 2022		Fecha (Día / Mes / Año)	
		Acta de Vecindad de Inicio		13 FEBRERO 2023	
		Suplimento			
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN					
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>					
VIA _____					
FIRMAS					
Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Interventoría		Testigo	
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.		C.C. O NIT:	
Original: Contraloría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Control (Subdirección Administrativa).					

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SH.19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		VERSIÓN	1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Confirmando de Intervención No. 1495 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento No. 2		PÁGINA	1 DE 3
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO			
Ubicación:		Departamento: HUILA		Municipio: SUAZA		Vereda: GALLARDO	
Dirección:		N/A		N/A		Teléfonos: 3235754521	
Nombre de la persona que atiende la visita:		AMPARO JOVEN		CC No.		26.642.351	
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		CC No.		1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		ALCEMO ZAMBRANO CABRERA		No. de Apartamentos		2	
Edad de la construcción		20		No. de pisos		1	
No. de Hogares		1		Mujeres jefas de hogar		0	
Niños (menores de 14 años)		0		Personas en situación de discapacidad		0	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		RURAL			
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		2			
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Onclado; 3. Escarpado		1			
SERVICIOS PÚBLICOS		Observaciones del estado de las redes: LA VIVIENDA CUENTA PARA SUS AGUAS RESIDUALES CON POZO SEPTICO					
1. Acueducto		SI		NO			
2. Alcantarillado		X					
3. Energía		X					
4. Gas		X					
5. Teléfono		X					
6. Televisión cable		X					
7. Internet		X					
8. Otros		X					
DESTINACIÓN ECONOMICA		1. Residencial		7. Educativo		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		3. Industrial		8. Salud		Garaje	
3. Industrial		4. Minero		9. Cultural		SI	
4. Minero		5. Agropecuario		10. Religioso		NO	
5. Agropecuario		6. Recreacional		11. Institucional		Uso del garaje:	
6. Recreacional		7. Otro		12. Otro			
FIRMAS							

Firma		Firma	
Nombre:	Amparo Joven	Nombre:	Ing. Residente Contraloría
Responsible Unidad Social	26 54 23 51	Matrícula profesional No.:	
C.C. O.NIT:		Matrícula profesional No.:	
Notas:	1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita ante las partes.		



		DEPARTAMENTO DEL ILLA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JANEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE BUZA, DEPARTAMENTO DEL ILLA.		CONTROL DE OBRA No. 1354 / 2022		FECHA 13 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022		(Día / Mes / Año)	
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Caissons 5. Concreto ciclopapo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cuál?		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Laminas colaborantes (Steel deck) 4. Vigas moldadas 5. Cerchas metálicas 6. Enramado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		1. Reformas (si/no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro, Cuál?		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y leja 4. Estructura de madera y leja 5. Otro, Cuál?		1. Pórticos y paneles en concreto 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prelabricados en concreto 5. Mampostería confinada 6. Mampostería reforzada 7. Mampostería no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos y paneles en otros 12. Muros en bataqueque 13. Muros en tapia pisada 14. Muros en adobe 15. Construcción improvisada 16. Mixto 17. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN		1. Edificaciones con reforzamiento espacial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
1. Edificaciones con reforzamiento espacial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?		1. Edificaciones con reforzamiento espacial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?		1. Edificaciones con reforzamiento espacial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?	
OBSERVACIONES:		ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		REGULAR DANEOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		BUENO DANEOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS			

	<p>DEPARTAMENTO DEL NULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASP-S-MH-IN-3-FR-4 VERSIÓN 1 PÁGINA 6 20 12</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCIÓ AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL NULA.</p>	<p>FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023</p>
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐</p>
<p>6. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>		
		
		
<p>Notas: 5. En caso de requerir, incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>		

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
		OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL 10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		VERSIÓN 1	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		PÁGINA 5 DE 7	
6. REGISTRO FOTOGRAFICO		Acta de Vecindad de Inicio ☒		Acta de Vecindad de Seguimiento ☐	
					
					

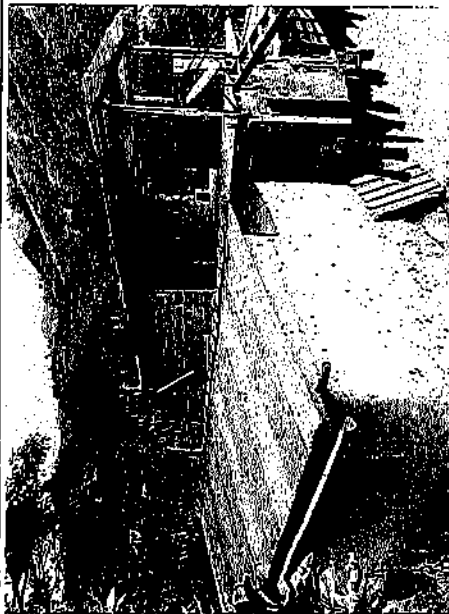

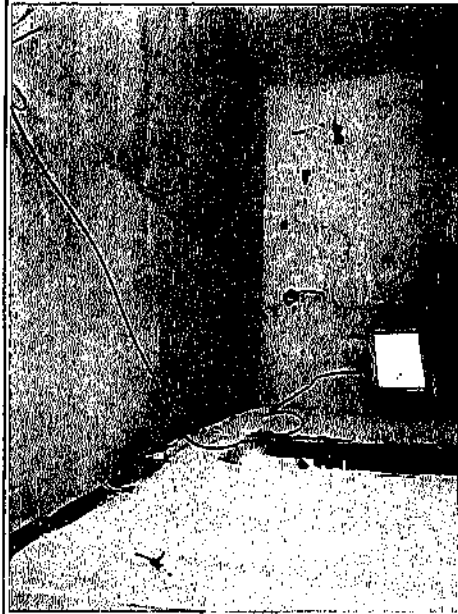
Notas:

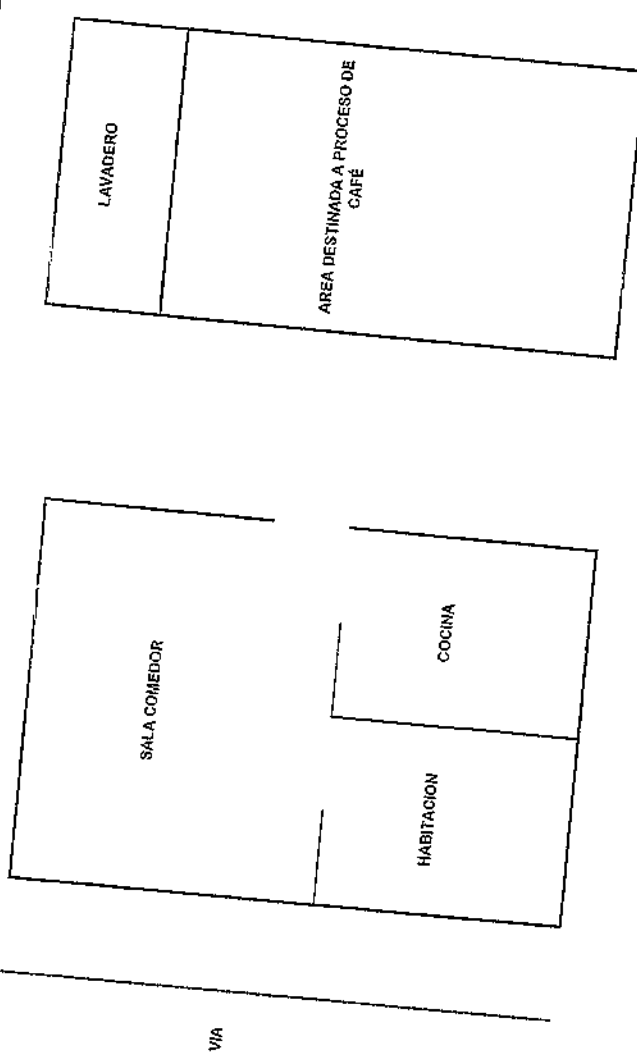
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales (técnicos del Confitec y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto).
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueren tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	6 DE 7
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	(Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 3554 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que deba ser diligenciado por profesionales técnicos del Contaduría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD</p>			CÓDIGO		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2 DE 2	
				FECHA		(Día / Mes / Año)	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,8 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022		Acta de Vejeidad de		Iniciado	
						Seguimiento	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN							
<div><div><div>BAÑOS</div><div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div></div><div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div></div></div><div><div>BAÑOS</div><div><div>APTO 2</div></div></div></div>							
VIA							
FIRMAS							
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Testigo C.C. O NIT:	
Amparo Jarama 26542351		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
Original: Contratación, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).							

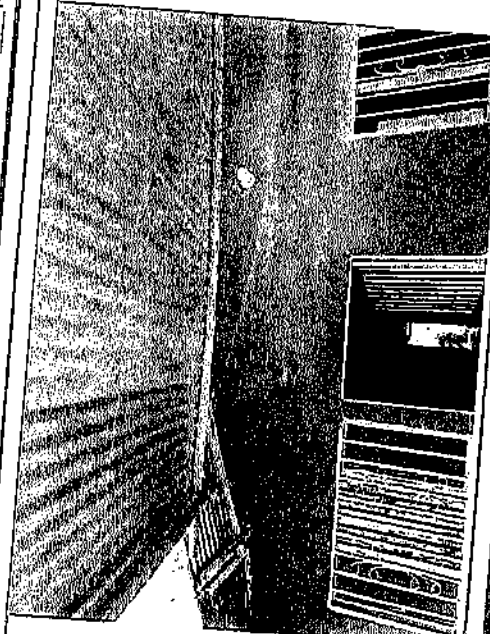
		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIRENEZ ROA ACTA DE VECHIDAD				CÓDIGO MASPS-MIN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		1 DE 5	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Control de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vechidad de Inicial Seguinte		13 FEBRERO 2023	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO			
Ubicación:		Municipio SUAZA		Vereda GALLARDO		PR 21+230 MI	
Dirección		N/A		Teléfonos		3143207698	
Nombre de la persona que atende la visita:		LICEITH VELA COLLAZOS		CC No.		1,077,842,609	
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		CC No.		2	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:							
Edad de la construcción		NIS		No. de pisos		1 Y 2 PISOS	
No. de Hogares		1		No. total residentes		3	
Niños (menos de 14 años)		1		Adultos mayores (más de 60 años)		0	
Niños con discapacidad		0		Personas en situación de discapacidad		0	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural				2	
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3 Y 2	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No				2	
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2	
1. Acueducto		X		NO			
2. Alcantarillado		X		NO			
3. Energía		X		NO			
4. Gas		X		NO			
5. Teléfono		X		NO			
6. Televisión cable		X		NO			
7. Internet		X		NO			
8. Otros		X		NO			
SERVICIOS PÚBLICOS							
Observaciones del estado de las redes: LA VIVIENDA CUENTA PARA SUS AGUAS RESIDUALES CON POZO SEPTICO							
DESTINACIÓN ECONÓMICA		1. Residencial		7. Educativo			
2. Comercial		3. Industrial		8. Salud			
3. Industrial		4. Minero		9. Cultural			
4. Minero		5. Agropecuario		10. Religioso			
5. Agropecuario		6. Recreacional		11. Institucional			
6. Recreacional		7. Otros		12. Otro			
ACCESOS VEHICULARES		Garaje		SI		NO	
Uso del Garaje:						X	
FIRMAS							
Firma		Firma		Firma			
Nombre:		Nombre:		Nombre:			
Ing. Residente Contralista		Ing. Residente Interventoría		Testigo			
Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		C.C. O.N.T.:			
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vechidad corresponde a la realidad		2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vechidad suscrita entre las partes.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD					MASPS-MIN-IN-3-FR-4			
						CÓDIGO			
						VERSIÓN			
						PÁGINA			
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCIÓ AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		(Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de		Inicio Seguimiento		13 FEBRERO 2023	
6. REGISTRO FOTOGRAFICO									
									
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>									


	DEPARTAMENTO DEL HUILA S. SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		MASPS-MIN-IN-3-FR-4	
	OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO PUEBLO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	CODIGO	1
	Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	VERSION	5 DE 5
	1. PLANO DE LA CONSTRUCCION		PAGINA	1
		Acta de Vecindad de	FECHA	13 FEBRERO 2023
		Inicio	Seguimiento	(Dia / Mes / Año)
				
FIRMAS				
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.N.T. Original: Concejalia. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	 Juan Carlos Collares	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.:	 Fernando Jimenez Roa	Firma Nombre: Tosigo C.C. O.N.T.:





	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJIDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	VERSIÓN 1	PÁGINA 2 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vejidad de Seguimiento	Inleto	13	FEBRERO	2023
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL						
CIMENTACIÓN:	SISTEMA DE ENTREPISO:	SISTEMA ESTRUCTURAL	IRREGULARIDAD EN PLANTA			
1. Zapatas	1. Placa maciza de concreto	1. Pórticos en concreto reforzado	1. Irregularidad alta			
2. Vigas corridas	2. Placa aligerada de concreto	2. Muros estructurales en concreto	2. Irregularidad media			
3. Sistema mixto	3. Laminas colabocante (Steel deck)	3. Sistema combinado en concreto	3. Irregularidad baja o Inexistente			
4. Caissons	4. Vigas metálicas	4. Prefabricados en concreto	IRREGULARIDAD EN ALTURA			
5. Concreto ciclopao	5. Corchas metálicas	5. Mampostería confinada	1. Irregularidad alta			
6. Pilotes	6. Entromado en madera	6. Mampostería no reforzada	2. Irregularidad media			
7. Placa de cimentación	7. No aplica	7. Mampostería no reforzada	3. Irregularidad baja o Inexistente			
8. No Identificada	8. Otro, Cuál?	8. Pórticos en acero				
9. No existe	9. No aplica	9. Pórticos en concreto				
10. Otro, Cuál?	10. No aplica	10. Pórticos y paneles en madera				
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		11. Pórticos y paneles en otros				
1. Reformas (si / no)		12. Muros en bahareque				
2. En altura: No. de pisos adicionales		13. Muros en teja pisada				
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		14. Muros en adobe				
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción Improvisada				
5. Otro, Cuál?		16. Mixto				
6. Otro, Cuál?		17. Otro, Cuál?				
Observaciones: Teniendo en cuenta						
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO						
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		
GRIETAS	FISURAS	X	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BIENO	REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
FISURAS		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
FISURAS		X		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:						
LA FACHADA LATERAL DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA EN BLOQUE, CUENTA CON PINTURA EN ACEITE, PRESENTA ALGUNAS FISURAS						
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:						
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BIENO
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
FISURAS		X		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:						
EL ACCESO A LA VIVIENDA DESDE LA VÍA ES ATRAVÉS DE UN PENTE ARTESANAL CONSTRUIDO CON GUADUA Y TIERRA, EL ANDEN DE LA VIVIENDA TIENE GRIETAS Y SE ENCUENTRA LEVANTADO EN ALGUNAS PARTES						
ESTADO DE CERRAMIENTOS:						
MALLA ESTRUCTURAL	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	BIENO	REGULAR
MALLA ESTRUCTURAL		POSTES DE MADERA		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:						
NO CUENTA CON CERRAMIENTO HACIA LA VÍA						

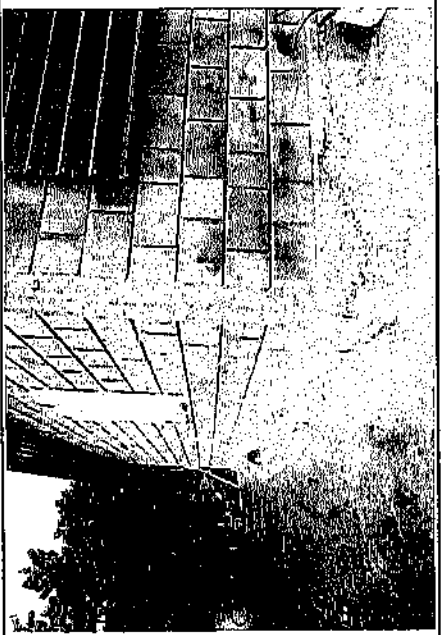
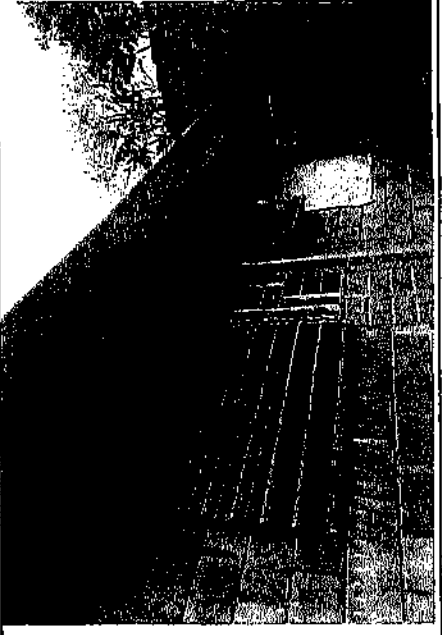
	DEPARTAMENTO DEL JULIA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD					CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
	VERSIÓN	1							
	PÁGINA	3 De 6							
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL JULIA.						FECHA	13 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vejeidad de Seguimiento	Inicial	Inicial	Inicial				
6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO									
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON PISOS EN CEMENTO-ROJO PRESENTA EN ALGUNAS AREAS AFECTACIONES COMO FISURAS Y GRIETAS									
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON DOS TIPOS DE CONSTRUCCIONES EN LAS PAREDES, 1. PAREDES EN BLOQUE Y 2 PAREDES EN BAREQUE LAS CUALES PRESENTAN GRIETAS Y FISURAS EN ALGUNAS PARTES									
ESTADO DE TECHOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON DOS TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA EL TECHO 1 EN MADERA Y TEJA DE ZINC Y 2 ESTRUCTURA METALIA Y TEJA DE ZINC									
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON DOS TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA EL TECHO 1 EN MADERA Y TEJA DE ZINC Y 2 ESTRUCTURA METALIA Y TEJA DE ZINC									
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON DOS TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA EL TECHO 1 EN MADERA Y TEJA DE ZINC Y 2 ESTRUCTURA METALIA Y TEJA DE ZINC									
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON DOS TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA EL TECHO 1 EN MADERA Y TEJA DE ZINC Y 2 ESTRUCTURA METALIA Y TEJA DE ZINC									
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:									
LA VIVIENDA CUENTA CON DOS TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA EL TECHO 1 EN MADERA Y TEJA DE ZINC Y 2 ESTRUCTURA METALIA Y TEJA DE ZINC									
FIRMAS									
Firma Responsable Unidad Social C.C. O.N.T.	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:
3. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio inferior del predio del cual se va a recopilar información (solo, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.									

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	4 DE 6	
				FECHA	13 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.8 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SHL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Control de Intervención No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Suplemento ☒		
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página designada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron leídas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	3 DE 6		
			FECHA	13 FEBRERO 2023		
OBJETO DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZUA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Certificado de Obra No. 1354 / 2022			Certificado de Interventoría No. 1465 / 2022			
			8. REGISTRO FOTOGRAFICO			
						
						
<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none">5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.						

	DEPARTAMENTO DEL NIULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN		1				
	PÁGINA		6 DE 6				
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL NIULA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Control de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento	FECHA				
			(Día / Mes / Año)				
			13 FEBRERO 2023				
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION							
<div><div>VIA</div><div>FUENTE HIDRICA</div><div>LAVADERO</div><div>COCINA</div><div>HABITACIO</div><div>SALA</div><div>HABITACIO</div><div>HABITACIO</div><div>HABITACION</div></div>							
FIRMAS							
Firma:  Nombre: Juan Luis Responsable Unidad Social C.C. O.NIT:		Firma:  Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma:  Nombre: Ing. Residente Tosilgo C.C. O.NIT:			
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).							


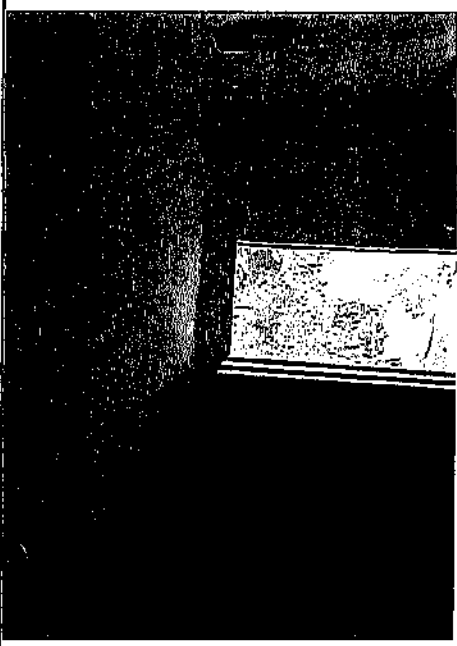
DEPARTAMENTO DEL NULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECHIDAD		CÓDIGO VERSION PAGINA FECHA		MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 1 DE 3 13 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL NULA.		CÓDIGO VERSION PAGINA FECHA		MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 1 DE 3 13 FEBRERO 2023	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		ENCARGADO	
Cantón de Obra No. 1354 / 2022		Cantón de Interventoría No. 1465 / 2022		Cantón de Interventoría No. 1465 / 2022	
Ubicación: Departamento: NULA Municipio: SUAZA Vereda: GALLARDO PR 214650 NM		Dirección: N/A		Teléfono: 3144751530 CC No. 1,083,076,889	
Nombre de la persona que atiende la visita: MILTON FABIAN VERA MOSQUERA		Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		CC No. -	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: YENER ALEXANDER PERDOMO		Edad de la construcción: 2 AÑOS		No. de pisos: 1	
No. de Hogares: 1		No. total residentes: 3		Mujeres jefes de hogar: 1	
Niños (menores de 14 años): 1		Adultos mayores (más de 60 años): 0		Personas en situación de discapacidad: 0	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural		ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		2	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Si; 2. No		PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		3	
1. Acueducto 2. Alcantarillado 3. Energía 4. Gas 5. Teléfono 6. Televisión cable 7. Internet 8. Otros		SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones del estado de las redes:	
DESTINACIÓN ECONOMICA		ACCESOS VEHICULARES		Garaje	
1. Residencial 2. Comercial 3. Industrial 4. Minero 5. Agropecuario 6. Recreacional		7. Educativo 8. Salud 9. Cultural 10. Religioso 11. Institucional 12. Otro		SI ☐ NO ☒	
Firma:  Nombre: Milton Fabian Vera Mosquera Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 1083876889		Firma:  Nombre: Yener Alexander Perdomo Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: -		Firma:  Nombre: Yener Alexander Perdomo Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: -	
Notas: 1. Se firma en conformidad, que lo consignado en la presente Acta de Vechidad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vechidad suscrite entre las partes.		Firma:  Nombre: Yener Alexander Perdomo Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: -		Firma:  Nombre: Yener Alexander Perdomo Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: -	

	DEPARTAMENTO DEL IIRUA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 4 DE 5
			FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 204 EN EL MUNICIPIO DE BUACA, DEPARTAMENTO DEL IIRUA.	Inicio Seguimiento ☒		
Contrato de Obra No. 1954 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
			
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.			

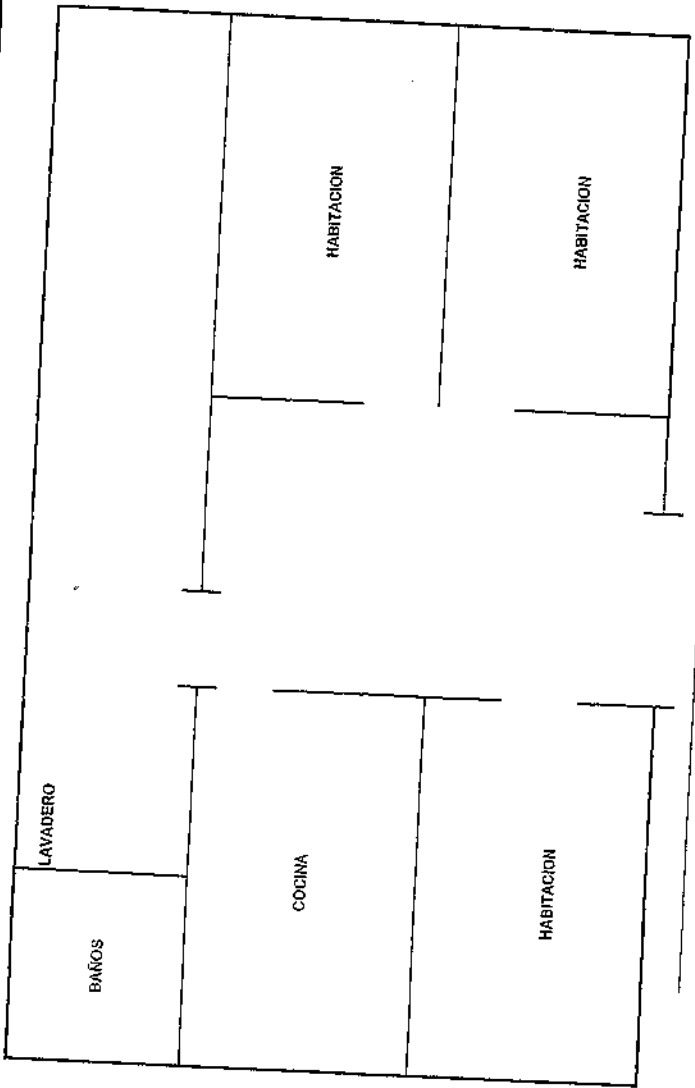
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1				
	PÁGINA	5 DE 5				
	FECHA	(Día / Mes / Año) 13 FERRERO 2023				
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 29A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION						
<div>VIA</div> <div></div>						
FIRMAS						
Firma Nombre: Responsable Unidad Ejecutora C.C. O.NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Testigo C.C. O.NIT:		
Milton Fabian Vera 1.083826689						
Original: Contralista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).						

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD				CÓDIGO	MASSP-MN-IN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
				PÁGINA		1 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vejididad de Septiembre 2022		FECHA (Día / Mes / Año) 16 FEBRERO 2023
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA						
2. DATOS DEL PREDIO						
Ubicación:		Departamento: HUILA		Municipio: SUAZA		Vereda: GALLARDO
Dirección:		N/A		Teléfonos:		PR: 214880 ml
Nombre de la persona que aliende la visita: EZEQUIEL PLAZA						
Tipo de tenencia de la vivienda:						
1. Propia; 2. En arriendo; 3. Peseñón; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva						
Nombre del responsable / propietario de la construcción:						
EZEQUIEL PLAZA						
CC No. 93.230.892						
Edad de la construcción						
18 No. de Apartamentos						
1 No. de pisos						
No. de Hogares						
1 No. total residentes						
3 Mujeres jefes de hogar						
Niños (menores de 14 años)						
0 Adultos mayores (más de 60 años)						
0 Personas en situación de discapacidad						
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:						
1. Urbano; 2. Rural						
2						
ESTADO DEL PREDIO:						
1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado						
3						
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN						
1. SI; 2. No						
2						
PENDIENTE DEL TERRENO						
1. Plano; 2. Ortophoto; 3. Escarpado						
1						
SERVICIOS PÚBLICOS						
Observaciones del estado de las redes: LA VIVIENDA REALIZA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA QUEBRADA EL SALADO						
1. Acueducto						
X						
2. Alcantarillado						
X						
3. Energía						
X						
4. Gas						
X						
5. Teléfono						
X						
6. Televisión cable						
X						
7. Internet						
X						
8. Otros						
X						
DESTINACIÓN ECONÓMICA						
1. Residencial						
X						
2. Comercial						
X						
3. Industrial						
X						
4. Minero						
X						
5. Agropecuario						
X						
6. Recreacional						
X						
7. Educativo						
X						
8. Salubridad						
X						
9. Cultural						
X						
10. Religioso						
X						
11. Institucional						
X						
12. Otro						
X						
ACCESOS VEHICULARES						
Garaje						
SI NO						
X						
Uso del garaje:						
X						
FIRMAS						
Firma		Firma		Firma		Firma
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre
Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		Tesligo
Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		C.C. O.R.T.:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vejididad corresponde a la realidad.						
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vejididad suscrita entre las partes.						

	DEPARTAMENTO DEL JULIA		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA			PÁGINA	3 DE 6
	ACTA DE VEJECIDAD			FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍDIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SH10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL JULIA.				
Contrato de Obra No. 1354	1. 2022	Contrato de Interventoría No. 1465	1. 2022	Acta de Vejecidad de	16 FEBRERO 2023
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE	PISOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	X	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
LAS PAREDES ESTÁN CONSTRUIDAS EN BAREQUE Y SE EVIDENCIAN FISURAS EN VARIAS PARTES DE LAS PAREDES (ES UNA CONSTRUCCIÓN ANTIGUA)					
ESTADO DE	PAREDES	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	X	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
EL TECHO ESTA CONSTRUÍDO EN GUADUA Y TEJAS DE ZINC, SE ENCUENTRA DETERIORADO A LA VISTA.					
ESTADO DE	TECHOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS	FISURAS	X	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE	FISURAS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS	FISURAS		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE	FISURAS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS	FISURAS		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE	FISURAS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS	FISURAS		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
FIRMAS					
Firma	Firma				
Nombre:	Nombre:				
Ing. Residente Controlista	Ing. Residente Interventoría				
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:				
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)					
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.					

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIRENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	4 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL 10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 30A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento	16	FEBRERO 2023	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
							
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros (fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>							

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASPS-MIN-IN-3-FR-4</p>	<p>Versión 1</p>	<p>Página 5 DE 6</p>
<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento</p>	<p>FECHA (Día / Mes / Año)</p>	<p>16 FEBRERO 2023</p>
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>5. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>		
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>			<p>Notas:</p>	<p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contabilista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueren tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>

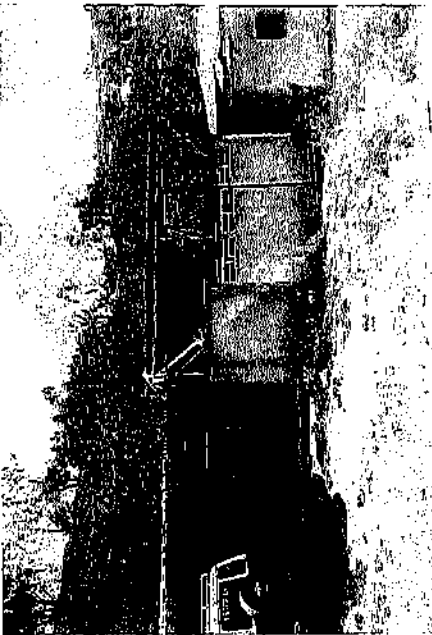
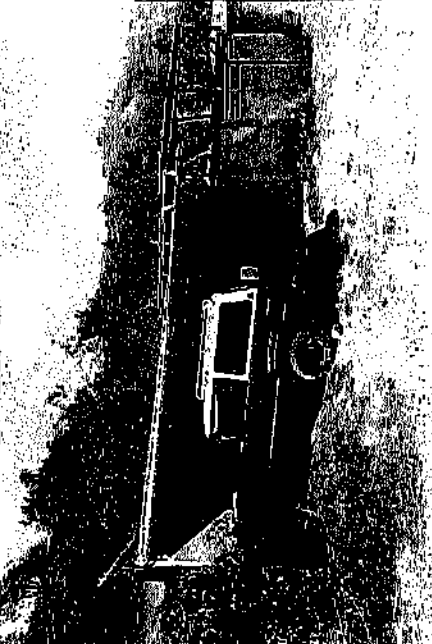
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	CODIGO	VERSION
	Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	PAGINA	1
	7. PLANO DE LA CONSTRUCCION		FECHA	6 DE 6
		Acta de Vecindad de	(Dia / Mes / Año)	
		Inicio	16 FEBRERO 2023	
		Seguimiento		
				
FIRMAS				
Firma: Elequi Plazas				
Nombre: Elequi Plazas				
Ingr. Residente Contraloría				
Matrícula profesional No.:				
Firma: [Firma]				
Nombre: [Nombre]				
Ingr. Residente Interventoría				
Matrícula profesional No.:				
C.C. O.N.T.:				
Copia: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				MUNICIPIO DE SUIZA		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA		21 FEBRERO 2023		(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1405 / 2022		Acta de Vecindad de Inicial		21 FEBRERO 2023			
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO		Vereda		PR	
				Municipio		GALLARDO		21+695 MI	
				Ubicación:		HUILA		Teléfonos	
				Dirección		N/A		3144761530	
				Nombre de la persona que atiende la visita:		MILTON FABIAN VERA MOSQUERA		CC No. 1.083.876.889	
				Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
				Nombre del responsable / propietario de la construcción:		MILTON FABIAN VERA MOSQUERA		CC No. 1.083.876.889	
				Edad de la construcción		15 AÑOS		No. de pisos	
				No. de Hogares		1		Mujeres jefes de hogar	
				Niños (menores de 14 años)		1		Personas en situación de discapacidad	
				CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2	
				ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3	
				CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		2	
				PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		1	
				SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones del estado de las redes: PTICO PARA LAS AGUAS RESIDUALES			
				1. Acueducto		SI NO			
				2. Alcantarillado		X			
				3. Energía		X			
				4. Gas		X			
				5. Teléfono		X			
				6. Televisión cable		X			
				7. Internet		X			
				8. Otros		X			
				DESTINACIÓN ECONOMICA		Cual?			
				1. Residencial		X			
				2. Comercial		X			
				3. Industrial		X			
				4. Minero		X			
				5. Agropecuario		X			
				6. Recreacional		X			
				7. Educativo		X			
				8. Salud		X			
				9. Cultural		X			
				10. Religioso		X			
				11. Institucional		X			
				12. Otro		X			
				ACCESOS VEHICULARES		General		SI NO	
								SI NO	
								USO DEL GARAJE: VEHICULAR	

Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría	
Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	
Responsable Unidad Segura		Responsable Unidad Segura		Responsable Unidad Segura	
C.C. O.NIT:		C.C. O.NIT:		C.C. O.NIT:	
Notas:		Notas:		Notas:	
1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.	
2. Una vez firmado y conformado, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado y conformado, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado y conformado, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-PR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO AG-HL 10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año)	
Control de Obra No. 1354 / 2022		Control de Interventoría No. 1405 / 2022		21 FEBRERO 2023	
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Irregularidad baja o inexistente	
4. Caissons		4. Vigas metálicas		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
5. Concreto ciclopeo		5. Cerchas metálicas		1. Irregularidad alta	
6. Pilotes		6. Entramado en madera		2. Irregularidad media	
7. Placa de cimentación		7. No aplica		3. Irregularidad baja o inexistente	
8. No existe		8. Otro, Cuál?		TIPOLÓGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
9. Otro, Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:		1. Edificaciones con reforzamiento especial	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Reformas (si / no)		2. Edificaciones reforzadas	
1. Placa en concreto		2. En altura: No. de pisos adicionales		3. Mampostería reforzada	
2. Placa en Steel deck		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
3. Estructura metálica y teja		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		5. Estructuras ligeras	
4. Estructura de madera y teja		5. Otro, Cuál?		6. Construcciones simples	
5. Otro, Cuál?				7. Otro, Cuál?	
Observaciones:					
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
		X		DANOS EN PUERTAS Y VENTANAS	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
		X		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
GRIETAS</					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	1	
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA		PÁGINA	3 DE 6	
ACTA DE VECINDAD		FECHA		21 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Control de Obra No. 1354 / 2022	Control de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	21 FEBRERO 2023		
6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☒	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
EL PISO DE LA VIVIENDA ES EN CEMENTO Y SE ENCUENTRA ESMALTADO					
ESTADO DE PAREDES	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☒
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
LAS PAREDES INTERNAS DE LA VIVIENDA SON EN BAREQUE, CUENTAN CON PINTURA, SE EVIDENCIA DETERIORO Y FISURAS					
ESTADO DE TECHOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☒
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
EL TECHO DE LA VIVIENDA EN EL MADERA Y TEJA DE ZINC EN ESTADO REGULAR					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	BUENO	☐	REGULAR	☐
FISURAS	HUMEDAD	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	☐	REGULAR	☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
FIRMAS					
<div><div> Milton Fabian Vera Firma Nombre: Milton Fabian Vera Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 1003830889</div><div> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 1003830889</div></div>					
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MAEPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	4 DE 6			
OBJETO DEL PROYECTO				FECHA	(Día / Mes / Año)
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA				21	FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Control de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio	☒ Seguimiento		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página dosificada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Confitecila y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MIN-IN-3-FR-4
	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA			PÁGINA	3 DE 6
ACTA DE VECINDAD					
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
OBJETO DEL PROYECTO	FECHA				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	(Día / Mes / Año)				
Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	21 FEBRERO 2023				
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					

Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.

6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Corralia y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adicionar una página anexa de observaciones, una a juicio del componente técnico, no fueren tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato. Acta de Vecindad


	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MA-SPS-MH-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	6 DE 6			
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO PUEBLO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA (Día / Mes / Año)	21 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Suplemento		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN					
<p>BAÑOS</p> <div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div><div>COMEDOR</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>GARAJE</div></div> <p>VIA</p>					
FIRMAS					
Firma Nombre: <u>William Fabian Vera</u> Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: <u>1083878889</u>		Firma Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: <u>[Firma]</u> Testigo C.C. O.NIT:	
Original: Contralista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				
	CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA		
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA		(Día / Mes / Año)	
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		13 FEBRERO 2023		1 DE 5	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento 2	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA					
Ubicación:		Municipio		Vereda	
Dirección		SUAZA		GALLARDO	
Nombre de la persona que atiende la visita:		N/A		Teléfonos	
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		CC No.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		No. de Apartamentos		No. de pisos	
Edad de la construcción		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
No. de Hogares		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	
Niños (menores de 14 años)		1. Urbano; 2. Rural		2	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3	
ESTADO DEL PREDIO:		1. SI; 2. No		1	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Plano; 2. Onduleado; 3. Escarpado		1	
PENDIENTE DEL TERRENO		1. SI; 2. No		1	
SERVICIOS PUEBLOS		Observaciones del estado de las redes: PTICO PARA LAS AGUAS		RESIDUALES	
1. Acueducto		SI		NO	
2. Alcantarillado		SI		NO	
3. Energía		SI		NO	
4. Gas		SI		NO	
5. Teléfono		SI		NO	
6. Televisión cable		SI		NO	
7. Internet		SI		NO	
8. Otros		SI		NO	
DESTINACIÓN ECONÓMICA		1. Residencial		2. Comercial	
3. Industrial		4. Minero		5. Agropecuario	
6. Recreacional		7. Educativo		8. Suburbanidad	
9. Cultural		10. Religioso		11. Institucional	
12. Otro		Cual?		ACCESOS VEHICULARES	
Garaje		SI		NO	
Uso del garaje:		SI		NO	
Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Inq. Residente Interventoría		Inq. Residente Interventoría		Inq. Residente Interventoría	
Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No.	
C.C. O.N.T.		C.C. O.N.T.		C.C. O.N.T.	
Notas:		Notas:		Notas:	
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.	
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
		VERSION 1		PÁGINA 2 DE 5			
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año)		13 FEBRERO 2023			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento			
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL:			
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mado 4. Caissons 5. Concreto ciclópeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cuál?		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel Deck) 4. Vigas metálicas 5. Cerdas metálicas 6. Entremado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prehinchados en concreto 5. Manpostera confinada 6. Manpostera reforzada 7. Manpostera no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos y paneles en otros 12. Muros en bahareque 13. Muros en lapla pisada 14. Muros en adobe 15. Construcción improvisada 16. Mito 17. Otro, Cuál?			
SISTEMA DE CUBIERTA:		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:			
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel Deck 3. Estructura metálica y leja 4. Estructura de madera y leja 5. Otro, Cuál?		1. Reformas (sí / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente 4. Irregularidad alta 5. Irregularidad media 6. Irregularidad baja o inexistente 7. Otro, Cuál?			
Observaciones: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO:							
GRIETAS		FISURAS		BUENO			
HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE			
X		X		REGULAR			
X		X		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			
ESTADO DE LAS FACHADAS:							
GRIETAS		FISURAS		BUENO			
HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE			
X		X		REGULAR			
X		X		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:							
TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA FACHADA LATERAL DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN BAREQUE, SE EVIDENCIAN FISURAS A LO LARGO DE ESTA							
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:							
GRIETAS		FISURAS		BUENO			
HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE			
X		X		REGULAR			
X		X		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:							
TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA VIVIENDA CUENTA CON ANDEN EN CONCRETO Y PRESENTA FISURA, EL ACCESO DESDE LA VÍA ES EN TIERRA							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:							
MALLA EMBLONADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO			
POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO			
MURO		OTROS		MALO			
NO CUENTA CON CERRAMIENTO							

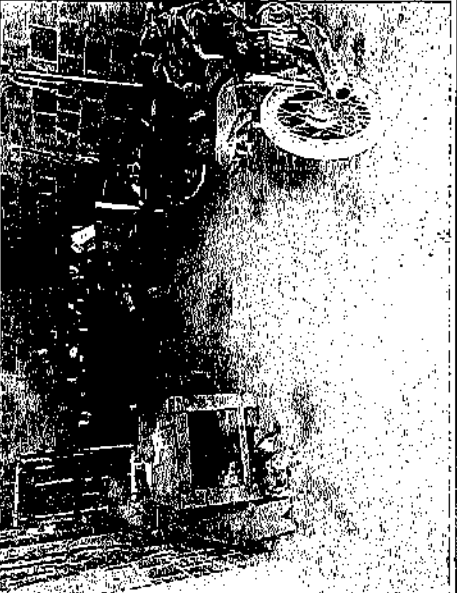
	DEPARTAMENTO DEL JULIA			MASPS-MH-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO	VERSIÓN
	FERNANDO JIMENEZ ROA			PÁGINA	1
ACTA DE VECINDAD				3 DE 5	
OBJETO DEL PROYECTO					
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS (ADJUNTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL JULIA.					
Contrato de Obra No. 1351 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Fecha 13 FEBRERO 2023	
		Acta de Vecindad de Seguimiento		(Día / Mes / Año)	
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE PISOS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE PAREDES (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE TECHOS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE FISURAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE HUMEDAD (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE DESPLAZAMIENTO (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE VENTANAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
ESTADO DE PUERTAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)					
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO					
FIRMAS					
Firma Responsable Unidad Social		Firma Ing. Residente Confidencial		Firma Nombre	
C.C.O. NIT.		Matrícula profesional No.		Tosligo C.C. O. NIT.	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJINDAD	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 4 DE 5
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	Inicial Inicial Inicial
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicial Inicial
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Notas: 6. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 7. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 8. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.		

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1				
	PÁGINA	5		VER	S.	
OBJETO DEL PROYECTO				FECHA		
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20N EN EL MUNICIPIO DE SUZÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				{Día / Mes / Año}		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Vejeidad de	Inicio	Suplemento	13	FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION						
						
VIA						
FIRMAS						
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contraloría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O.NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.
Original: Contraloría	Original: Contraloría	Original: Contraloría	Original: Contraloría	Original: Contraloría	Original: Contraloría	Original: Contraloría
Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).						

	DEPARTAMENTO DEL HUILA		CÓDIGO		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN		1	
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA		PÁGINA		3 DE 5	
ACTA DE VECINDAD				FECHA		(Día / Mes / Año)
				13		FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 30A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Inicio Seguimiento		☒
		5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO				
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO	BUENO	☐ REGULAR ☐ MALO ☐
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	BUENO	☒ REGULAR ☐ MALO ☒
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		LAS PAREDES ESTAN EL OBRA GRIS, LADRILLO				
ESTADO DE TECHOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	BUENO	☒ REGULAR ☐ MALO ☐
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		EL TECHO ES METALICO Y TEJA DE ZINC				
ESTADO DE FISURAS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	BUENO	☐ REGULAR ☐ MALO ☐
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
ESTADO DE FISURAS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	BUENO	☐ REGULAR ☐ MALO ☐
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
ESTADO DE FISURAS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	BUENO	☐ REGULAR ☐ MALO ☐
				DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
FIRMAS						
Firma		Firma		Firma		
Nombre:		Nombre:		Nombre:		
Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		
Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		
12.295.100						
C.C. O.N.T.:		C.C. O.N.T.:		C.C. O.N.T.:		
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)						
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.						

Foto p/aza.

	DEPARTAMENTO DEL NIULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERRANDO JIRENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASP-S-MN-IN-3-FR-4 VERSIÓN 1 PÁGINA 4 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE CALVARIO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL NIULA.	FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento ☒
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
			
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MAFPS-MH-IN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	5 DE 5
					FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento
				7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN		
<div>BAÑOS</div> <div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div><div>SALA</div></div> <div>VIA</div>						
FIRMAS						
Firma Nombre: <u>Floro Plaza</u>		Firma Nombre: <u>[Signature]</u>		Firma Nombre: <u>[Signature]</u>		
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contraloría		Ing. Residente Interventoría		
C.C. O.H.T. 12.298.100		Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No.		
Original: Contraloría		Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).		C.C. O.N.T.		

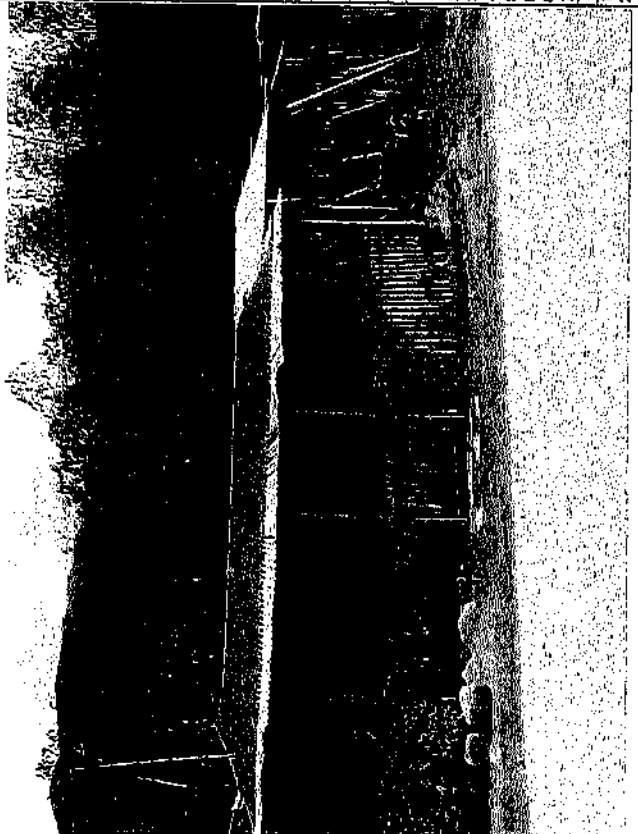
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALTARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1954 / 2022	Contrato de Intervención No. 1405 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento			
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
2. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento: HUILA	Municipio: SUAZA	Vereda: GALTARDO	PR	
Otorección:	N/A		Teléfonos:		
Nombre de la persona que atiende la visita: GUSTAVO FIERRO			CC No. 160010872	X	
Tipo de tenencia de la vivienda:			1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			GUSTAVO FIERRO		
Edad de la construcción			6 MESES	No. de Apartamentos	1
No. de Hogares			1	No. total residentes	1
Niños (menores de 14 años)			0	Adultos mayores (más de 60 años)	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:			1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:			1. Sin edificar; 2. Obra Grs; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			1. Si; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO			1. Plano; 2. Ordeñado; 3. Escarpato		
SERVICIOS PÚBLICOS			Observaciones del estado de las redes: NO CUENTA CON NINGUNO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, REALIZA VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIRECTAMENTE EN LA FUENTE HÍDRICA		
1. Acueducto			SI	NO	
2. Alcantarillado			X		
3. Energía			X		
4. Gas			X		
5. Teléfono			X		
6. Televisión cable			X		
7. Internet			X		
8. Otros			X		
DESTINACIÓN ECONÓMICA			Cual?		
1. Residencial			X		
2. Comercial					
3. Industrial					
4. Minero					
5. Agropecuario					
6. Recreacional					
7. Educativo					
8. Salud					
9. Cultural					
10. Religioso					
11. Institucional					
12. Otro					
ACCESOS VEHICULARES			SI ☐ NO ☒		
Uso del garaje:					

Firma	Firma
Nombre:	Nombre:
Ing. Residente Concedista	Ing. Residente Interventor
Matrícula profesional No. 7.610872	Matrícula profesional No.:
Notas:	
1. Si firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.	
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	

	DEPARTAMENTO DEL INIUA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN 1		PÁGINA 2 DE 5
	FECHA (Día / Mes / Año)		14 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL INIUA.	Contrato de Obra No. 1534 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento. ☒
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL			
SISTEMA DE ENTREPISO:			
CIMENTACIÓN: 1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Celosones ☐ 5. Concreto ciclópeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☐ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro. Cuál? BASE- VCEMENTO ☐	SISTEMA DE ENTREPISO: 1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cercas metálicas ☐ 6. Entramado en madera ☐ 7. No aplica ☒ 8. Otro. Cuál? ☐	SISTEMA ESTRUCTURAL 1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prefabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería en concreto ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Pórticos en bahareque ☐ 12. Muros en tapia pisada ☐ 13. Muros en adobe ☐ 14. Muros en concreto ☐ 15. Construcción improvisada ☐ 16. Mixto ☐ 17. Otro. Cuál? ☐	IRREGULARIDAD EN PLANTA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ IRREGULARIDAD EN ALTURA 1. Irregularidad alta ☐ 2. Irregularidad media ☐ 3. Irregularidad baja o inexistente ☐ TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 1. Edificaciones con reforzamiento ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento ☐ 5. Estructuras híbridas ☐ 6. Estructuras ligeras ☐ 7. Otro. Cuál? ☐
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO			
ESTADO DE LAS FACHADAS:			
GRIETAS ☐ FISURAS ☐ HUMEDAD ☐ DESPLAZAMIENTO ☐ FACHA EN LADRILLO SIN TERMINAR	BUENO ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐	REGULAR ☒ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS ☐	MALO ☐
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:			
GRIETAS ☐ FISURAS ☐ HUMEDAD ☐ DESPLAZAMIENTO ☐ LATERALES EN LADRILLO	BUENO ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐	REGULAR ☒ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS ☐	MALO ☐
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:			
GRIETAS ☐ FISURAS ☐ HUMEDAD ☐ DESPLAZAMIENTO ☐ NO CUENTA CON ANDEN, ACCESO EN TIERRA	BUENO ☒ DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA ☐	REGULAR ☒ GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm) ☐	MALO ☐
ESTADO DE CERRAMIENTOS:			
MALLA EMBLANADA ☐ POSTES DE CONCRETO ☐ POSTES DE MADERA ☐ CERCA VIVA ☐ MURO ☐ OTROS ☐	BUENO ☒	REGULAR ☒	MALO ☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVENIDAS:			
CUENTA CON CERRAMIENTO EN GUADUA EN MAL ESTADO			

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MIN-JN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	14 DE 15
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA				
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		(Día / Mes / Año)				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento	14 FEBRERO 2023	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Catastro y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

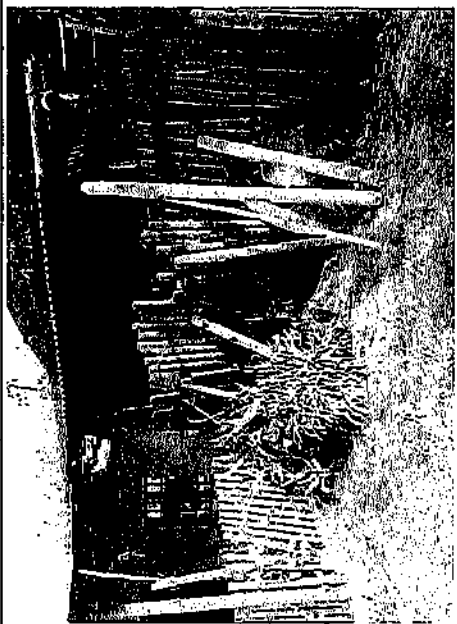
	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1	
	FERNANDO JIMENEZ ROA			PÁGINA	5 DE 5	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO PUEBLO DE GILLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZUA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1495 / 2022	Acta de Verificación de Seguimiento	14	FEBRERO	2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION						
BAÑOS						
<div>HABITACION</div> <div>COCINA</div>						
VIA						
FIRMAS						
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No. C.C. O.NIT:		
Gustavo Fierro 7610872		[Firma]		[Firma]		
Original: Contraloría Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).						

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASP9-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				VERSIÓN 1	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio		PÁGINA 1 DE 6	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO		FECHA 15 FEBRERO 2023	
				Ubicación: Municipio SUAZA Vereda GALLARDO PR 21780 MD			
				Dirección: N/A		Teléfonos	
				Nombre de la persona que atiende la visita: ENELIA PLAZAS PLAZAS		CC No. 26,575,713	
				Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
				Nombre del responsable / propietario de la construcción: ENELIA PLAZAS PLAZAS		CC No. 26,575,713	
				Edad de la construcción: 9 AÑOS		No. de pisos 1	
				No. de Hogares 1		No. total residentes 3	
				Niños (menores de 14 años) 2		Mujeres jefes de hogar 1	
				Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad 0	
				CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural		2	
				ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3	
				CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. SI; 2. No		2	
				PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		1	
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				Observaciones del estado de las redes:			
				1. Acueducto SI NO			
				2. Alcantarillado SI NO			
				3. Energía SI NO			
				4. Gas SI NO			
				5. Teléfono SI NO			
				6. Televisión cable SI NO			
				7. Internet SI NO			
				8. Otros SI NO			
				DESTINACIÓN ECONÓMICA			
				1. Residencial SI NO			
				2. Comercial SI NO			
				3. Industrial SI NO			
				4. Minero SI NO			
				5. Agropecuario SI NO			
				6. Recreacional SI NO			
				7. Educativo SI NO			
				8. Salud SI NO			
				9. Cultural SI NO			
				10. Religioso SI NO			
				11. Institucional SI NO			
				12. Otro TIENDA SI NO			
				ACCESOS VEHICULARES			
				Gareje SI NO			
				Uso del gareje: SI NO			

Firma Nombre: <u>Henelita Plazas P.</u>		Firma Nombre: <u>[Firma]</u>	
Responsable Unidad Social C.C. O NIT: <u>26.925.713</u>		Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: <u>[Firma]</u>	
Notas: 1. Se firmó en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		C.C. O NIT: C.C. O NIT:	

DEPARTAMENTO DEL HUILA		CÓDIGO		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN		1	
FERNANDO JIMENEZ ROA		PÁGINA		2 DE 5	
ACTA DE VECINDAD		FECHA		(Día / Mes / Año)	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 43H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE CALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		15 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento	
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel Deck)		3. Sistema combinado en concreto	
4. Caissons		4. Vigas metálicas		4. Prelabados en concreto	
5. Concreto ciclopaso		5. Cercas metálicas		5. Manpostera confinada	
6. Pilotes		6. Entramado en madera		6. Manpostera reforzada	
7. Placa de cimentación		7. No aplica		7. Manpostera no reforzada	
8. No identificada		8. Otro,Cuál?		8. Pórticos en acero	
9. No existe		9. Reformas en la estructura		9. Pórtico artostizado en acero	
10. Otro,Cuál?		1. Relomas (si/no)		10. Pórticos y paneles en madera	
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		11. Pórticos y paneles en otros	
1. Placa en concreto		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		12. Muros en bahareque	
2. Placa en Steel Deck		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		13. Muros en teja pisada	
3. Estructura metálica y teja		5. Otro,Cuál?		14. Muros en adobe	
4. Estructura de madera y teja		6. Otro,Cuál?		15. Construcción improvisada	
5. Otro,Cuál?		7. Otro,Cuál?		16. Mito	
Observaciones: Teniendo en cuenta		4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO		TIPOLÓGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		ESTADO DE LAS FACHADAS:		1. Edificaciones con reforzamiento espacial	
		GRIETAS		2. Edificaciones reforzadas	
		FISURAS		3. Manpostera reforzada	
		HUMEDAD		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
		X		5. Estructuras ligeras	
		X		6. Construcciones simples	
		X		7. Otro,Cuál?	
		X		8. Otro,Cuál?	
		X		9. Otro,Cuál?	
		X		10. Otro,Cuál?	
		X		11. Otro,Cuál?	
		X		12. Otro,Cuál?	
		X		13. Otro,Cuál?	
		X		14. Otro,Cuál?	
		X		15. Otro,Cuál?	
		X		16. Otro,Cuál?	
		X		17. Otro,Cuál?	
		X		18. Otro,Cuál?	
		X		19. Otro,Cuál?	
		X		20. Otro,Cuál?	
		X		21. Otro,Cuál?	
		X		22. Otro,Cuál?	
		X		23. Otro,Cuál?	
		X		24. Otro,Cuál?	
		X		25. Otro,Cuál?	
		X		26. Otro,Cuál?	
		X		27. Otro,Cuál?	
		X		28. Otro,Cuál?	
		X		29. Otro,Cuál?	
		X		30. Otro,Cuál?	
		X		31. Otro,Cuál?	
		X		32. Otro,Cuál?	
		X		33. Otro,Cuál?	
		X		34. Otro,Cuál?	
		X		35. Otro,Cuál?	
		X		36. Otro,Cuál?	
		X		37. Otro,Cuál?	
		X		38. Otro,Cuál?	
		X		39. Otro,Cuál?	
		X		40. Otro,Cuál?	
		X		41. Otro,Cuál?	
		X		42. Otro,Cuál?	
		X		43. Otro,Cuál?	
		X		44. Otro,Cuál?	
		X		45. Otro,Cuál?	
		X		46. Otro,Cuál?	
		X		47. Otro,Cuál?	
		X		48. Otro,Cuál?	
		X		49. Otro,Cuál?	
		X		50. Otro,Cuál?	
		X		51. Otro,Cuál?	
		X		52. Otro,Cuál?	
		X		53. Otro,Cuál?	
		X		54. Otro,Cuál?	
		X		55. Otro,Cuál?	
		X		56. Otro,Cuál?	
		X		57. Otro,Cuál?	
		X		58. Otro,Cuál?	
		X		59. Otro,Cuál?	
		X		60. Otro,Cuál?	
		X		61. Otro,Cuál?	
		X		62. Otro,Cuál?	
		X		63. Otro,Cuál?	
		X		64. Otro,Cuál?	
		X		65. Otro,Cuál?	
		X		66. Otro,Cuál?	
		X		67. Otro,Cuál?	
		X		68. Otro,Cuál?	
		X		69. Otro,Cuál?	
		X		70. Otro,Cuál?	
		X		71. Otro,Cuál?	
		X		72. Otro,Cuál?	
		X		73. Otro,Cuál?	
		X		74. Otro,Cuál?	
		X		75. Otro,Cuál?	
		X		76. Otro,Cuál?	
		X		77. Otro,Cuál?	
		X		78. Otro,Cuál?	
		X		79. Otro,Cuál?	
		X		80. Otro,Cuál?	
		X		81. Otro,Cuál?	
		X		82. Otro,Cuál?	
		X		83. Otro,Cuál?	
		X		84. Otro,Cuál?	
		X		85. Otro,Cuál?	
		X		86. Otro,Cuál?	
		X		87. Otro,Cuál?	
		X		88. Otro,Cuál?	
		X		89. Otro,Cuál?	
		X		90. Otro,Cuál?	
		X		91. Otro,Cuál?	
		X		92. Otro,Cuál?	
		X		93. Otro,Cuál?	
		X		94. Otro,Cuál?	
		X		95. Otro,Cuál?	
		X		96. Otro,Cuál?	
		X		97. Otro,Cuál?	
		X		98. Otro,Cuál?	
		X		99. Otro,Cuál?	
		X		100. Otro,Cuál?	
		X		101. Otro,Cuál?	
		X		102. Otro,Cuál?	
		X		103. Otro,Cuál?	
		X		104. Otro,Cuál?	
		X		105. Otro,Cuál?	
		X		106. Otro,Cuál?	
		X		107. Otro,Cuál?	
		X		108. Otro,Cuál?	
		X		109. Otro,Cuál?	
		X		110. Otro,Cuál?	
		X		111. Otro,Cuál?	
		X		112. Otro,Cuál?	
		X		113. Otro,Cuál?	
		X		114. Otro,Cuál?	
		X		115. Otro,Cuál?	
		X		116. Otro,Cuál?	
		X		117. Otro,Cuál?	
		X		118. Otro,Cuál?	
		X		119. Otro,Cuál?	
		X		120. Otro,Cuál?	
		X		121. Otro,Cuál?	
		X		122. Otro,Cuál?	
		X		123. Otro,Cuál?	
		X		124. Otro,Cuál?	
		X		125. Otro,Cuál?	
		X		126. Otro,Cuál?	
		X		127. Otro,Cuál?	
		X		128. Otro,Cuál?	
		X		129. Otro,Cuál?	
		X		130. Otro,Cuál?	
		X		131. Otro,Cuál?	
		X		132. Otro,Cuál?	
		X		133. Otro,Cuál?	
		X		134. Otro,Cuál?	
		X		135. Otro,Cuál?	
		X		136. Otro,Cuál?	
		X		137. Otro,Cuál?	
		X		138. Otro,Cuál?	
		X		139. Otro,Cuál?	
		X		140. Otro,Cuál?	
		X		141. Otro,Cuál?	
		X		142. Otro,Cuál?	
		X		143. Otro,Cuál?	
		X		144. Otro,Cuál?	
		X		145. Otro,Cuál?	
		X		146. Otro,Cuál?	
		X		147. Otro,Cuál?	
		X		148. Otro,Cuál?	
		X		149. Otro,Cuál?	
		X		150. Otro,Cuál?	
		X		151. Otro,Cuál?	
		X		152. Otro,Cuál?	
		X		153. Otro,Cuál?	
		X		154. Otro,Cuál?	
		X		155. Otro,Cuál?	
		X		156. Otro,Cuál?	
		X		157. Otro,Cuál?	
		X		158. Otro,Cuál?	
		X		159. Otro,Cuál?	
		X		160. Otro,Cuál?	
		X		161. Otro,Cuál?	
		X		162. Otro,Cuál?	
		X		163. Otro,Cuál?	
		X		164. Otro,Cuál?	
		X		165. Otro,Cuál?	
		X		166. Otro,Cuál?	
		X		167. Otro,Cuál?	
		X		168. Otro,Cuál?	
		X		169. Otro,Cuál?	
		X		170. Otro,Cuál?	
		X		171. Otro,Cuál?	
		X		172. Otro,Cuál?	
		X		173. Otro,Cuál?	
		X		174. Otro,Cuál?	
		X		175. Otro,Cuál?	
		X		176. Otro,Cuál?	
		X		177. Otro,Cuál?	
		X		178. Otro,Cuál?	
		X		179. Otro,Cuál?	
		X		180. Otro,Cuál?	
		X		181. Otro,Cuál?	
		X		182. Otro,Cuál?	
		X		183. Otro,Cuál?	
		X		184. Otro,Cuál?	
		X		185. Otro,Cuál?	
		X		186. Otro,Cuál?	
		X		187. Otro,Cuál?	
		X		188. Otro,Cuál?	
		X		189. Otro,Cuál?	
		X		190. Otro,Cuál?	
		X		191. Otro,Cuál?	
		X		192. Otro,Cuál?	
		X		193. Otro,Cuál?	
		X		194. Otro,Cuál?	
		X		195. Otro,Cuál?	
		X		196. Otro,Cuál?	
		X		197. Otro,Cuál?	
		X		198. Otro,Cuál?	
		X		199. Otro,Cuál?	
		X		200. Otro,Cuál?	
		X		201. Otro,Cuál?	
		X		202. Otro,Cuál?	
		X		203. Otro,Cuál?	
		X		204. Otro,Cuál?	
		X		205. Otro,Cuál?	
		X		206. Otro,Cuál?	
		X		207. Otro,Cuál?	
		X		208. Otro,Cuál?	
		X		209. Otro,Cuál?	
		X		210. Otro,Cuál?	
		X		211. Otro,Cuál?	
		X		212. Otro,Cuál?	
		X		213. Otro,Cuál?	
		X		214. Otro,Cuál?	
		X		215. Otro,Cuál?	
		X		216. Otro,Cuál?	
		X		217. Otro,Cuál?	
		X		218. Otro,Cuál?	
		X		219. Otro,Cuál?	
		X		220. Otro,Cuál?	
		X		221. Otro,Cuál?	
		X		222. Otro,Cuál?	
		X		223. Otro,Cuál?	
		X		224. Otro,Cuál?	
		X		225. Otro,Cuál?	
		X		226. Otro,Cuál?	
		X		227. Otro,Cuál?	
		X		228. Otro,Cuál?	
		X		229. Otro,Cuál?	
		X		230. Otro,Cuál?	
		X		231. Otro,Cuál?	
		X		232. Otro,Cuál?	
		X		233. Otro,Cuál?	
		X		234. Otro,Cuál?	
		X		235. Otro,Cuál?	
		X		236. Otro,Cuál?	
		X		237. Otro,Cuál?	
		X		238. Otro,Cuál?	
		X		239. Otro,Cuál?	
		X		240. Otro,Cuál?	
		X		241. Otro,Cuál?	
		X		242. Otro,Cuál?	
		X		243. Otro,Cuál?	
		X		244. Otro,Cuál?	
		X		245. Otro,Cuál?	
		X		246. Otro,Cuál?	
		X		247. Otro,Cuál?	
		X		248. Otro,Cuál?	
		X		249. Otro,Cuál?	
		X		250. Otro,Cuál?	
		X		251. Otro,Cuál?	
		X		252. Otro,Cuál?	
		X		253. Otro,Cuál?	
		X		254. Otro,Cuál?	
		X		255. Otro,Cuál?	
		X		256. Otro,Cuál?	
		X		257. Otro,Cuál?	
		X		258. Otro,Cuál?	
		X		259. Otro,Cuál?	
		X		260. Otro,Cuál?	
		X		261. Otro,Cuál?	
		X		262. Otro,Cuál?	
		X		263. Otro,Cuál?	
		X		264. Otro,Cuál?	
		X		265. Otro,Cuál?	
		X		266. Otro,Cuál?	
		X		267. Otro,Cuál?	
		X		268. Otro,Cuál?	
		X		269. Otro,Cuál?	
		X		270. Otro,Cuál?	
		X		271. Otro,Cuál?	
		X		272. Otro,Cuál?	
		X		273. Otro,Cuál?	
		X		274. Otro,Cuál?	
		X		275. Otro,Cuál?	
		X		276. Otro,Cuál?	
		X		277. Otro,Cuál?	
		X		278. Otro,Cuál?	
		X		279. Otro,Cuál?	
		X		280. Otro,Cuál?	
		X		281. Otro,Cuál?	
		X		282. Otro,Cuál?	
		X		283. Otro,Cuál?	
		X		284. Otro,Cuál?	
		X		285. Otro,Cuál?	
		X		286. Otro,Cuál?	
		X		287. Otro,Cuál?	
		X		288. Otro,Cuál?	
		X		289. Otro,Cuál?	
		X		290. Otro,Cuál?	
		X		291. Otro,Cuál?	
		X		292. Otro,Cuál?	
		X		293. Otro,Cuál?	
		X		294. Otro,Cuál?	
		X		295. Otro,Cuál?	
		X		296. Otro,Cuál?	
		X		297. Otro,Cuál?	
		X		298. Otro,Cuál?	
		X		299. Otro,Cuál?	
		X		300. Otro,Cuál?	
		X		301. Otro,Cuál?	
		X		302. Otro,Cuál?	
		X		303. Otro,Cuál?	
		X		304. Otro,Cuál?	
		X		305. Otro,Cuál?	
		X		306. Otro,Cuál?	
		X		307. Otro,Cuál?	
		X		308. Otro,Cuál?	
		X		309. Otro,Cuál?	
		X		310. Otro,Cuál?	
		X		311. Otro,Cuál?	
		X		312. Otro,Cuál?	
		X		313. Otro,Cuál?	
		X		314. Otro,Cuál?	
		X		315. Otro,Cuál?	
		X		316. Otro,Cuál?	
		X		317	

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECONDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46RL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SURZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		VERSIÓN	1
					PÁGINA	3 DE 6.
Control de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento		FECHA (Día / Mes / Año) 15 FEBRERO 2023
6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
ESTADO DE		PISOS		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
PISOS EN CONCRETO ON FISURAS						
ESTADO DE		PAREDES		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
PAREDES EN BAREQUE REPELLADA CON FISURAS						
ESTADO DE		TECHOS		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
TECHOS EN MADERA Y TEJAS DEZINO - CUENTA CON RECUBRIMIENTO INTERNO POR ZONAS EN POLISOMBRA BLANCA						
ESTADO DE		FISURAS		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
ESTADO DE		FISURAS		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
ESTADO DE		FISURAS		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
ESTADO DE		FISURAS		BUENO		REGULAR
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
FIRMAS						
Firma: Nombre: Daniel Rivas R. Responsable Unidad Social: Ing. Residente Interventoría C.C. O.N.T.: 26 543 713. Matrícula profesional No.: Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.						

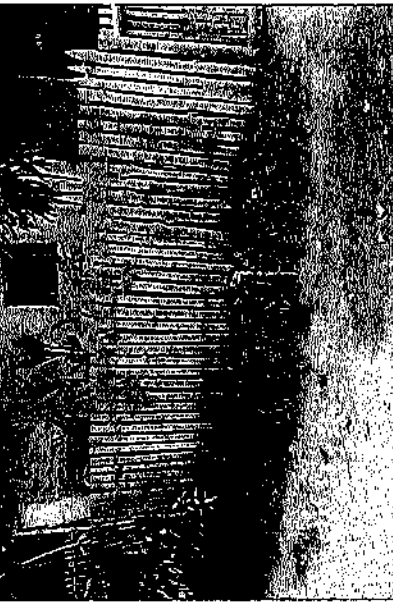
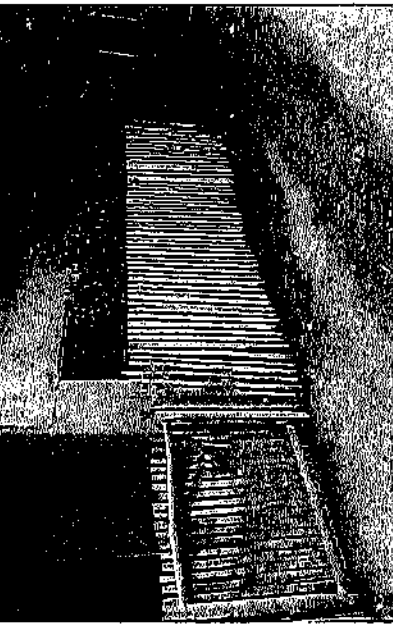
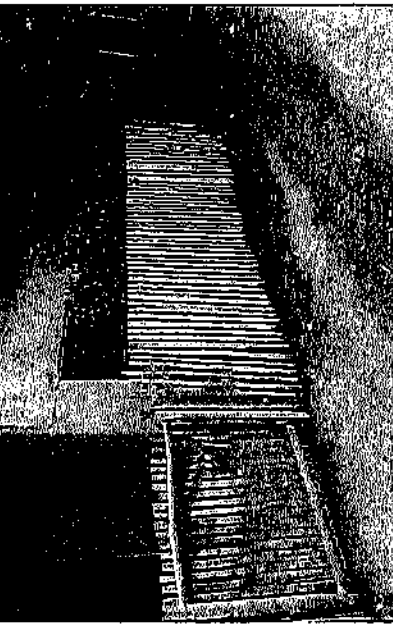
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD					CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	11 DE 15
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	15	FEBRERO	2023		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>							

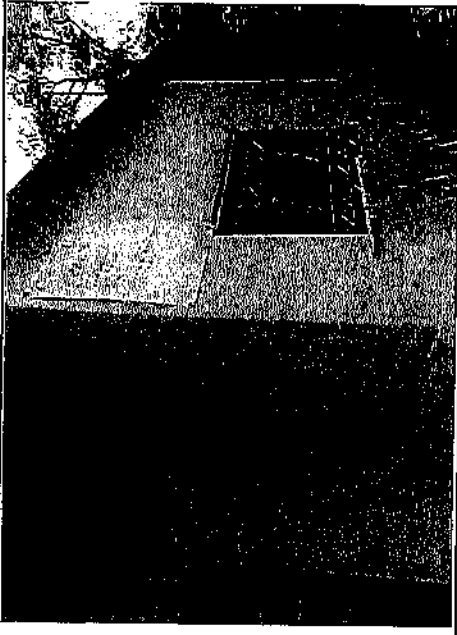
			DEPARTAMENTO DEL HUILA		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	1
			FERNANDO JIMENEZ ROA		PÁGINA	5 DE 6
			ACTA DE VECINDAD		FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46PL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZUA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Control de Obra No. 1354 / 2022	Control de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de		Inicio	Seguimiento	
						(Día / Mes / Año)
				15		FEBRERO 2023
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
						
Notas:						
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.						
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.						
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.						

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MIN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1					
	PÁGINA	6 DE 6					
	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 FEBRERO 2023					
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.8 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 451110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento			
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION							
<div><div>BAÑOS - LAVADERO</div><div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div><div>SALA COMEDOR</div><div>HABITACION</div></div></div> <div>VIA</div>							
FIRMAS							
Firma Nombre: Responsable Unidad Ejecutiva C.C. O.N.T. 24 582 713.	Firma Nombre: Ing. Residente Contraloría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: C.C. O.N.T.:				
Original: Contraloría. Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).							

DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Control de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicial Seguinte	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			
			
2. DATOS DEL PREDIO		Vereda GALLARDO PR 217700 MD	
Ubicación: Departamento HUILA Municipio SUAZA		Vereda GALLARDO PR 217700 MD	
Dirección N/A		Teléfonos	
Nombre de la persona que allende la visita: DURANTE LOS DIAS DE VISITA NO SE LOCALIZÓ HABITANTES			
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propio; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: CC No.			
Edad de la construcción		No. de pisos	
No. de Hogares		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menores de 14 años)		Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. SI; 2. No			
PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			
SERVICIOS PUBLICOS Observaciones del estado de las redes:			
1. Acueducto 2. Alcantarillado 3. Energía 4. Gas 5. Teléfono 6. Televisión cable 7. Internet 8. Otros		SI NO	
DESTINACIÓN ECONOMICA		Cual?	
1. Residencial 2. Comercial 3. Industrial 4. Minero 5. Agropecuario 6. Recreacional		7. Educativo 8. Salud 9. Cultural 10. Religioso 11. Institucional 12. Otro	
ACCESOS VEHICULARES		Garaje	
SI		NO	
Uso del garaje:			
FIRMAS			
Firma Nombre: Ing. Residente Contraloría C.C. O NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

	DEPARTAMENTO DEL IQUIA		CÓDIGO		INMSPS-MN-IN-3-FR-4		
	SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		VERSIÓN		1		
		PÁGINA		2 de 6			
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL IQUIA.		FECHA		(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1351 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022		Inicio		14 FEBRERO 2023	
		Acta de Velocidad de Seguimiento					
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Lámula colaborante (Steel deck)		3. Sistema combinado en concreto		3. Irregularidad baja o inexistente	
4. Caissons		4. Vigas metálicas		4. Prefabricados en concreto			
5. Concreto ciclopao		5. Cercas metálicas		5. Mampostería conlinda			
6. Pilotes		6. Enlramado en madera		6. Mampostería reforzada		1. Irregularidad alta	
7. Placa de cimentación		7. No aplica		7. Mampostería no reforzada		2. Irregularidad media	
8. No identificada		8. Otro, Cuál?		8. Pórtico en acero		3. Irregularidad baja o inexistente	
9. No existe				9. Pórtico arriostrado en acero			
		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros		1. Edificaciones con reforzamiento especial	
		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque		2. Edificaciones reforzadas	
		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en losa plisada		3. Mampostería reforzada	
		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adoba		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
		5. Otro, Cuál?		15. Construcción improvisada		5. Estructuras ligeras	
				16. Níclo		6. Construcciones simples	
				17. Otro, Cuál?		7. Otro, Cuál?	
Observaciones: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VELOCIDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PRECIO							
GRIETAS		X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO
						BUENO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VELOCIDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA VIVIENDA, LA FACHADA ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE Y CUENTA CON PINTURA VERDE EN ESTADO REGULAR Y CON FISURAS							
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:							
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO
						BUENO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VELOCIDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERIOR DE LA VIVIENDA, LA FACHADA ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE Y CUENTA CON PINTURA VERDE EN ESTADO REGULAR Y CON FISURAS							
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:							
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO
						BUENO	DISTANCIA DE CONSTRUCCION A VIA
TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VELOCIDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERIOR DE LA VIVIENDA, CUENTA CON ANDEN EN CONCRETO							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:							
MALLA EMBLONADA			POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA
						BUENO	MURO
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VELOCIDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERIOR DE LA VIVIENDA, CUENTA CON CERRAMIENTO EN GUADUA EN ESTADO REGULAR							

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 4 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023		
Contrato de Obra No. 354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Velocidad de Inicio Suplemento ☒	8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
				
				
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Velocidad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Velocidad.				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJINDAD			CÓDIGO	MASP-S-MN-IN-3-FR-4	
	VERSION	1				
	PAGINA	5 DE 6				
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZKA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	(Dia / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Control de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Veclidad de Inicio Seguimiento ☒			
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
<p>Notas:</p> <p>6. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Veclidad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales letrados del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueren tenidas en cuenta en el esquema Propuesto del formato Acta de Veclidad.</p>						

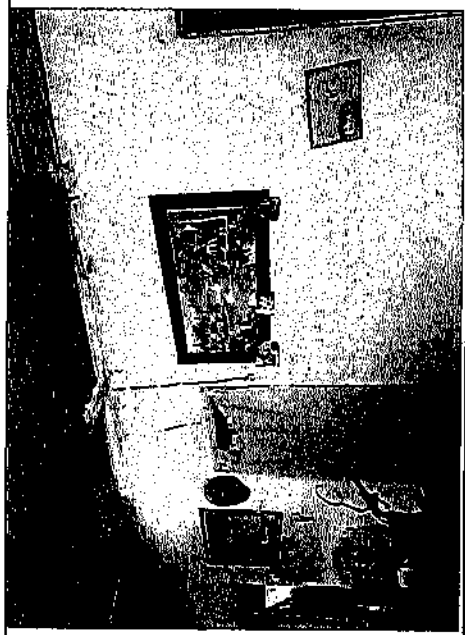
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA FECHA	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 6 DE 6 (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE DEL CENTRO PUEBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022 Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐	7. PLANO DE LA CONSTRUCCION	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>VIA</p>			
FIRMAS			
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.N.T. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Admisión).	 Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	 Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Testigo C.C. O.N.T.

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD			
	CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Velocidad de Seguimiento ☒	13 FEBRERO 2023	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				
2. DATOS DEL PREDIO				
Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
Dirección	HUILA	SUAZA	GALLARDO	217760 MI
Nombre de la persona que afianza la visita:		ROGELIO PLAZAS		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propie; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		ROGELIO PLAZAS		
Edad de la construcción		8 No. de Apartamentos 1 No. de pisos 1		
No. de Hogares		1 No. total residentes 6 Mujeres jefes de hogar 0		
Niños (menos de 14 años)		2 Adultos mayores (más de 60 años) 2 Personas en situación de discapacidad 0		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Si; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS				
1. Acueducto		SI NO		
2. Alcantarillado		X		
3. Energía		X		
4. Gas		X		
5. Teléfono		X		
6. Televisión cable		X		
7. Internet		X		
8. Otros		Cual?		
DESTINACIÓN ECONÓMICA		1. Residencial ☒ 7. Educativo ☐ 8. Salud ☐ 9. Cultural ☐ 10. Religioso ☐ 11. Institucional ☐ 12. Otro ☐		
ACCESOS VEHICULARES		Garaje SI ☐ NO ☒		
FIRMAS		Firma Nombre		
Rogelio Plazas		Firma Nombre		
Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría		
Matrícula profesional No. 17698898		Matrícula profesional No.		
C.C. O NIT:		C.C. O NIT:		
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Velocidad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de velocidad suscrita entre las partes.				

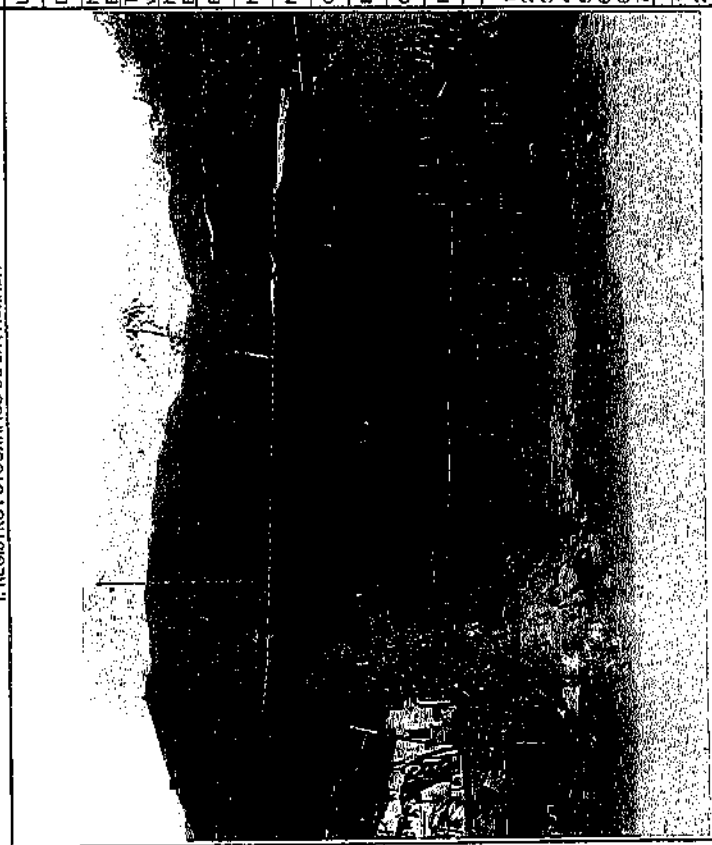
		DEPARTAMENTO DEL HULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MIN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48HL19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HULA.		FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Inició Seguimiento 13 FEBRERO 2023	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Caissons 5. Concreto ciclopaeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro,Cuál? BASE PISO		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cercas metálicas 6. Enlaminado en madera 7. No aplica 8. Otro,Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente 4. Irregularidad alta 5. Irregularidad media 6. Irregularidad baja o inexistente	
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro,Cuál?		1. Reformas (si / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro,Cuál?		1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Manposteria reforzada 4. Estructuras con confinamiento 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro,Cuál?	
Observaciones:					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☒ REGULAR ☒ MALO ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		HUMEDAD		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
LA FACHADA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN BARREQUE CON REPULLO EN CEMENTO Y PINTURA EN ESTADO REGULAR					
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:					
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☒ REGULAR ☒ MALO ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:					
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:					
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		HUMEDAD		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
CUENTA CON ANDEN EN CONCRETO, SE EVIDENCIAN FISURAS Y GRIETAS EN ALGUNAS PARTES. EL ACCESO SE ENCUENTRA EN TIERRA					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA ESALABONADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		POSTES DE MADERA		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
NO CUENTA CON CERRAMIENTO					

	DEPARTAMENTO DEL INILA SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4								
			VERSIÓN	1								
			PÁGINA	3 DE 6								
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALIARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL INILA.											
Contrato de Obra No. 1354 I 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 I 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento	13 FEBRERO 2023								
6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO												
ESTADO DE PISOS												
GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO	
PISOS EN CONCRETO (AMARILLO) SE EVIDENCIA DETERIORO Y LEVANTAMIENTO DEL MISMO												
ESTADO DE PAREDES												
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: LAS PAREDES DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRAN CONSTRUÍDAS EN BAREQUE CON REPELLO EN CEMENTO Y PINTURA, LA CUAL PRESENTA FISURAS												
ESTADO DE TECHOS												
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: EL TECHO DE LA VIVIENDA ESTÁ CONSTRUÍDO EN MADERA Y TEJAS DE ZINC, SE EVIDENCIA DETERIORO												
ESTADO DE												
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:												
ESTADO DE												
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:												
ESTADO DE												
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:												
ESTADO DE												
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:												
FIRMAS												
Firma	Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	
Notas:												
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)												
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.												


Yogelio Plata 17698898

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>					CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4	
						VERSIÓN	1	
						PÁGINA	4 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VAS TERCERAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					FECHA	(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Regulamento		13	FEBRERO	2023
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
								
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>								

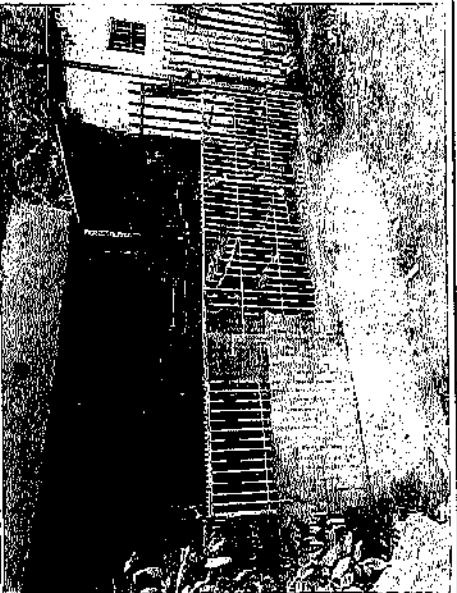
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			NASPS-MN-IN-3-FR-4							
				CÓDIGO							
				VERSIÓN	1						
				PÁGINA	6 DE 6						
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.									
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	13	FEBRERO 2023						
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION											
<p>BARROS</p> <table border="1"><tr><td>SALA</td><td>HABITACION</td></tr><tr><td>COCINA</td><td>HABITACION</td></tr><tr><td>HABITACION</td><td>HABITACION</td></tr></table>						SALA	HABITACION	COCINA	HABITACION	HABITACION	HABITACION
SALA	HABITACION										
COCINA	HABITACION										
HABITACION	HABITACION										
VIA											
FIRMAS											
Firma Nombre: Rogelio Plata Responsable Unidad Social 17698898		Firma Nombre: [Firma] Ing. Residente Contrata Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: [Firma] Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:							
Original: Contrata. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).											

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD				CÓDIGO	MAFPS-MN-IN-3-FR-4
	OBJETO DEL PROYECTO		FECHA		VERSIÓN	1
Contrato de Obra No. 1354		Acta de Vejeidad de		PÁGINA	1 DE 5	
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		14 FEBRERO 2023				
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO				
		Ubicación: Huila		Vereda: GALLARDO		
		Dirección: N/A		PR: 21+766 MO		
		Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.		
		EL PROPIETARIO NO ATENDIÓ LA VISITA				
		Tipo de tenencia de la vivienda:		1		
		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
		Nombre del responsable / propietario de la construcción:				
		EVELIO PLAZAS				
		Edad de la construcción:		No. de pisos		
		No. de Hogares		Mujeres jefes de hogar		
Niños (menores de 14 años)		Personas en situación de discapacidad				
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				
SERVICIOS PÚBLICOS						
1. Acueducto		SI NO				
2. Alcantarillado						
3. Energía						
4. Gas						
5. Teléfono						
6. Televisión cable						
7. Internet						
8. Otros		Cuál?				
DESTINACIÓN ECONÓMICA		ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial		Garaje				
2. Comercial		SI NO				
3. Industrial		Uso del garaje:				
4. Minero						
5. Agropecuario						
6. Recreacional						
7. Educativo						
8. Salubridad						
9. Cultural						
10. Religioso						
11. Institucional						
12. Otro						


Firma
Nombre:
Ing. Residente Catastrista
Matrícula profesional No.:
C.C. O NT:
Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vejeidad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vejeidad suscrita entre las partes.


Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.:
C.C. O NT:
Notas:

	DEPARTAMENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO	MA-SPS-MN-IN-3-FR-4
	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMENEZ ROA		PÁGINA	2 DE 5
ACTA DE VECINDAD				
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HULA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1495 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	14	FEBRERO 2023
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL				
CIMENTACIÓN:				
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Irregularidad alta
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Irregularidad media
3. Sistema mixto	☐	3. Laminas colaborante (Steel deck)	☐	3. Irregularidad baja o inexistente
4. Calsons	☐	4. Vigas metálicas	☐	
5. Concreto ciclópero	☐	5. Cercas metálicas	☐	
6. Pilotes	☐	6. Ecranado en madera	☐	
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	
8. No identificada	☐	8. Otro, Cuál?	☐	
9. No existe	☐		☐	
10. Otro, Cuál?	☐		☐	
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA				
1. Reformas (si/no)	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	
2. En altura: No. de pisos adicionales	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	☐	4. Prelabricados en concreto	☐	
5. Otro, Cuál?	☐	5. Manposteria confinada	☐	
SISTEMA DE CUBIERTA				
1. Placa en concreto	☐	6. Manposteria reforzada	☐	
2. Placa en Steel deck	☐	7. Manposteria no reforzada	☐	
3. Estructura metálica y leja	☐	8. Pórticos en acero	☐	
4. Estructura de madera y leja	☐	9. Pórtico arriostrado en acero	☐	
5. Otro, Cuál?	☐	10. Pórticos y paneles en madera	☐	
TIPOLÓGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN				
1. Edificaciones con reforzamiento especial				
2. Edificaciones reforzadas				
3. Manposteria reforzada				
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas				
5. Estructuras ligeras				
6. Construcciones simples				
7. Otro, Cuál?				
Observaciones: EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA NO ATENDIO LA VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD				
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO				
ESTADO DE LAS FACHADAS:				
GRIETAS	X	FISURAS	X	BUENO
		HUMEDAD	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
				REGULAR
				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
				IRREGULAR
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA NO ATENDIO LA VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERIOR DE LA VIVIENDA, LA FACHADA ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE Y CUENTA CON PINTURA VERDE EN ESTADO REGULAR Y CON FISURAS				
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				
GRIETAS		FISURAS		BUENO
		HUMEDAD		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
				REGULAR
				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
				IRREGULAR
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				
TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA NO ATENDIO LA VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERIOR DE LA VIVIENDA, LA FACHADA LATERAL ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE EN ESTADO REGULAR Y CON FISURAS				
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				
GRIETAS		FISURAS		BUENO
		HUMEDAD		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA
				REGULAR
				GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)
				IRREGULAR
TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA NO ATENDIO LA VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL CUENTA CON ANDEN EN CONCRETO EN ESTADO REGULAR, SE EVIDENCIAN FISURAS Y GRIETAS				
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				
MALLA EMBROMADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO
		POSTES DE MADERA		MURO
				REGULAR
				OTROS
				IRREGULAR
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA NO ATENDIO LA VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD, DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL CUENTA CON CERRAMIENTO EN REJA METALICA COLOR GRIS				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4 VERSIÓN 1 PÁGINA 11 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	Contrato de Obra No. 1354 / 2022 Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022 Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
			
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.			

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JUJUEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>		<p>CÓDIGO</p>		<p>MASPS-MN-IN-3-FR-4</p>	
			<p>VERSIÓN</p>		<p>1</p>	
			<p>PÁGINA</p>		<p>5 DE 5</p>	
			<p>FECHA</p>		<p>(Día / Mes / Año)</p>	
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>		<p>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>		<p>14 FEBRERO 2023</p>		
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>		<p>Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022</p>		<p>Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento ☒ ☐</p>		
<p>7. PLANO DE LA CONSTRUCCION</p>						
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>						
<p>VIA</p>						
<p>FIRMAS</p>						
<p>Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: Original, Contratista.</p>		<p>Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:</p>		<p>Firma Nombre: Ing. Residente Interventor Matrícula profesional No.:</p>		
<p>Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).</p>						

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD				CÓDIGO MASPS-MH-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				VERSIÓN 1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vejecidad de Inicio Seguimiento	2. DATOS DEL PREDIO		PÁGINA 1 DE 5
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		FECHA 14 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)	
		Ubicación: HUILA	Municipio SUIZA	Vereda GALLARDO	PR 217767
		Dirección	N/A		Teléfonos
		Nombre de la persona que allende la villa:			
		Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
		Nombre del responsable / propietario de la construcción:			
		Edad de la construcción	No. de Apartamentos	No. de pisos	CC No.
		No. de Hogares	No. total residentes	Mujeres jefes de hogar	
		Niños (menores de 14 años)	Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad	
		CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural			
		ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado			
		CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. SI; 2. No			
		PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			
		SERVICIOS PÚBLICOS			
		1. Acueducto	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
		2. Alcantarillado			
		3. Energía			
		4. Gas			
		5. Teléfono			
		6. Televisión cable			
		7. Internet			
		7. Otros			
		DESTINACIÓN ECONOMICA			
		1. Residencial			ACCESOS VEHICULARES
		2. Comercial			Garaje
		3. Industrial			SI ☐ NO ☐
		4. Minero			Uso del garaje:
		5. Agropecuario			
		6. Recreacional			
		7. Educativo			
		8. Seguridad			
		9. Cultural			
		10. Religioso			
		11. Institucional			
		12. Otro			

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O.RIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.
Notas:			
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vejecidad corresponde a la realidad.			
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vejecidad suscrita entre las partes.			


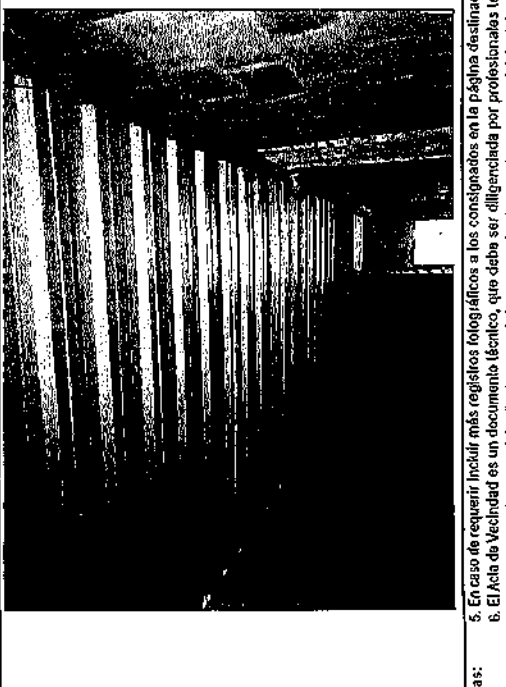
	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-1
	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD			VERSIÓN	1
				PÁGINA	2 DE 5.
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA			
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		(Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1455 / 2022		14 FEBRERO 2023	
		Acta de Vejeidad de Seguimiento			
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas		1. Placa madre de concreto		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corrientes		2. Placa aligerada de concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Irregularidad baja o inexistente	
4. Calensos		4. Vigas metálicas			
5. Concreto ciclopaso		5. Cercas metálicas		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes		6. Entramado en madera		1. Irregularidad alta	
7. Placa de cimentación		7. No aplica		2. Irregularidad media	
8. No identificada		8. Otro, Cuál?		3. Irregularidad baja o inexistente	
9. No existe					
10. Otro, Cuál?					
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
1. Placa en concreto		1. Reformas (s/f no)		1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Placa en Steel deck		2. En altura: No. de pisos adicionales		2. Edificaciones reforzadas	
3. Estructura metálica y leja		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		3. Mampostería reforzada	
4. Estructura de madera y leja		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructura híbrida	
5. Otro, Cuál?		5. Otro, Cuál?		5. Estructuras ligeras	
				6. Construcciones simples	
				7. Otro, Cuál?	
Observaciones: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VEJECIDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA QUE FUERAN MAYORES DE EDAD Y PUDIERAN ATENDER LA VISITA					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
GRIETAS		FIGURAS	X	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:					
GRIETAS		FIGURAS	X	BUENO	REGULAR
				DANOS EN REPELO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:					
GRIETAS		FIGURAS	X	BUENO	REGULAR
				DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)
				3.6	10
DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL AL EXTERIOR DE LA VIVIENDA CUENTA CON ANDÉN EN BUEN ESTADO, SE EVIDENCIAN ALGUNAS FIGURAS					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA ESABONADA		POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	BUENO	REGULAR
				MURO	OTROS
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:					
DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL AL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE EVIDENCIA QUE ESTA NO CUENTA CON CERRAMIENTO Y EL ACCESO DESDE LA VÍA ES EN TIERRA					

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MNHN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	14 DE 5.	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 40HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inició	14	FEBRERO	2023
		Seguimiento	☒			
<p>4. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	DEPARTAMENTO DEL NIULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 5 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO Poblado DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL NIULA.	FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Verificación de Inicio ☐ Seguimiento ☐	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION			
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>			
VIA _____			
FIRMAS			
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contraloría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Testigo C.C. O NIT:
Original: Contraloría. Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJIDAD			CÓDIGO MASPS-MH-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48H.10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALÁRDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vejidad de Seguimiento	Inicio	2023
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL				
CIMENTACIÓN:	SISTEMA DE ENTREPISO:	SISTEMA ESTRUCTURAL	IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Caissons 5. Concreto ciclopeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cuál?	1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cercas metálicas 6. Enramado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cuál?	1. Pórticos en concreto reforzado 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prelabificados en concreto 5. Mampostería confinada 6. Mampostería reforzada 7. Mampostería no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico articulado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos y paneles en otros 12. Muros en bahareque 13. Muros en tapia pisada 14. Muros en adobe 15. Construcción improvisada 16. Mixto 17. Otro, Cuál?	1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		IRREGULARIDAD EN ALTURA		
1. Reformas (si/no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente		
SISTEMA DE CUBIERTA		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN		
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro, Cuál?		1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?		
Observaciones:				
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO				
ESTADO DE LAS FACHADAS:		BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
LA FACHADA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LADRILLO SIN PINTURA NI PAÑETE				
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
EN LADRILLO				
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA
				3.5
				GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)
				5
EL ANDÉN DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUÍDO EN PLACA DE CEMENTO, SE EVIDENCIAN GRIETAS Y FISURAS SOBRE ESTA				
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				
MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO
				REGULAR ☐ MALO ☐
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
MURO EN LADRILLO A LA VISTA DE ALTURA APROXIMADA DE 0.66 MTS (CERRAMIENTO LATERAL DERECHO SOLAMENTE)				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 3 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL 10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Conflicto de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
ESTADO DE GRIETAS	ESTADO DE PISOS	ESTADO DE FISURAS	5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO	
			Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	
			BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐	
			DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
			VENTANAS	
CUENTA CON PISOS EN TIERRA				
ESTADO DE PAREDES				
			Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	
			BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐	
			DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
			VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
PAREDES EN LADRILLO EN OBRA GRIS				
ESTADO DE TECHOS				
			Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	
			BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐	
			DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
			VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
PLACA EN CONCRETO Y LAMINA TELJA				
ESTADO DE FISURAS				
			Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	
			BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐	
			DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
			VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
ESTADO DE FISURAS				
			Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	
			BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐	
			DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
			VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
ESTADO DE FISURAS				
			Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso	
			BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐	
			DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
			VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
FIRMAS				
Flm Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.N.T. 1080362153	Flm Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Flm Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Flm Nombre: Tasiglo C.C. O.N.T.	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el estado interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.				

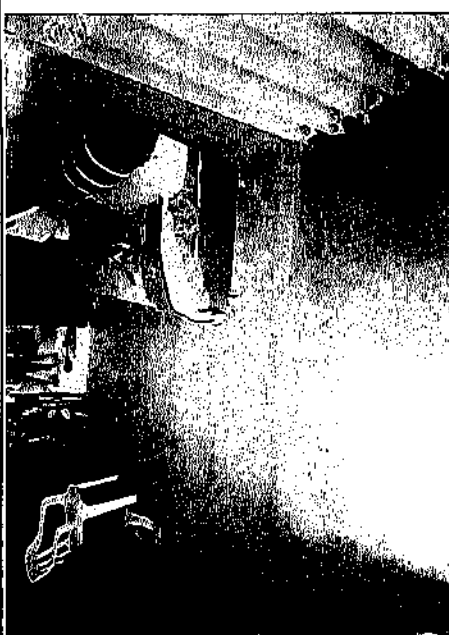
	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4</p> <p>VERSIÓN 1</p> <p>PÁGINA 21 DE 60</p>	<p>FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KMS DE PAVIMENTO RÍDIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GÁLVARO CONDUCE AL CRUCE RUTA 29A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>
<p>Acta de Vecindad de</p>	<p>Inicio Seguimiento</p>	<p>Acta de Vecindad de</p>	<p>Inicio Seguimiento</p>
			
<p>Notas:</p>			
<p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			

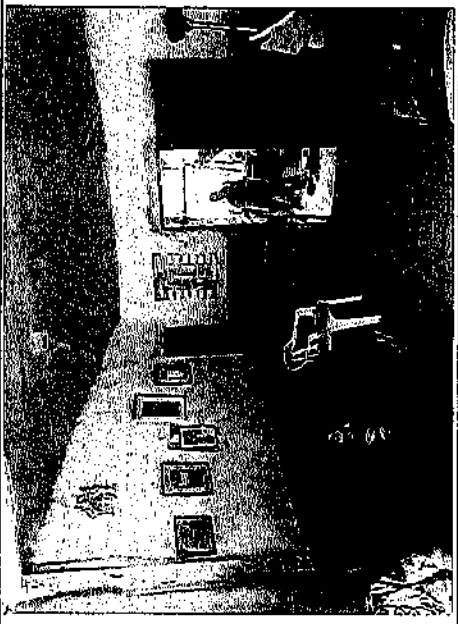
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	5 DE 6			
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CORRIJE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE BUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	14	FEBRERO 2023
6. REGISTRO FOTOGRAFICO					
Notas: 6. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MA.SPS-MN-IN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	6 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SHL19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	14	FEBRERO	2023	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION						
<div><div>COCINA</div><div>PATIO</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div><div>HABITACION</div></div> <p>VIA</p>						
FIRMAS						
Firma	Nombre:	Firma	Nombre:	Firma	Nombre:	Firma
Maria Emilee Silva	Responsable Unidad Social	Ing. Residente	Interventoría	Ing. Residente	Interventoría	Interventoría
C.C. O.N.T. 1080362153	Matrícula profesional No.:	C.C. O.N.T.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O.N.T.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O.N.T.:
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).						




		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 4581.10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicial		FECHA	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		3. DATOS DEL PREDIO		14 FEBRERO 2023	
		Ubicación:		Municipio		Vereda	
		SUAZA		SUAZA		GALLARDO	
		Dirección		N/A		Teléfonos	
		Nombre de la persona que atiende la visita		DEMETRIO PLAZAS		CC No. 12,295,016	
		Tipo de tenencia de la vivienda		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		CC No. 12,295,016	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		DEMETRIO PLAZAS		CC No. 12,295,016		1	
Edad de la construcción		50		No. de Apartamentos		1	
No. de Hogares		1		No. total residentes		4	
Niños (menores de 14 años)		0		Adultos mayores (más de 60 años)		2	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		No. de pisos		1	
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		Mujeres jefes de hogar		0	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		Personas en situación de discapacidad		0	
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado					
SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones del estado de las redes:					
1. Acueducto		SI NO					
2. Alcantarillado		X					
3. Energía		X					
4. Gas		X					
5. Teléfono		X					
6. Televisión cable		X					
7. Internet		X					
7. Otros		X					
DESTINACIÓN ECONOMICA		1. Residencial		7. Educativo			
2. Comercial		X		8. Salud			
3. Industrial		X		9. Cultural			
4. Minero		X		10. Religioso			
5. Agropecuario		X		11. Institucional			
6. Recreacional		X		12. Otro			
ACCESOS VEHICULARES		SI NO		Garete		SI NO	
1. SI		X		SI		X	
2. NO				NO			

Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O.NIT:		Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No.	
12 295016		12 295016		12 295016	
Notas:		1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrito entre las partes.	

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>		<p>MASPS-MN-IN-3-FR-4</p>	
			CÓDIGO	
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	21 DE 21
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA		
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS KARDE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H1V QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		(Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		14 FEBRERO 2023		
Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
				
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueran tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>				

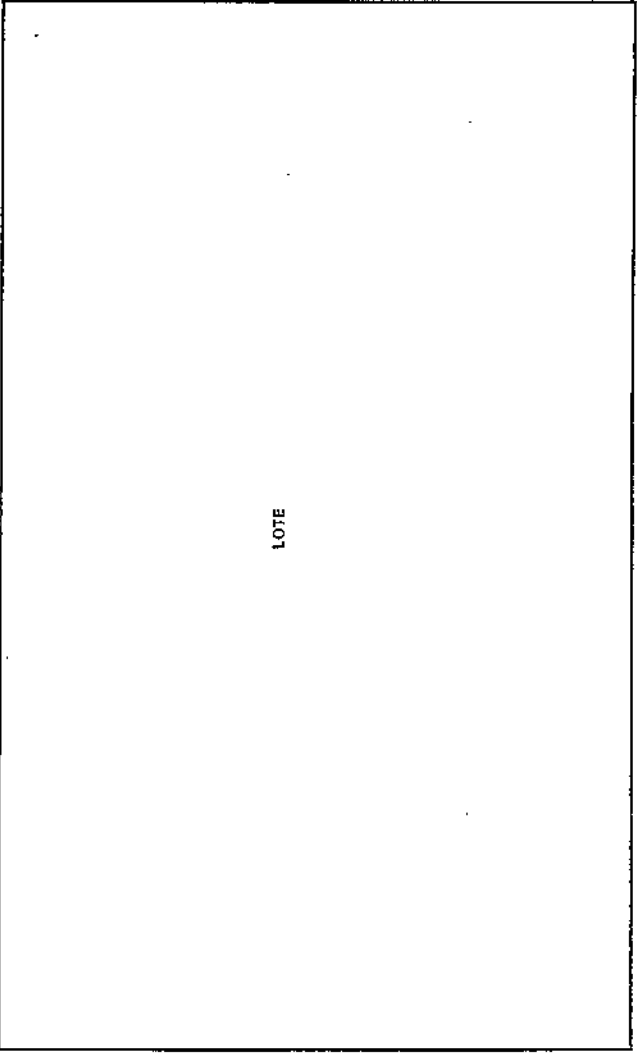
	<p>DEPARTAMENTO DEL NIULA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5 DE 6.	
				FECHA		(Día / Mes / Año)	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.9 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL NIULA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Control de Interventoría No. 1405 / 2022	Año de Vecindad de	Inicio	Sequitante	14	FEBRERO	2023
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
							
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Concelista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>							

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO VERSION PÁGINA	MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 6 DE 6.
	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4611.10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA (Día / Mes / Año)	14 FEBRERO 2023
	Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento ☒		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> LAVADERO </div> <div style="text-align: center;"> COCINA </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> HABITACION </div> <div style="text-align: center;"> SALA </div> <div style="text-align: center;"> HABITACION </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> HABITACION </div> <div style="text-align: center;"> HABITACION </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> VIA </div>					
FIRMAS					
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Centralista Matricula profesional No.:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.:	
Original: Contralista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

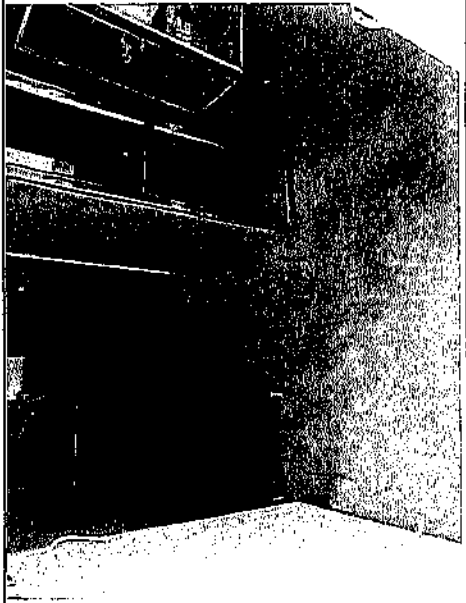
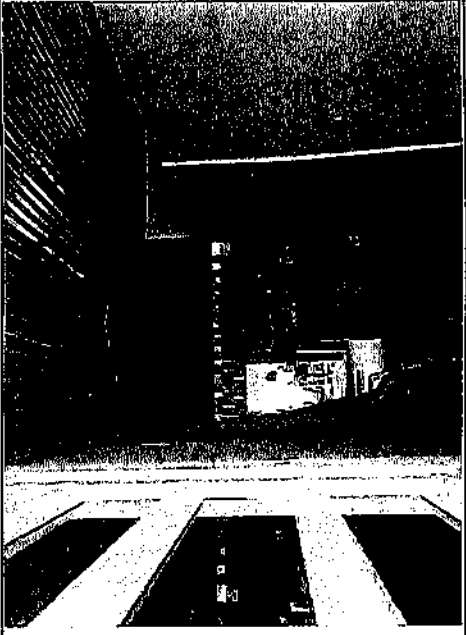
Demetrio Plaza
 12 295016




	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN 1		PÁGINA A DE 5	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1405 / 2022	Acta de Velocidad de Inicio Seguimiento	FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				
2. DATOS DEL PREDIO				
Ubicación: Huila		Municipio: SUAZA		Veeda: GALLARDO
Dirección: N/A		Teléfonos: -		PR: 21+800 MI
Nombre de la persona que aliende la visita: DEMETRIO PLAZAS				
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Número del responsable / propietario de la construcción: CC No. 12,295,016				
Edad de la construcción: No. de Apealamientos				
No. de Hogares: No. total residentes				
Niños (menores de 14 años): Adultos mayores (más de 60 años)				
Mujeres jefes de hogar				
Personas en situación de discapacidad				
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. SI; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				
SERVICIOS PÚBLICOS				
1. Acueducto SI NO Observaciones del estado de las redes:				
2. Alcantarillado				
3. Energía				
4. Gas				
5. Teléfono				
6. Televisión cable				
7. Internet				
8. Otros				
DESTINACIÓN ECONÓMICA				
1. Residencial 7. Educativo				
2. Comercial 8. Salud				
3. Industrial 9. Cultural				
4. Minero 10. Religioso				
5. Agropecuario 11. Institucional				
6. Recreacional 12. Otro				
ACCESOS VEHICULARES				
Garaje SI NO				
Uso del garaje:				
FIRMAS				
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Contraloría	Ing. Residente Contraloría	Ing. Residente Contraloría
C.C. D.NIT.	C.C. D.NIT.	C.C. D.NIT.	C.C. D.NIT.	C.C. D.NIT.
Notas:				
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Velocidad corresponde a la realidad.				
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de velocidad suscrita entre las partes.				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MASPS-WH-IN-3-FR-4 1 14 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HIL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	FECHA (Día / Mes / Año)	14 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1954 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa no observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA FECHA	MASPS-MH-IN-3-FR-4 1 5 DE 5
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARCO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		Acta de Vecindad de Intero Seguimiento	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN			
<div style="text-align: center;">  <p>LOTE</p> </div>			
VIA			
FIRMAS			
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Testigo C.C. O.NIT:
Original: Contraloría, Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).			

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
						VERSION	1
						PAGINA	2 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.6 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 43PL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		(Dia / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento		Inicio Seguimiento	
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
CIMENTACION:		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborente (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cercas metálicas 6. Entramado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prelabricados en concreto 5. Manpostera confinada 6. Manpostera reforzada 7. Manpostera no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos en bahareque 12. Muros en tabla pisada 13. Muros en adobe 14. Construcción improvisada (perpendicular a la vía) 15. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
10. Otro, Cuál? CEMENTO-PIEDRA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		1. Reformas (si / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro, Cuál?		1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Manpostera reforzada 4. Estructuras con confinamiento débil y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA ESIFICACION	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREMIO		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		FACHADA TERMINADA CON GRANIPLAST EN BUEN ESTADO		DESPLAZAMIENTO		REGULAR	
						DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES:		LATERALES EN LADRILLO		DESPLAZAMIENTO		REGULAR	
						DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		ANDEN EN CONCRETO Y LADRILLO EN BUEN ESTADO. ACCESO EN TIERRA		DESPLAZAMIENTO		REGULAR	
						DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MALLA EMBONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		NO CUENTA CON CERRAMIENTO		CERCA VIVA		REGULAR	
						DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	14 DE 5.	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SHL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	14	FEBRERO 2023	
				6. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						


	DEPARTAMENTO DEL HUILA			MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO	
	FERNANDO JIMENEZ ROA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VEJECIDAD			PÁGINA	5 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48H110 QUE DEL CENTRO PUEBLO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 135A / 2022	Contrato de Interventoría No. 1466 / 2022	Acta de Vejeidad de	Inicio	Seguimiento	14 FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
<p>BAÑOS Y LAVADERO</p> <div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div><div>TIENDA</div></div> <p>VIA</p>					
FIRMAS					
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Original: Contratista, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					


	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECHIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vochidad de Seguimiento	2. DATOS DEL PREDIO	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA				
Ubicación:		Donatario	Municipio	Vereida
Dirección		HUILA	SUAZA	GALLARDO
			N/A	21+825 MI
		Teléfonos		
		CC No.		
		Nombre de la persona que atiende la visita:		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Poseedor; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.		
Edad de la construcción		No. de Apartamentos	No. de pisos	1
No. de Hogares		No. total residentes	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menores de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS		1		
1. Acueducto		SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
2. Alcantarillado				
3. Energía				
4. Gas				
5. Teléfono				
6. Televisión cable				
7. Internet				
8. Otros				
DESTINACIÓN ECONÓMICA		7. Educativo		
1. Residencial		☒	8. Salud	
2. Comercial		☐	9. Cultural	
3. Industrial		☐	10. Religioso	
4. Minero		☐	11. Institucional	
5. Agropecuario		☐	12. Otro	
6. Recreacional		☐		
		ACCESOS VEHICULARES		
		Garaje		
		SI ☐ NO ☐		
		Uso del garaje:		

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
C.C. O.NIT:	C.C. O.NIT:	C.C. O.NIT:	C.C. O.NIT:
Notas:			
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vochidad corresponde a la realidad.			
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vchidad suscrita entre las partes.			

	DEPARTAMENTO DEL MUNICIPIO SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FEIJUNDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
				PÁGINA		2 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 494110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL MUNICIPIO.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1405 / 2022		Acta de Velocidad de Seguimiento	FECHA	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL						
GIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Calensos 5. Concreto colado 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cuál?		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cerdas metálicas 6. Enlucado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente		
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		IRREGULARIDAD EN ALTURA		
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y leja 4. Estructura de madera y leja 5. Otro, Cuál?		1. Relevar (si / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente		
Observaciones: NO SE TUVO INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLÍ, SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PÚBLICO.						
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐		
		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
		DESPLAZAMIENTO		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:						
DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA PARTE EXTERNA DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA FACHADA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES CUENTA CON PINTURA COLOR NEGRO						
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:						
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐		
		HUMEDAD		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
		DESPLAZAMIENTO		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:						
DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA PARTE EXTERNA DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LOS LATERALES DE ESTA SON EN LADRILLO EN BUEN ESTADO						
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:						
GRIETAS		FISURAS		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐		
		HUMEDAD		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		
		DESPLAZAMIENTO		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)		
DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA PARTE EXTERNA DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE CUENTA CON ANDEN EN LADRILLO Y CONCRETO EN BUEN ESTADO, EL ACCESO POR LA VÍA ES DESTAPADO						
ESTADO DE CERRAMIENTOS:						
MALLA EMBALADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐		
		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		
				MURO		
				OTROS		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:						
NO CUENTA CON CERRAMIENTO						

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD				CÓDIGO	MAFPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 43HL10 QUE DEL CENTRO PUBLADO DE GALLARDO CONDUCIENDO AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		VERSIÓN	PÁGINA
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022		(Día / Mes / Año)		1	3 DE 5
ESTADO DE PISOS		ESTADO DE PISOS		ESTADO DE PISOS		ESTADO DE PISOS	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO							
ESTADO DE PAREDES		ESTADO DE PAREDES		ESTADO DE PAREDES		ESTADO DE PAREDES	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO							
ESTADO DE TECHOS		ESTADO DE TECHOS		ESTADO DE TECHOS		ESTADO DE TECHOS	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO							
ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO							
ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO							
ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS		ESTADO DE FISURAS	
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO							



Ing. Residente Controlista
Maldonado profesional No.:


Ing. Residente Interventoría
Maldonado profesional No.:


Ing. Residente Interventoría
Maldonado profesional No.:

3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).

4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos prescriptibles.

	<p>DEPARTAMENTO DEL NIILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-NIN-IN-3-FR-4	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	14 DE 5.	
					FECHA	(Día / Mes / Año)	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20N EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL NIILA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Vejidad de Inicio Seguimiento	14 FEBRERO 2023				
6. REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
							
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vejidad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contadista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vejidad.</p>							

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO	1
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA			VERSIÓN	5 DE 5
ACTA DE VEJECIDAD				PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO					
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 29A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vejeidad de Suplimento	☒	FECHA	(Día / Mes / Año)
				14	FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN					
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>					
VIA					
FIRMAS					
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Original: Contratista, Copias: Interventor, Subdirección de Socialización, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					



CONTRATO No. 1354 DE 2022

ACTA DE PERMISO DE OBRA PARA CORTE DE TALUD.

Fecha
15/02/2023.
DD MM AA

LUGAR:
PR:

BRASILEIRO/GALLARDO SUAZA
21+613 AL PR 21+614 MARSEN REQUERIDOS

ASISTENTES CONTRATISTA	
NOMBRE	CARGO
LUCA YOTO GIMAN	SOCIO AMBIENTAL
JAIRO QUIROSA	TOPOGRAFO
PROPIETARIO/VO ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO
DEMETRIO PLAZAS	PROPIETARIO

Siendo las 08:30 AM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes para tratar los temas relacionados con

TEMAS A TRATAR
Solicitud de permiso al Señor (a) DEMETRIO PLAZAS ; en calidad de PROPIETARIO del predio denominado _____ ; para REALIZAR ACTIVIDADES DE CORTE DE TALUD. PARA AMPLIACIÓN DE VIA.

_____ ; y demás obras requeridas en la ejecución del Contrato 1354 DE 2022 para "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Las obras del predio en mención se encuentran localizadas en el PR 21+613 AL 21+614 costado INTERIOR de la vía que de GALLARDO conduce a 20A. El contrato esta siendo ejecutado por FERNANDO JIMENEZ ROA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Esta actividad en ningún caso representa una afectacion predial por parte del DEPARTAMENTO HUILA y las obras ejecutadas en mi predio no seran causal de pago por compensacion economica.

(Firma) _____
(Nombre) LUCA YOTO GIMAN
Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Contratista

(Firma) Demetrio Plazas H.
(Nombre) _____
Propietario

(Firma) _____
(Nombre) Juan J. Jimenez Roa
Representante de Interventoria

1era copia: Interventor
2da copia: Contratista



CONTRATO No. 1354 DE 2022

ACTA DE PERMISO DE OBRA PARA CORTE DE TALLADO/ADUACION.

Fecha

22 02 2023
DD MM AA

LUGAR:

PREDIO - EL LLANO.

PR:

21 + 140 MI AL PR 21 + 120 MI.

ASISTENTES/CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO
Laura Pilo Girman.	Socio Administrador.

PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR

NOMBRE	CARGO
JORGE DUARTE HERNANDEZ	PROPIETARIO.

Siendo las _____ se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes para tratar los temas relacionados con

TEMAS A TRATAR

Solicitud de permiso al Señor (a) JORGE DUARTE HERNANDEZ en calidad de PROPIETARIO del predio denominado EL LLANO para LA REDUCCION DE CORTE DE TALLADO PARA EMPUJACION DE VIA.

_____ y demás obras requeridas en la ejecución del Contrato 1354 DE 2022 para "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, Las obras del predio en mención se encuentran localizadas en el _____ costado POBLADO de la vía que de GALLARDO conduce a LA RUTA 20A. El contrato esta siendo ejecutado por FERNANDO JIMENEZ ROA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

REALIZACION DE CERCO A TERMINACION DE ACTIVIDAD CON ALAMBRE DE PUA Y POSTE PUNTERA

Esta actividad en ningún caso representa una afectación predial por parte del DEPARTAMENTO HUILA y las obras ejecutadas en mi predio no serán causal de pago por compensación económica.

(Firma) Laura Pilo
(Nombre) Laura Pilo
Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Contratista


(Firma) Jorge Duarte Hernandez
(Nombre) Jorge Duarte Hernandez
Propietario

(Firma) José F. Jiménez Roa
(Nombre) José F. Jiménez Roa
Representante de Interventoría

1era copia : Interventor
2da copia: Contratista



CONTRATO No. 1354 DE 2022



Fecha

15 02 2023

DD MM AA

LUGAR:

PR:

ACTA DE PERMISO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO

PASELITO GARCIA/SOPA

24530 AL PR. 24514 MARCELO FERNANDO

ASISTENTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO
USLA TOLO GARCIA	SOCIO INYECTOR
MARCO GARCIA	TOPOGRATO

PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR

NOMBRE	CARGO
ERNESTO PLAZA	PROPIETARIO
DEMETRIO PLAZA	ENCARGADO

Siendo las 08:20 AM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes para tratar los temas relacionados con

TEMAS A TRATAR

Solicitud de permiso al Señor (a) ERNESTO PLAZA, en calidad de PROPIETARIO del predio denominado BENEFICIO ACTIVIDADES DE OBRAS DE TRUENO PARA IMPLANTACION DE VIA

; y demás obras requeridas en la ejecución del Contrato 1354 DE 2022 para "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, Las obras del predio en mención se encuentran localizadas en el 24530 AL 24514 costado FERNANDO de la vía que de GARCIA conduce a RUTA 20A. El contrato esta siendo ejecutado por FERNANDO JIMENEZ ROA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Esta actividad en ningún caso representa una afectación predial por parte del DEPARTAMENTO HUILA y las obras ejecutadas en mi predio no serán causal de pago por compensación económica.

(Firma)

(Nombre) USLA TOLO

Contratista

(Firma) _____

(Nombre) _____

Contratista

(Firma)

(Nombre) _____

Propietario

(Firma)

(Nombre) JIMENEZ ROA

Representante de Interventoria

1era copia: Interventor


2da copia: Contratista

CALIBRACION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

373

 VÍAS SUMINISTROS	VÍAS Y SUMINISTROS S.A.S. NIT. 900.587.985-3				
	CODIGO:	FECHA		VERSION 001	
	CE-FR-01	2017	23	2	
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION DE EQUIPOS					
CERTIFICADO DE CALIBRACION					
Instrumento:	ESTACION TOTAL	Marca:	TOPCON		
Modelo:	GTS-102N	Número de serie:	V10090		
Cliente:	JAIRO QUIROGA				
NIT/C.C.:	12,193.31	Ciudad:	NEVA		
Fecha de calibración:	2022-08-22	Fecha de emisión:	2022-08-22		
Numero de certificado:	335				
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE					
Aumento del telescopio:	30X	Alcance sin reflector	NO APLCA		
Precisión angular:	2"	Alcance con un prisma	2,00m		
Enfoque mínimo:	1,3m				
DESCRIPCIÓN SERVICIO					
a) Revisión general b) Verificación de verticalidad c) Ajuste de cierre de angular vertical y horizontal d) Calibración de distanciómetro (0 a 5,872m) e) Ajuste de plomada					
AJUSTE ANGULOS					
1 Lectura		°Grado	'Minuto	"Segundo	
Primera Posicion	vertical	89	59	39	
	horizontal	0	0	0	ERROR 1 segundos
segunda Posicion	vertical	270	0	21	Vertical 0
	horizontal	180	0	0	Horizontal 0
2 lectura		°Grado	'Minuto	"Segundo	
Primera Posicion	vertical	89	59	39	
	horizontal	0	0	0	ERROR2 segundos
segunda Posicion	vertical	270	0	21	Vertical 0
	horizontal	180	0	0	Horizontal 0
 VÍAS & SUMINISTROS S.A.S. Nit 90 0587 985 - 3					
PROMEDIO				segundos	
Vertical				0	
Horizontal				0	

376

	VIAS Y SUMINISTROS S.A.S			
	NIT. 900.587.985-3			
	CODIGO:	FECHA		VERSION
	CE-FR-01	2017	23	2
Página 1 de 1				
PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL				
CERTIFICADO DE CALIBRACION				
Instrumento:	NIVEL PRECISION	Marca:	NIKON	
Modelo:	AS-2C	Número de serie:	679186	
Cliente:	JAIRO QUIROGA			
NIT/C.C:	12.193.311	Ciudad:	NEIVA	
Fecha de calibración:	2022-08-22	Fecha de emisión:	2022-08-22	
Código de ingreso:	334			
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE				
Desviación estándar	1mm	Mínima distancia focal	0,1m	
Tipo de Imagen	Directa	Relación de estadía	100	
Magnificación	34X	Rango de compensador	±15'	
Apertura del objetivo	45mm	Exactitud de compensador	0.3	
DESCRIPCIÓN SERVICIO				
Revisión general, ajuste nivel circular, ajuste retículo, minilla de puntería, compensador				
AJUSTES EFECTUADOS				
CODIGOS: 1 CORRECTO 2 FALLA CORREGIDA 3 NO CORREGIDA 4 NO APLICA				
Ajuste del nivel circular	2	Ajuste de retículo	1	
Ajuste de minillas de puntería	1	Ajuste de compensador	1	
AJUSTE CON COLIMADORES				
DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA SEGUNDOS			
Línea de visión	5"			
Nivel circular	5"			
DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA SEGUNDOS			
Rango de compensación	± 15'			
Verticalidad del retículo	10"			
El presente informe de calibración no debe reproducirse sin la aprobación escrita del laboratorio.				
FIN DE INFORME				
Elaboró:				
Jesús A. Quiguazú.				
JESUS ALBERTO QUIGUAZU SOTO	RIMEL HERNAN VASQUEZ			
Técnico Laboratorio	Gerente			
1. El laboratorio VIAS Y SUMINISTROS S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. 2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado. 3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. 4. Somos aliados estratégicos de Galileo Instrumentos quienes están certificados en la norma ISO 9001:2008				

CHARLA - CAPACITACIONES

 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSION	
			001	
	ASISTENCIA Y PARTICIPACION		CODIGO	
			SIG-TH-F-01	
			PAGINA	
1 DE 1				

TEMAS TRATADOS :		TIPO DE ACTIVIDAD	
uso adecuado y obligatorio de Casco en obra (EPPs). • Entrega hidratación. • Riesgos Asociados a la Actividad "Corrientes de talud / Caída de Roca."		Reunión ☐ Curso Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Inducción de Personal ☐ Taller ☐ Charla Capacitación ☒ Charla Integral ☐ Difusión ☐ Charla EDT ☐ A Integrantes ☐ A Líderes Directos ☐	

Hora de Inicio: 7:00 am		Hora Final: 8:00 am		Nº PARTICIPANTES: 11	
DURACION (hrs.): 01 hora		LUGAR: Comendante			

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	AREA	FIRMA
1.	Natalia Alejandra Celler D	FJR	Controladora Val	Operativa	Natalia A Celler
2.	Saira Chirreca	FJR	Topografía	OTB	Saira
3.	Edwin J. Toledo	FJR	Operador	Operativa	Edwin J
4.	Sebastian J. Jara	FJR	Operador	Operativa	Sebastian J
5.	Leopoldo Jara	FJR	Conductor	Via	Leopoldo
6.	Sebastian Jara	FJR	Conductor	Via	Sebastian
7.	Rodriguez Jara	FJR	Conductor	Via	Rodriguez
8.	Carlos T. Herrera	FJR	Conductor	Via	Carlos T
9.	Lucas Jara	FJR	Controlador	Via	Lucas
10.	Fernando Jimenez	FJR	Inspector	Via	Fernando
11.	LUKA TOLO GUTIERREZ	FJR	Operador	Operativa	Luka
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR :	CARGO :	FIRMA :	FECHA :
LUKABIO GUTIERREZ	OPERADOR	[Firma]	24/02/23


 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSION
			001
	ASISTENCIA Y PARTICIPACION		CODIGO
			SIG-TH-F-01
			PAGINA
		1 DE 1	

TEMAS TRATADOS :	TIPO DE ACTIVIDAD
1. CONTROL VIAL 2. COMUNICACIÓN CONTROL VIAL 3. PERSONAL OPERATIVO	Reunión ☐ Curso Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Inducción de Personal ☐ Taller ☐ Charla Capacitación ☒ Charla Integral ☐ Difusión ☐ Charla EDT ☐ A Integrantes ☐ A Líderes Directos ☐

Hora de Inicio: 7:00 am.	Hora Final: 9:30 am	Nº PARTICIPANTES: 7
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

DURACION (hrs.): 02 horas	LUGAR: COMPUENITH
----------------------------------	--------------------------

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	ÁREA	FIRMA
1.-	Notale Alexandra Cullor	EXR	Controladora	Operadora	Notale Alexandra
2.-	Leonide Soto de Vives	EXR	Controladora	Operador	Leonide Soto
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
21.-					
22.-					
23.-					
24.-					
25.-					
26.-					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR : LUKA POLO	CARGO : LIBRENCIA	FIRMA : 	FECHA : 20/05/2016
---	-----------------------------	---	------------------------------



381
FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO

CARACTERIZACION DE MATERIALES GRANULARES

- BASE GRANULAR
- MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO

[illegible]

65700

OSCAR FERRANDO AREVALO PEÑALTA
NIT. 7.140.499-8
Mecánica de Sólidos,
Cavimetros y Curvímetros

Non-Flying & Non-Hot Operations
Tactical & General Combat Exercises & SENA

~~Official Family History~~
~~Reg. 1.000 of Laboratory~~

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9160-9160>

MSPG OFA 003-23
OFA 003-23
Id# 20

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LÍMITES DE CONSISTENCIA		CODIGO	OFA-EC-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila		
UBICACIÓN:	STOCK PLANTA - GUACANAS		
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	FECHA:	16 de enero de 2023
FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	NORMA:	INVIAS-13 / NTC / NSR-10
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	ENSAYO:	E-123-E126-E126 - NTC 4630
		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 009-23 2 de 20

LÍMITES DE CONSISTENCIA

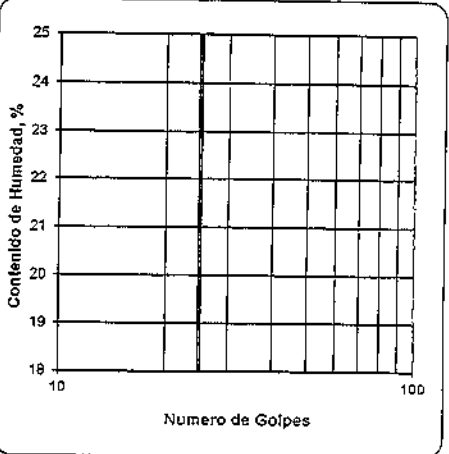
LÍMITE LÍQUIDO			
Prueba No. 1	1	2	3
No. Golpes			
Recipiente No.			
Vidrio + Suelo Humedo, gm			
Vidrio + Suelo Seco, gm	NL	NL	NL
Peso del Agua, gm			
Peso vidrio, gm			
Peso Suelo Seco, gm			
Contenido de agua, %			

LÍMITE PLÁSTICO	
1	2
NP	NP

GRADACIÓN

P1 = 10881 P2 = 9879.0

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% PASA	BASE GRANULAR BG 38 ART. 330-13
2"	0.0	0.0	100.0	100
1 1/2"	0.0	0.0	100.0	100
1"	715.0	6.6	93.4	70-100
3/4"	1,352.0	12.4	81.0	60-90
1/2"	949.0	8.7	72.3	-
3/8"	1,110.0	10.2	62.1	45-75
No. 4	1,234.0	11.3	50.7	30-60
No. 10	1,238.0	11.4	39.4	20-45
No. 40	1,696.0	15.6	23.8	10-30
No. 200	1,586.0	14.6	9.2	5-15
Pasa No. 200	1002.0	9.2		
TOTAL	10881	100.0		



49.3	41.5	9.2
GRAVAS	ARENAS	FINOS
% Fracción menor del Tamiz No. 200		9.21

D10	0.1	COEFICIENTE UNIFORMIDAD (Cu)	101.2	HUMEDAD NATURAL
D30	0.8			
D60	8.7			
		COEFICIENTE CURVATURA (Cc)	0.9	5.8%
PRUEBA LÍMITE DE CONTRACCIÓN				

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS	
Límite Líquido (%)	NL
Límite Plástico (%)	NP
Índice de Plasticidad (%)	0.00
Índice de Consistencia	0.00
Índice de grupo	0
AASHTO	A-1a
USCS	GW-GM

[Handwritten Signature]

Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 7.630.239-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Y LIMITES DE CONSISTENCIA

CODIGO	OFA-EC-14
VERSION	2
FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1 BASE GRANULAR

16 de enero de 2023

PROYECTO:

MUESTRA:

FECHA:

CODIGO:

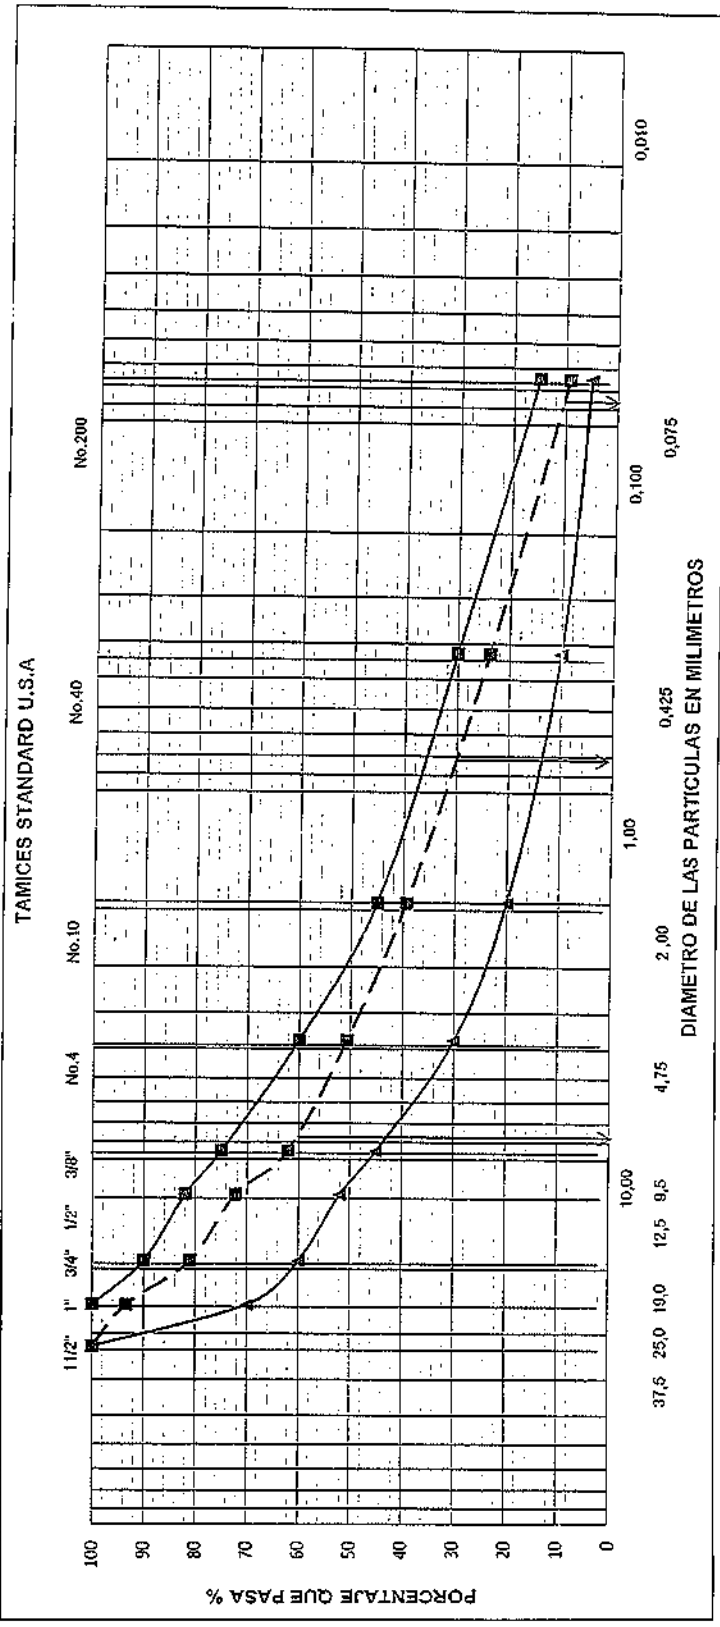
REMISION:

HOJAS:

MSPC OFA 003-23

OFA 009-23

3 de 20



	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	EQUIVALENTE DE ARENA	
		CODIGO	OFA EA-14
		VERSIÓN	2
		FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330 INVIAS/13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-133

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO REMISIÓN: OFA 009-23

DESCRIPCION: INORGÁNICA COLOR CAFÉ PAGINAS: 4 de 20

ENSAYO	1	2	3	4
PROBETA No.	A	B	C	D
LECTURA DE ARENA, A	3,2	3,3	3,2	
LECTURA DE ARCILLA, B	10,5	10,8	10,5	
EQUIVALENTE DE ARENA, $C = A * 100 / B$	30,48	30,56	30,48	

% EQUIVALENTE DE ARENA =	30,50
---------------------------------	--------------

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Mínimo
Sub Base			25%
Base Granular	X		30%
Sello de Arena Asfalto			50%
Lechada Asfáltica			50%
Mezcla densa en frío gradación combinada			50%
Mezcla densa en caliente MDC 0 - 3			50%
Fresado pavimento existente en frío			30%
Fresado pavimento existente en caliente			50%
Concretos			60%


OBSERVACIONES


 Jhon Fredy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de suelos,
 pavimentos y concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicasuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	RELACIÓN HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)		CODIGO:	OFA-EPM-14
			VERSIÓN:	2
			FECHA:	20-may.-16

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR

FUENTE: PLANTA - GUACANAS

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ

FECHA: 16-ene.-23

NORMA: Art. 330/13 INVIAS

ENSAYO: E-142

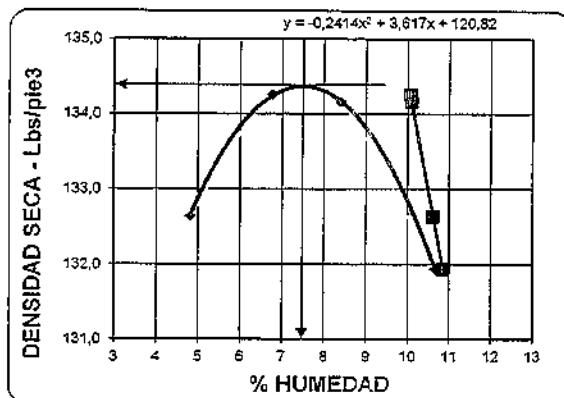
CODIGO: MSPC OFA 003-23

REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 5 de 20

DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
Humedad Natural	3,2	3,2	3,2	3,2
Agua Añadida (c.c.)	0	120	240	360
Peso Molde + Muestra Humeda, g	10588	10735	10806	10826
Peso Molde, g	5854	5854	5854	5854
Peso Suelo Humedo, g	4734	4881	4952	4972
Volumen del Molde, cc	2125	2125	2125	2125
Densidad Humeda, g/cc	2,228	2,297	2,330	2,340
Humedad, %	4,8	6,8	8,4	10,7
Densidad Seca, lbs/ft ³	132,6	134,3	134,2	131,9
Curva de saturación 100%	10,6	10,1	10,1	10,9

HUMEDAD				
Capsula No.	1	2	3	4
Peso Capsula + Suelo humedo, grm	356,7	408,5	420,9	471,1
Peso Capsula + Suelo Seco, grm	342,5	385,7	392,1	432,5
Peso agua, grm	14,2	22,8	28,8	38,6
Peso Capsula	47,6	48,7	49,2	70,6
Humedad, %	4,8	6,8	8,4	10,7



CLASIFICACION DEL SUELO

A.A.S.H.O. A-1a

U.S.C.E. GW-GM

Indice de Grupo 0

Densidad Max. 134,3 Lbs/Pulg³

Humedad Optima 7,5 %

OBSERVACIONES

Densidad Maxima 2,152

grs/cm³



**OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
NIT. 7.600.209-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

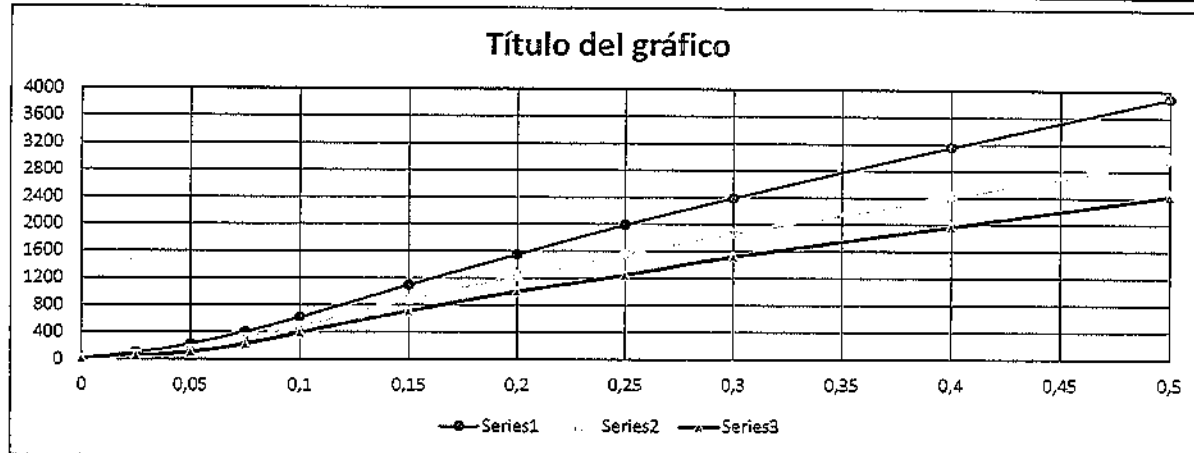
Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS		CODIGO	OFA-CBR-14
	CBR DEL SUELO COMPACTADO EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS		VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	METODO:	No.1, E-148/13 INVIAS
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	FECHA:	16 de enero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 009-23 6 de 20

MOLDE No		1			3			9					
No de golpes		65			30			10					
Días de inmersión		2			2			2					
Expansión mm		0,00			0,00			0,00					
PENETRACIÓN		Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR
Pulgadas	Tiempo (min)		Psi	%		psi	%		Psi	%		Psi	%
0,025	00:30	121	89		83	61		65	48				
0,050	1:00	298	219		182	134		125	92				
0,075	1:30	546	401		422	310		285	209				
0,100	2:00	832	611	61,1	649	477	47,7	514	378	37,8			
0,150	3:00	1.486	1.092		1.206	886		956	703				
0,200	4:00	2.096	1.540	102,7	1.670	1.227	81,8	1.352	994	66,2			
0,250	5:00	2.699	1.983		2.126	1.562		1.685	1.238				
0,300	6:00	3.248	2.387		2.536	1.864		2.065	1.518				
0,400	8:00	4.286	3.150		3.299	2.424		2.689	1.976				
0,500	10:00	5.286	3.885		4.056	2.981		3.325	2.443				
HUMEDAD PENETRACIÓN %		7,5			9,2			11,3					



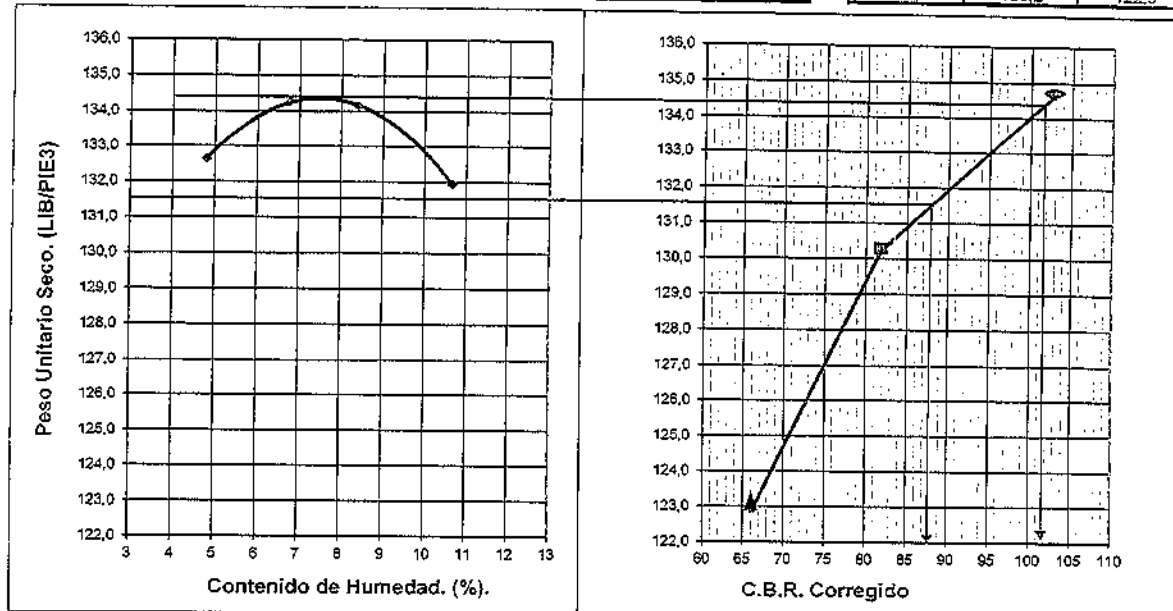
CBR a 0,1" =	Carga Unitaria Leída a 0,1" * 100%	CBR Corregido a 0,1" =	61,1	47,7	37,8
	1000				
CBR a 0,2" =	Carga Unitaria Leída a 0,2" * 100%	CBR corregido a 0,2" =	102,7	81,8	66,2
	1500				

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13	TERRAPLENES >10-5-3% Min.	AFRIMADO >15% Min.	SUB BASE >30% Min.	BASE >100% Min.
------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA <small>MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS</small>	CBR DEL SUELO COMPACTADO EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS		CODIGO:	OFA-CBR-14
			VERSIÓN:	2
			FECHA:	30-jul.-18

FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	METODO:	No.1. E-148/13 INVIAS
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	OBRA:	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCION:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGANICA COLOR CAFE	FECHA:	16 de enero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISION:	OFA 009-23 7 de 20

MOLOE NUMERO	2	2	2	2	1	2	3
NUMERO DE GOLPES POR CAPA	55	55	55	55	65	30	10
VOLUMEN cc	2.125	2.125	2.125	2.125	2.367	2.381	2.379
PESO MOLDE + MUESTRA COMPACTADA (g)	10.588	10.735	10.806	10.826	12.442	12.484	11.958
PESO MOLDE (gr)	5.854	5.854	5.854	5.854	6.949	7.140	6.917
PESO MUESTRA COMPACTADA (g)	4.734	4.881	4.952	4.972	5.493	5.344	5.041
DENSIDAD HUMEDAD (g/cc)	2.228	2.297	2.330	2.340	2.320	2.245	2.119
RECIPIENTE NUMERO	47.6	48.7	49.2	70.6	70.2	70.2	70.2
PESO MUESTRA HUMEDAD + RECIPIENTE (g)	356.7	408.5	420.9	471.1	512.3	512.3	512.3
PESO MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)	342.5	385.7	392.1	432.5	481.2	481.2	481.2
CONTENIDO DE HUMEDO (%)	4.8	6.8	8.4	10.7	7.6	7.6	7.6
PESO UNITARIO SECO (Kg / m3)	2.126	2.152	2.150	2.114	2.157	2.087	1.970
PESO UNITARIO SECO (Lbs / Pies³)	132.6	134.3	134.2	131.9	134.6	130.2	122.9



CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD.	7.5
PESO UNITARIO SECO MAXIMO Lbr/pie³	134.3
C.B.R. CORREGIDO / 100%.	101.8%
C.B.R. CORREGIDO / 98%.	97.8%

●	55 GOLPES / CAPA.
■	30 GOLPES / CAPA.
▲	10 GOLPES / CAPA.

Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 7.441.348-2
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@meconicadesuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PROCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS A UNA CARA	CODIGO VERSION FECHA	OFA CF-14 2 30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA. FECHA: 18-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: INVIAS-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-227

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 8 de 20

TAMIZ		PESO DE LA MUESTRA	PESO DE LA MUESTRA FRACTURADA	% DE CARAS FRACTURADAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	CÁLCULO FINAL
PASA	RETENIDO	(Grs)	(Grs)	(B/A X 100)	(%)	(C X D)
		A	B	C	D	E
1" 1/2	1"	1.052,0	425,2	40,4	6,6	265,6
1"	3/4"	749,0	413,0	55,1	12,4	685,1
3/4"	1/2"	1.110,0	549,0	49,5	8,7	431,4
1/2"	3/8"	634,0	406,0	64,0	10,2	653,3
TOTAL		3.545,0	1.793,2	209,1	37,9	2035,4
PORCENTAJE UNA CARA FRACTURADA = $\frac{\text{TOTAL E}}{\text{TOTAL D}}$ = 53,7 %						
ESPECIFICACIÓN-13		AGREGADO		UNA CARA	DOS CARAS	Cumple/No Cumple
		BASE GRANULAR		70% MÍNIMO	50% MÍNIMO	Cumple
		MEZCLA ASFÁLTICA		85% MÍNIMO	75% MÍNIMO	
		CONCRETOS		80% MÍNIMO	NA	

OBSERVACIONES:



Jhon-Fredy Sanchez Ospitian

Técnico profesional Obras Civiles - SENA



**OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.550.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo

Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158928582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PEÑALTA <small>MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS</small>	PROCENTAJE DE CARAS		CODIGO	OFA CF-14
	FRACTURADAS EN LOS		VERSIÓN	2
	AGREGADOS A DOS CARAS		FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA. FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: INVIAS-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-227

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGANICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 9 de 20

TAMIZ		PESO DE LA MUESTRA	PESO DE LA MUESTRA FRACTURADA	% DE CARAS FRACTURADAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	CÁLCULO FINAL
PASA	RETENIDO	(Grs)	(Grs)	(B/A X 100)	(%)	(C X D)
		A	B	C	D	E
1" 1/2	1"	1.052,0	333,0	31,7	6,6	208,0
1"	3/4"	749,0	387,0	51,7	12,4	642,0
3/4"	1/2"	1.110,0	345,0	31,1	8,7	271,1
1/2"	3/8"	634,0	378,0	59,6	10,2	808,2
TOTAL		3.545,0	1.443,0	174,0	37,9	1729,3
PORCENTAJE DOS CARAS FRACTURADA = $\frac{\text{TOTAL E}}{\text{TOTAL D}}$ = 45,6 %						
ESPECIFICACIÓN-13		AGREGADO		UNA CARA	DOS CARAS	Cumple/No Cumple
		BASE GRANULAR		70% MÍNIMO	50% MÍNIMO	Cumple
		MEZCLA ASFÁLTICA		85% MÍNIMO	75% MÍNIMO	
		CONCRETOS		80% MÍNIMO	NA	

OBSERVACIONES:



Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PEÑALTA
 NIT. 7.651.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA <small>MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS</small>	INDICE DE FORMA PARTICULAS PLANAS AGREGADO GRUESO		CODIGO	OFA PPG-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA. FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-230

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 10 de 20


INICIAL		PARTICULAS PLANAS (grs)	% PARTICULAS PLANAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	% PROMEDIO PARTICULAS PLANAS
TAMIZ	RETENIDO (grs)				
1"	1052,0	221,0	21,01	6,6	1,38
3/4"	749,0	102,5	13,68	12,4	1,70
1/2"	1110,0	98,6	8,88	8,7	0,77
3/8"	634,0	96,5	15,22	10,2	1,55
TOTAL		518,60	58,80	37,92	5,41

% PARTICULAS APLANADAS:	14,3
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Base granular	X		35%
Mezcla densa en caliente			30%
Fresado pavimento existente			30%
Concretos			25%

OBSERVACIONES


John Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA**
NIT. 7.650.239-8
Mecánica de Suelos, Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE FORMA		CODIGO	OFA PPG-14
	PARTICULAS LARGAS		VERSIÓN	2
	AGREGADO GRUESO		FECHA	30-jul-18

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila.

OBRA:	DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA:	16-ene.-23
UBICACIÓN:	STOCK PLANTA - GUACANAS	NORMA:	Art. 330-13
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	ENSAYO:	E-230
FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	REMISIÓN:	OFA 009-23
		PAGINAS:	11 de 20


INICIAL		PARTICULAS LARGAS (grs)	% PARTICULAS LARGAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	% PROMEDIO PARTICULAS LARGAS
TAMIZ	RETENIDO (grs)				
1"	1052,0	236,5	22,48	6,6	1,48
3/4"	749,0	215,4	28,76	12,4	3,57
1/2"	1110,0	312,4	28,14	8,7	2,45
3/8"	634,0	212,4	33,50	10,2	3,42
TOTAL		976,70	112,89	37,92	10,92

% PARTICULAS ALARGADAS:	28,8
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Base granular	X		35%
Mezcla densa en caliente			30%
Fresado pavimento existente			30%
Concretos			25%

OBSERVACIONES


 Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.654.299-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN AGREGADO GRUESO		CODIGO	OFA PEG-14
				VERSIÓN	2
				FECHA	20-ago.-18

OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila	FECHA:	16-ene-23
FUENTE:	STOCK PLANTA - GUACANAS	NORMA:	Art. 630/P501 FAA
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	ENSAYO:	ASTM C138/E-222-13
		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 009-23
		PAGINAS:	12 de 20

PRUEBAS	1	2
Peso en el aire de muestra seca(g), A	1581,2	1219,3
Peso Superficialmente Seco, en el aire(g), B	1597,6	1232,6
Peso en la canastilla, en el agua(g), C	954,2	735,9
Gs. Bulk Seca = $A/(B+S-C)$	2,458	2,455
Gs. Bulk(s.s.s.) = $S/(B+S-C)$	2,483	2,482
Gs. Aparente = $A/(B+A-C)$	2,522	2,522
Absorción (%) = $(B-A)*100/A$	1,04	1,09
GS. BULK SECA =	2,456	
% DE ABSORCIÓN =	1,06	
T° del agua para la ejecución del ensayo	23°C	

Observaciones: _____




Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.630.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

394

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	ANGULARIDAD DEL AGREGADO Y CONTENIDO DE VACIOS EN FINOS NO COMPACTADOS		CODIGO:	OFA-AF041
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	20-may.-14

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON
CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL
CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: INVIAS-13 / NTQ / NSR-10

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR CÓDIGO: MSPC OFA 003-23

FUENTE: PLANTA - GUACANAS REMISIÓN: OFA 009-23 13 de 20

PRUEBAS		1	2	3	4
METODO		A	A	A	A
SERIE GRANULOMETRICA		A	A	A	A
TAMIZ PASA	TAMIZ RETIENE	grs	grs	grs	grs
No. 8	No. 16	44	44		
No. 16	No. 30	57	57		
No. 30	No. 50	72	72		
No. 50	No. 100	17	17		
Total Agregados en grs		190	190		

PESO ESPECIFICO ARENA	2,584	2,584		
(P. RECIPIENTE + AGREGADO FINO) - P. RECIPIENTE	142.5	143.2		

%U= 100 * $\frac{V - (F/G)}{V}$	%U =	43,4	43,1	43,3	Cumple
---------------------------------	------	------	------	------	--------


Donde: V = Volumen del medidor ml
F= Masa en bruto del agregado fino
G= Peso especifico del agregado

ESPECIFICACIONES INVIAS 2013	VALOR MINIMO		
MEZCLA DENSA EN CALIENTE	CLASE C NT1	CLASE B NT2	CLASE A NT3
Mezcla Densa en Caliente	40%	45%	45%
Mezcla Densa en Frio	40%	45%	45%
Reciclado en Frio / Caliente	35% a 40%	35% a 45%	35% a 45%
Sello Arena Asfalto	45%	45%	-
Base Granular	-	35%	35%
PAVIMENTOS HIDRAULICOS			
Concretos			30%

OBSERVACIONES: _____


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.190.219-2
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos


Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio


Jhon Freddy Sanchez Ospitia
 Técnico Profesional Obras Civiles - SENA

Oficina calle 2 No. 2-58 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com


 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO - METODO COLORIMETRICO	CODIGO	OFA-CMO-14
		VERSIÓN	1
		FECHA	20-oct-13

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA:	16-ene.-23
OBRA:		NORMA:	INVIAS-13 / NYC / NSR-10
UBICACIÓN:	STOCK PLANTA - GUACANAS	ENSAYO:	E-212
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	REMISIÓN:	OFA 009-23
		PAGINAS:	14 de 20

EQUIPO : <ul style="list-style-type: none"> * Frascos incoloros * Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 3% * Tabla de colores No.815 ASTM C-40 con Número de referencia Orgánica de 1 a 5 en el cual el número 3 es el COLOR NORMAL DE REFERENCIA a comparar. 					
REGISTRO INICIO DE ENSAYO			REGISTRO ENSAYO DESPUES DE LAS 24H		
					
INTERPRETACION DE RESULTADOS: Se considera que la arena contiene componentes orgánicos perjudiciales, cuando el color que sobrenada por encima de la muestra de ensayo es mas oscuro que el COLOR NORMAL DE REFERENCIA					
RESULTADO CUALITATIVO	Agregado	Tolerancia	Cumple	No Cumple	Numero de referencia Orgánica
	Terraplen				
	Afirmado				
	Sub base granular				
	Base granular		X		
	Concreto				
	MDC				

 Jhon Fredy Sanchez Ospitian Técnico profesional Obras Civiles - SENA	 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA NIT. 7.651.299-2 Mecánica de Suelos, Pavimentos y Concretos Oscar Fernando Arevalo Ing. Jefe de Laboratorio
---	---

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PERDIDA EN ENSAYOS DE SOLIDEZ EN SULFATOS		CODIGO	OFA PSG-14
				VERSIÓN	2
				FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 16 de enero de 2023

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: E-220 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR CODIGO: MSPC OFA 003-23

FUENTE: PLANTA - GUACANAS REMISIÓN: OFA 009-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ PAGINAS: 15 de 20


SULFATO UTILIZADO:		MAGNECIO		No. DE CICLOS:		CINCO	
DIA Y HORA DE INMERSION:		30-may-22	10:00:00 a. m.	TERMINACION ENSAYO:		4-jun-22	10:00:00 a.m
PASA	RETENIDO	PESO INICIAL grs	TAMIZ FINAL	PESO FINAL grs	PERDIDAS (%)	%RETENIDO GRADACIÓN	PROMEDIO PERDIDAS%
1 1/2"							
1"	3/4"	1502.6	5/8"	1495.3	0.50	19.00	0.09
3/4"	3/8"	1001.4	5/16"	992.1	0.93	13.92	0.18
3/8"	No. 4	300.5	No. 5	290.8	3.23	11.34	0.37
TOTAL		2804.7		2778.2	4.66	49.26	0.64

PERDIDAS EN SULFATO SODIO $\frac{\text{PROM. PERDIDAS} \times 100}{\text{TOTAL RET. GRAD. ORIG.}}$ = $\frac{63.7}{49.3}$ = 1.29%

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES INV-13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Maximo
Afirmado			12%
Sub Base			12%
Base granular	X		18%
Mezcla densa en caliente			12%
Fresado pavimento existente			12%
Concretos			12%


 Jhon Fredy Sanchez Ospiten
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA


 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.739.129-8
 Mecánica de Suelos, Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PERDIDA EN ENSAYOS DE SOLIDEZ EN SULFATOS		CODIGO	OFA PSA-14
				VERSIÓN	2
				FECHA	30-jul.-18


MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA: 16 de enero de 2023
OBRA:	UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS	NORMA: E-220 INVIAS
MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR	CODIGO: MSPC OFA 003-23	REVISIÓN: OFA 009-23
FUENTE: STOCK PLANTA - GUACANAS	DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	PAGINAS: 16 de 20

SULFATO UTILIZADO:		MAGNECIO		No. DE CICLOS:		CINCO	
DÍA Y HORA DE INMERSION:		30-may-22	10:00:00 a. m.	TERMINACION ENSAYO:		4-jun-22	10:00:00 a.m
INICIAL	RETENIDO	PESO INICIAL grs	TAMIZ FINAL	PESO FINAL grs	PERDIDAS (%)	%RETENIDO GRADACIÓN	PROMEDIO PERDIDAS%
3/8"	No. 4	300,0	No. 4	291,3	2,90	10,20	0,30
No. 4	No. 8	100,0	No. 10	97,1	2,90	9,23	0,27
No. 8	No. 16	100,0	No. 40	96,4	3,60	6,39	0,23
No. 16	No. 30	100,0	No. 10	95,2	4,80	5,83	0,28
No. 30	No. 50	100,0	No. 40	87,6	12,40	3,85	0,48
TOTAL		700,0		667,6	26,60	35,50	1,55


PERDIDAS EN SULFATO SODIO $\frac{\text{PROM. PERDIDAS} \times 100}{\text{TOTAL RET. GRAD. ORIG.}}$ = $\frac{155,08}{35,5}$ = **4,37%**

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES INV-13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Maximo
Afirmado			12%
Sub Base			12%
Base granular	X		18%
Mezcla densa en caliente			12%
Fresado pavimento existente			12%
Concretos			12%



Jhon Freddy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

Calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158936582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelos.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DESGASTE DE LOS AGREGADOS		CODIGO	OFA DAG-14
	MAQUINA DE LOS ANGELES		VERSIÓN	2
	RELACIÓN HUMEDO/SECO		FECHA	30-jul-18

DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA:	STOCK PLANTA - GUACANAS	FECHA:	16 de enero de 2023
UBICACIÓN:	# 1 BASE GRANULAR	NORMA:	Art. 330/13 INVIAS
MUESTRA:	PLANTA - GUACANAS	ENSAYO:	E-218 y E-219
FUENTE:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
DESCRIPCIÓN:	INORGÁNICA COLOR CAFÉ	REMISIÓN:	OFA 009-23
		PAGINAS:	17 de 20


PRUEBAS	1	2	3	4
Gradación usada	A	A		
No. de esferas	12	12		
No. de revoluciones	100	500		
Pa = Peso muestra seca antes del ensayo (grs)	5000,5	5000,5		
Pb = Peso muestra seca lavado sobre tamiz No.12 (grs)	4612,3	3366,4		
Pérdida (grs) = Pa - Pb	388,2	1634,1		
% Desgaste = (Pa - Pb) * 100/Pa	7,8	32,7		
Especificación: menor de	8	40		
	SECO	SECO		

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
75,0mm - 3"	63,0mm - 2 1/2"							
63,0mm - 2 1/2"	50,0mm - 2"					2500±50		
50,0mm - 2"	37,5mm - 1 1/2"					2500±50	5000±50	
37,5mm - 1 1/2"	25,0mm - 1"					5000±50	5000±25	5000±25
25,0mm - 1"	19,0mm - 3/4"	1250±25						5000±25
19,0mm - 3/4"	12,5mm - 1/2"	1250±25						
12,5mm - 1/2"	9,50mm - 3/8"	1250±10	2500±10					
9,50mm - 3/8"	6,30mm - 1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
6,30mm - 1/4"	4,75mm - No. 4			2500±10				
4,75mm - No. 4	2,36mm - No. 8				5000±10			
No. Esferas		12	11	8	6	12	12	12
No. Revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

ESPECIFICACIONES INV-13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Afirmado			50%
Sub Base			50%
Base granular y Concretos	X		40%
Mezcla abierta en frío rodadura			35% Base - 25% Rodadura
Mezcla densa en caliente			35% Base - 25% Rodadura
Fresado material existente			35% Base - 25% Rodadura



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.781.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DESGASTE DE LOS AGREGADOS POR ABSORCIÓN EN EL EQUIPO MICRO DEVAL		CODIGO	OFA-MD 040
			VERSIÓN	1
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: HUILA FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-238

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGANICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 18 de 20

PRUEBAS	1	2	3	4
Gradación usada	7,2	7,2		
No. de esferas	5000	5000		
No. de revoluciones	12000	12000		
Pa = Peso muestra seca antes del ensayo (grs)	1500,2	1500,9		
Pb = Peso muestra	1373,3	1375,1		
Perdida (grs) = Pa - Pb	126,9	125,8		
% Desgaste = (Pa - Pb) * 100/Pa	8,5	8,4		
Especificación: menor de	8,42			
Especificación: menor de	25	25		

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

Tipo de Gradación		7,2	7,3	7,4				
	Retenido	max. Nominal 25mm	max. Nominal 12,5mm	max. Nominal 9,5mm				
19,0mm - 3/4"	16,0mm - 5/8"	375g						
16,0mm - 5/8"	12,5mm - 1/2"	375g						
12,5mm - 1/2"	9,5mm - 3/8"	750g	750g					
9,5mm - 3/8"	6,70mm - 0,265"		375g	750g				
6,70mm - 0,265"	6,30mm - 1/4"							
6,30mm - 1/4"	4,75mm - No. 4		375g	750g				
4,75mm - No. 4	1,18mm - No. 16							
Peso muestra (grs)		1500±5	1500±5	1500±5				
Peso esferas (grs)		5000±5	5000±5	5000±5				
Tiempo rotación		105±1	95±1	95±1				
No. Revoluciones		12000±100	10500±100	9500±100				

ESPECIFICACIONES INV-13

Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Afirmado			N/A
Sub Base			30%
Base granular y Concretos	X		30%
Mezcla abierta en frío rodadura			35% Base - 25% Rodadura
Mezcla densa en caliente			35% Base - 25% Rodadura
Fresado material existente			40% Frío - 25% Caliente
Concretos			10%



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
NIT. 7.750.249-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

400

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	EVALUACION DE LA RESISTENCIA MECANICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL METODO DE 10% DE FINOS	CODIGO	OFA-RMA-14
		VERSIÓN	2
	FECHA	30-jul.-18	

OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.	FECHA:	16-ene-23
UBICACIÓN:	STOCK PLANTA - GUACANAS	NORMA:	Art. 330-13 INVIAS
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	ENSAYO:	ASTM C31 / E-218 E-219
FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	REMISIÓN:	OFA 009-23
		PAGINAS:	19 de 20

		PESO EN GRAMOS	
		SECO	HUMEDA
Ma	Material que pasa 3/8" y retiene 1/2"	2865,3	2913,1
Mr	Material Retenido N° 8	2586,3	2563,6

ESTADO DEL AREGADO		SECO	HUMEDO
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDO	fi %	9,7	12,0
VALOR DE LA CARGA	X1	298,7	289,3
CARGA NECESARIA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS	C10	304,57	253,29

KN
KN

RELACION HUMEDO SECO	83,2%
----------------------	-------

ESPECIFICACION INVIAS/13 P501 FAA	SECO		RELACION HUMEDO/SECO		
	RODADURA	110 Kn mín.	RODADURA	110 Kn mín.	75% mín.
	BASE	70 Kn mín.	BASE	75 Kn mín.	
	CONCRETO	75 Kn mín.	CONCRETO	75 Kn mín.	


Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 7.950.209-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS		CODIGO	OFA TAD-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	20-may.-14

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS

NORMA: Art. 330-13 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR

ENSAYO: E-211

FUENTE: PLANTA - GUACANAS

CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ

REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 20 de 20

FRACCIÓN GRUESA						
Fracción		Gradación Original (%)	Peso Fracción Ensayada (g)	Peso Retenido después Ensayo (g)	Pérdida Total (%)	Pérdida Corregida (%)
Pasa	Retiene					
	37.5 mm	0				
	(1 1/2")					
37.5 mm	19 mm	19,0	3000	2998,0	0,07	0,01
(1 1/2")	(3/4")					
19 mm	9.51 mm	18,9	2000	1996	0,20	0,04
(3/4")	(3/8")					
9.51 mm	4.75 mm	10,2	1000	989,0	1,10	0,11
(3/8")	(No. 4)					
TOTALES		48,1	6000,0	5983,0	1,4	0,16
FRACCIÓN FINA						
4.75 mm	1.19 mm	15,6	100,0	98,2	1,80	0,28
(No. 4)	(No. 16)					
TOTALES		15,6	100,0	98,2	1,8	0,28


p = porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznable,
 M = masa de la muestra de ensayo. Para los agregados finos, corresponde a la masa de la porción más gruesa que el tamiz de 1.18 mm (No.16), como se describe en la Sección 4.3. Para los agregados gruesos, corresponde a la masa de la fracción respectiva.
 R = masa de las partículas retenidas sobre el tamiz designado, determinada de acuerdo con la Sección 5.2.

$$p = \frac{M - R}{M}$$

REQUISITO NORMA INVIAS/13			OBSERVACIONES:
MATERIAL	Partículas de Arcilla y deleznales		
	Finos	Gruesos	
CONCRETOS	1%	0,25%	
SUB BASE-BASE GRANULAR	2%	2,00%	




Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA




OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 7.850.339-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158696882 Pitalito / correo electronico info@laboratorio@mecanicadesuelosofa.com



 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LÍMITES DE CONSISTENCIA		CODIGO	OFA-EC-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	20-may.-16

OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1,5 km de pavimento rígido - Tramo de vía del Centro Poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Mpio de Suaza, DPT. del Huila		FECHA: 20 de febrero de 2023	
UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ		NORMA: INVIAS-13 / NTC / NSR-10	
MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO		ENSAYO: E-123-E125-E126 - NTC 4630	
FUENTE: CANTERA MASSEQ		CODIGO: MSPC OFA 003-23	
DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGÁNICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.		REMISIÓN: OFA 042-23 2 de 10	

LÍMITES DE CONSISTENCIA

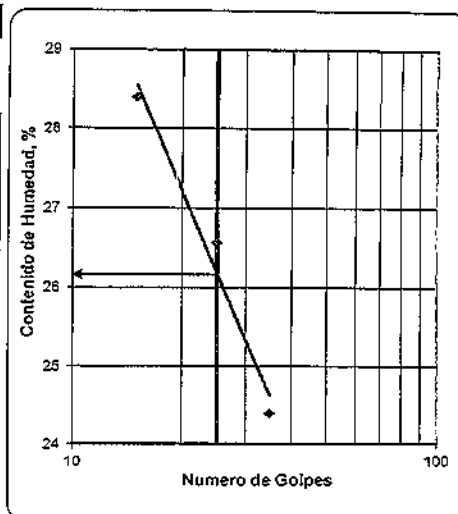
LÍMITE LÍQUIDO			
Prueba No. 1	1	2	3
No. Golpes	35	25	15
Recipiente No.	20	26	27
Vidrio + Suelo Humedo, grm	30,26	32,15	30,26
Vidrio + Suelo Seco, grm	25,55	26,72	24,88
Peso del Agua, grm	4,71	5,43	5,38
Peso vidrio, grm	6,24	6,28	5,94
Peso Suelo Seco, grm	19,31	20,44	18,94
Contenido de agua, %	24,39	26,67	28,41

LÍMITE PLÁSTICO	
1	2
33	27
30,12	29,25
26,32	25,52
3,80	3,73
6,00	5,48
20,32	20,04
18,70	18,61

GRADACIÓN

P1 = 7061 6578 6248,9

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% PASA	ART. 220-13
3"	0			
2 1/2"	0	0,0	100,0	
2"	0,0	0,0	100,0	
1 1/2"	170,1	2,4	97,6	
1"	601,2	8,5	89,1	
3/4"	326,6	4,6	84,5	
1/2"	614,0	8,7	75,8	
3/8"	378,7	5,4	70,4	
No. 4	1047,0	14,8	55,6	
No. 10	1323,0	18,7	36,8	<80%
No. 40	1338,2	19,0	17,9	
No. 200	450,1	6,4	11,5	<20%
Pasa No. 200	812,1	11,5		
TOTAL	7061	100,0		



44,4	44,1	11,5
GRAVAS	ARENAS	FINOS

% Fracción menor del Tamiz No. 200 11,50

D10	0,90	COEFICIENTE UNIFORMIDAD (Cu)	12,0	HUMEDAD NATURAL
D30	6,80			
D60	10,8	COEFICIENTE CURVATURA (Cc)	4,8	11,3%
PRUEBA LÍMITE DE CONTRACCIÓN		LC	R	CV

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS	
Límite Líquido (%)	26,20
Límite Plástico (%)	18,66
Índice de Plasticidad (%)	7,54
Índice de Consistencia	3,47
Índice de grupo	-3
AASHTO	A-2-4
USCS	GC

[Signature]
 Jhon Fredy Sanchez Ospita

Técnico profesional en construcción - SENA

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.160.339-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Jefe de Laboratorio



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

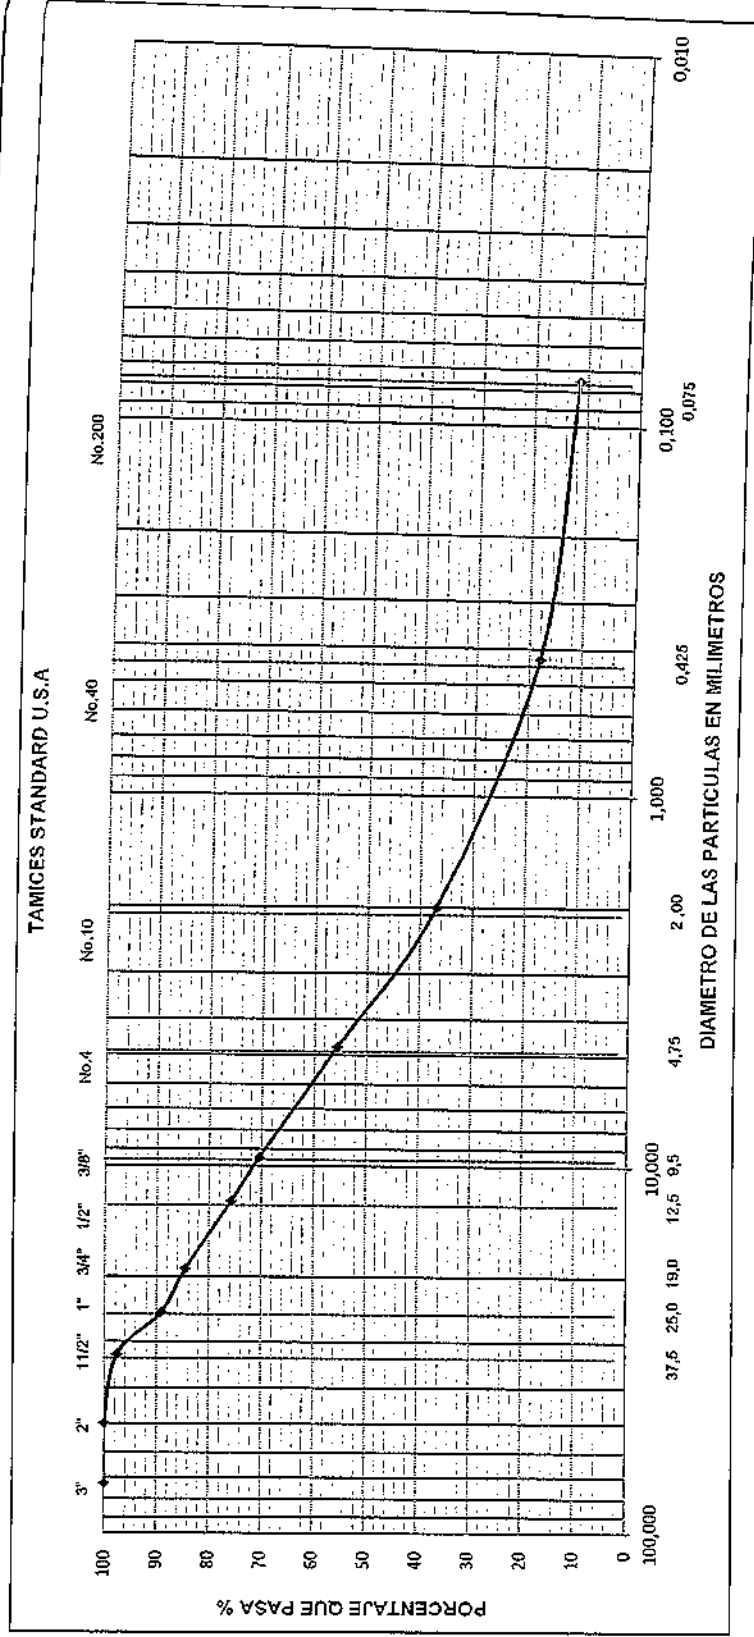
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Y LIMITES DE CONSISTENCIA

CODIGO	OFA-EC-14
VERSION	2
FECHA	20-may.-16

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO -
TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA,
DPT. DEL HUILA
1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO
20 de febrero de 2023

PROYECTO:
MUESTRA:
FECHA:

CODIGO: MSPC OFA 003-23
REMISION: OFA 042-23
HOJAS: 3 de 10

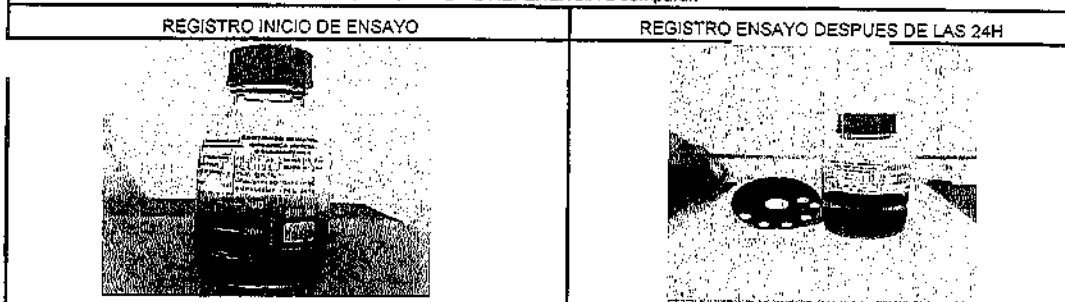


 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO - METODO IGNICIÓN	CODIGO	OFA-CMO-14
		VERSIÓN	1
		FECHA	20-oct.-13

OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA	FECHA:	20-feb.-23
UBICACIÓN:	STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ	NORMA:	INVIAS-13
MUESTRA:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	ENSAYO:	E-121
FUENTE:	CANTERA MASSEQ	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.	REMISIÓN:	OFA 042-23
		PAGINAS:	4 de 10

EQUIPO :


- * Frascos incoloros
- * Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 3%
- * Tabla de colores No.815 ASTM C-40 con Número de referencia Orgánica de 1 a 5 en el cual el número 3 es el COLOR NORMAL DE REFERENCIA a comparar.



INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Se considera que la arena contiene componentes orgánicos perjudiciales, cuando el color que sobrenada por encima de la muestra de ensayo es mas oscuro que el COLOR NORMAL DE REFERENCIA

RESULTADO CUALITATIVO	Agregado	Tolerancia	Cumple	No Cumple	Numero de referencia Orgánica
	Terrapien				
	Afirmado		X		
	Sub base granular				
	Base granular				
	Concreto				
	MDC				

 John Fredy Sanchez Ospitia Tecnico profesional en construcción - SENA	 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA NIT. 7.850.239-2 Mecánica de Suelos, Pavimentos y Concretos Ing. Jefe de Laboratorio
--	--

406


 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE COLAPSO	CODIGO:	OFA-DM-08
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	4-ene-18

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO FUENTE: CANTERA MASSEQ	FECHA: 20-feb-23 NORMA: INV E157-13 CÓDIGO: MSPC OFA 003-23 REMISIÓN: OFA 042-23 PAGINAS: 5 de 10
--	--

MASA INICIAL (g)		ALTURA INICIAL (Pulg)	
95,92		0,0866	
TIEMPO (min)	CARGA (g)	DEFORMACIÓN AXIAL 0,0001"	ESFUERZO VERTICAL (KPa)
5	25	42	6
10	60	58	15
10	125	112	25
10	250	142	50
10	500	250	102
10	1000	219	200
10	2000	475	400
0,1	INUNDACION	479	400
0,25		480	400
0,5		481	400
1		481	400
2		482	400
4		482	400
8		482	400
15		483	400
30		483	400
60		483	400
120		483	400
240		483	400
APLICACION DE CARGA			
480	4000	488	800
960	8000	489	1600
1920		492	

OBSERVACIONES: Se determino el potencial de colapso para una capa de suelo 0,50m, aplicando un esfuerzo vertical de 400 Kpa, se obtuvo un indice de colapso de 0,66% que corresponde a un grado de colapso ligero. Se debe tener en cuenta que el ensayo no intenta reproducir ninguna condición particular en campo, sino una correlación directa del comportamiento del suelo mediante los datos obtenidos.

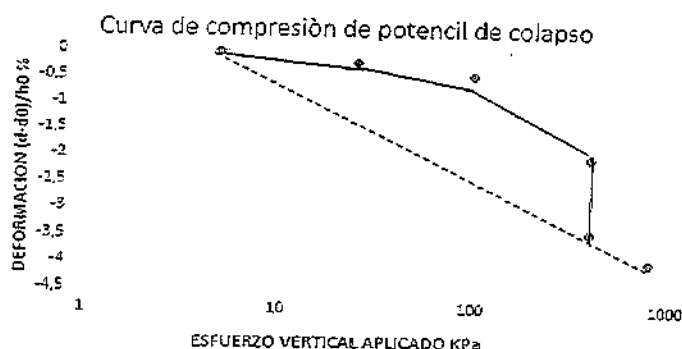

Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Tecnico profesional en construcción - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT: 7.651.249-B
 Mecánica de suelos,
 pavimentos y concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Jefe del Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE COLAPSO	CODIGO:	OFA-DM-08
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	4-ene-18

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA
UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ
MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO
FUENTE: CANTERA MASSEQ


FECHA: 20-feb-23
NORMA: IINV E157-13
CÓDIGO: MSPC OFA 003-23
REMISIÓN: OFA 042-23
PAGINAS: 6 de 10



$$I_e = \frac{df - d_i}{h_0} \times 100 = 0,92$$

GRADO DEL COLAPSO DEL ESPECIMEN	INDICE DE COLAPSO I_e %
Ninguno	0
Ligero	0.1 a 2.0
Moderado	2.1 a 6.0
Moderadamente severo	6.1 a 10.0
Severo	> 10

OBSERVACIONES: Se determinó el potencial de colapso para una capa de suelo 0.50m, aplicando un esfuerzo vertical de 400 Kpa, se obtuvo un índice de colapso de 0.88% que corresponde a un grado de colapso ligero. Se debe tener en cuenta que el ensayo no intenta reproducir ninguna condición particular en campo, sino una correlación directa del comportamiento del suelo mediante los datos obtenidos.



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Técnico profesional en construcción - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.660.239-8
 Mecánica de suelos,
 pavimentos y concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Jefe de Laboratorio

A00

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CONTENIDO DE SALES SOLUBLES	CODIGO	OFA AM-14
		VERSIÓN	2
		FECHA:	20-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA

OBRA:	STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ	FECHA:	20-feb.-23
UBICACIÓN:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	NORMA:	Art. 220-13
MUESTRA:	CANTERA MASSEQ	ENSAYO:	E-157
FUENTE	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFE, VETA ROJIZA.	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
DESCRIPCIÓN:		REMISIÓN:	OFA 042-23
		PAGINAS:	7 de 10

ENSAYO	1	2	3
MUESTRA No.	1		
V = Contenido inicial del agua en el frasco.(ml)	500,0		
Va= Volumen del extracto acuoso en cápsula.(ml)	100,0		
Mr= Masa del residuo en la cápsula.(g)	0,7		
Ms= Masa inicial del suelo introducido en el frasco.(g)	50,0		
S= Contenido de Sales Solubles (%)	0,1		

VALOR DE AZUL DE METILENO

=

0,07

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13

		Maximo
Terraplenes	Cumple	2%
Mejoramiento de la Subrasante		2%
Relleno estructural		2%

PARAMENTOS DE ACEPTACION DEL ENSAYO	Calidad del agregado	Cumple	No Cumple	Rangos
	EXCELENTE	X		≤ 2
	MARGINALMENTE ACEPTABLE			4 a 6
	PROBLEMAS + POSIBLES FALLAS			8 a 10
	FALLADO			≥ 10

OBSERVACIONES:




Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional en construcción - SENA
Oficina Calle 2-Nº. 2-58 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3158538582 - 3105510967 / correo electronico: info.laboratorio@mecnicadesuelosofa.com



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT: 7.660.209-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	RELACIÓN HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	CODIGO	OFA-EPM-14
		VERSIÓN	2
		FECHA	20-may.-16

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE
VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE
RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA

UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ

MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO

FUENTE: CANTERA MASSEQ

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.

FECHA: 20-feb.-23

NORMA: Art. 220-230/13

ENSAYO: E-142

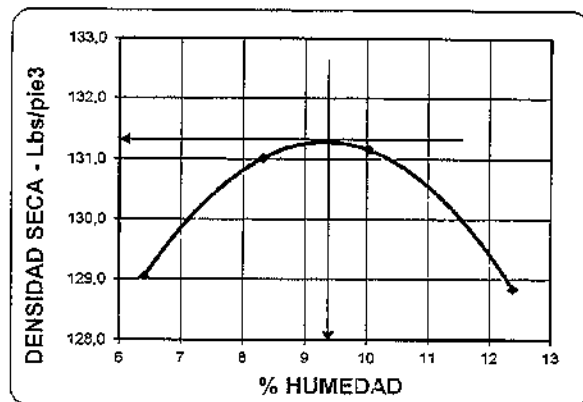
CODIGO: MSPC OFA 003-23

REMISIÓN: OFA 042-23

PAGINAS: 8 de 10

DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
Humedad Natural	5,0	5,0	5,0	5,0
Agua Añadida (c.c.)	120	240	360	480
Peso Molde + Muestra Humeda, g	10578	10729	10808	10824
Peso Molde, g	6067	6067	6067	6067
Peso Suelo Humedo, g	4511	4662	4741	4757
Volumen del Molde, cc	2050	2050	2050	2050
Densidad Humeda, g/cc	2,200	2,274	2,313	2,320
Humedad, %	6,4	8,3	10,0	12,4
Densidad Seca, lbs/pie ³	129,0	131,0	131,2	128,8

HUMEDAD				
Capsula No.				4
Peso Capsula + Suelo humedo, grm	659,3	625,0	619,9	690,0
Peso Capsula + Suelo Seco, grm	626,4	582,3	570,0	621,6
Peso agua, grm	32,9	42,7	49,9	68,4
Peso Capsula	113,0	69,3	72,5	69,3
Humedad, %	6,4	8,3	10,0	12,4





CLASIFICACION DEL SUELO

A.A.S.H.O. A-2-4
U.S.C.E. GC
Indice de Grupo -3

Densidad Max. 131,2 Lbs/Pulg³
Humedad Optima 9,3 %

OBSERVACIONES
Densidad Máxima 2,103
grs/cm³


Jhon-Fredy Sanchez Ospitia
Tecnico profesional en construcción - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT: 7.761.249-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos
Oscar Fernando Arevalo
Jefe de Laboratorio



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

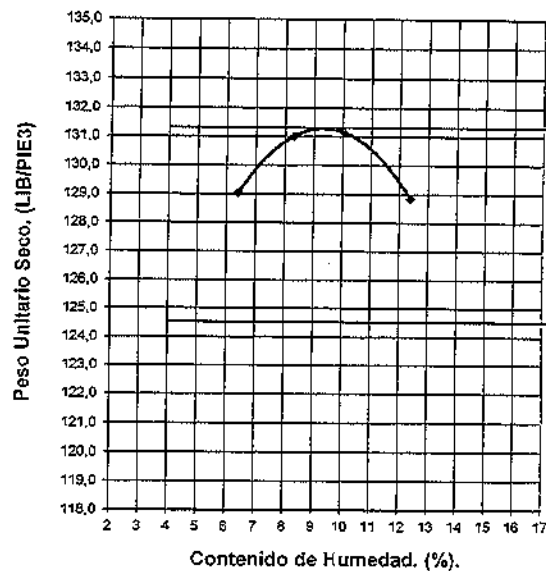
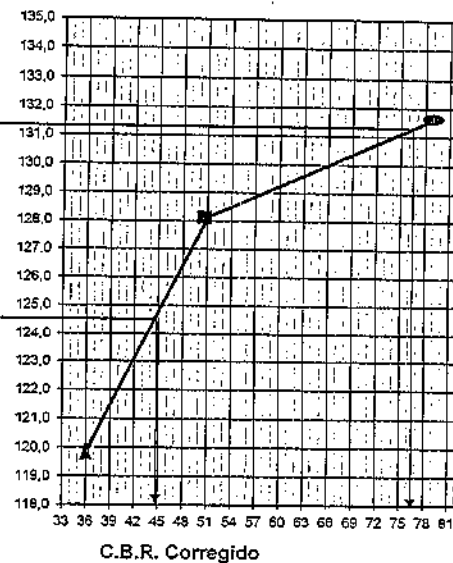
**CBR DEL SUELO COMPACTADO
EN EL LABORATORIO Y SOBRE
MUESTRAS INALTERADAS**

CODIGO	OFA-CBR-14
VERSIÓN	2
FECHA	20-may.-16

FUENTE:	CANTERA MASSEQ	METODO:	No.1.
MUESTRA:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.	FECHA:	20 de febrero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 042-23 10 de 10

MOLDE NUMERO	2	2	2	2
NUMERO DE GOLPES POR CAPA	55	55	55	55
VOLUMEN cc	2.050	2.050	2.050	2.050
PESO MOLDE + MUESTRA COMPACTADA (g)	10.578	10.729	10.808	10.824
PESO MOLDE (g)	6.067	6.067	6.067	6.067
PESO MUESTRA COMPACTADA (g)	4.511	4.662	4.741	4.757
DENSIDAD HUMEDAD (g/cc)	2.200	2.274	2.313	2.320
PESO MUESTRA HUMEDAD + RECIPIENTE (g)	113.0	69.3	72.5	69.3
PESO MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)	659.3	625.0	619.9	690.0
CONTENIDO DE HUMEDO (%)	6.4	8.3	10.0	12.4
PESO UNITARIO SECO (Kg / m ³)	2.068	2.099	2.102	2.065
PESO UNITARIO SECO (Lbs / Pies ³)	129.0	131.0	131.2	128.8

2	8	9
56	30	10
2.322	2.322	2.313
12.547	12.387	11.804
7.203	7.181	6.954
5.344	5.206	4.850
2.301	2.242	2.097
69.3	69.3	69.3
738.8	738.8	738.8
682.5	682.5	682.5
9.2	9.2	9.2
2.108	2.053	1.921
131.5	128.1	119.8



CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD	9.3
PESO UNITARIO SECO MAXIMO, Lb/pulg ³	131.2
C.B.R. CORREGIDO / 100%	76.2%
C.B.R. CORREGIDO / 95%	44.8%

●	65 GOLPES / CAPA.
■	30 GOLPES / CAPA.
▲	10 GOLPES / CAPA.

Jhon Fredy Sanchez Ospitia

Técnico profesional en construcción - SENA

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 9.700.309-2
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo Peralta
Jefe de Laboratorio

Oficina Calle 2 No. 2-53 Vahnera Tel. 0988362780 Cel.3158938582-3105510987 Páizito - Huila / correo electrónico mecanicasuelosca@gmail.com

FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSION 001
	ASISTENCIA Y PARTICIPACION		CODIGO SIG-TH-F-01
			PAGINA 1 DE 1

TEMAS TRATADOS: Inducción general objetivos / riesgos asociados funciones / generalidades FJR	TIPO DE ACTIVIDAD Reunión ☐ Curso Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Inducción de Personal ☒ Taller ☐ Charla Capacitación ☐ Charla Integral ☐ Difusión ☐ Charla EDT ☐ A Integrantes ☐ A Líderes Directos ☐
---	--

Hora de Inicio: 7:30 AM	Hora Final: 11:00 AM	Nº PARTICIPANTES: 8
DURACIÓN (hrs.): 03 HORAS	LUGAR: Oficina 647-201	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	AREA	FIRMA
1.	Edwin Orley Toledo	FJR	operador	operativo	[Firma]
2.	Sebastian Polo Garay	FJR	operador	operativo	[Firma]
3.	David Quiroga D.	FJR	topógrafo	operativo	[Firma]
4.	Sebastian clares G.	FJR	conductor	operativo	[Firma]
5.	Ruben Joven.	FJR	conductor	operativo	[Firma]
6.	Carlos J. Hernandez	FJR	conductor	operativo	[Firma]
7.	Fernando Jimenez	FJR	inspector	operativo	[Firma]
8.	Leonardo perulosa	FJR	conductor	operativo	[Firma]
9.	Natalia Alejandro Gelbiri	FJR	administrativa	operativa	[Firma]
10.	Leonilde Corudo	FJR	administrativa	operativa	[Firma]
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:	CARGO:	FIRMA:	FECHA:
LEONILDE CORUDO	INSTRUCCION	[Firma]	Febrero 4/23

INDUCCIONES

FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

VERSION
001
CODIGO
SIG-TH-F-01
PAGINA
1 DE 1

ASISTENCIA Y PARTICIPACION

TEMAS TRATADOS :

Inducción general
objetivos / riesgos asociados
Oportunidades / responsabilidades FJR

TIPO DE ACTIVIDAD

- Reunión ☐
- Curso Capacitación ☐
- Entrenamiento ☐
- Reinducción ☐
- Inducción de Personal ☒
- Taller ☐
- Charla Capacitación ☐
- Charla Integral ☐
- Difusión ☐
- Charla EDT ☐
- A Integrantes ☐
- A Líderes Directos ☐

Hora de Inicio: 1:30pm

Hora Final: 4:00pm

Nº PARTICIPANTES: 5

DURACION (hrs.): 02 HORAS

LUGAR: OFICINA CAPTAN

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	AREA	FIRMA
1.	Edwin Oney Diez	FJR	operador	operativo	[Firma]
2.	Sebastian Polo Garza	FJR	operador	operativo	[Firma]
3.	David Quiroga D.	FJR	topografo	operativo	[Firma]
4.	Sebastian clares G.	FJR	conductor	operativo	Sebastian
5.	Ruben Tovar N.	FJR	cadenero	operativo	Ruben T.
6.	Carlos J. Hernandez	FJR	cadenero	operativo	[Firma]
7.	Fernando Jimenez	FJR	Inspector	operativo	[Firma]
8.	Leonardo penolosa	FJR	conductor	operativo	Leonardo
9.	Natalia Alexandra Gelbif	FJR	controladora	operativa	[Firma]
10.	Leonilde Corudo	FJR	controladora	operativa	[Firma]
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

[Firma Instructores]

[Firma Instructores]

[Firma Instructores]

Febrero 4/13

INSPECCIONES KIT EMERGENCIAS

ENTIDAD CONTRATANTE



Gobernación del Huila



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDICO 45HL10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1

LUIS MIGUEL PERDOMO
INTERVENTORIA EXTERNA

ANEXO 15.DOCUMENTOS COMPONENTES

Dirección: Carrera 8 # 17 – 02 Campo Núñez
Celular: 3168641874
Correo Electrónico: InterventoriaGallardo2023@gmail.com
Neiva – Huila

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

Plan de Gestión del Proyecto

FERNANDO JIMENEZ ROA

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

Suaza - Huila-2023



MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila*.

FERNANDO JIMENEZ ROA

Contenido

1	ACTA DE PROYECTO.....	3
2	PARTES INTERESADAS	6
3	ESTABLECER EL EQUIPO DE PROYECTO.....	7
4	Desarrollar planes de proyecto.....	7
5	Definir alcance	8
5.1	Características del proyecto.....	8
5.2	Mapa De Procesos Del Proyecto.....	9
5.3	Responsabilidad De La Dirección	10
5.4	Compromiso De La Dirección	10
6	DEFINIR ACTIVIDADES	11
7	ESTIMAR RECURSOS	11
8	ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.....	11
9	SECUENCIA DE ACTIVIDADES.....	14
9.1	Diagrama Red.....	14
10	DESARROLLO DEL CRONOGRAMA	16
10.1	Diagrama Gantt	16
11	ESTIMACIÓN COSTOS	18
12	DESARROLLAR EL PRESUPUESTO	19
12.1	Oferta Económica	19
13	PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD	20
13.1	Plan De Calidad para MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila*.....	20
13.2	Programa De Puntos De Inspección Y Ensayo De La Obra	22
13.3	Equipo De Inspección, Medición Y Ensayo	24

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

1 ACTA DE PROYECTO.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Es una oportunidad para generar utilidades importantes para FERNANDO JIMENEZ ROA

OBJETIVOS

- Cumplir con el plazo pactado
- Cumplir con el precio pactado
- Realizar el proyecto con los costos estimados
-

CRITERIOS DE ÉXITO

- Realizar las actividades contratadas en un tiempo menor a 4 meses.
- Lograr unos costos inferiores al 90% del valor del contrato antes de A.I.U.
- Cumplir en 100% con las normas técnicas colombianas.

REQUISITOS DE ALTO NIVEL

Cumplimiento de normas técnicas colombianas.

RIESGOS DE ALTO NIVEL

Riesgo identificado:	Accidentes De Trabajo.
Medida de mitigación:	Programa de Salud Ocupacional

Riesgo identificado:	Incumplimiento de Normas Técnicas.
Medida de mitigación:	Plan de Calidad

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CRONOGRAMA

Descripción	Und	Cant	Duración
INICIO		0	0 días
LOGISTICA INICIAL Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE VICINDAD		0	19 días
ACTIVIDADES EN TRAMO ENTRE LAS ABSCISAS K21+120 - K22+120		0	181 días
PRELIMINARES		0	45 días
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	m	1500	45 días
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA		0	159 días
EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	10217,4	89 días
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (NO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	m3	90	78 días
TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.(NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	746	84 días
INICIO ACTIVIDADES ENTRE LAS ABSCISAS K20+620 - K21+120 (DEBIDO A TRABAJOS DE LA COMUNIDAD Y LA ALCALDIA DE SUAZA EN ALCANTARILLADO).		0	0 días
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		0	136 días
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	9600	93 días
PAVIMENTO RIGIDO MR-40, ESPESOR (0,20) M, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,8	m3	1884	103 días
SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR ESP. 330-13 INV.(NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	1503	105 días
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE BORDILLO. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m	3000	62 días
TRANSPORTE		0	143 días
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	67427,04	127 días
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (CONCRETOS). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	267425,6	132 días
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y/O GRANULARES (MEJORAMIENTO Y/O SUBBASE Y/O BASE Y/O ASFALTO). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	320697,83	114 días
OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (9)		0	111 días
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	20	81 días
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE ENCOLES, DESCOLES,	m3	74	82 días

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS Y BORDILLO. (NO INCLUYE TRANSPORTE).			
SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	63	68 días
ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA	Kg	11544	84 días
EXCAVACIÓN MECÁNICA NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	577	90 días
TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV.(NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	296	56 días
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	432	68 días
DEMOLICION DE CONCRETOS DE EXISTENTES, INCLUYE RETIRO.	m3	66	70 días
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE C- (F' C=280 KG/CM2). PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	93	83 días
SEÑALIZACIÓN		0	6 días
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO. ESP. 700-13 INV.	m	4500	4 días
TACHAS REFLECTIVAS 701-13 INV.	Unidad	564	3 días
OTROS		0	169 días
(PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL) PAGA	Glb	1	142 días
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	Glb	1	152 días
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA - PAPSO	Glb	1	2 días
FIN OBRA		0	0 días

Requisitos para la aprobación del proyecto

Acta de adjudicación por parte de GOBERNACION DEL HUILA

Director del proyecto y nivel de autoridad

Quien tendrá autonomía técnica y administrativa para la toma de decisiones y adquisiciones concernientes al proyecto. Autonomía dada por el representante legal

FERNANDO JIMENEZ ROA

423

FERNANDO JIMENEZ ROA

2 PARTES INTERESADAS

MATRIZ DE INTERESADOS

Interesado	Compromiso					Poder / Influencia	Interés	
	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
GOBERNACION DEL HUILA				DX		A	A	Gestionar de cerca
Interventoría				DX		A	A	Gestionar de cerca
Residentes Áreas de Influencia				DX		B	A	Informar
Alcaldía			D	x		B	B	Monitorear
Empleados			D	X		A	A	Gestionar de cerca

Notas:

X: Actual ; D: deseado

A: Alto ; B: Bajo

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

3 ESTABLECER EL EQUIPO DE PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila", contara con los siguientes cargos directivos y administrativos:

- 1 DIRECTOR DE OBRA (50% DEDICACIÓN)
- 1 RESIDENTE DE OBRA (100% DEDICACIÓN)
- 1 PROGRAMADOR DE OBRA (15% DEDICACIÓN)
- 1 PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL (15% DEDICACIÓN)
- 1 AUDITOR DE AMBIENTAL (15% DEDICACIÓN)
- 1 AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (15% DEDICACIÓN)
- 1 INSPECTOR DE OBRA (100% DEDICACIÓN)

4 Desarrollar planes de proyecto

Dentro de los planes para la ejecución de proyecto se identificaron los siguientes:

PLANES	FORMA DE EJECUCIÓN	ENTREGABLE
Identificación De Requisitos Técnicos	Identificación De Normas Técnicas, Frecuencia De Inspección Y Criterios De Aceptación	Plan De Calidad, Programa De Puntos De Inspección Y Ensayos, Equipos De Medición Y Ensayos
Riesgos Laborales	Identificación, Valoración, Mitigación O Eliminación De Riesgos Laborales	Programa De Salud Ocupacional, Panorama De Riesgos
Cronograma De Actividades	Identificación De Actividades Y Secuencia Lógicas De Las Mismas, Identificación De Restricciones De Recursos	Cronograma De Actividades, Diagrama De GANTT, Ruta Crítica

A25

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila”.

FERNANDO JIMENEZ ROA

Flujo de Fondos	Identificación De Actividades Y Secuencia Lógicas De Las Mismas, Identificación De Restricciones De Recursos, Identificación De Recursos En Periodo De Tiempo	Flujo de Fondos
-----------------	---	-----------------

5 Definir alcance

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila”, En Un Periodo De 6 Meses, Con Un Costo Maximo De TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETANTAY SIETE PESOS M/CTE. (\$ 3.942.890.677,00),

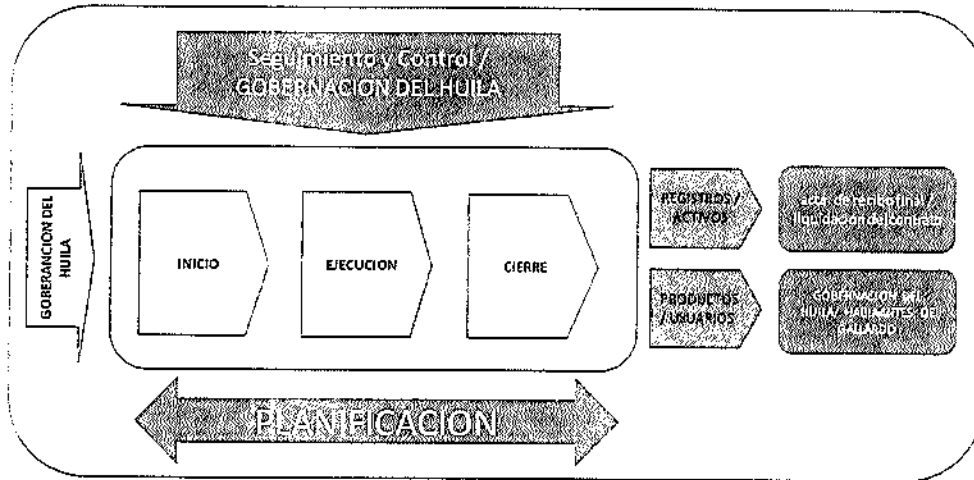
5.1 Características del proyecto.

Proyecto único, en obra civil, con entidad estatal, con limitado contractualmente desde el pliego de condiciones con presupuesto oficial y plazo de ejecución establecido, para el ejecutor que en este caso es FERNANDO JIMENEZ ROA, se obtiene un beneficio económico , y para los habitantes del municipio un beneficio social. El patrocinador o auspiciador del proyecto es GOBERNACION DEL HUILA

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila.

FERNANDO JIMENEZ ROA

5.2 Mapa De Procesos Del Proyecto.



427
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila*.

FERNANDO JIMENEZ ROA

5.3 Responsabilidad De La Dirección

Entre las principales responsabilidades de Dirección se encuentra la planificación donde define claramente los objetivos y alcance del proyecto, llega a un acuerdo con los clientes sobre ese alcance, comunica los objetivos al equipo de trabajo y desarrolla el plan involucrando a los miembros del equipo de trabajo.

Además, organiza el proyecto mediante la obtención de los recursos necesarios para lograr los objetivos, decidiendo qué tareas se hacen internamente y cuáles son tercerizadas, asignando responsabilidades y delegando autoridad, creando un ambiente donde las personas estén motivadas para el trabajo en equipo.

Por último, controla la evolución del proyecto y arregla los desvíos entre el progreso real y lo planificado. Todo esto con una actitud proactiva para resolver los problemas antes de que empeoren.

5.4 Compromiso De La Dirección

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

El FERNANDO JIMENEZ ROA, Se determinó cumplir estrictamente las directrices del PLAN DE GESTIÓN de la MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila", el cumplimiento y compromiso del cumplimiento del PLAN DE GESTIÓN está en cabeza del director del proyecto.

En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal.

FERNANDO JIMENEZ ROA
Representante Legal

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

El proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila", está dividido en un frente el cual están claramente definidos por la GOBERNACION DEL HUILA. Para observar claramente las actividades y la estructura de desglose EDT, ver diagrama de GATT ADJUNTO.

6 DEFINIR ACTIVIDADES

Las actividades a realizar dentro del proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila", esta discriminadas en el diagrama de GATT adjunto.

7 ESTIMAR RECURSOS

El FERNANDO JIMENEZ ROA realizo la estimación de los recurso necesarios para le ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila", de la siguiente manera:

1. Identificación de actividades (según presupuesto oficial)
2. Elaboración de A.P.U. (Análisis de precios unitarios)
3. Cálculos de cantidades d totales por actividad, (recurso necesarios para la unidad de la actividad multiplicado por la cantidad total a ejecutar.
4. Ejecución de diagrama programación LPU. En Project

8 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a los rendimientos determinados por cada activada en los A.P.U., se determina la duración de cada una de las actividades, teniendo en cuenta las restricciones de recurso que posee La FERNANDO JIMENEZ ROA y las restricciones propios del proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila”.

FERNANDO JIMENEZ ROA

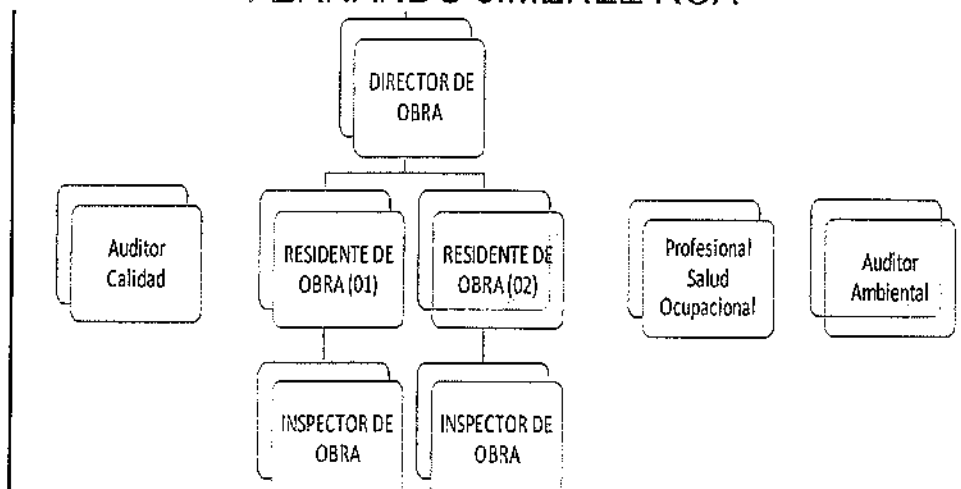
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, dentro de las cuales se encuentran:

RESTRICCIONES PROYECTOS					
ALCANCE	PLAZO	COSTO	CALIDAD	RECURSOS	RIESGO
Negociable	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente
Definida Cliente	Negociable	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente
Definida Cliente	Definida Cliente	Negociable	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente
Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Negociable	Definida Cliente	Definida Cliente
Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Negociable	Definida Cliente
Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Definida Cliente	Negociable

La FERNANDO JIMENEZ ROA, diseño el diagrama de GANTT para el proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila”, En el cual esta expresado la manera sistemática que se desarrollara la obra. Para lograr de dicho objetivo se diseñó el organigrama del proyecto el cual es el siguiente:

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila*.

FERNANDO JIMENEZ ROA



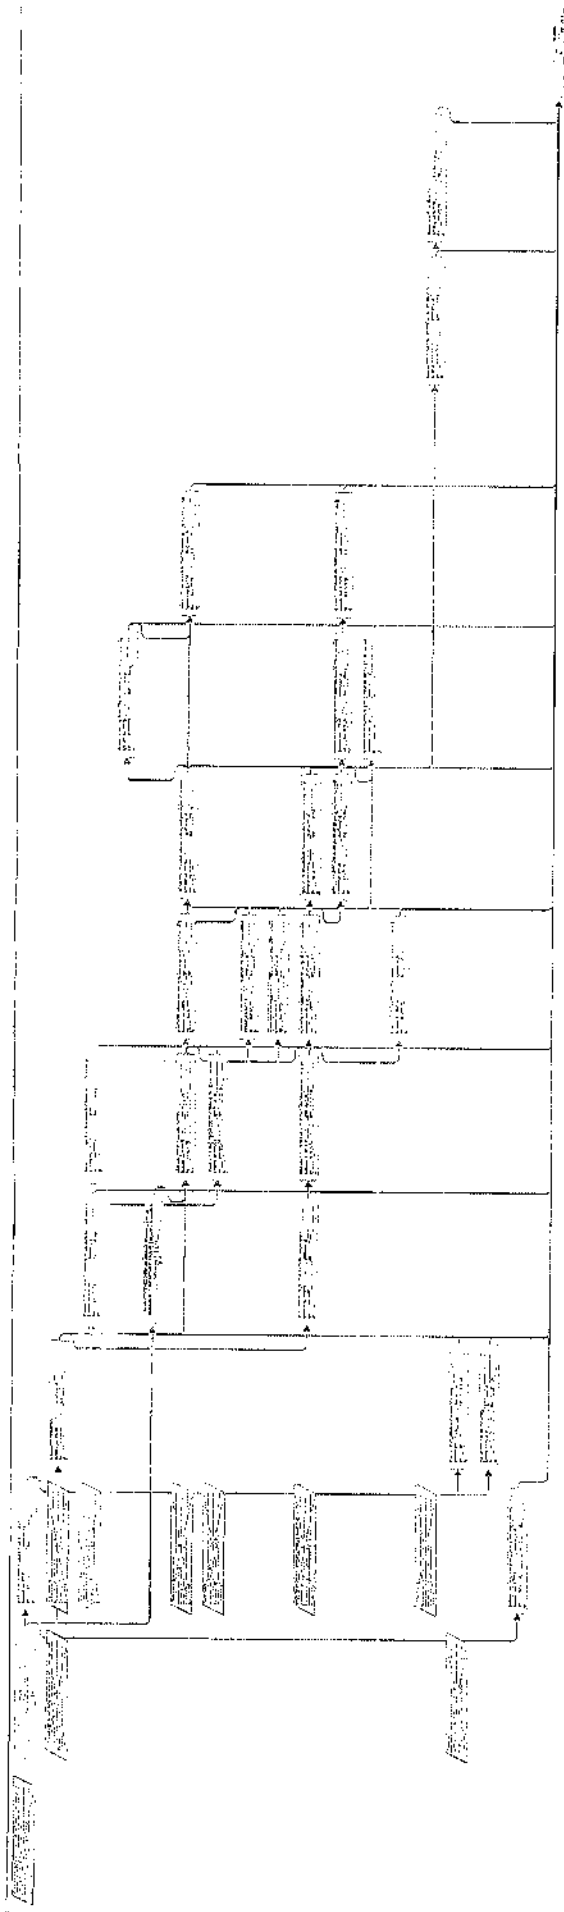
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

9 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

9.1 Diagrama Red

VER DIAGRAMA DE RED



MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

10 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

10.1 Diagrama Gantt

VER DIAGRAMA DE GANTT

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila”.

FERNANDO JIMENEZ ROA

11 ESTIMACIÓN COSTOS

La estimación de costos se hizo desarrollando los Análisis de Precios Unitarios – A.P.U. Por cada una de las actividades a ejecutar dentro de la MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila”.. Dentro de los Análisis de Precios Unitarios – A.P.U. Se tuvieron en cuenta factores y recursos como lo son el material, la mano de obra, la herramienta y equipo y los transportes necesarios para cada una de las actividades.

436

MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

12 DESARROLLAR EL PRESUPUESTO

12.1 Oferta Económica

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARÍA DE VÍAS INFRAESTRUCTURA



OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

PRESUPUESTO OFICIAL

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR						
1. PRELIMINARES									
1	1.1		1P S.V.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	m	1,500.00	\$ 4,269.00	\$ 4,449,500.00	
Subtotal									\$ 4,449,500.00
2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA									
2	2.1	ESP. 210-13 RVV		EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN), ESP. 210-13 RVV, (NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MUESTRO).	m3	18,217.40	\$ 15,000.00	\$ 153,261,009.00	
3	2.2		2P S.V.	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SECO (NO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO).	m3	50.00	\$ 28,416.00	\$ 2,537,620.00	
4	2.3	ESP. 220-13 RVV		TERRAPIEN DE MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, ESP. 220-13 RVV (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	746.00	\$ 61,000.00	\$ 45,503,000.00	
Subtotal									\$ 261,321,629.00
3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
5	3.1	ESP. 310-13 RVV		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	9,609.00	\$ 1,200.00	\$ 11,530,800.00	
6	3.2	ESP. 500-13 RVV		PAVIMENTO RÍGIDO (R-40, ESPESOR (8.25) M, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO (LONGITUD 0.35 M, ESPACIADOS CADA 0.30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0.65 M) SEPARADAS 1.20 M, CURADO CON ANTICL, (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m2	1,054.00	\$ 840,476.00	\$ 1,593,458,744.00	
7	3.3	ESP. 330-13 RVV		SUBMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENSIÓN, AMPLIACIÓN, MURIEDECIMIENTO O AREACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESP. 330-13 RVV (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	1,503.00	\$ 147,434.00	\$ 217,066,332.00	
8	3.4	ESP. 600-13 RVV		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-F (C-210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m	3,000.00	\$ 95,572.00	\$ 286,716,000.00	
Subtotal									\$ 2,010,762,116.00
4. TRANSPORTE									
9	4.1	ESP. 800-13 RVV		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES DE 100 METROS (1,000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CEN. METROS (100 M).	m3-km	67,427.04	\$ 1,000.00	\$ 67,427,040.00	
10	4.2	ESP. 800-13 RVV		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS (CONCRETOS) PARA DISTANCIAS MAYORES DE 100 METROS (1,000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CEN. METROS (100 M).	m3-km	207,429.00	\$ 1,000.00	\$ 207,429,000.00	
11	4.3	ESP. 800-13 RVV		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS Y/O GRANULARES (MEJORAMIENTO Y/O SUBBASE Y/O BASE Y/O ASFALTO), PARA DISTANCIAS MAYORES DE 100 METROS (1,000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CEN. METROS (100 M).	m3-km	370,697.83	\$ 1,000.00	\$ 370,697,830.00	
Subtotal									\$ 655,553,870.00
5. OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (O)									
12	5.1	ESP. 630-13 RVV		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LUJEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F-F (C-140 KG/CM2) PARA OBRAS DE ARTE. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	50.00	\$ 582,124.00	\$ 11,411,400.00	
13	5.2	ESP. 630-13 RVV		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D-F (C-210 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE ENCOQUES, DESCOQUES, PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS Y DOPADO (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	74.00	\$ 609,020.00	\$ 11,704,070.00	
14	5.3	ESP. 630-13 RVV		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO F400, 4" M, ESP. 630-13 RVV.	m	63.00	\$ 305,402.00	\$ 21,840,326.00	
15	5.4	ESP. 630-13 RVV		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60,000 PSI) ESP. 630-13 RVV, PARA ALCANTARILLA.	Kg	11,544.00	\$ 6,000.00	\$ 69,264,000.00	
16	5.5	ESP. 210-13 RVV		EXCAVACIÓN MECÁNICA (NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MUESTRO).	m3	377.00	\$ 15,000.00	\$ 5,655,000.00	
17	5.6	ESP. 220-13 RVV		TERRAPIEN DE MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, ESP. 220-13 RVV (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	290.00	\$ 81,000.00	\$ 23,691,000.00	
18	5.7	ESP. 630-13 RVV		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR ALTAIRE, ESP. 630-13 RVV, (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	432.00	\$ 209,534.00	\$ 90,520,000.00	
19	5.8		3P S.V.	DETALLACIÓN DE CONCRETOS DE EXISTENTES, EXCLUIRE RETIRO.	m3	64.00	\$ 300,000.00	\$ 19,200,000.00	
20	5.9	ESP. 630-13 RVV		SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE C-F (C-200 KG/CM2), PARA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT, (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	53.00	\$ 755,780.00	\$ 40,056,000.00	
Subtotal									\$ 413,033,020.00
6. SEÑALIZACIÓN									
21	6.1	ESP. 700-13 RVV		LÍNEA DE DESVIACIÓN CON PINTURA EN FRIO, ESP. 700-13 RVV.	m	4,500.00	\$ 2,115.00	\$ 9,517,500.00	
22	6.2	ESP. 701-13 RVV		TACHAS REFLECTIVAS 201-3 RVV	Unidad	501.00	\$ 8,236.00	\$ 4,145,104.00	
Subtotal									\$ 14,162,604.00
SUBTOTAL OBRAS									\$ 3,390,113,112.00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA									\$ 20,000,000.00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)									\$ 27,832,180.00
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA - PARGO									\$ 11,877,000.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)									\$ 3,809,426.00
INTERVENCIÓN									
VALOR TOTAL									\$ 3,450,118,172.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.T.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del precio sea igual o superior a 5 se redondea por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se redondea por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.T.U. y su interpretación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	AR	
PREPUESTO	PR	
UTILIDAD	UT	
TOTAL A.T.U.	A.T.U.	

438


MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila".

FERNANDO JIMENEZ ROA

13 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

13.1 Plan De Calidad para MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila".

APROBADO 9/02/2023


Interventoria Externa.

INFORME AMBIENTAL

ENTIDAD



Gobernación del Huila



HUILA
CRECE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO

**LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO**
INTERVENTORIA EXTERNA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA



FEBRERO 2023

Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 N0. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p align="center">LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	--	--

Contenido

ALCANCE DEL PROYECTO	3
Valor Costo Inicial del Proyecto.....	3
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	4
COMPONENTE AMBIENTAL	4
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA.....	4
PROYECTO 2: CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA	7
PROGRAMAS DE INDUCCION:.....	8
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA	9
PAPSO 9	
Objetivos Específicos.....	9
MANEJO DE RESIDUOS.....	11
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.....	15
Proyecto 1: Manejo integral de materiales de construcción	15
Proyecto 2: Señalización frentes de obras y sitios temporales	16
Proyecto 3: Manejo y disposición final de escombros.....	19
Proyecto 4: Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.	20
PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO.....	21
Proyecto 1: Manejo de Aguas superficiales.....	21
PROGRAMA 4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES	23
Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.....	23
Proyecto 2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	24
ACCIONES A EJECUTAR	24
PROGRAMA 5. GESTIÓN SOCIAL	25
Proyecto 1: Atención a la comunidad	25
Proyecto 2: Manejo de la infraestructura de predios.....	26
Proyecto 3: Contratación de Mano de Obra	27
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SUAZA.....	28
Recomendaciones:	28

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
 Celular: **3153635758- 3168641874**
 Correo Electrónico: **gallardosuaza2022@hotmail.com**

ENTIDAD  Gobernación del Huila	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 - 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 <i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA
--	--	---

1. ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto hace referencia al mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento rígido de 1.5 Km en el tramo identificado con código 45HL10 que del Centro Poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A del municipio de Suaza, departamento del Huila, el cual se ejecutará a través de la implementación de un diseño de pavimento rígido que contempla un periodo de vida útil de 20 años.

Valor Costo Inicial del Proyecto

PAGA	\$ \$ 20.605.000,00
PMT	\$ 27.522.180,00
PAPSO	\$ 11.877.080,00
SUBTOTAL	\$ 3.390.113.912
VALOR TOTAL	\$ 3.450.118.172

Tabla 1. Valor inicial del contrato

Plazo Inicial = Seis (6) Meses

A la presente fecha no se han realizado modificaciones al contrato de obra en tiempo y valor.

A la presente fecha no se han realizado modificaciones al contrato de interventoría en tiempo y valor.

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
 Celular: 3153635758- 3168641874
 Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD  Gobernación del Huila	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 <i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA
--	--	---

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

En coordinación con el equipo Técnico del Consorcio Luis Miguel Perdomo Velasco. Integrado por el Ingeniero Civil Jhon Fredy Mayungo, El Ingeniero Civil Jonatan Duran Inspector de Obra, Luis Manuel Polanía Suarez. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Profesional de Apoyo. Yesica Gonzalez Salas Inspectora SST. Realizamos visitas Técnicas en el mes de Febrero del presente año; desarrollándose las siguientes actividades:

2. COMPONENTE AMBIENTAL.

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA

PROGRAMA 1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental Proyecto 1: Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental

OBJETIVO DEL PROYECTO: Conformar y mantener un grupo de profesionales de las áreas ambiental que planeen, diseñen, ejecuten y cuantifiquen las medidas de manejo ambiental necesarias para la ejecución del proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

ACCIONES A EJECUTAR: El Contratista para el presente proyecto; en cumplimiento del documento técnico cuenta con los siguientes profesionales para manejo y gestión de temas socio ambiental.

Cargo	Dedicación en (%)	Nombre
Director de obra	100%	Fernando Jimenez Roa
Residente de obra	100%	Leonardo Andrés Ruiz Maldonado
Profesional SST.	100%	Juan Carlos Caballero
Profesional Ambiental	100%	Laura Nathalie Polo Guzmán
Trabajadora Social	100%	Laura Nathalie Polo Guzman

El profesional Ambiental y Siso deberá asegurar el cumplimiento del PAGA, 1: Velar por el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuestos. 2: Participar en los comités ambientales cuando

Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p align="center">LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	--	--

lo requiera la interventoría, 3.Elaborar informes mensuales sobre la Gestión Ambiental, quien contará con el apoyo de los profesionales Director de Obra y Residente de Obra.

El contratista debe garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental "PAGA" y del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con los requerimientos legales y operativos del contrato.
- Mantener actualizado el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental "PAGA" de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso de las obras.
- Contar con los insumos propios para adelantar las labores de manejo ambiental y social.
- 4. Garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuesto en el PAGA.
- 5. Brindar capacitación e inducción ambiental a todos los trabajadores.
- 6. Garantizar la formulación y el cumplimiento de los programas de gestión social que conforman el PAGA.
- 7. Garantizar la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.
- 8. Garantizar que se mantenga la señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.
- 9. Presentar los informes establecidos, indicando el avance del cumplimiento de cada uno de los programas que conforman el PAGA, con los registros correspondientes, para aprobación de la Interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO

- 1. El Contratista todavía no ha entregado el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA a pesar del compromiso adquirido según acta de fecha 23 de Febrero; donde se acordó la entrega del documento con los respectivos ajustes solicitados por la interventoría.
- 2. La señalización de la vía se viene dando de acuerdo al avance de obra; pero la interventoría recomienda colocar los elementos de señalización en buen estado; ya que los utilizados presentan deformidades que en algunos casos no le permiten estar de pie; generando desinformación a los transeúntes en algunos tramos.
- 3. El Contratista realizó el inventario forestal con el fin de darle trámite a la obra; inclusive le solicito a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM, la visita para el permiso de Aprovechamiento Forestal
- 4. En la reunión de socialización del proyecto se le informo a la comunidad los cierres de la vía que se debían realizar en forma temporal; igualmente los horarios; estos cierres se proyectan realizar en tiempos cortos y en

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p align="center">LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	--	--

casos de necesidad se dejara pasar los vehículos del estado, ambulancias y vehículos y/o personal que estén cumpliendo misiones humanitarias como sepelios etc. Estos cierres se solicitaran a través de la Alcaldía Municipal de Suaza; pero en reunión con la Supervisora del Proyecto Doctora Beatriz Eugenia Luna Salguero Supervisora Contrato 1464 de 2022 Secretaria de Vías Infraestructura Gobernación del Huila. Se recomendó hacerlo también a través de la Gobernación del Huila.

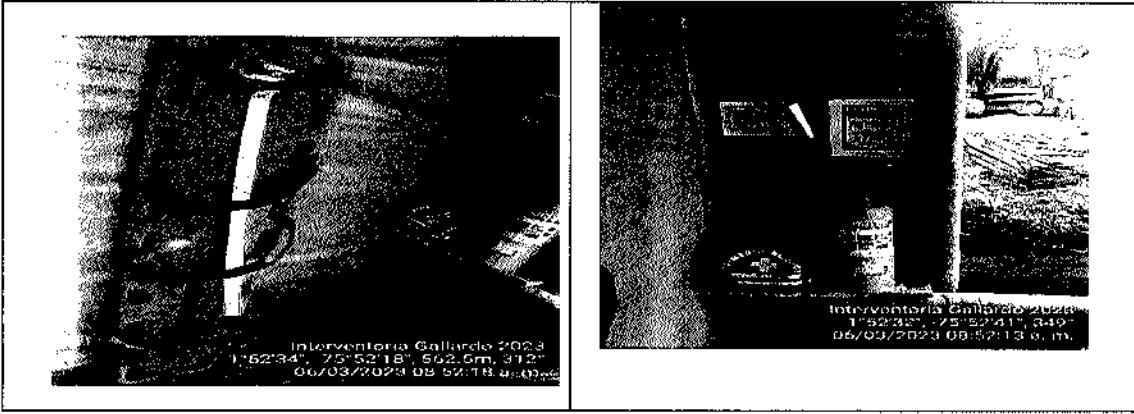
5. Igualmente El Contratista viene levantando Las Actas de Vecindad con la población acentuada al lado y lado de la vía; aunque ha habido algunas dificultades debido a la ausencia de algunas personas de sus viviendas, la Interventoría recomendó insistir en este proceso y hacerse acompañar de los presidentes de Junta de Acción Comunal.

6. El Contratista viene realizando conversaciones con la Empresa que maneja el Acueducto veredal con el fin de lograr que esta empresa les venda el agua para el proceso de preparación del concreto para la construcción de la obra.

7. La Unidad Sanitaria se proyecta instalar en el campamento y la hidratación se entrega en el momento de la realización de las charlas pre operacionales.

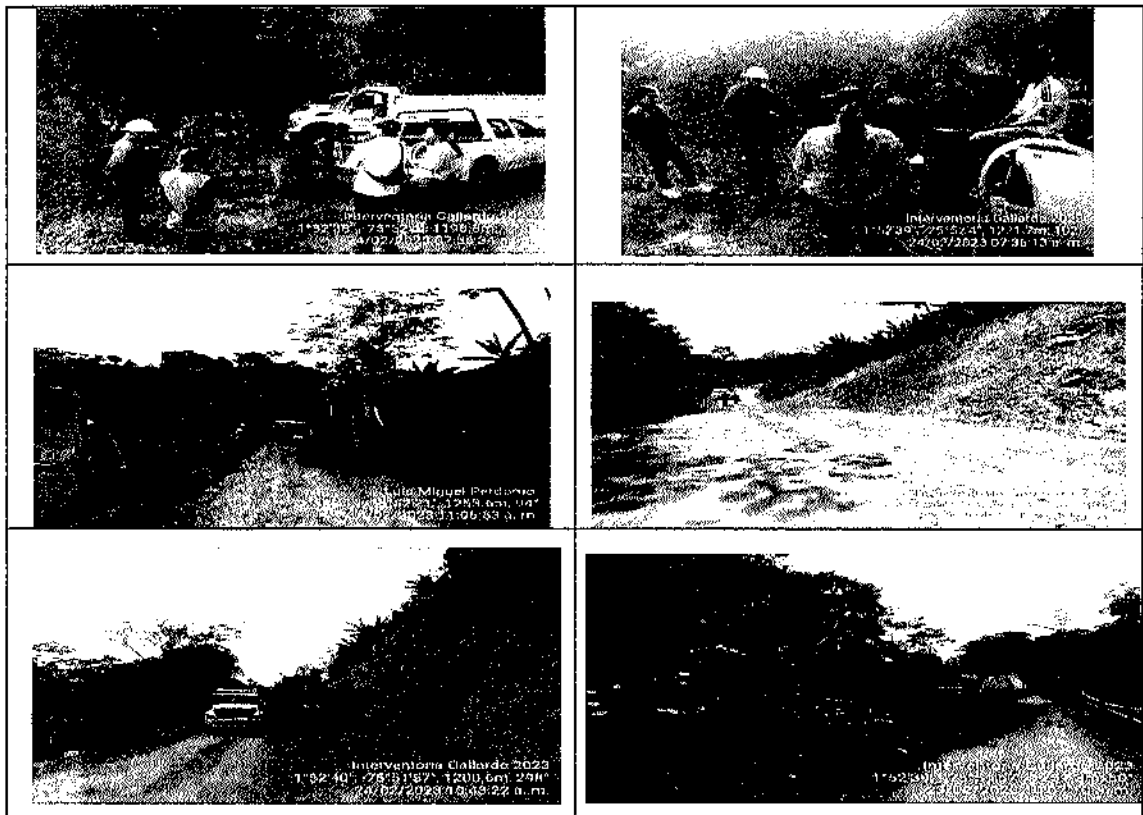
8. El Contratista a través de su profesional de apoyo viene dictando charlas relacionadas con el manejo y utilización de los Elementos de Protección Personal. E.P.P Y Seguridad en la Obra.

9. El Contratista ya tiene ubicado un sitio en el campamento con los elementos de emergencia y seguridad; su ubicación permite su utilización en forma rápida y oportuna; pero en el Punto Ecológico coloca una Imagen fotográfica de un punto ecológico ubicado en otro lugar



Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p>INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p>LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	---	--



PROYECTO 2: CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Planear estrategias para sensibilizar al personal sobre la importancia y manejo en los componentes socio ambiental, en el desarrollo de las actividades constructivas, mediante inducciones y capacitaciones.

ACCIONES A EJECUTAR

A través del profesional ambiental y Siso, la empresa deberá organizar y ejecutar capacitaciones a todo el personal vinculado al proyecto. El programa de capacitaciones se deberá realizar mensualmente de acuerdo

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO
LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO
INTERVENTORIA EXTERNA

Con el cronograma establecido; el Contratista aún no ha entregado el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental Paga, Pero viene realizando algunas capacitaciones que proyectan incluir en el documento.

Se deberá realizar inducciones y capacitaciones de manera cíclica, debido a la rotación del personal en las diferentes actividades durante el desarrollo de las obras; permitiendo al personal capacitado reforzar lo aprendido y para el personal recién ingresado, la adquisición de un nuevo conocimiento, cabe aclarar que las mismas están sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del proyecto y al contexto de la obra. La Interventoría recomienda la siguiente temática:

PROGRAMAS DE INDUCCION:

- ✓ Política y Objetivos del Sistema de Gestión.
- ✓ Uso adecuado EPP.
- ✓ Permisos de trabajo.
- ✓ Calificación de tareas de alto riesgo.
- ✓ Socialización del PAPSO.

El Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario Para la Obra. PAPSO. Todavía no ha iniciado su implementación.

PROGRAMAS DE CAPACITACIONES:

- ✓ Protección de flora y fauna.
- ✓ Manejo de materiales de construcción y concreto.
- ✓ Manejo integral de residuos.
- ✓ Manejo de señalización en vías en construcción.
- ✓ Cultura vial.
- ✓ Normatividad ambiental.
- ✓ Importancia de la biodiversidad.
- ✓ Manejo de conflictos y relaciones con la comunidad.

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO
LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO
INTERVENTORIA EXTERNA

1	Capacitación	MES I		MES II		MES III		MES IV		MES V		MES VI	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Protección de flora y fauna			X									
2	Manejo de materiales de construcción y concreto					X							
3	Manejo integral de residuos.					X							
4	Manejo de la señalización.	X	X										
5	Cultura vial			X									
6	Normatividad Ambiental			X									
7	Importancia de la biodiversidad.			X									
8	Manejo de conflictos y relaciones con la comunidad	X	X	X		X		X		X		X	

Convenciones: P: Programado E: Ejecutado

Observación: A la fecha se han realizado una (1) capacitación en la cual se abarco el tema de Capacitación en Seguridad Vial y manejo defensivo, Capacitación en controlador vial, Capacitación en actividades de alto riesgo, Uso adecuado de EPP, Manejo de herramienta, Manejo de Señalización y manejo de trafico

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO

Objetivo General: Formular las acciones a tomar por parte del representante legal, personal administrativo, operativo, contratista, proveedores de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo y todo aquel que intervenga en los proyectos de construcción para reducir el riesgo de exposición al SARS- COV-2 (COVID-19) Durante la emergencia Sanitaria.

Objetivos Específicos:

Definir lineamientos de Bioseguridad para prevenir, controlar y mitigar COVID-19.

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD



Gobernación del Huila


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

 INFORME MENSUAL
 No.1 FEBRERO

 LUIS MIGUEL PERDOMO
 VELASCO
 INTERVENTORIA EXTERNA

Asegurar la seguridad biológica de la población dentro de la obra, siempre y cuando este dentro de los riesgos grupales e individuales a intervenir por la empresa.

Implementar estrategias para controlar la exposición y expansión del virus dentro de los centros de trabajo, siempre y cuando se encuentren dentro de los riesgos grupales e individuales a intervenir en la empresa.

Garantizar los elementos de EPP suministrados por la empresa a los trabajadores.

Adoptar las medidas exigidas por la legislación nacional vigente ante la Pandemia del COVID-19.

Acciones comunes administrativas y operativas de prevención

Teniendo en cuenta que el COVID 19 es un evento endémico, de acuerdo a la evidencia científica, se logra mitigar la transmisión a través de medidas farmacológicas como la vacunación y nofarmacológicas (medidas de bioseguridad) las cuales deben asumirse como prácticas de autocuidado, por ello se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Se debe socializar el Papso con personal de la Interventoria, Contratista y de obra. Igualmente con representantes de la comunidad.
- Diariamente en la charla pre operacional se deberá reforzar la temática a los trabajadores y las recomendaciones propias del COVID- 19 Como uso del Tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos. Etc.
- Las charlas pre operacional y capacitaciones se deben hacer en horarios preestablecidos en un lugar con bastante ventilación, evitando aglomeraciones.
- El Vigía de seguridad o profesional SST, durante el día debe pasar por los frentes de trabajo para estar recordando a los trabajadores el uso de EPP y aseo de los mismos
- Se dispondrá de puntos de desinfección con Gel antibacterial, en áreas de uso común, oficinas y lugares de descanso o alimentación, que se consideren necesarios.

Observación: El Contratista no desea aplicar **El Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario Para la Obra. PAPSO**. La Interventoría está a la espera de la directriz que suministre la Gobernación del Huila.

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
 Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ASD

ENTIDAD  Gobernación del Huila	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 <i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA
--	--	---

MANEJO DE RESIDUOS

- Identificar los Residuos generados en el área de trabajo.
- Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto dela implementación de los Protocolos de Bioseguridad.
- Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos
- Los tapabocas y guantes deben ir separados en bolsas de color negro que no debe ser abiertos por el personal que realiza el reciclaje de oficio, además debe estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico, desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
- Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento
- Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos.

Observación: Estas actividades no se realizaron en el mes de Febrero debido a que la obra se encuentra en su fase inicial, esperamos que a partir del próximo informe ya tengamos avance en este componente que es tan importante para el desarrollo de la obra.

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales

OBJETIVO DEL PROYECTO

Realizar las actividades del alcance físico que obedezcan al amparo de los permisos que la entidad contratante en este caso la Gobernación del Huila continúe con el trámite, autorizaciones, licencias y concesiones por uso e intervención de recursos naturales que las autoridades ambientales de la jurisdicción emitan para cada caso.

ACCIONES A EJECUTAR

La empresa para la disposición final de los residuos de construcción demolición y sobrantes provee la utilización del sitito autorizado -ZODME
Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD



Gobernación del Huila

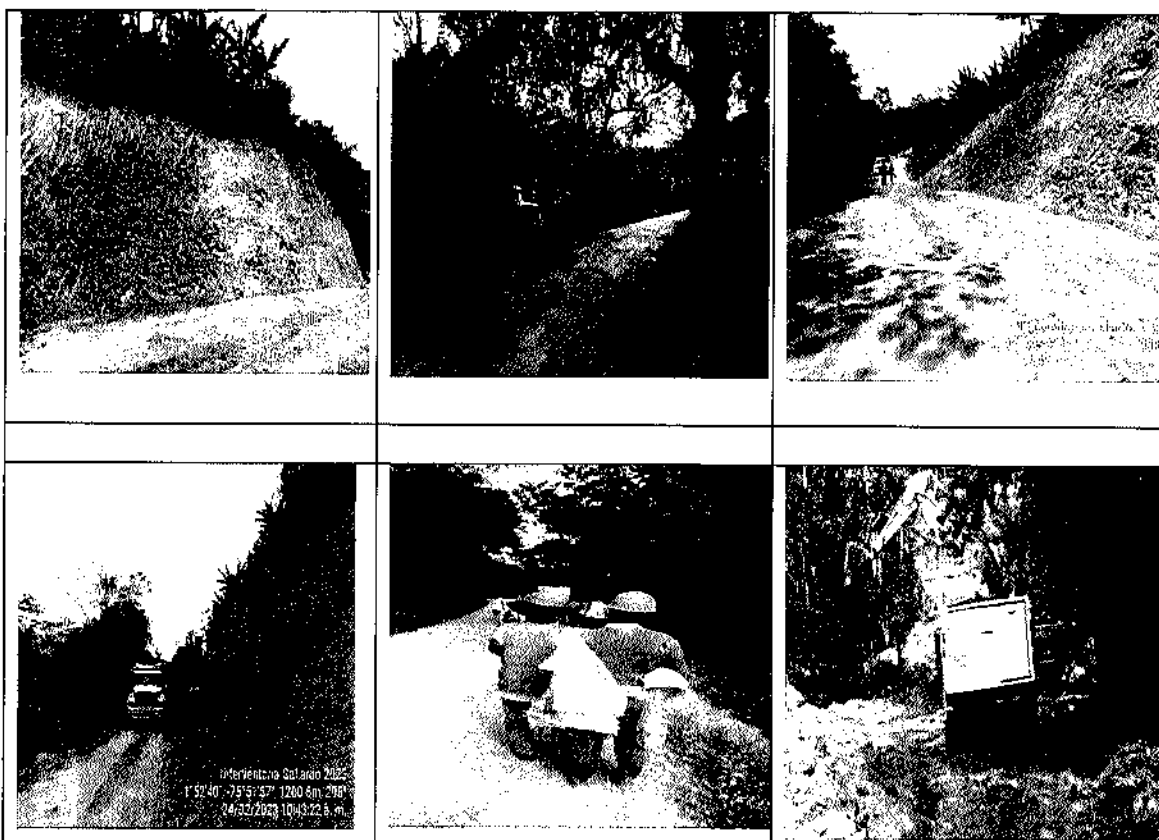

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO
LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO
INTERVENTORIA EXTERNA

ubicado en predios del municipio de SUAZA en coordenada Latitud 3.06569478° N y Longitud 7513295431° O.

El Contratista ya le solicito a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM. El permiso para el aprovechamiento Forestal de algunos árboles que se encuentran en el eje de trazado de la vía. Igualmente el permiso de Ocupación de Cauce.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD

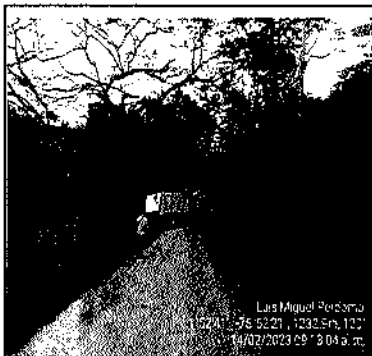


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
 No.1 FEBRERO

**LUIS MIGUEL PERDOMO
 VELASCO**
 INTERVENTORIA EXTERNA



LasMiguel Perdomo
 15240° -75°52'21" 1232.5m, 132°
 14/02/2023 09:50 a.m.



Interventoria Gallardo 2023
 1°52'40" -75°52'21" 1226.6m, 73°
 23/02/2023 06:22:27 a.m.



Interventoria Gallardo 2023
 1°52'40" -75°52'21" 1217.6m, 310°
 22/02/2023 09:07:18 a.m.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
 CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
 Celular: 3153635758- 3168641874
 Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD

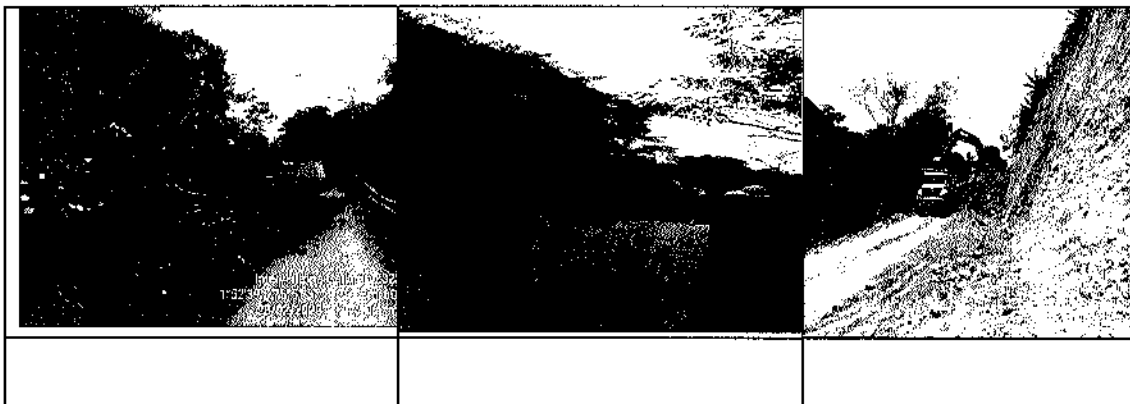


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 - 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

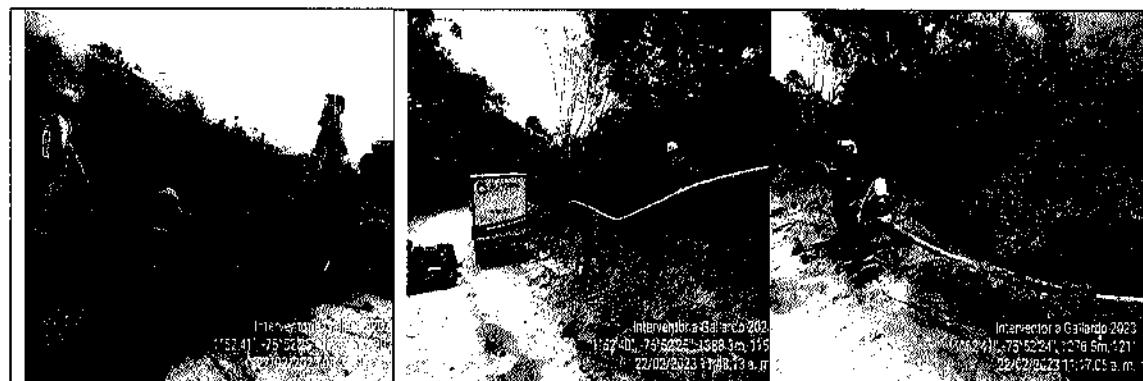
INFORME MENSUAL
 No.1 FEBRERO

LUIS MIGUEL PERDOMO
 VELASCO
 INTERVENTORIA EXTERNA



Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
 CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
 Celular: 3153635758- 3168641874
 Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p>INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p>LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	---	--



PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Proyecto 1: Manejo integral de materiales de construcción

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer medidas y acciones adecuadas en el manejo de materiales de construcción para la ejecución de las obras, con el fin de minimizar el impacto en los recursos naturales dentro del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

La empresa para el suministro de material pétreo contará con proveedores que cumplen con las exigencias normativas RUCOM para los materiales pétreos, inscripción Registro minero.

El Contratista presenta la caracterización del material granular (Base Granular y material seleccionado para mejoramiento), de una empresa con ubicación STOC PLANTA GUACANA, Pero no se relaciona con la documentación de las empresas que presentaron en el informe como empresas que proporcionaría el material de cantera (Masseq y Anunciación Trujillo Andrade)

Medidas de manejo de materiales: Los materiales pétreos, serán almacenados en forma de cono en el sitio destinado para acopio, los conos de material que por su granulometría emitan material articulado por efecto del viento, serán cubiertos con carpas o plástico.

El responsable profesional ambiental realizará inspecciones periódicas a los frentes de obra con el fin de revisar y verificar que el manejo de los materiales sea el adecuado.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p align="center">LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	--	--

Medidas para el transporte de materiales pétreos: Los vehículos de transporte deberán contar con volcó que contenga la carga depositada en ellos, de forma que evite derrames o pérdidas de material durante el transporte.

La Interventoría recomienda que: El material a transportar sea depositado en el vehículo de manera tal, que quede a ras del platón y cubierto con carpa en lona para evitar la emisión de material particulado. De esta manera se mitigarán impactos al aire, suelo, paisaje, las puertas de descargue deben permanecer cerradas y aseguradas durante el transporte.

Todo transporte de materiales sobre las vías se deberá realizar en vehículos aprobados para circular sobre las carreteras nacionales.

Observación: Las disposiciones finales de los residuos de excavaciones generados en la obra RCD, se están trasladando y descargando en predios privados de la zona, se le hizo la recomendación al Contratista para que presente a la Interventoría las respectivas solicitudes de los propietarios de los predios; debido a que la Gobernación presentó la opción de realizar la disposición final de los RCD en predios de particular previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Suaza; hasta el mes de Febrero el Contratista no presentó dicha autorización a la Interventoría.

Medidas para el cemento: La Interventoría recomienda que el cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben superar los siete metros (7) de altura. El personal no debe manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los EPP (de acuerdo con el panorama de riesgo), el contacto con estos puede generar daños en la piel o causar hemorragias e infecciones.

Medidas para varillas: Serán acopiados de forma ordenada y con alturas que no superen los 1.5 metros, debidamente señalizados.

Observación: Todavía no se han implementado estas medidas debido a que la obra apenas inicia la etapa de construcción, en este momento se está ejecutando la fase inicial de nivelación y cajeo de la vía.

Proyecto 2: Señalización frentes de obras y sitios temporales

OBJETIVO DEL PROYECTO

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

496

ENTIDAD



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO

**LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO**
INTERVENTORIA EXTERNA

Realizar una adecuada señalización de los frentes de obras para prevenir accidentes e informar del riesgo hacia terceros, usuarios y trabajadores del proyecto.

Estas medidas tienen como finalidad en el proceso de ejecución del proyecto y por ende de la obra, de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

Alcance: Establecer las medidas de seguridad que cumplan con las condiciones establecidas por el Ministerio de Transporte, Resolución 004100 de 2004, Resolución 004959 de Noviembre de 2006 y Resolución 0001885 de 2015 para la protección y seguridad vial, manejo y regulación del tránsito para garantizar la movilidad segura.

ACCIONES A EJECUTAR

La empresa deberá tener en cuenta e implementar la siguiente señalización para la ejecución de las actividades de obra:

Los sitios de intervención deberán estar demarcados y señalizados; se colocará avisos preventivos e informativos, los cuales serán localizados antes de llegar al área intervenida.

En caso de requerirse accesos temporales a viviendas o predios, estos estarán señalizados debidamente.

Observación: Esta actividad se viene realizando en el momento de cierre de la vía

En el sitio de acopio y AID, bodegas y/o oficinas y/o sitios de acopio de material e infraestructura se viene usando señales de seguridad industrial

En el sitio de cierres viales se usa señalización y personal que controle y supervise que se respete los cierres viales (Controladoras Viales). **Observación:** Esta actividad se viene realizando en forma permanente

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

157

ENTIDAD



Gobernación del Huila



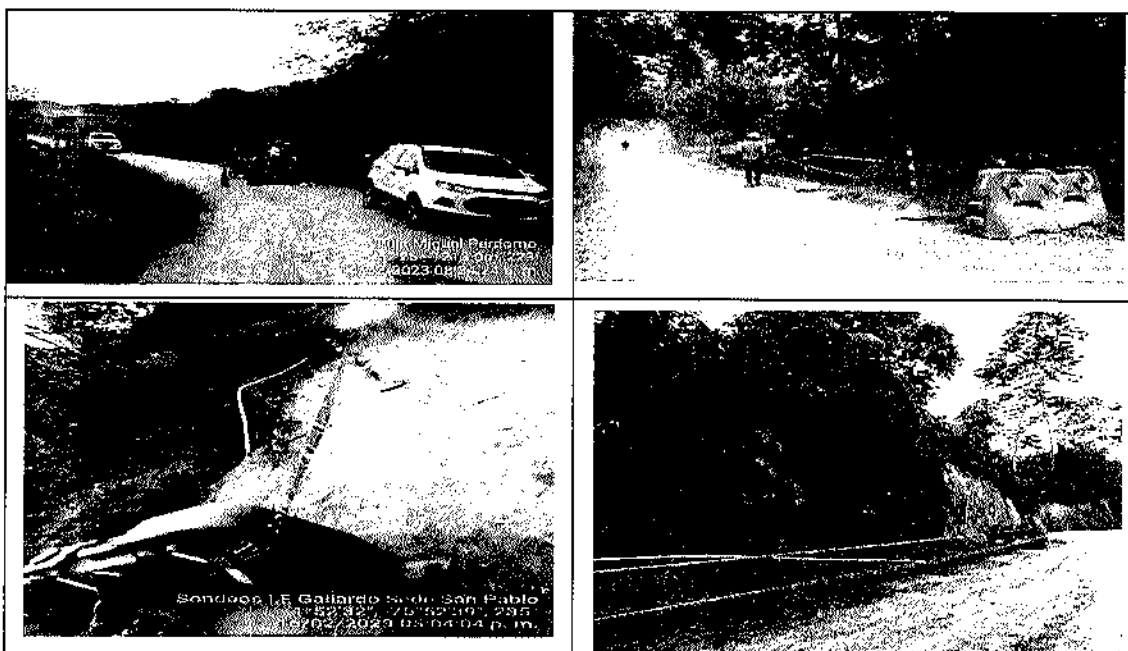
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 - 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO

**LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO**
INTERVENTORIA EXTERNA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD

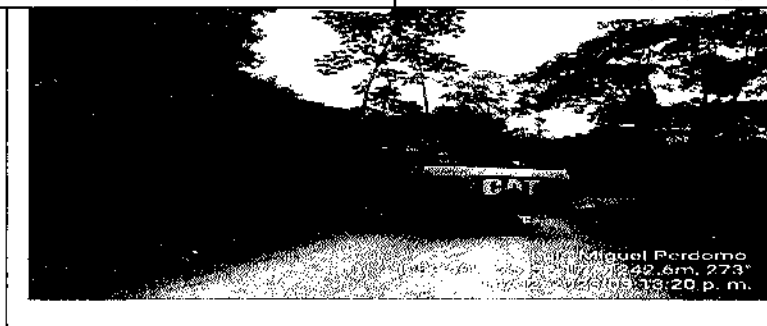


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO

LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
INTERVENTORIA EXTERNA



Proyecto 3: Manejo y disposición final de escombros

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer las medidas para el manejo de transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición RCD evitando todo daño o deterioro ambiental del área intervenida.

ACCIONES A EJECUTAR

La generación de posibles residuos como, escombros, materiales sobrantes de concreto y de derrumbes, que se encuentran previstos dentro de las actividades constructivas, se prevén entregarse en el sitio para disposición final de residuos de construcción demolición y sobrantes - ZODME el cual está ubicado en predios del municipio de SUAZA Latitud 3.06569478° N y Longitud 75.13295431°O . El cual no ha sido autorizado por el municipio de SUAZA mediante certificado.

Los escombros y materiales que se vayan generando en las actividades constructivas, serán acopiados temporalmente por el termino no superior a 60 horas en lugares donde evite la obstrucción de zonas vía, paso

**Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**

Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD  Gobernación del Huila	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 <i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA
--	--	---

de comunidad y alejados de fuentes hídricas, hasta contar con un volumen considerable para posterior transporte y disposición. Por las características de los escombros y gran tamaño de partículas las cuales no generaran material en suspensión en el aire, no se requiere cubrir dichos acopios temporales.

Transporte de los materiales, sobrantes de obra, excavaciones, derrumbes y escombros

En referencia a los residuos de construcción, materiales sobrantes y producto de las excavaciones de las obras, estos materiales una vez acumulados y acopiados dentro de las áreas. Se cargarán directamente a las volquetas y se deberán enviar al Zoodme.

En caso de que por indisponibilidad de volquetas o logística no se pueda transportar directamente hacia el ZODME, se realizara un acopio temporal en el campamento, para posterior traslado al sitio de disposición final.

Las volquetas que realizan esta actividad deben contar con los documentos requeridos como el SOAT y TECNOMECANICA

Observación: Se realiza la disposición final de los materiales sobrantes en predios particulares, los cuales surgen de excavaciones de cajeo y ampliación vial, con el debido cumplimiento de requisitos establecidos por la Interventoría para esta actividad.

Proyecto 4: Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer e implementar las medidas de manejo ambiental de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, garantizando la no afectación de las condiciones naturales de la zona de influencia del proyecto y que cumpla con la legislación ambiental vigente.

ACCIONES A EJECUTAR

- La primera medida a tomar será, la identificación y clasificación de los residuos sólidos como aprovechables, no aprovechables o desecho peligroso, según sus características, para continuar con las fases de reducción en la fuente, recolección, almacenamiento temporal y disposición final.
- El programa de manejo integral de residuos sólidos busca el principio de la reducción en la fuente, que consiste en abordar el problema desde el lugar de generación, minimizando la generación

**Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p>INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p>LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	---	--

de residuos sólidos, evitando el manejo innecesario de empaques, envases y embalajes durante el desarrollo de las actividades constructivas.

La Interventoría recomienda llevar a cabo un proceso de selección y separación en la fuente de residuos, utilizando canecas a modo de punto ecológico, identificando por colores según se requiera de acuerdo con la característica de los residuos generados, rotulados con el tipo de residuo a disponer (Empaques y envases (plástico), residuos aprovechables (papel, cartón), residuos peligrosos, residuos no aprovechables. Etc. Igualmente recomienda:

- ✓ En los frentes de obra, los residuos sólidos deben ser recolectados en bolsas plásticas de **color negro** para residuos no aprovechables, **blanco** para residuos aprovechables en proceso de reciclaje y **Roja** para residuos peligrosos, **no se usará recipiente de color verde** para residuos orgánicos aprovechables ya que no se contará con casino para elaboración de alimentos. Los residuos generados una vez recolectados serán llevados al sitio de almacenamiento hasta disponer de un volumen de recolección, para su posterior entrega y disposición final al gestor externo.
- ✓ Una vez recolectados los residuos; los residuos no aprovechables serán entregados para que se los lleve el vehículo encargado de la empresa de recolección del Municipio.
- ✓ En cuanto a los residuos peligrosos que se generen como bolsas de cemento se podrán organizar y entregar a la comunidad para reúso en actividades agrícolas o actividades del campo o reusar en otras obras para cubrimiento de regatas, reúsos como limpieza de baldes mezcladoras. Para el caso de envases contaminados con aceite o acpm y/o en su defecto proceder hacer el manejo indicado para este tipo de material.

PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO

Proyecto 1: Manejo de Aguas superficiales

OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar las medidas que prevengan, controlen y mitiguen los impactos generados por las Actividades constructivas de la obra a cuerpos de agua, infraestructura hidráulica, y uso del recurso hídrico, cumpliendo con la normatividad ambiental que aplica.

ACCIONES A EJECUTAR

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD  	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 <i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA
---	--	---

- ✓ Divulgación a los trabajadores del Plan de adaptación de la Guía Ambiental y programa de Gestión del Recurso hídrico.
- ✓ Capacitación a los trabajadores sobre la importancia del recurso hídrico y su protección
- ✓ Capacitación a los trabajadores sobre fenómenos naturales (inundaciones, avalanchas, movimientos telúricos, incendios forestales y tormentas eléctricas y Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias).
- ✓ La interventoría propone los siguientes temas; pero está a la espera del envío del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental Paga, para definir la temática final.



1	Capacitación	MES I		MES II		MES III		MES IV		MES V		MES VI	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Socialización del PAGA												
2	Gestión del Recurso Hídrico												
3	Manejo integral de residuos a partir de las 5 R's (Reducir, reciclar, reutilizar, reparar y recuperar) .Ahorro y uso eficiente de agua- .Protección de fuentes hídricas. .El reciclaje, su importancia y métodos de reciclaje. .Protección de la Fauna y Flora												
4	Gestión Social. .Valores Humanos y Trabajo en equipo .Normas de Convivencia Sociales en las obras .Comunicación Asertiva .Relaciones con la comunidad .Manejo de Estrés												

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 N0. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
 Celular: **3153635758- 3168641874**
 Correo Electrónico: **gallardosuaza2022@hotmail.com**

ENTIDAD  Gobernación del Huila	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022 <i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>	INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA
--	--	---

Capacitación en Seguridad Vial y manejo defensivo																				
-Capacitación en controlador vial																				
-Capacitación en actividades de alto riesgo																				
-Uso adecuado de EPP																				
-Manejo de herramienta																				
-Manejo de Señalización y manejo de tráfico																				

Convenciones: P: Programado E: Ejecutado

PROGRAMA 4. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Ejecutar las medidas de manejo que permitan minimizar los impactos ambientales generados por la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de sitios de acopio temporal.

ACCIONES A EJECUTAR

- ✓ La empresa establecerá un sitio de acopio temporal, donde se almacenará los materiales a utilizar en el proyecto, este lugar se adecuará fuera de la ronda de cuerpos de agua.
- ✓ Durante la ejecución se contará con personal para realizar actividades de orden y aseo, se contará con puntos ecológicos y de acopio para el almacenamiento de residuos generados en los frentes de obra, además de la señalización respectiva.
- ✓ Se dotará con todos los elementos para la atención de emergencia, tales como extintores, camilla, botiquín.

Observación: Los elementos de atención de emergencia y punto ecológico ya fueron ubicados en el lugar de acopio de materiales, por parte del contratista.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA

Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

<div>ENTIDAD</div> <div> Gobernación del Huila</div>	<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</div> <div><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></div>	<div>INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</div> <div>LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</div>
---	--	--

Proyecto 2: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

OBJETIVO DEL PROYECTO

Ejecutar las acciones que permitan controlar los impactos ambientales generados por lasmaquinarias, equipos y vehículos durante el proyecto

ACCIONES A EJECUTAR

Se establecerán revisiones y mantenimiento preventivo de cada equipo, ya que esto depende de las condiciones actuales de cada uno; sin embargo, se llevarán a cabo las actividades de cambio de aceite, filtros y mangueras.

Cuando exista algún tipo de derrame de material durante el cargue o descargue, se procederá a barrer todas las áreas afectadas.

Se evitarán derrames de hidrocarburos y combustibles al suelo y/o a fuentes de agua cercanas. Los vehículos destinados al transporte de material serán acampados con el fin de evitar arrastre de partículas por acción del viento.

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: **3153635758- 3168641874**
Correo Electrónico: **gallardosuaza2022@hotmail.com**

Abt

ENTIDAD

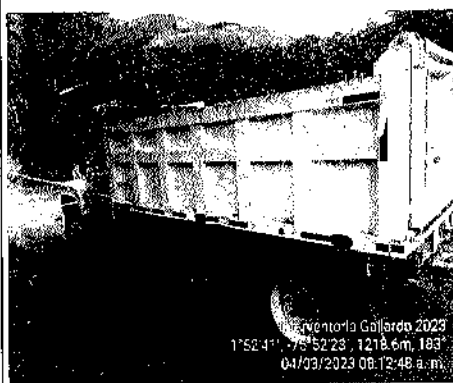


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO

**LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO**
INTERVENTORIA EXTERNA



PROGRAMA 5. GESTIÓN SOCIAL

Proyecto 1: Atención a la comunidad

OBJETIVO DEL PROYECTO

Atender oportunamente las situaciones que se generen la comunidad del área de influencia. Garantizar los medios físicos y electrónicos para la atención de la comunidad del área de influenciadel proyecto

ACCIONES A EJECUTAR

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA- CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**

Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

463

<p>ENTIDAD</p>  <p>Gobernación del Huila</p>	<p align="center">CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p align="center">INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p align="center">LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	--	--

- ✓ Se implementará un sistema para la recepción, el seguimiento y el cierre de las peticiones y solicitudes que se presenten, en la zona se contará con un espacio temporal y personal para la atención a la comunidad.
- ✓ La recepción de peticiones, quejas y reclamos se registrará por cualquier medio (físico, electrónico, telefónico) de atención al usuario. La atención de usuario contemplará un horario de atención de 8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 4:00 pm de lunes a viernes, sábado de 8:00 am a 11:30 am.

26

Sistema de Atención al Usuario, Recepción, Registro, Respuesta y Seguimiento a la petición.

- ✓ Buscando responder de la manera más cercana y oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se implementará el siguiente sistema de atención al usuario que comprende:
- ✓ La recepción de PQR'S se lleva a cabo a través de diferentes medios de atención implementados: Medio Físico: 1 sitio de atención al usuario o por medios electrónicos: Correo electrónico y Líneas telefónicas, medio por el cual se atiende y recepciona PQRS., las cuales serán recepcionadas y se llevara registro para el debido control, se registrará en la Gestión documental de la empresa para tramite de la respuesta., seguimiento y cierre de la PQRS.

Observación: A la fecha el personal del contratista no ha compartido esa información con el personal de la interventoría, sin embargo, la comunidad de la zona, tiene conocimiento de donde está ubicada su oficina para atender esos asuntos.

Proyecto 2: Manejo de la infraestructura de predios

OBJETIVO DEL PROYECTO

Prevenir y atender los eventuales conflictos que se originen por efecto de la obra.
 Registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, previo al inicio de las actividades constructivas.

ACCIONES A EJECUTAR

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022**
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBREROLUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO
INTERVENTORIA EXTERNA**Levantamiento de Actas de Vecindad**

Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles de cercas vivas, cultivos, vallados, mangueras de conducción del servicio de agua de la comunidad en zonas rurales y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

Observación: La Profesional Social del Contratista viene visitándolas viviendas ubicadas al lado y lado de las vía donde se está ejecutando el proyecto; ha tenido dificultad porque algunas viviendas permanecen solas, se le ha solicitado a la profesional por parte de la Interventoría que se haga acompañar del presidente de la Junta de Acción Comunal, para el respectivo avalúo del estado de la vivienda.

Veedurías: El Contratista ya conforme la veeduría y procedió hacer su respectivo registro ante la Personería del Municipio de Suaza, (Resolución No.004 del 8 de Febrero de 2023). La Interventoría recomendó para la próxima reunión programada el día 16 de Marzo de 2023, invitar a las personas integrantes de la Veeduría para la respectiva capacitación de funciones como veedores y llegar a acuerdos sobre temas relacionados con la ejecución del proyecto; igualmente recomienda que los Veedores deben presentar un informe a partir del mes de Marzo sobre la ejecución de la obra y acuerdos establecidos en cada uno de los comité que se deberán realizar una vez al mes.

Proyecto 3: Contratación de Mano de Obra**OBJETIVO DEL PROYECTO**

Establecer procedimiento para la vinculación de personal para las obras que se ejecutaran en el tramo vial. Para la ejecución de este programa se han establecido las siguientes actividades:

OBSERVACION: El contratista viene contratando el personal de mano de obra no calificado, a personas que viven en el Centro Poblado de Gallardo; esto con el fin de contribuir a disminuir el desempleo en la zona y a fortalecer el desarrollo económico de la región.

Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-
CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

ENTIDAD


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 4SHL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME MENSUAL
No.1 FEBRERO
LUIS MIGUEL PERDOMO
VELASCO
INTERVENTORIA EXTERNA
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SUAZA

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	ARL	EPS	AFP
LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO	12.284.240	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
JAIR QUIROGA PENAGOS	12.193.311	POSITIVA.	SANITAS	PORVENIR
FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	1007.605.211	POSITIVA.	SANITAS	PORVENIR
CARLOS HERRAN TRUJILLO	12.197.309	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
RUBEN JOVEN PEÑA	83.252.214	POSITIVA.	ASMETSALUD	PORVENIR
LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	1.075.265.99 4	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
EDWINARLEY TOLEDO PAIBA	83.182.410	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
SEBASTIAN POLO GOMEZ	1.077.873.98 8	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
SEBASTIAN CLAROS	1.077.866.25 7	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
LEONARDO PEÑALOSA RAMIREZ	1.077.859.43 2	POSITIVA.	NUEVA EPS	PORVENIR
NATALIA ALEJANDRA DUARTE	1.004.158.51 4	POSITIVA.	NUEVA EPS	PROTECCION
LEONILDE DORADO	36288084	POSITIVA.	NUEVA EPS	COLPENSIONES
DUNKAN VERGARA	1.077.869.63 4	POSITIVA.	SANITAS	PORVENIR

Recommendations:

La Interventoría Solicitar al Contratista nuevamente el envío de la siguiente Información:

- ✓ Documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental Paga. Incluyendo Presupuesto y Cronograma de Capacitaciones Ambientales, Sociales, SST y PMT
- ✓ Iniciar con la Ejecución del Plan de aplicación del Protocolo Sanitario para la obra PAPSO; una vez se determine por parte de la Supervisión su implementación.
- ✓ Terminar de completar las visitas de para diligenciar las Actas de vecindad


Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**

Celular: 3153635758- 3168641874

Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

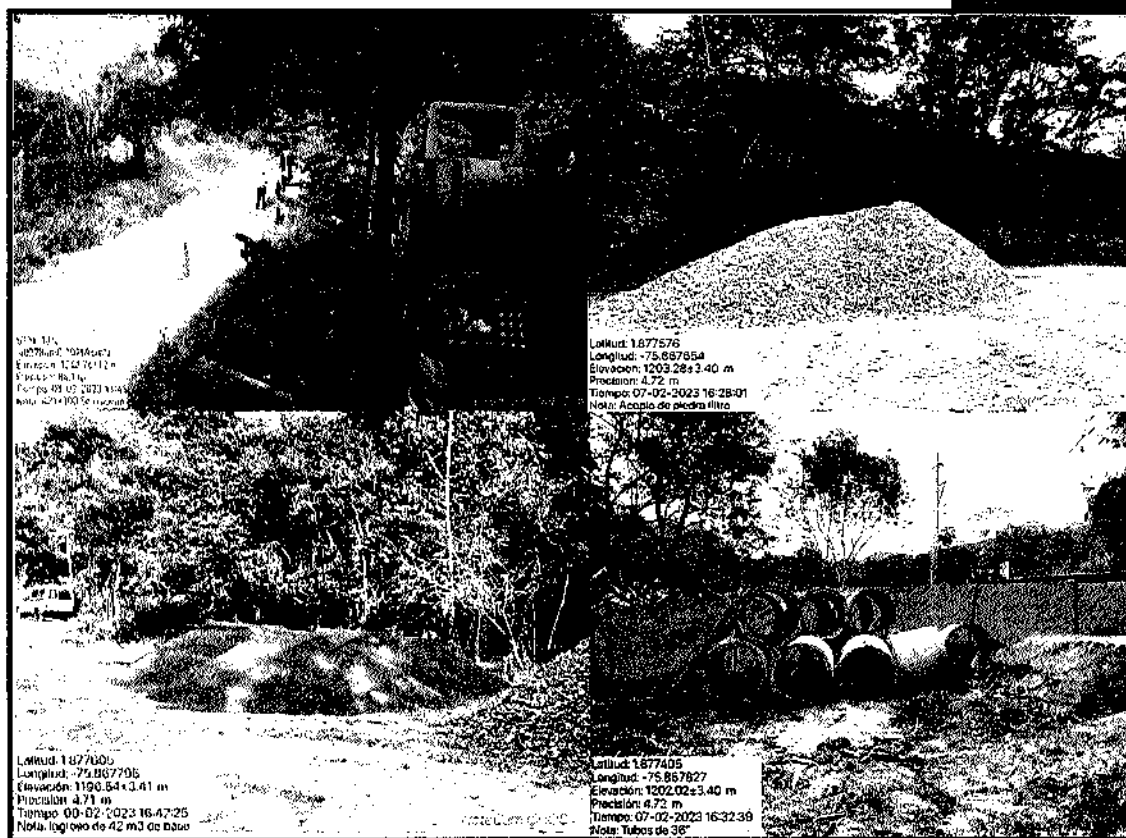
<p>ENTIDAD</p> <div></div> <p>Gobernación del Huila</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 – 2022 CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022</p> <p><i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA</i></p>	<p>INFORME MENSUAL No.1 FEBRERO</p> <p>LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO INTERVENTORIA EXTERNA</p>
--	--	--

- ✓ Invitar a la Veeduría a la reunión programada para el 16 de Marzo de 2023. Con el fin de capacitarlos en los Deberes y derechos como Veedores; igualmente invitarlos a presentar en forma mensual un informe sobre avance de la obra y actividades relacionada con su labor de Veeduria.



Dirección: **OFICINA PRINCIPAL. CALLE 9 NO. 5-50 OF: 201. NEIVA HUILA-CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 EDIFICIO DIEGO DE OSPINA. NEIVA HUILA**
Celular: 3153635758- 3168641874
Correo Electrónico: gallardosuaza2022@hotmail.com

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 01 **CONTRATO DE OBRA No 1354 DE 2022**



CONTRATISTA

FERNANDO JIMENEZ ROA



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 01 CONTRATO No 1354 DE 2022

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:
1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

**MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la
CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO
DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO
POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL
MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

**CONTRATISTA:
FERNANDO JIMENEZ ROA**

**INTERVENTORÍA:
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN**



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 01

CONTRATO No 1354 DE 2022

DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL No. 1
ELABORADO POR:	Nombre: ING. FERNANDO JIMÉNEZ ROA Director de obra - Contratista
	Firma 
REVISADO POR:	Nombre: Ing. LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO Contratista - Interventoría
	Firma 
FECHA	Marzo de 2023



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1 OBJETIVO GENERAL	7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3. PRELIMINARES	8
3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	8
3.2 LOCALIZACIÓN DEL TRAMO A INTERVENIR	9
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	9
4.1 DATOS GENERALES	10
4.2 ESTADO DE POLIZAS	11
4.3 BALANCE PRESUPUESTAL	11
5. CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS	12
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS	14
6.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES	15
6.2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	15
6.3 TRANSPORTE	16
6.3.4 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36",L=1M. ESP. 661-13 INV.	16
7. EQUIPO MINIMO REQUERIDO EN EL PROYECTO	17
7.1 EQUIPO DE OBRA REQUERIDO EN EL PROYECTO:	17
7.2 EQUIPO DE OBRA UTILIZADO EN ESTE PERIODO:	17
8. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	18
8.1 PERSONAL REQUERIDO EN EL PROYECTO:	18
8.2 PERSONAL UTILIZADO EN ESTE PERIODO:	18



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1 : Localización general del Proyecto.....</i>	<i>8</i>
<i>Ilustración 2: Localización del Tramo 1.5 Km.....</i>	<i>9</i>

ANEXOS

- INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL
- IFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- PROGRAMACIÓN DE OBRA
- FLUJO DE CAJA SEMANAL
- ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO
- CONFORMACIÓN DE VEEDURIA
- POLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZADAS
- CARACTERIZACION DE MATERIALES GRANULARES



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS


-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

1. INTRODUCCIÓN

En el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE". previsto para el periodo 2020-2023, adoptado mediante la Ordenanza No. 020 del 2020, Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento del Huila, se estableció dentro del Sector TRANSPORTE. el Programa HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías a cargo del departamento en la conservación, rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios y la integración de nuestra región, fomentando el turismo y el agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vías.

Que la vía que del centro poblado de Gallardo hacia el cruce ruta .20A. identificada con código 45HL 10 Timana-Gallardo- Cruce ruta 20A. que hace parte de la red vial de tercer orden a cargo del Departamento, será objeto de intervención y que se encuentra actualmente en malas condiciones debido al deterioro producido por el desgaste por uso y tiempo en la vía que del centro poblado de Gallardo hacia el cruce ruta 20A del Departamento del Huila.

Con base en lo anterior. se requiere la intervención de la vía que del centro poblado de gallardo hacia el cruce ruta 20A. identificada con código 45HL1 O Timana-Gallardo- Cruce ruta 20A. que hace parte de la red vial de tercer orden a cargo del Departamento, mediante el mejoramiento con la construcción de 1.5 km de pavimento rígido, lo cual, permitirá disminuir el tiempo y los costos en los desplazamientos para los usuarios de la vía y habitantes del sector. así como un beneficio en la movilidad y conectividad de vías necesarias para dinamizar el comercio. el desarrollo del turismo y la economía en este sector siendo esta vía una de las arterias que surte a la capital huilense de los productos agrícolas que se cosechan en esta zona. por lo que el impacto positivo se sentirá en varios sectores.



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- ✓ Evidenciar el cumplimiento de labores realizadas en el periodo correspondiente 01 al 28 febrero de 2023, en cuanto el componente técnico y socio-ambiental del Contrato No. 1354 de 2022; MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Plasmar las actividades ejecutadas en el presente periodo, referentes a la pavimentación en concreto rígido de los 1.5 km de la vía Gallardo-Cruce Acevedo.
- ✓ Efectuar el monitoreo y seguimiento a los componentes ambientales del proyecto.
- ✓ Reportar las actividades realizadas para la implementación del PAGA y sus correspondientes fichas de manejo ambiental, cuantificando los avances del Sistema de Gestión Socio - Ambiental.



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

3. PRELIMINARES

3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El tramo a intervenir, corresponde a los primeros 1.5 Km de la vía que identificada con código 45HL10, que del Centro Poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A, en el municipio de suaza.

El Municipio de Suaza se encuentra situado al suroriente del Departamento del Huila, en la región central del Valle del río Suaza. Posee una superficie total de 336 km², se encuentra bordeado en la margen occidental por la serranía de la Ceja, en la oriental por las estribaciones de la Cordillera Oriental o corredor transamazónico. Su altitud es de 990 m.s.n.m. en el casco urbano y su Localización geodésica es 1° 59' latitud norte y 75° 48' longitud oeste. Cuenta con una población de 21.119 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.

Esta vía hace parte de la mailla vial departamental de Huila y conforma una de las vías terciarias de la región. Actualmente este tramo se encuentra sin estructura de pavimento, con un ancho de banca que oscila entre 4.5 m y 6.0m.

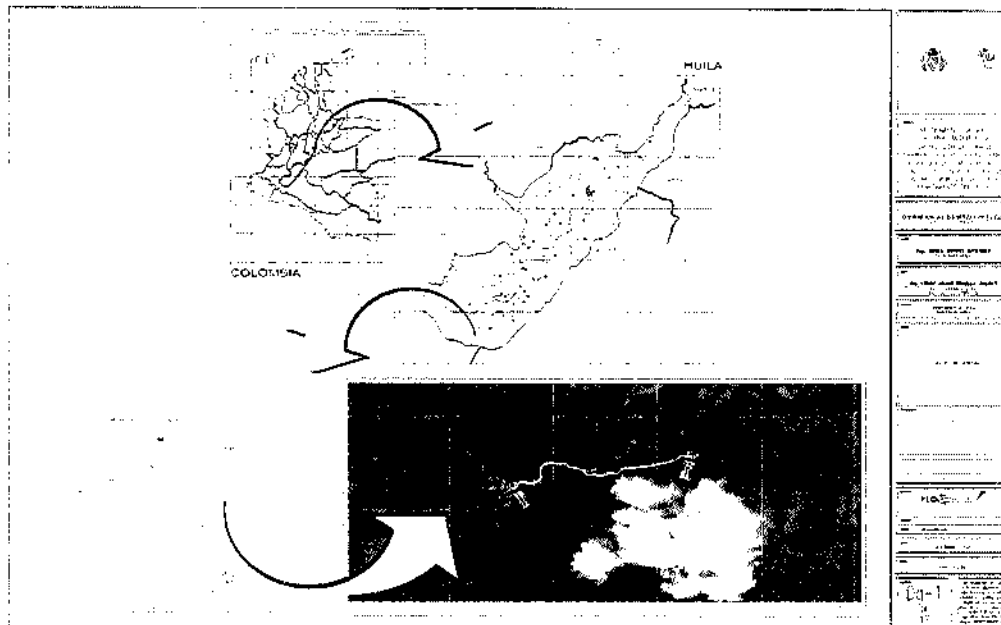



Ilustración 1 : Localización general del Proyecto
Fuente: Documentos técnicos del proyecto



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultaría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

3.2 LOCALIZACIÓN DEL TRAMO A INTERVENIR.

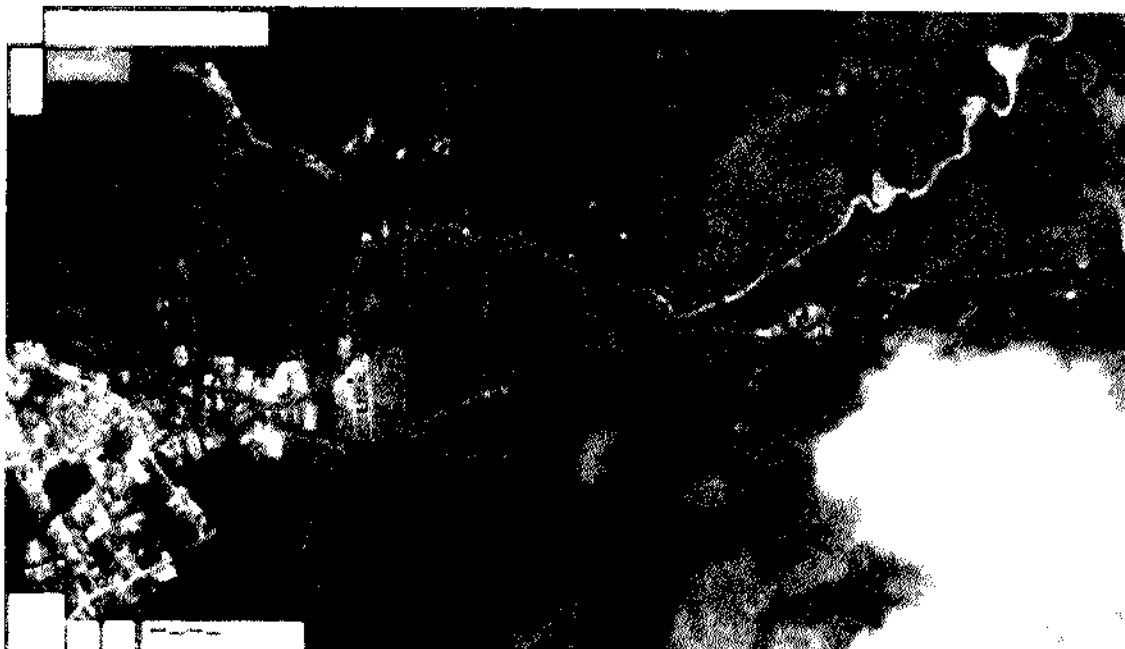


Ilustración 2: Localización del Tramo 1.5 Km

DESCRIPCION (TRAMO)	Punto	Abscisa	Coordenada	
			E:	N:
1 Inicia en Gallardo hacia cruce Ruta 20A, longitud 1.5 km.	Inicio	K20+620	1133611.48	699299.39
	Final	K22+120	1134858.24	699464.79

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El proyecto de "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila", tiene como propósito mejorar las condiciones de movilidad vehicular de carga y pasajeros en la vía que comunica el centro poblado de Gallardo hacia el cruce Ruta 20A; y con ello, incrementar la calidad de vida de la población, dando cumplimiento igualmente a los programas de rehabilitación de la infraestructura vial tanto del Departamento del Huila, como del municipio de



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

Suaza, garantizando la conectividad entre los territorios, incentivando el turismo, fomentando el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y la integración de la región.

4.1 DATOS GENERALES

CLASE DE ACTA:	FINAL: ____ PARCIAL: ____ INFORME MENSUAL: <u>X</u> No.: 01				
<u>X</u> CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1354	AÑO:	2022
__ CONVENIO DE:					
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA — SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	FERNANDO JIMENEZ ROA			
	NIT O CC:	12.192.340			
	DIRECCIÓN:	Carrera 7 No. 9-47 Casa 1, Provivienda	TEL:	3202317459	
	CIUDAD:	Garzón, Huila			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 11422 FECHA: 07 de junio de 2022				
VALOR CONTRATO:	\$ 3.450.118.172,00 Valor en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETANTA Y DOS PESOS M/CTE				
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
FECHA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DE 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2023				



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS


-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

4.2 ESTADO DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA				
TIPO Y NUMERO DE POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 560-47-994000156756	Cumplimiento del Contrato	28/10/2022	7/09/2023	\$ 690.023.634,40
	Anticipo	28/10/2022	7/09/2023	\$ 1.035.035.452,00
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	28/10/2022	8/07/2026	\$ 345.011.817,00
	Estabilidad de la Obra	5 años contados a partir de la fecha de recibo de las obras		\$ 690.023.634,40
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 560-74-994000028832	Responsabilidad Civil Extracontractual (Predios, labores y operaciones)	28/10/2022	30/05/2023	\$ 400.000.000,00

4.3 BALANCE PRESUPUESTAL

BALANCE CONTRATO			
V/R INICIAL CONTRATO:	\$ 3.450.118.172,00	VALOR ANTICIPO:	\$ 1.035.035.451,60
ACTA MODIFICACIONES	\$ 0,00	% PORCENTAJE EJECUTADO:	
V/R TOTAL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES):	\$ 0,00		
ACTAS DE OBRA TRAMITADAS	FECHA	VALOR	VALOR POR COBRAR
NINGUNA A LA FECHA	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL FACTURADO		\$ 0,00	\$ 0,00



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

5. CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS.

El siguiente es el resumen general de las cantidades de obra contratadas inicialmente para el contrato de obra:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES					
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	m	1.500,00	\$ 4.299,00	\$ 6.448.500,00
Subtotal					\$ 6.448.500,00
2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2	EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	10.217,40	\$ 15.000,00	\$ 153.261.000,00
3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (NO INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)	m3	90,00	\$ 28.418,00	\$ 2.557.620,00
4	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	746,00	\$ 61.000,00	\$ 45.506.000,00
Subtotal					\$ 201.324.620,00
3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
5	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	9.600,00	\$ 1.200,00	\$ 11.520.000,00
6	PAVIMENTO RIGIDO MR-40, ESPESOR (0,20) M, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,20 M, CURADO CON ANTISOL (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	1.884,00	\$ 840.476,00	\$ 1.583.456.784,00
7	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR ESP. 330-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	1.503,00	\$ 144.444,00	\$ 217.099.332,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'c=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE BORDILLO. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m	3.000,00	\$ 95.572,00	\$ 286.716.000,00
Subtotal					\$ 2.098.792.116,00



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

481

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					
4. TRANSPORTE					
9	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3-Km	67.427,04	\$ 1.000,00	\$ 67.427.040,00
10	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (CONCRETOS). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3-Km	267.425,60	\$ 1.000,00	\$ 267.425.600,00
11	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y/O GRANULARES (MEJORAMIENTO Y/O SUBBASE Y/O BASE Y/O ASFALTO). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3-Km	320.697,83	\$ 1.000,00	\$ 320.697.830,00
Subtotal					\$ 655.550.470,00
5. OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS: ALCANTARILLAS (9)					
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F'C=140 KGF/CM2). PARA OBRAS DE ARTE. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	20,00	\$ 582.124,00	\$ 11.642.480,00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F'C=210 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE ENCOLES, DESCOLES, PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS Y BORDILLO. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	74,00	\$ 699.920,00	\$ 51.794.080,00
14	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36", L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	63,00	\$ 505.402,00	\$ 31.840.326,00
15	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM ² (60.000 PSI) ESP.640-13 INV. PARA ALCANTARILLA	Kg	11.544,00	\$ 8.000,00	\$ 92.352.000,00
16	EXCAVACIÓN MECÁNICA NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	m3	577,00	\$ 15.000,00	\$ 8.655.000,00
17	TERRAPLEN / MEJORAMIENTO CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220.1-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	296,00	\$ 61.000,00	\$ 18.056.000,00
18	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	432,00	\$ 268.534,00	\$ 116.006.688,00
19	DEMOLICION DE CONCRETOS DE EXISTENTES, INCLUYE RETIRO.	m3	66,00	\$ 200.000,00	\$ 13.200.000,00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE C- (F'C=280 KGF/CM2). PARA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT. (NO INCLUYE TRANSPORTE).	m3	93,00	\$ 755.796,00	\$ 70.289.028,00
Subtotal					\$ 413.835.602,00
6. SEÑALIZACIÓN					
21	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO. ESP. 700-13 INV.	m	4.500,00	\$ 2.115,00	\$ 9.517.500,00



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					
22	TACHAS REFLECTIVAS 701-13 INV.	Unidad	564,00	\$ 8.236,00	\$ 4.645.104,00
Subtotal					\$ 14.162.604,00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 390.113.912,00
(PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL) PAGA					\$ 20.605.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)					\$ 27.522.180,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA - PAPSO					\$ 11.877.080,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$ 60.004.260,00
VALOR TOTAL					\$ 3.450.118.172,00

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante la socialización del contrato, el secretario de planeación y alcalde municipal de Suaza, exponen ante los asistentes a la reunión, que antes de iniciar los trabajos en la vía, es necesario instalar la red de alcantarillado y reestructurar la red de acueducto de los primeros trescientos 300 metros del tramo a intervenir; debido a que actualmente las viviendas depositan las aguas residuales en los predios aledaños y otros a un costado de la vía.

Por lo anterior, se establece junto con la interventoría iniciar los trabajos de la vía en la abscisa K21+120, correspondiente a quinientos 500 metros más delante de la abscisa inicial (K20+620), mientras la alcaldía municipal adelanta los respectivos tramites administrativos, para la ejecución de los trabajos, y así no afectar la ejecución del contrato.

A la fecha del presente informe, no se evidencia actividad alguna por parte de la administración municipal en el tramo anteriormente mencionado.

Por otra parte, durante la localización y replanteo de la vía, se pudo evidenciar que, existe una red principal de gasoducto de la empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P -SURGAS. Firma, que fue informada mediante comunicado CTO-1354/2022-EXT-001, acerca de los trabajos a ejecutar en este corredor vial y la necesidad de reubicar aproximadamente 1,5 Km de la línea principal de Gas entre el Centro Poblado de Gallardo y el Cruce de Acevedo; debido a que la tubería que



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultaría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

actualmente surte a este corregimiento, se encuentra ubicada superficialmente dentro de la franja de ampliación de la vía; lo que pondría en riesgo la integridad de la misma, durante las labores de excavación y/o ampliación de la misma.

A continuación, se relacionan por capítulos las principales actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

6.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

6.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

- Se realiza calibración de equipos de topografía
- Chequeo de mojones y ubicación de deltas
- Localización, replanteo y ajuste del eje de la vía en los sitios críticos; además de la toma de topografía inicial.
- Se realiza chaflanado entre las abscisas K21+120 al K22+120.

6.2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

6.2.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.

- Se avanza con la ampliación de la vía en los tramos:
 - ✓ K21+100 al K21+430
 - ✓ K21+700 al K21+930.
- Cajeo de la vía
 - ✓ K21+160 al K21+175.
- Excavación y extracción de la tubería de gas en los tramos:
 - ✓ K21+260 al K21+350
 - ✓ K21+420 al K21+520
 - ✓ K21+100 al K21+151.



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

6.3 TRANSPORTE

6.3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

- Se avanza con el transporte de material proveniente de la ampliación de la vía entre las siguientes abscisas:
 - ✓ K21+100 al K21+430
 - ✓ K21+700 al K21+930.
- Se avanza con el transporte de material proveniente del cajeo de la vía entre las siguientes abscisas:
 - ✓ K21+160 al K21+175.

6.3.2 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (CONCRETOS). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

- En el presente periodo se avanza con el transporte y acopio en campamento de 56 m3 de arena para elaboración de concretos.

6.3.3 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS Y/O GRANULARES (MEJORAMIENTO Y/O SUBBASE Y/O BASE Y/O ASFALTO). PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

- En el presente periodo se avanza con el transporte y acopio de 308 m3 de Subbase granular en campamento.
- Se avanza con el transporte y acopio de 206 m3 de material filtrante para Stock en campamento.
- Se avanza con el transporte y acopio de 896 m3 de material seleccionado para terraplenes y/o mejoramientos.

6.3.4 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=36",L=1M. ESP. 661-13 INV.



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

- Hasta la fecha se avanza con el transporte y acopio en campamento 23 Tubos de concreto reforzado, tipo Invias de D:36".

7. EQUIPO MINIMO REQUERIDO EN EL PROYECTO


7.1 EQUIPO DE OBRA REQUERIDO EN EL PROYECTO:

EQUIPO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
Volqueta	3	Requerido en obra
Retrocargador	1	Requerido en obra
Excavadora sobre oruga	1	Requerido en obra
Motoniveladora	1	Requerido en obra
Vibrocompactador	1	Requerido en obra
Carrotanque	1	Requerido en obra
Compactador manual saltarín	1	Requerido en obra
Compresor con martillo	1	Requerido en obra
Cargador	1	Requerido en obra
Cortadora de pavimento	1	Requerido en obra
Rodillo tambor liso	1	Requerido en obra
Rodillo vibrante	1	Requerido en obra
Camioneta	1	Requerido en obra
Vehículo delineador/Demarcador	1	Requerido en obra

7.2 EQUIPO DE OBRA UTILIZADO EN ESTE PERIODO:

Durante los trabajos ejecutados en el periodo se cuenta con la siguiente maquinaria:

EQUIPO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
Volqueta	3	Tiempo Completo
Retrocargador	1	Tiempo completo
Vibrocompactador	1	Tiempo Completo
Carrotanque	1	Tiempo Completo



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

EQUIPO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
Excavadora sobre oruga	2	Tiempo Completo
Camioneta	1	Tiempo Completo

8. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

8.1 PERSONAL REQUERIDO EN EL PROYECTO:

CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
Director de Obra	1	100%
Residente de Obra	1	100%
Especialista en Pavimentos	1	100%
Especialista en vías	1	100%
Ingeniero industrial (SISOMA)	1	100%
Inspector de obra	1	100%
Topógrafo	1	100%
Cadenero	1	100%
Especialista en gerencia de proyectos	1	100%

8.2 PERSONAL UTILIZADO EN ESTE PERIODO:

Se verifica que el contratista cumpla con el personal propuesto para la obra de acuerdo a los términos de referencia. Y a continuación se resume el personal presente en la obra durante la ejecución de la obra.


CARGO	CANTIDAD	NOMBRE
Director de Obra	1	FERNANDO JIMENEZ ROA
Residente de Obra	1	LEONARDO A. RUIZ MALDONADO
Especialista en Pavimentos	1	EDINSON LEONARDO OVIEDO MONTES
Especialista en vías	1	EDISON MORA MOTA
Ingeniero industrial (SISOMA)	1	JUAN CARLOS CABALLERO ANDRADE
Inspector de obra	1	FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ
Topógrafo	1	JAIRO QUIROGA PENAGOS



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE
Cadenero	1	CARLOS JAVIER HERRAN TRUJILLO
Especialista en gerencia de proyectos	1	EDER SAMIR ALDANA BARCINILLA



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



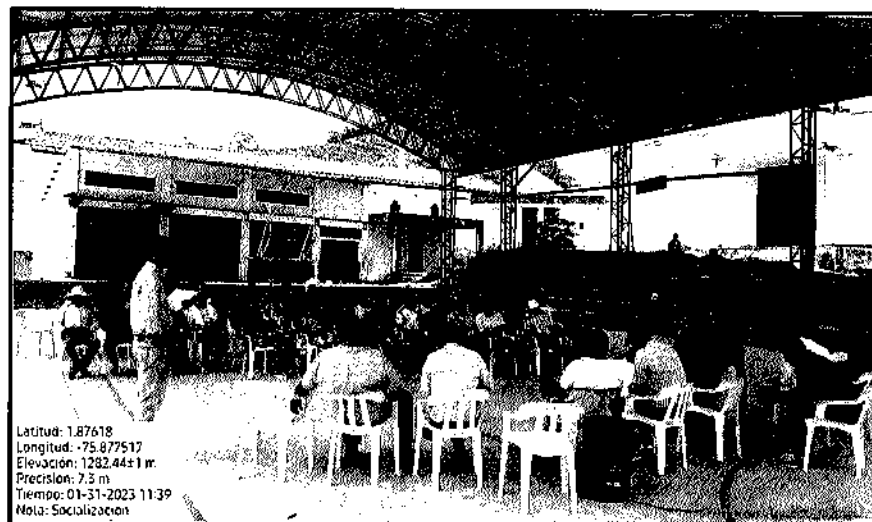
FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Socialización del Proyecto



Socialización del Proyecto

OFICINA PRINCIPAL: CARRERA 7 No. 9-47 CASA 1 GARZON HUILA TEL:8332529
email: fernandojimenezroa1@gmail.com



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Construcción de campamento en obra K21+820



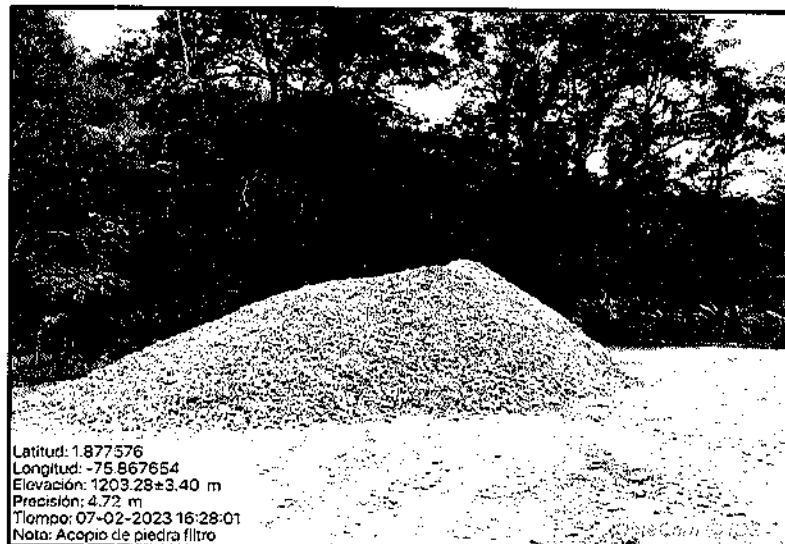
Acopio de Arena en Campamento



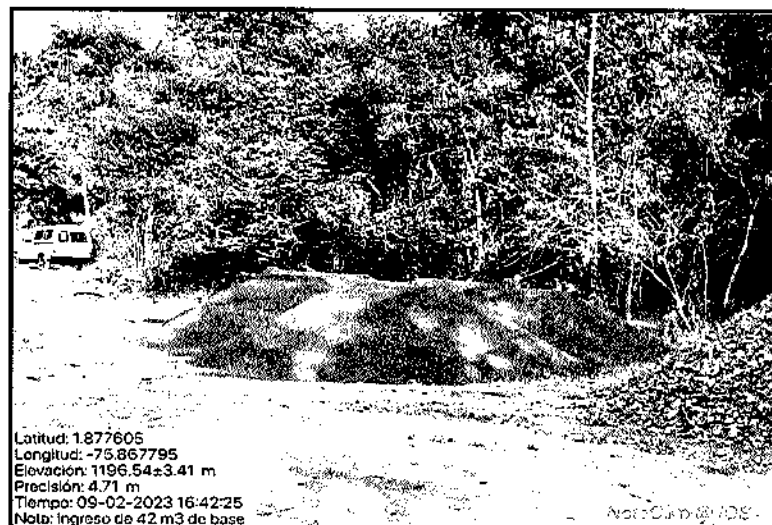
FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Acopio de Material filtrante en Campamento



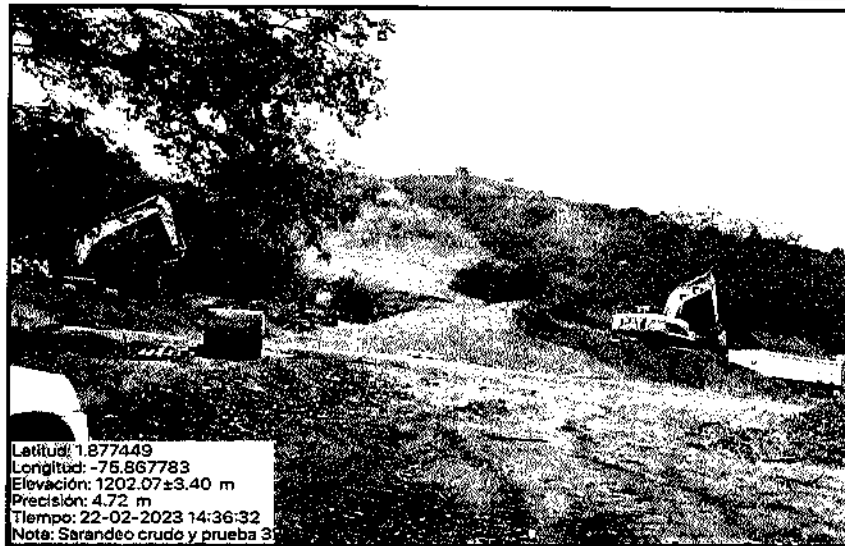
Acopio de Base Granular en Campamento



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultaría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de Pavimento Rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Acopio de Material seleccionado para mejoramiento/rellenos en Campamento



Acopio de Tubería de concreto reforzado de 36"



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Localización y replanteo de la vía



Avance Localización y replanteo de la vía

OFICINA PRINCIPAL: CARRERA 7 No. 9-47 CASA 1 GARZON HUILA TEL: 8332529
email: fernandojimenezroa1@gmail.com



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Chaflanado de la vía



Chaflanado de la vía



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Cajero de Vía



Cajero y ampliación de Vía

OFICINA PRINCIPAL: CARRERA 7 No. 9-47 CASA 1 GARZON HUILA TEL:8332529
email: fernandojimenezroa@gmail.com



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Excavación y retiro de manguera principal del Gas



Excavación y retiro de manguera principal del Gas



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Excavación y/o ampliación de la vía



Excavación y/o ampliación de la vía

OFICINA PRINCIPAL: CARRERA 7 No. 9-47 CASA 1 GARZON HUILA TEL: 8332529
email: fernandojimenezroa1@gmail.com



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de Pavimento Rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Avance en excavación y/o ampliación de la vía



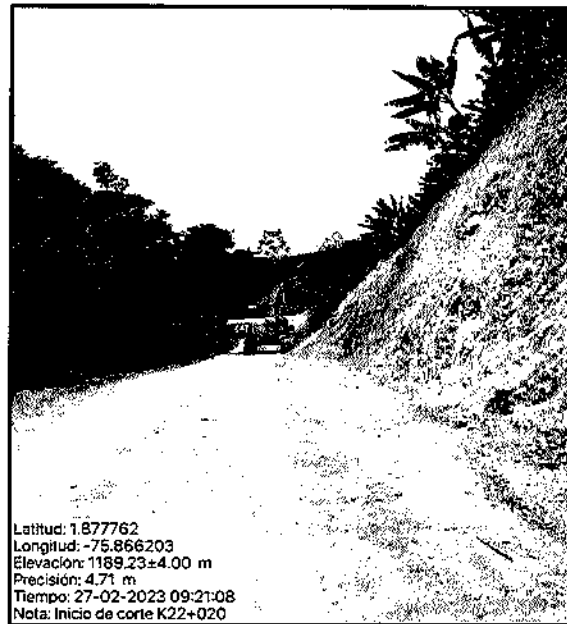
Avance en excavación y/o ampliación de la vía



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	INFORME MENSUAL No.1
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila.
CONTRATISTA:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CONTRATO DE OBRA No.	1354 DE 2022



Avance en ampliación de la vía



Avance en ampliación de la vía



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultaría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO

INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 1 de 27

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de la vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20 A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila

CONTRATO 1354 DE 2022

INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA EXTERNA 1364 DE 2022

**GALLARDO, SUAZA
FEBRERO 2023**

502

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 2 de 27


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
ALCANCE.....	6
1. OBJETIVO.....	7
1.1. Objetivo General.....	7
1.2. Objetivos Específicos.....	7
2. GESTIÓN AMBIENTAL.....	8
2.1. PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.....	8
2.1.1. Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental.....	8
2.1.2. Proyecto 2. Capacitación ambiental al personal de obra.....	9
2.1.3. Proyecto 3. Cumplimiento de los requerimientos legales.....	11
2.2. PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.....	12
2.2.1. Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.....	12
2.2.2. Proyecto 2. Explotación fuentes de materiales.....	14
2.2.3. Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales.....	14
2.2.4. Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros.....	16
2.2.5. Proyecto 5. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.....	17
2.3. PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO.....	18
2.3.1. Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales.....	18
2.4. PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICO.....	19
2.4.1. Proyecto 1. Manejo De Descapote Y Cobertura Vegetal.....	19
2.4.2. Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.....	19
2.4.3. Proyecto 3. Protección de fauna.....	20
2.4.4. PROYECTO 4. Protección de ecosistemas sensibles.....	20
2.5. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES.....	21
2.5.1. Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.....	21
2.5.2. Proyecto 3. Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos.....	21
2.6. PROGRAMA 6. GESTION SOCIAL.....	22
2.6.1. Proyecto 1. Atención a la comunidad.....	22
2.6.2. Proyecto 2. Información y divulgación.....	23
2.6.3. Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos.....	24
2.6.4. Proyecto 6 Contratación de mano de obra.....	26

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 3 de 27

Tablas

Tabla 1. Grupo Gestión Ambiental.....	8
Tabla 2. Indicador Conformación del equipo de trabajo y cumplimiento de informes	9
Tabla 3. Indicador Capacitaciones Ambientales	10
Tabla 4. Gestión Ambiental	12
Tabla 5. Indicadores de cumplimiento permisos ambientales	12
Tabla 6. Materiales de construcción requeridos por el proyecto	12
Tabla 7. Indicadores manejo integral de materiales de construcción	14
Tabla 8. Indicadores de cumplimiento para el proyecto señalización	16
Tabla 9. Indicadores de cumplimiento para el manejo de residuos sólidos.	17
Tabla 10. Indicadores de cumplimiento proyecto manejo de aguas superficiales	18
Tabla 11. Indicadores de cumplimiento del proyecto manejo de descapote y cobertura vegetal.	19
Tabla 12. Indicador de recuperación de áreas afectadas.....	20
Tabla 13. Indicador de cumplimiento del proyecto protección de fauna	20
Tabla 14. Indicador de instalación y desmantelamiento de áreas.	21
Tabla 15. Indicadores Atención a la comunidad	23
Tabla 16. indicadores información y divulgación	23
Tabla 17. Indicadores Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos	25
Tabla 18. Indicadores Contratación de mano de obra.....	27

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 4 de 27

ANEXOS

Anexo 1. Charla- Capacitación

Anexo 2. Permisos ambientales/ Tramites

Anexo 3. Documentación legal de canteras

Anexo 4. Actas de vecindad

505

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL		Fecha:	28-02-2023
			No. Informe:	01
			Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
			Página:	Página 5 de 27

INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Huila por medio de la secretaria de Vías e infraestructura ha emprendido la labor de mejorar la malla vial Departamental en aras de mejorar así la movilidad de tránsito existente, determina la ejecución de construcción de pavimento rígido en vía del centro poblado de Gallardo en el municipio de Suaza.

FERNANDO JIMENEZ ROA, responsable de la ejecución de las obras de este contrato y como conocedor de la importancia de la aplicación de buenas prácticas de ingeniería acorde con la protección del medio ambiente se encuentra en la tarea de la elaboración del documento para el proyecto con base al "Programa de adaptación a las guías Ambientales – PAGA" el cual se convertirá en una herramienta importante en el contexto del desarrollo sostenible de los proyectos lineales de infraestructura vial.

Conforme a lo anterior, el presente PAGA, propone una serie de programas y acciones a seguir puesto que con la ejecución de las actividades de obra existe la probabilidad de presentarse alteraciones sobre los componentes y elementos ambientales; es por ello que se formulan acciones puntuales a seguir para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos generados a partir de la ejecución del proyecto y así poder garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del mismo.

El presente informe mensual da cumplimiento a lo establecido en los lineamientos socioambientales del proyecto, siendo así este el informe de la Gestión No. 1 el cual corresponde al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023.


Es así como en el presente informe, se recopilan todas y cada una de las actividades realizadas desde el área ambiental del Proyecto, que se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental V.0.1, todos encaminados a la protección del ambiente y la comunidad adyacente al proyecto.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 6 de 27

ALCANCE

El presente informe, corresponde al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023, en el cual se consolidan las acciones desarrolladas en el marco de ejecución del proyecto.

El PAGA tiene como finalidad la gestión oportuna de permisos o autorizaciones, a partir de estudios y soportes técnicos necesarios, para uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades competentes. La identificación de impactos ambientales y sociales con el fin de establecer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar dichos impactos, a partir de los programas según la Guía Ambiental, y el establecimiento de indicadores de gestión y seguimiento ambiental.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 7 de 27


1. OBJETIVO

1.1. Objetivo General

Presentar el avance en la ejecución de los programas y proyectos formulados en el documento PAGA según las condiciones particulares del contrato N.º 1354 de 2022, efectuando seguimiento de las actividades del periodo comprendido entre 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto en cuanto a los componentes ambientales.

1.2. Objetivos Específicos

- Implementar los programas y proyectos estipulados en la guía ambiental para el proyecto vial.
- Seguimiento a cada uno de los proyectos presentes en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 8 de 27

2. GESTIÓN AMBIENTAL

2.1. PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

2.1.1. Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental

Teniendo en cuenta que durante el presente periodo se dio inicio al proyecto en gestión, FERNANDO JIMENEZ ROA cuenta con el grupo de gestión Socio-ambiental encargados de implementar los programas y proyectos orientados al cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones establecidas para el manejo socioambiental, donde se pretende implementar las acciones de protección necesarias para el desarrollo de las obras, para prevenir y evitar impactos que degraden su calidad y usos futuros, y no afectar los derechos de las siguientes generaciones.

Entre las actividades desarrolladas en el mes estuvieron:

- Verificación e implementación de medidas de manejo ambiental en los frentes de obra habilitados e intervenidos.
- Verificación de señalización en sitios intervenidos
- Gestión y seguimiento de trámites ante la Corporación Ambiental competente, autoridades municipales referente a la solicitud de permisos ambientales.
- Ejecución de actividades correctivas y de mejora para los programas ambientales.

Tabla 1. Grupo Gestión Ambiental

NOMBRE	CARGO
FERNANDO JIMENEZ ROA	DIRECTOR DE OBRA
LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO	RESIDENTE DE OBRA
JUAN CARLOS CABALLERO	SISOMA
LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	ING. AMBIENTAL-SST

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 9 de 27

Tabla 2. Indicador Conformación del equipo de trabajo y cumplimiento de informes

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{N^{\circ} \text{ profesionales contratados}}{N^{\circ} \text{ profesionales propuestos}} \cdot 100$	4/4 * 100	100%	Se cuenta con los profesionales del grupo de gestión ambiental
$\frac{N^{\circ} \text{ Informes presentados}}{N^{\circ} \text{ Informes contractuales}} \cdot 100$	1/1 * 100	100%	Para el período se presenta el denominado Informe Mensual No. 1 referente al mes de FEBRERO DE 2023, siendo este el primer informe de avance del proyecto.
$\frac{N^{\circ} \text{ de Vs de PAGA aprobados}}{N^{\circ} \text{ de Vs de PAGA presentados}} \cdot 100$	0/0 * 100	0%	No se ha realizado entrega de documento PAGA

2.1.2. Proyecto 2. Capacitación ambiental al personal de obra


Durante este periodo se realizó una (1) capacitación ambiental durante la jornada laboral del día jueves 24 de febrero de 2023 en sitio de acopio de materiales, donde se abordó temas de importancia respecto a "importancia de aseo y limpieza en obra" además durante la jornada de capacitación se abordaron temas SST correspondiente a "Uso adecuado de EPP" teniendo en cuenta los riesgos asociados a las actividades de corte de talud y se llevó a cabo la entrega de hidratación al personal operativo para la jornada laboral. (Ver anexo 1. Capacitación).

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 10 de 27



Tabla 3. Indicador Capacitaciones Ambientales

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº de trabajadores capacitados}}{\text{Nº de total de trabajadores del proyecto}} \cdot 100$	11/14 * 100	78.57%	Se realizó capacitación y charla preoperacional al personal vinculado al contrato; durante la jornada laboral del día 24 de febrero de 2023; teniendo en cuenta la ausencia de personal durante esta jornada de capacitación que por el desarrollo de sus funciones se encuentran fuera de obra no estuvieron durante dicha jornada se concluye que se logró abordar un total de 11 trabajadores.
$\frac{\text{Nº de capacitaciones realizadas}}{\text{Nº de capacitaciones programadas}} \cdot 100$	1/1 * 100	100%	Las capacitaciones buscan sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental del área de influencia del proyecto.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 11 de 27

2.1.3. Proyecto 3. Cumplimiento de los requerimientos legales

A la fecha, el proyecto se encuentra realizando los trámites correspondientes para la obtención de los permisos ambientales antes la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en Dirección Territorial Norte como se describe a continuación:

- El día 02 de febrero de 2023 mediante radicado 20233300023562 se inició trámite para Solicitud de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos para construcción de box Culvert con la solicitud de liquidación por servicios de evaluación, La Corporación mediante comunicado con Rad. 20233300031541 el día 20 de febrero de 2023 emite respuesta con los costos a cancelar por servicios de evaluación, posteriormente el día 21 de febrero de 2023 se realiza cancelación de dichos costos y se realiza solicitud mediante oficio CTO-1354/2022-EXT-003 y Rad. 20233300039602. Seguidamente la Corporación emite AUTO DE INICIO DE TRAMITE No. 10 el día 22 de febrero de 2023, para lo cual se está a la espera de la programación de la visita de acuerdo al cronograma de la Corporación. **(Ver anexo 2. Permisos ambientales).**
- El día 16 de febrero de 2023 luego haber realizado recorrido a la vía a intervenir y determinar las especies arbóreas que se afectarían con la ampliación de la vía se realizó la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal de 2,07 m², mediante oficio CTO-1354/2022-EXT-002 y Rad. 20233300036102 del 16 de febrero de 2023 ante la corporación **(Ver anexo 2. Permisos ambientales).**
- Se recibió solicitud para la disposición de residuos de demolición y construcción por parte de propietario de predio ubicado en vereda Guayabal del municipio de Suaza **(Ver anexo 2. Permisos ambientales)**, para lo cual se realizará gestión con Planeación municipal de Suaza de certificación y autorización debida.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 12 de 27

Tabla 4. Gestión Ambiental

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. DE PERMISO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	MEDIDA COMPENSATORIA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Ocupación de cauces	En trámite		CAM			En espera de respuesta de la Corporación Ambiental
Aprovechamiento Forestal	En trámite		CAM			En espera de respuesta de la Corporación Ambiental
Disposición de material de construcción y demolición	En trámite		Administración municipal/ Propietario del predio			Se cuenta con la solicitud y autorización del propietario del predio, se realiza la gestión con administración municipal

Tabla 5. Indicadores de cumplimiento permisos ambientales

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº de permisos obtenidos}}{\text{Nº de permisos requeridos}} \cdot 100$	0/3 * 100	0%	En trámite
$\frac{\text{Nº de requerimientos resueltos}}{\text{Nº de requerimientos generados}} \cdot 100$	0/0 * 100	0%	No hubo requerimientos respecto a permisos ambientales del proyecto durante este período.

2.2. PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

2.2.1. Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción

Para el proyecto se cuenta con los siguientes proveedores para el manejo de materiales de construcción.

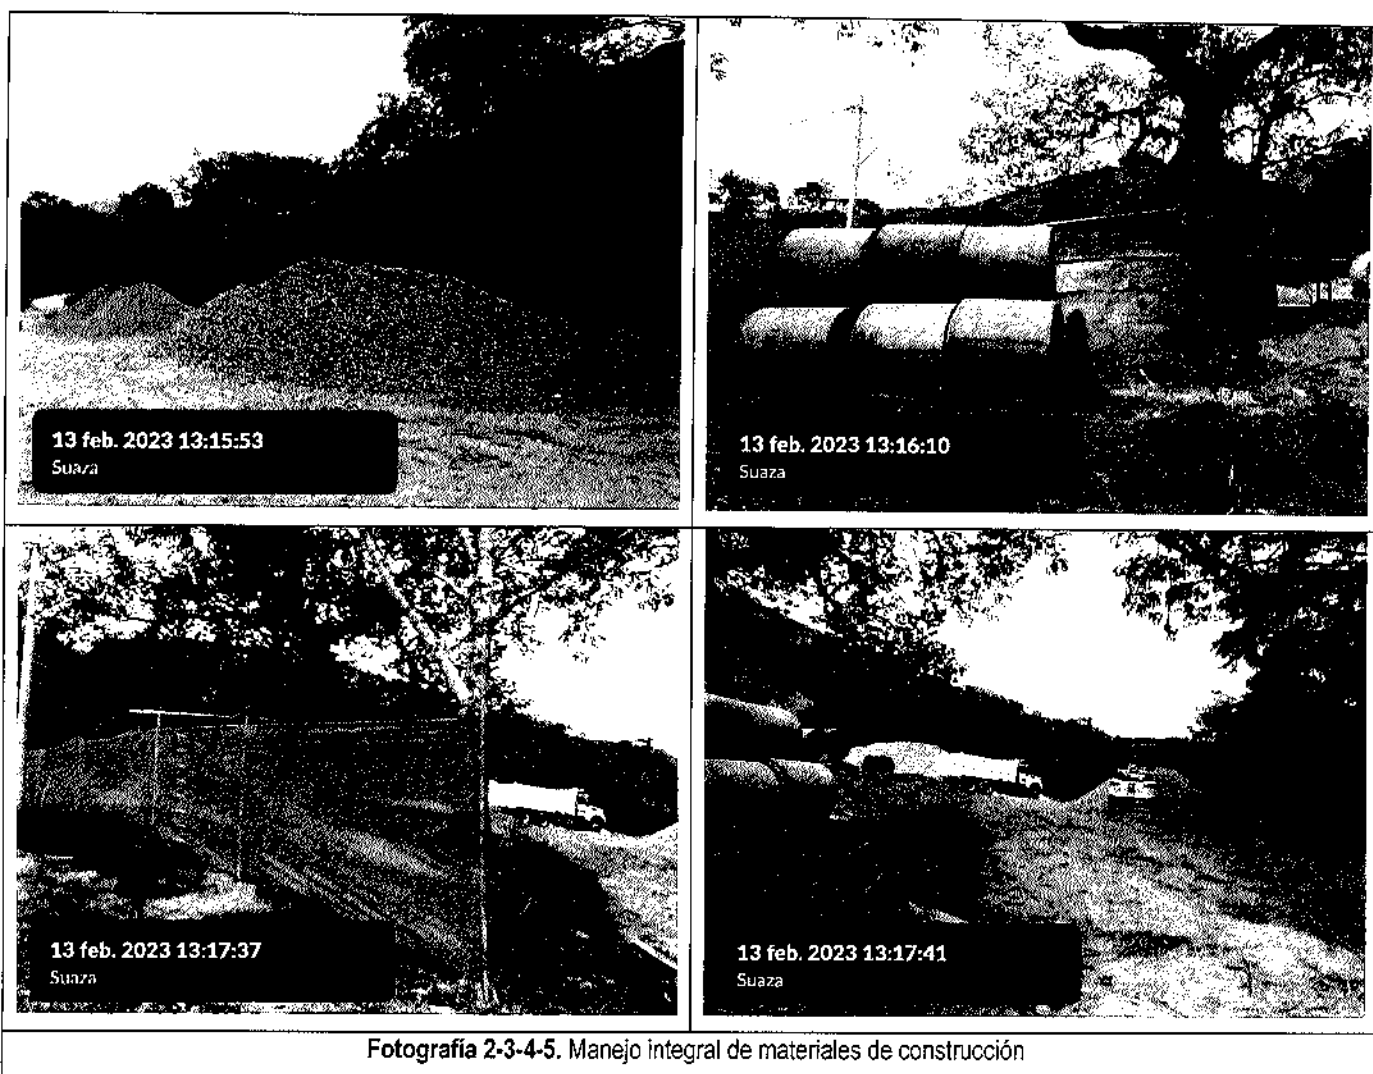
Tabla 6. Materiales de construcción requeridos por el proyecto

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Cemento
Acero
Geotextil


	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 13 de 27

Tubería
Señalización temporal
Subbase granular
Material granular filtrante
Arena
Concretos

La tubería 36" que ya se encuentra en obra se almacena en sitio de acopio de materiales del proyecto, al igual que materiales como piedra filtro, mejoramiento, sub base.



Fotografía 2-3-4-5. Manejo integral de materiales de construcción

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 14 de 27

2.2.2. Proyecto 2. Explotación fuentes de materiales

El Proyecto de explotación de fuentes de materiales no aplica para las presentes actividades, debido a que los materiales a utilizar son adquiridos a través de proveedores externos, los cuales cuentan con licencia ambiental y permiso de explotación minera, por parte de las autoridades competentes. **(Ver anexo 3. Documentación legal de canteras).**

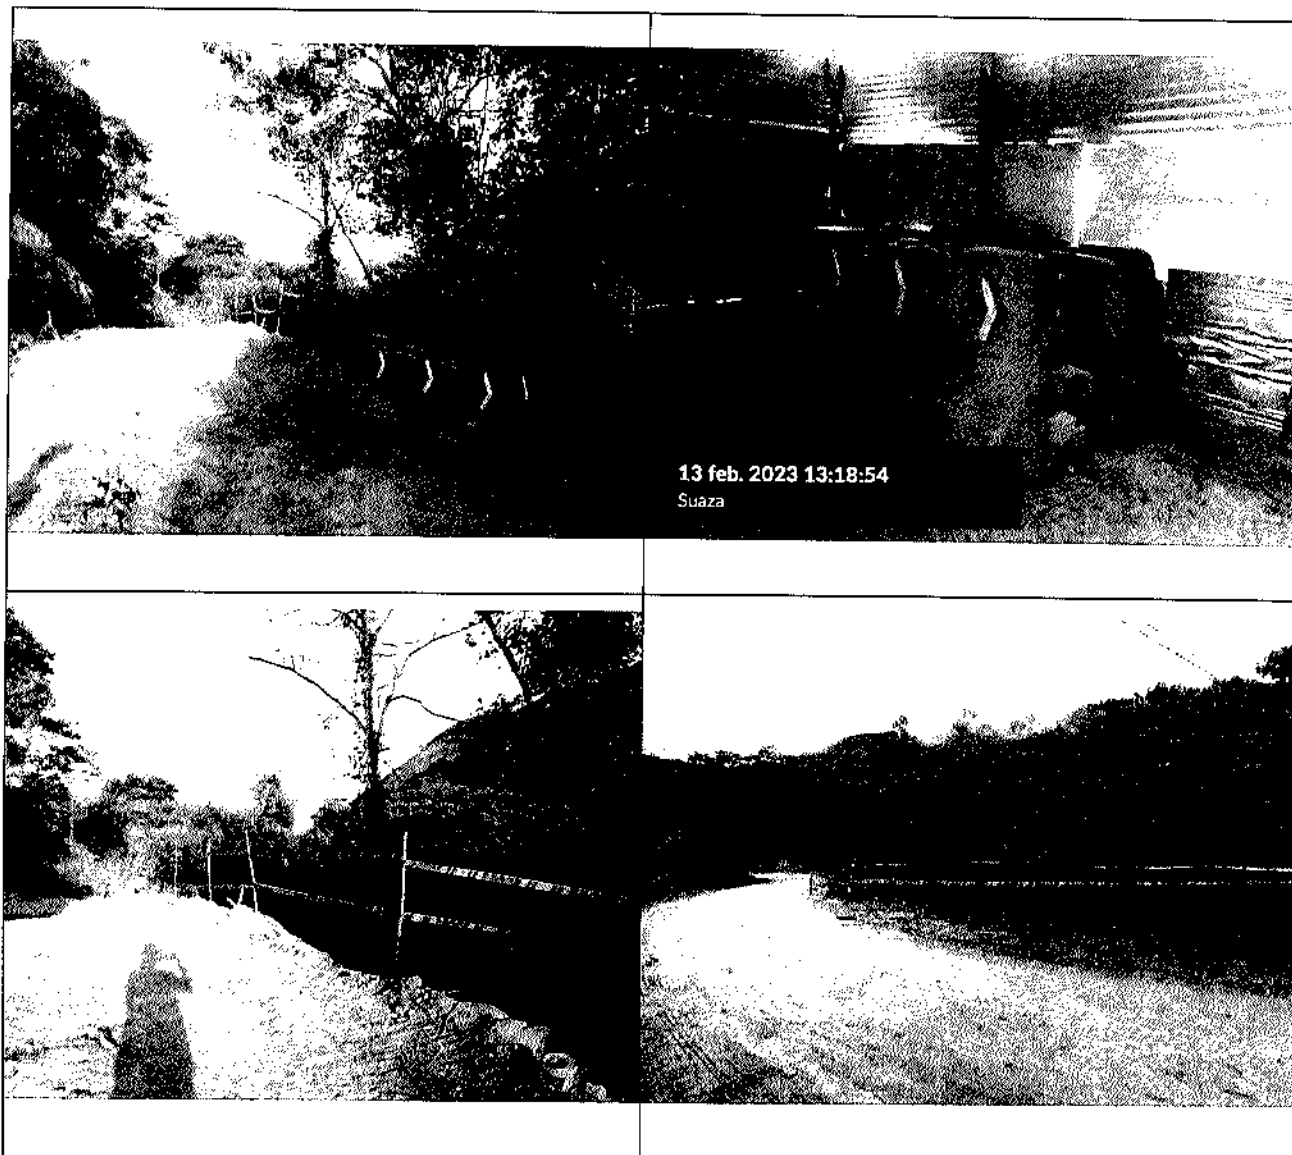
Tabla 7. Indicadores manejo integral de materiales de construcción

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº de quejas y reclamos atendidos por manejo de materiales de construcción}}{\text{Nº de quejas y reclamos presentados en el periodo}} \cdot 100$	0/0 x100	100%	No se registraron quejas ni reclamos por parte de la comunidad respecto al manejo de materiales de construcción

2.2.3. Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales

Se ha instalado señalizadores tubulares, acompañada con cinta de demarcación en áreas intervenidas. Se han venido coordinando recorridos para la verificación de la señalización y la verificación de acciones adecuadas en obra, a continuación, se relaciona la señalización fija ubicada en el tramo intervenido:

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 15 de 27



	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 16 de 27



Fotografía 6-7-8-9-10-11. Señalización general en obra

Tabla 8. Indicadores de cumplimiento para el proyecto señalización

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº de frentes de obra señalizados}}{\text{Nº de frentes de obra}} \cdot 100$	2/2 * 100	100%	Los frentes de obra intervenidos se encuentran señalizado con cinta y delineadores tubulares además de las barreras viales tipo maletín.
$\frac{\text{Nº de medidas implementadas}}{\text{Nº de medidas propuestas}} \cdot 100$	2/2 X 100	100%	Se realiza seguimiento a la señalización y se realizan mejoras continuas como reposición de cinta de peligro continuo, por el desgaste que se presenta por las lluvias y vientos de la zona.

2.2.4. Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros

Teniendo en cuenta que no se ha realizado la demolición de alcantarillas y estructuras en concreto, se está realizando el trámite correspondiente para la ubicación del sitio con respectiva autorización y certificación de propietario y/o Planeación municipal para la respectiva disposición de material de escombros.

Se recibió solicitud para la disposición de residuos de demolición y construcción por parte de propietario de predio ubicado en vereda Guayabal del municipio de Suaza (**Ver anexo 2. Permisos ambientales**), para

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 17 de 27

lo cual se realizará gestión con Planeación municipal de Suaza de certificación y autorización debida.

2.2.5. Proyecto 5. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Para manejo de residuos sólidos en los frentes de obra se realiza por medio de punto ecológico con contenedores plásticos de acuerdo con el código de colores establecido para separación en la fuente de los residuos generados, el punto ecológico se ubicó inicialmente en oficina ubicada en Centro Poblado de Gallardo, Suaza a la espera de la ubicación constante de personal y vigilancia en punto de acopio donde se reubicará definitivamente para que cumpla su función en obra. Se coordinará con empresas públicas de Suaza la respectiva recolección de estos residuos sólidos convencionales generados.

Por otra parte, en este periodo no se entregaron residuos peligrosos, debido a que no se han generado en obra este tipo de residuos.



Fotografía 12. Punto ecológico Recolección de residuos

Tabla 9. Indicadores de cumplimiento para el manejo de residuos sólidos.

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{N^{\circ} \text{ de residuos ordinarios dispuestos}}{N^{\circ} \text{ de residuos ordinarios generados}} \cdot 100 \geq 95\%$	0/0*100	0 %	Durante este periodo no se realizó entrega de residuos sólidos convencionales a empresas públicas de suaza.
$\frac{\text{volumen de RSP entregados}}{\text{volumen RSP generados}} \cdot 100$	0/0*100	0%	Durante este periodo no se realizó entrega de material peligroso.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 18 de 27

2.3. PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO

2.3.1. Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales

Se tramitará con La junta de acueducto de Gallardo Suaza el suministro de agua para actividades de obra. Durante este periodo no se realizaron actividades de humectación de vías ni trabajos de concretos.

Ocupación de cauces

El día 02 de febrero de 2023 mediante radicado 20233300023562 se inició trámite para Solicitud de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos para construcción de box Culvert ubicado en PR 21+520 con la solicitud de liquidación por servicios de evaluación, La Corporación mediante comunicado con Rad. 20233300031541 el día 20 de febrero de 2023 emite respuesta con los costos a cancelar por servicios de evaluación, posteriormente el día 21 de febrero de 2023 se realiza cancelación de dichos costos y se realiza solicitud mediante oficio CTO-1354/2022-EXT-003 y Rad. 20233300039602. Seguidamente la Corporación emite AUTO DE INICIO DE TRAMITE No. 10 el día 22 de febrero de 2023, para lo cual se está a la espera de la programación de la visita de acuerdo al cronograma de la Corporación. **(Ver anexo 2. Permisos ambientales).**

Tabla 10. Indicadores de cumplimiento proyecto manejo de aguas superficiales

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{No de permisos obtenidos para el desarrollo del proyecto}}{\text{Nº de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto}} \cdot 100$	0/0 * 100	0%	El permiso de ocupación de cauces se encuentra en trámite

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 19 de 27

2.4. PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICO

2.4.1. Proyecto 1. Manejo De Descapote Y Cobertura Vegetal

Aprovechamiento Forestal

Se identificó la necesidad de realizar aprovechamiento forestal principalmente en las zonas donde se localizan ampliaciones de la vía. En este sentido se detalla el inventario forestal de 9 individuos de especies comunes con un volumen de 2,07m³, para lo cual se realizó el trámite de solicitud como se describen en el proyecto No. 3 (*Ver anexo 2. Permisos ambientales*).

Tabla 11. Indicadores de cumplimiento del proyecto manejo de descapote y cobertura vegetal.

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{N^{\circ} \text{ acciones adelantadas}}{N^{\circ} \text{ acciones a ejecutar}} \cdot 100$	0/0 * 100	0%	Se está a la espera de Rta de la Corporación Ambiental. (Permiso Aprovechamiento forestal)
$\frac{N^{\circ} \text{ de arboles a talar}}{N^{\circ} \text{ total de arboles con permiso a talar}} \cdot 100$	0/9 * 100	0%	Se está a la espera de Rta de la Corporación Ambiental. (Permiso Aprovechamiento forestal) para dar inicio a la tala de los árboles identificados.

2.4.2. Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se implementarán todas las medidas para la recuperación de las áreas utilizadas como bodegas, zonas de parqueo y zonas RCD, teniendo en cuenta en dejar y devolver los espacios en iguales o mejores condiciones de las recibidas. Estas actividades se realizarán en el momento de entrega de bodegas o zonas de parqueo.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 20 de 27

Tabla 12. Indicador de recuperación de áreas afectadas

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº actividades implementadas para recuperación áreas afectadas}}{\text{Nº total de actividades ejecutadas}} \cdot 100$	0/0 * 100	N/A	Durante el presente periodo nose realizan acciones implementadas ya que no lo requiere.

2.4.3. Proyecto 3. Protección de fauna

Durante este periodo no se realizó capacitación referente a la protección de la fauna.

Tabla 13. Indicador de cumplimiento del proyecto protección de fauna

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº capacitaciones programadas}}{\text{Nº total de capacitaciones ejecutadas en tema fauna}} \cdot 100$	0/0 * 100	N/A	Durante este periodo no se realizó capacitación relacionada con la protección con la fauna

2.4.4. PROYECTO 4. Protección de ecosistemas sensibles

En el área de influencia del proyecto no existe presencia de ecosistemas sensibles debido a la gran presión antrópica a lado y lado de la vía donde existen grandes extensiones de cultivos, lícitos e ilícitos, ganadería extensiva que según información de la comunidad existe hace más de cincuenta años así mismo encontramos viviendas y demás elementos prestadores de servicios.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 21 de 27

2.5. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

2.5.1. Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

Para el desarrollo del proyecto se reside dentro del área de influencia de la obra, para ello se cuenta con una vivienda localizada en el casco urbano del Centro Poblado de Gallardo, las cuales cuentan con todos los servicios agua, luz, alcantarillado, aseo.

Dentro de las instalaciones temporales se cuenta con una oficina en Centro Poblado de Gallardo, donde se realizan actividades administrativas y atención a la comunidad, la instalación cuenta con servicio de acueducto, alcantarillado, energía y equipos para que el personal realice las actividades satisfactoriamente.

Además, se cuenta con campamento ubicado en el tramo de intervención para la realización posteriormente de actividades administrativas de requerirse y acopio de materiales y herramientas.

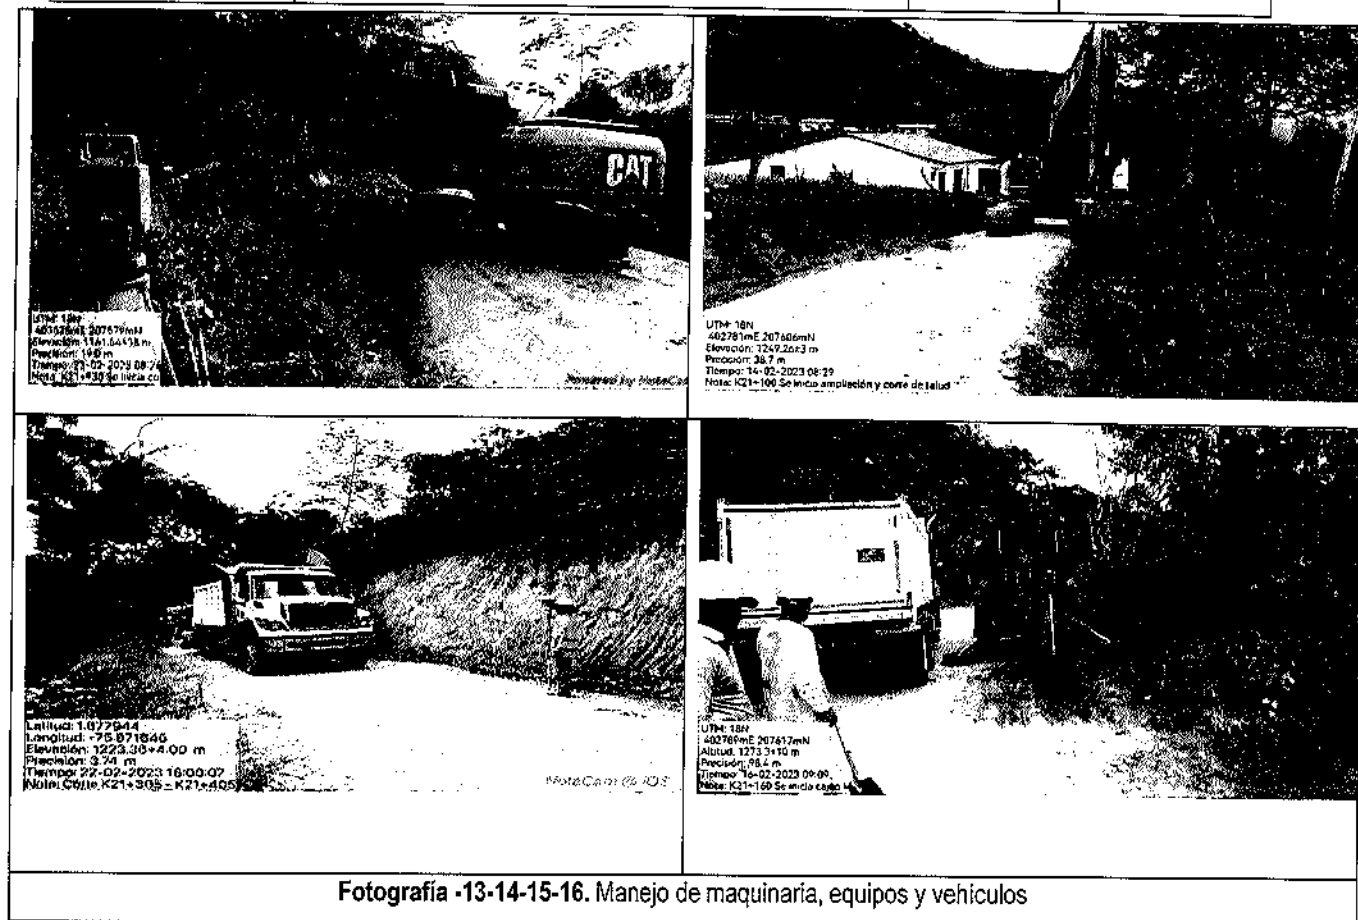
Tabla 14. Indicador de instalación y desmantelamiento de áreas.

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ áreas desmanteladas y restauradas}}{\text{N}^{\circ} \text{ áreas intervenidas}} \cdot 100$	0/1 * 100	0%	Durante este periodo no se desmanteló ningún área intervenida

2.5.2. Proyecto 3. Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos

La maquinaria, equipo y vehículos requeridos para el desarrollo del proyecto se mantendrán en obra. Serán inspeccionados para el desarrollo de las actividades propuestas. Diariamente antes de iniciar labores el operador de la maquinaria y/o equipo diligenciará una lista de chequeo visual y de funcionamiento específico, para determinar posibles fallas o anomalías. Esta información será reportada con el fin de identificar a tiempo la necesidad de realizar mantenimiento preventivo; sin embargo, una vez surja un daño en el automotor su reparación la ejecutará personal calificado y en sitios autorizados. Durante este periodo No se realizaron mantenimientos maquinarias o vehículos.

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 22 de 27



2.6. PROGRAMA 6. GESTION SOCIAL

2.6.1. Proyecto 1. Atención a la comunidad

Para la atención a la comunidad se dispone de oficina ubicada en Centro Poblado Gallardo y posteriormente se tendrá atención en Sitio de Acopio de materiales

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 23 de 27


SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO SAU

CONTRATO 1354 DE 2022

HORARIOS DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 7:30 AM

12:00 M Y DE 1:00 PM A 5:00 PM

TELEFONO 3143979684



13 feb. 2023 13:15:47

Suaza

Fotografía 17-18. Atención a la comunidad

Tabla 15. Indicadores Atención a la comunidad

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{N^{\circ} \text{ Quejas o reclamos atendidos}}{N^{\circ} \text{ Quejas o reclamos generados}} \cdot 100$	0/0 * 100	0%	No se presentaron Reclamos durante este periodo por parte de la comunidad
$\frac{N^{\circ} \text{ Sitio Atención al usuario instalado}}{N^{\circ} \text{ Sitios Atención al usuario requeridos}} \cdot 100$	1/1 * 100	100%	Durante este periodo se dispuso oficina par atención en el Centro Poblado de Gallardo

2.6.2. Proyecto 2. Información y divulgación

Tabla 16. indicadores información y divulgación

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{N^{\circ} \text{ autoridades informadas}}{N^{\circ} \text{ autoridades del AID}} \cdot 100$	1/1 * 100	100%	El día 16 de febrero de 2023 se remitió a la administración municipal comunicado informativo de horarios de cierre de la vía, y los días 17 y 18 de febrero se realizó perifoneo informativo a la comunidad.

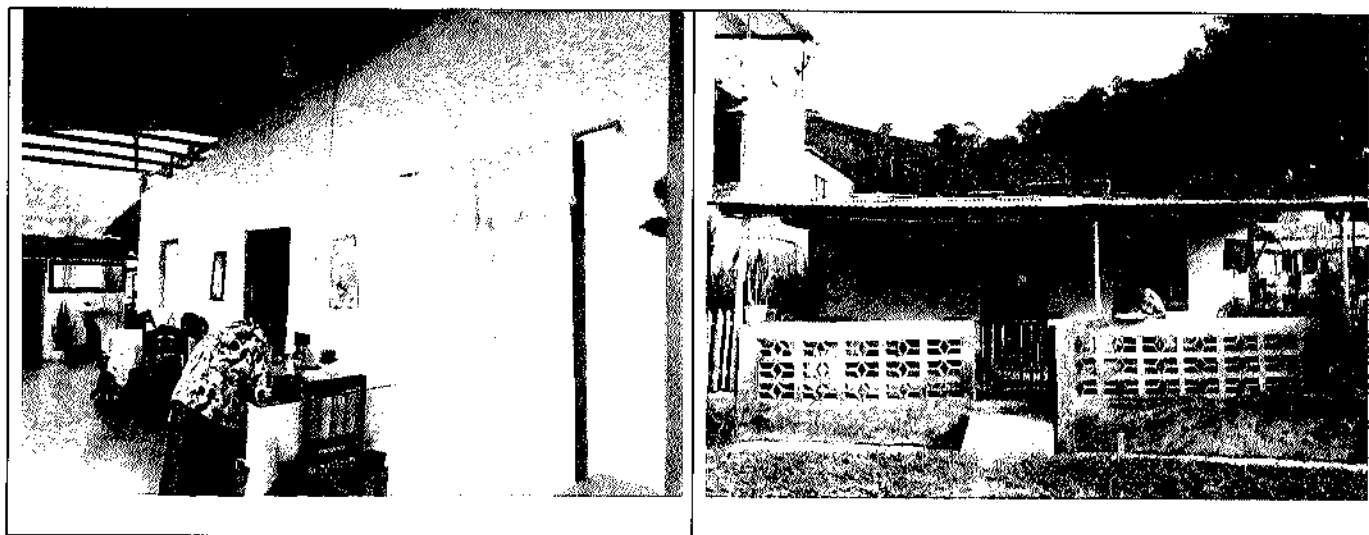
	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 24 de 27

$\frac{N^{\circ} \text{ Reuniones ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Reuniones programadas}} \cdot 100$	1/1 * 100	100%	Durante la mañana del día 31 de enero de 2023 se realizó reunión de socialización del proyecto con la comunidad del Centro Poblado de Gallardo, Administración municipal de Suaza, Supervisión del contrato, e Interventoría.
$\frac{N^{\circ} \text{ Piezas de información emitidas}}{N^{\circ} \text{ Piezas informativas generadas}} \cdot 100$	1/1 * 100	100%	

2.6.3. Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos

A partir del 13 de febrero de 2023 se dio inicio al levantamiento de actas de vecindad en viviendas ubicadas en el tramo de intervención del contrato de la referencia; de acuerdo a esto se tiene el reconocimiento inicial de 70 predios (viviendas, lotes sin edificar e instituciones); es importante mencionar que durante los días de visita no se han encontrado la totalidad de propietarios ni responsables de dichos predios para lo cual se realizarán nuevas visitas para poder llegar a la mayor cantidad de propietarios, de lo contrario se deberá solicitar el acompañamiento de los representantes de la veeduría ciudadana del proyecto para el levantamiento en conjunto del acta desde la inspección visual externa de la propiedad.

Para el levantamiento del acta de vecindad de las instituciones (escuela, colegio, iglesia cristiana y estación de servicio) se coordinará con los propietarios vía telefónica la visita.



	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 25 de 27

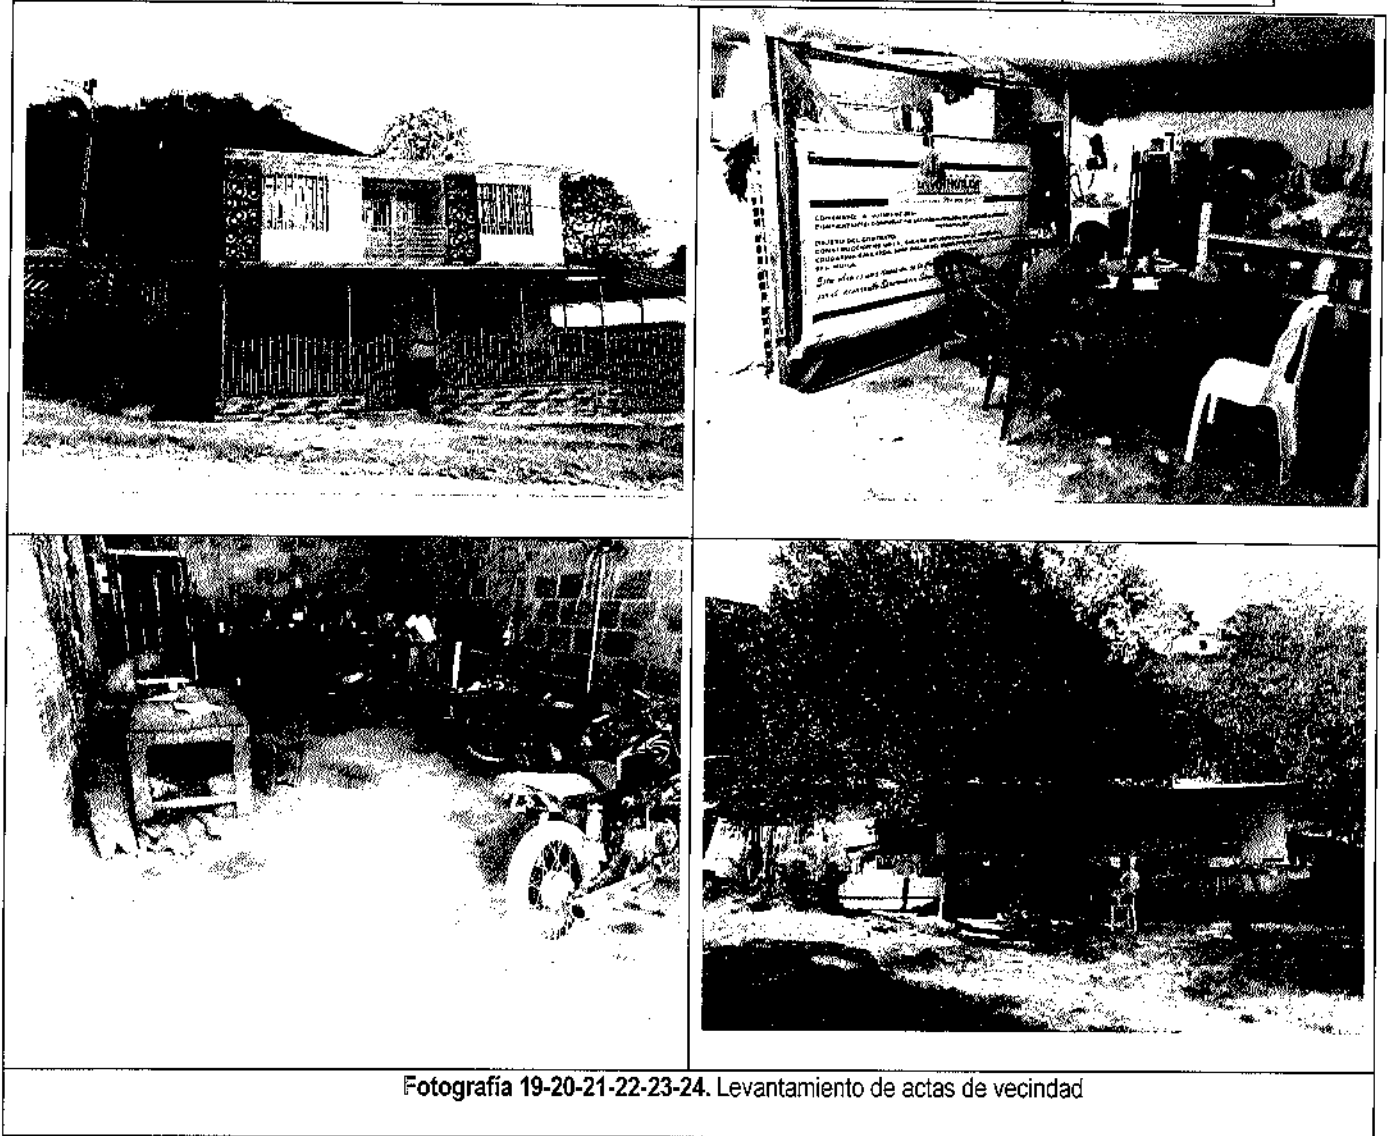


Tabla 17. Indicadores Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
$\frac{\text{Nº Actas de vecindad levantadas}}{\text{Nº Actas de vecindad programadas}} \cdot 100$	70/70 * 100	100%	Se realizó el levantamiento inicial (ubicación y registro fotográfico) de las actas de vecindad de la totalidad de los predios (viviendas, predios sin edificar e instituciones) ubicados

	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 26 de 27

			dentro del tramo a intervenir, sin embargo, durante los días de visita no se encontró a la totalidad de propietarios para lo cual se realizarán nuevas visitas y coordinación con propietarios vía telefónica
$\frac{N^{\circ} \text{ Reuniones ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Reuniones programadas}} \cdot 100$	1/2 * 100	50%	Se ha realizado reunión de inicio del proyecto.

Para el presente informe de gestión se realiza la entrega de 20 actas de vecindad debidamente diligenciadas y firmadas por el propietario del predio, y en el caso de propiedades en donde no se encontró el propietario se coordinará con la veeduría ciudadana del contrato. Las demás actas de vecindad levantadas se encuentran en proceso de digitación y posterior suscripción de firmas. **(Ver anexo 4. Actas de vecindad).**

2.6.4. Proyecto 6 Contratación de mano de obra



Fotografía 25-26 Contratación mano de obra


	INFORME MENSUAL AVANCE PROYECTOS PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL	Fecha:	28-02-2023
		No. Informe:	01
		Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 27 de 27

Tabla 18. Indicadores Contratación de mano de obra

INDICADOR	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No. de empleos generados para el desarrollo del proyecto	14	100%	
$\frac{N^{\circ} \text{ Personal de la zona}}{N^{\circ} \text{ Personal requerido por el proyecto}} \cdot 100$	$3/14 \cdot 100$	21.42%	Se debe tener en cuenta que este periodo fue de inicio del proyecto y se está realizando la recepción de hojas de vida para las actividades constructivas

ANEXO 1. CHARLA- CAPACITACION



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ASISTENCIA Y PARTICIPACION

VERSION
001
CODIGO
SIG-TH-F-01
PAGINA
1 DE 1

TEMAS TRATADOS :

- Uso adecuado y obligatorio de Casco en obra (cpps).
- Entrega hidratación
- Riesgos Asociados a la Actividad "Correr de talud / caída de roca."

TIPO DE ACTIVIDAD

- Reunión ☐
- Curso Capacitación ☐
- Entrenamiento ☐
- Reinducción ☐
- Inducción de Personal ☐
- Taller ☐
- Charla Capacitación ☒
- Charla Integral ☐
- Difusión ☐
- Charla EDT ☐
- A Integrantes ☐
- A Líderes Directos ☐

Hora de Inicio: 7:00 am

Hora Final: 8:00 am

Nº PARTICIPANTES: 11

DURACION (hrs.): 01 hora

LUGAR: Comendante

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	AREA	FIRMA
1.	Natalia Alejandra Ceballos D.	FJR	Controladora Val	Operativa	Natalia A Ceballos
2.	Jaime Chirre D.	FJR	Topógrafo	OP3 Val de	Jaime Chirre
3.	Gabriel Tolento	FJR	operador	operativa	Gabriel Tolento
4.	Sebastián Pile	ATP	operador		Sebastián Pile
5.	Sebastián Pile	FJR	conductor	Via	Sebastián Pile
6.	Sebastián Pile	FJR	conductor	Via	Sebastián Pile
7.	Rosario Tovar	FJR	CADENOR	VIA	Rosario Tovar
8.	CRISTIAN HERRERA	FJR	CADENOR	VIA	CRISTIAN HERRERA
9.	Luis de la Cruz	FJR	controlador	VIA	Luis de la Cruz
10.	Fernando Jimenez	FJR	Inspector	VIA	Fernando Jimenez
11.	LUISA TOLOBOZAS	FJR	MBICAJOL	OPERATIVA	LUISA TOLOBOZAS
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: LUABIOLOBOZAS CARGO: AMERICVIDL FIRMA: [Firma] FECHA: 24/02/23

ANEXO 2. PERMISOS AMBIENTALES/ TRAMITES

TRAMITE PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
-Diseños estructurales-Construcción-Consultaria-Interventoria-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

532

Garzón, febrero 16 de 2023.

CTO-1354/2022-EXT-002

Señores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
DIRECCION TERRITORIA CENTRO
Ciudad.

Referencia: CONTRATO 1354 DE 2022: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del Centro Poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.

Asunto: Solicitud Permiso de aprovechamiento forestal

Cordial saludo.

Mediante la presente me permito realizar la solicitud ante esta Corporación del permiso de aprovechamiento forestal para la ejecución del contrato de la referencia en la vía que del Centro Poblado de Gallardo Suaza conduce al cruce Ruta 20 A, para lo cual se anexa la siguiente documentación:

- Formato Único Nacional de solicitud
- Lista de chequeo
- Copia cedula de ciudadanía
- Registro único tributario
- Cuadro inventario forestal
- Copia soporte de pago por concepto de visita

Agradecemos su atención a la presente y estamos atentos a sus indicaciones.

Sin otro particular,

FERNANDO JIMENEZ ROA
C.C. 12.192.340 de Garzón
CONTRATISTA

24/2/23, 13:48

Gmail - Radicacion No: 20233300036102 para la solicitud No. 2300001219234023001



FERNANDO JIMENEZ ROA <fernandojimenezroa1@gmail.com>

Radicacion No: 20233300036102 para la solicitud No. 2300001219234023001

1 mensaje

notificacionesvital@minambiente.gov.co <notificacionesvital@minambiente.gov.co>
Para: fernandojimenezroa1@gmail.com

16 de febrero de 2023, 17:49

Señor(a):

FERNANDO JIMENEZ ROA

Ciudad

Nos permitimos informarle que hemos recibido su solicitud y ha sido radicada con la siguiente información:

Número VITAL: 2300001219234023001

Número de Radicación: 20233300036102

Fecha de Radicación : 16/02/2023

Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Cordialmente,

VITAL

Participa en la encuesta de satisfacción a través del siguiente Enlace

**TRAMITE PERMISO OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS
Y LECHOS**



SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN POR SERVICIO DE EVALUACIÓN
F-CAM-203 V4



Carrera 1 No. 60 79 Neiva - Huila
PBX (578) 8769817 - FAX 8765344
camhuila@cam.gov.co



Rad: 20233309023562 Fecha: 02-FEB-2023 03:42
Us: DLVARON Dest: Dep DTC No.Folio: 4
Rem: FERNANDO JIMENEZ ROA
Desc.Anes: NA M.Ancos

Neiva.

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

Referencia: Solicitud de liquidación por el servicio de evaluación

En relación con el asunto de la referencia, solicito se expida la liquidación por el servicio de evaluación del proyecto relacionado a continuación:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| *Diagnóstico Ambiental de Alternativas | ☐ | Licencia Ambiental | ☐ |
| Plan de Manejo Ambiental | ☐ | Actualización Plan de Manejo Ambiental | ☐ |
| Modificación Licencia Ambiental | ☐ | Modificación Plan de Manejo Ambiental | ☐ |
| Evaluación Programa Manejo Ambiental para Generadores de RCD | ☐ | Evaluación Medidas Mínimas de Manejo Ambiental Sitios Disposición Final de RCD | ☐ |
| Evaluación Medidas Mínimas Manejo Ambiental en puntos limpios y Plantas de Aprovechamiento de RCD | ☐ | Plan de Contingencia para Transporte y/o almacenamiento de Hidrocarburos y sustancias nocivas | ☐ |
| Permiso de Vertimientos | ☐ | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | ☒ |
| Prospección y exploración de aguas subterráneas | ☐ | Concesión de aguas subterráneas | ☐ |
| Concesión de aguas superficiales | ☐ | Aprovechamiento Forestal | ☐ |
| Sector: | Hidrocarburos ☐ | Agroquímicos ☐ | **Infraestructura ☐ |
| | Eléctrico ☐ | Minería ☐ | Otros ☐ |

**Para infraestructura vial se debe señalar la longitud en Km de la vía.

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE COXOLUERT



SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN POR SERVICIO DE EVALUACIÓN
F-CAM-203 V4

Descripción breve del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN EN
CONCRETO RIGIDO DE ALERNA DEL AGUA CON CODIGO 454210.

Ubicación del Proyecto (Indicar las coordenadas):
X 1104301.774 Y 699419.662. Municipio Sozua.

Expediente No. (Cuando sea modificación) _____

Descripción breve de la modificación: _____

Costos del proyecto (Ver NOTA) \$ 117.423.721

Valor en letras CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL
SETECIENTOS VENTUN PESOS

Indique los permisos ambientales que se requieren en el proyecto:

PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS

Forma de entrega (Elija una):

Personal ☒ Correo Postal ☐ Correo Electrónico ☐

Solicitante: Persona Natural ☒ Persona Jurídica ☐

• Personas Naturales:

Nombre: FERNANDO VINCENTE ROMERO

Tipo de identificación: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. de identificación: 12.197.340

Dirección: C/PA 1 N. 1-47 Teléfono: 3214712147

Correo Electrónico: fernandromerovinc@agricultura.com

• Personas Jurídicas:

Empresa: _____
 Representante Legal: _____
 Nit No. _____ Dirección: _____
 Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

NOTA:

- Para reportar los costos del proyecto por favor tener en cuenta el artículo 1º de la Resolución No.1086 del 18 de diciembre de 2012, así:

1. Para fases de construcción y operación

COSTOS DE INVERSIÓN		COSTOS DE OPERACIÓN (administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad)	
ITEMS	COSTOS (\$)	ITEMS	COSTOS (\$)
Estudio de prefactibilidad	\$1200000	Valor de materias primas para la operación del proyecto	
Estudio de factibilidad y diseño	\$2.000.000	Mano de Obra Calificada y No Calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad	
Valor del Terreno (Adquisición o alquiler de Predios) y servidumbres		Pago de Arrendamientos	
Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona		Pago de servicios públicos	
Construcción de obras civiles principales y accesorias	\$114.223.721	Pago Seguros y otros servicios requeridos	
Adquisición de equipos principales y auxiliares		Costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad	
Montaje de Equipos		Los costos en que incurre la empresa, para la recolección, almacenamiento, acopio, transporte, manejo y disposición final de residuos	
Interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos		Todos los demás costos y gastos de operación que permitan la obtención de beneficios económicos para el propietario	
Elaboración y ejecución del Plan de Manejo Ambiental			



**SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN POR SERVICIO DE EVALUACIÓN
F-CAM-203 V4**

Todos los demás costos de inversión que hagan posible la obtención de beneficios económicos para el propietario			
SUBTOTAL COSTOS DE INVERSIÓN		SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (subtotal costos de inversión + subtotal costos de operación)			5117423.721

* Para la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, no se requiere informar costos, teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 1º de la Resolución No.1086 del 18 de diciembre de 2012, así:

"Parágrafo 3º. Necesidad de diagnóstico ambiental de alternativas y diagnóstico ambiental de alternativas. Teniendo en cuenta que para esta fase de evaluación no se ha determinado el valor del proyecto, no se requiere informar costos. Para tal efecto se cobrará la tarifa fijada en la tabla número 11, contenida en el artículo 19 de la presente resolución."

FIRMA DEL SOLICITANTE



Huila
Territorio de vida.

Conazón

DTC –

Garzón,

Señor (a):
FERNANDO JIMENEZ ROA
Carrera 7 No. 9 – 47
Teléfono: 321 471 2147
Correo e:
Garzón - Huila



Carrera 1 No. 60 79 Nava - Huila
PBX (578) 8765017 - FAX 8765344
camhuila@cam.gov.co



Rad: 20233300031541 Fecha: 20-FEB-2023 02:59
Us: DLVARON Dest: Dep DTC No. Folios: 1
Rem: FERNANDO JIMENEZ ROA
Desc. Anex: NA N. Anex: 00

Asunto: Radicación solicitud liquidación costos servicio de evaluación, proyecto permiso de ocupación de cauces para construcción Box Coulvert, Municipio de Suaza.

Por medio de la presente me permito manifestarle que, de acuerdo a la solicitud de liquidación presentada bajo el radicado CAM No. 20223300023562 de 02/12/2022, para realizar la evaluación de la solicitud de permiso de ocupación de cauces para la construcción de un Box Coulvert, en el kilómetro 21 + 520 de la pavimentación en concreto rígido de 1,5 Km de la vía con código 45H210 en el Municipio de Suaza – Huila, Se deberá cancelar por concepto de evaluación el valor de **QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$518.582,00)**, la cual se deberá realizar en la cuenta No. 287-06426-5 CAM Gastos Generales del Banco DAVIVIENDA o en la Pagaduría de la CAM.

Una vez realizada la consignación, sírvase radicar formalmente su solicitud de permiso de ocupación de cauces con todos sus documentos adjuntando el respectivo recibo de pago, para lo cual, se debe realizar dicha radicación en un término máximo de un (1) mes calendario, de lo contrario se aplicará el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,


RODRIGO GONZALEZ CARRERA
Director Territorial Centro

Proyectó: Dagoberto Castro – Profesional Universitario

Radicados: 20223300023562

Expediente: Facilitativos

Expediente Digital: 2022330520100011E

Gestión Documental: Documentos Facilitativos / Documentos Facilitativos / Respuesta a solicitud.

Dirección Territorial Centro


□ Carrera 4A No. 4 - 46 Barrio San Cayetano
Garzón - Huila (Colombia)
✉ radicacion@cam.gov.co
☎ (608) 833 2444
🌐 www.cam.gov.co



C R COMPAÑIA
MUNICIPAL
DE ASEGURAMIENTO
SG-2022009234-B

C R COMPAÑIA
MUNICIPAL
DE ASEGURAMIENTO
SG-2022009234-A

f CAM
t CAMHUILA
@ cam_huila
CAMHUILA



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS
-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

Garzón, febrero 21 de 2023.

CTO-1354/2022-EXT-003

Señores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
DIRECCION TERRITORIAL CENTRO

Ciudad.

Referencia: CONTRATO 1354 DE 2022: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila.

Asunto: Solicitud Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos para construcción de Box Culvert

Cordial saludo.

Con el propósito de dar alcance al contrato de la referencia, nos permitimos solicitar a esta corporación el permiso de ocupación de cauces, playas y lechos para la construcción del Box Culvert ubicado en el K 21+520 de la pavimentación en concreto rígido de 1.5 km de la vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20 A en el municipio de Suaza, para lo cual se adjunta lo siguiente

- Lista de chequeo requisitos mínimos para la solicitud de ocupación cauces, playas y lechos
- Formulario único de solicitud
- Copia documento de identificación del solicitante
- Rut del solicitante
- Estudio hidrológico del proyecto
- Valor total construcción Box Culvert
- Planos generales y constructivos del Box Culvert
- Recibo de pago costos servicios de evaluación

Agradecemos su atención a la presente y estamos atentos a sus indicaciones.

Sin otro particular,

FERNANDO JIMENEZ ROA
C.C. 12.192.340 de Garzón
CONTRATISTA

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 21/02/2023 Hora: 08:56:08
Jornada: Normal Bancafé
Oficina: 773
Terminal: CJ0773W702
Usuario: HTL

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
CAM HUILA PUBLICACIONES - TSE
Cuenta Convenio: *****4265
Código Convenio: 1024900
No. de Referencia 1: 12192340
No. de Referencia 2: 202333

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$518,582.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 540944
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 12192340
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



FERNANDO JIMENEZ ROA <fernandojimenezroa1@gmail.com>

Radicacion No: 20233300039602 para la solicitud No. 4900001219234023001

1 mensaje

notificacionesvital@minambiente.gov.co <notificacionesvital@minambiente.gov.co>
Para: fernandojimenezroa1@gmail.com

21 de febrero de 2023, 17:55

Señor(a):

FERNANDO JIMENEZ ROA

Ciudad

Nos permitimos informarle que hemos recibido su solicitud y ha sido radicada con la siguiente información:

Número VITAL: 4900001219234023001

Número de Radicación: 20233300039602

Fecha de Radicación : 21/02/2023

Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Cordialmente,

VITAL

Participa en la encuesta de satisfacción a través del siguiente Enlace

543

	AUTO INICIO DE TRAMITE	Código: F-CAM-102
		Versión: 7
		Fecha: 18 Jul 16

No. 010

Garzón, 22 de febrero de 2023

El Director Territorial Centro de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la ley 99 de 1993 y la Resolución No. 4041 de diciembre 21 del 2017 modificada por la Resolución No. 466 de febrero 28 del 2020 proferidas por el Director General de la CAM y teniendo en cuenta los siguientes:

HECHOS

Mediante escrito bajo los radicados CAM No. 2022330039602 de 21 de febrero de 2023, y VITAL No. 4900001219234023001, el señor FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.192.340 de Garzón - Huila, en calidad de persona natural, con dirección de notificación Carrera 7 No. 9 – 47 del Municipio de4 Garzón, teléfono Celular 320 231 7459 y correo electrónico fjroa@cam.gov.co, solicita permiso de ocupación de cauce con el fin de realizar la construcción de un boxculvert de 13 metros de longitud, 3,15 metros de alto y 5,40 metros de ancho, obra a construir sobre la vía identificada con el código 45hl10 que del Centro Poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A en el Municipio de Suaza en el Departamento del Huila.


Mediante radicado 20233300023562 de 02 de febrero de 2023 se solicita liquidación por costos de evaluación; mediante radicado 20233300031541 de 20 de febrero de 2023 se envía oficio con costos de liquidación por evaluación.

Como soporte a la petición suministro la siguiente información: Formulario único nacional de solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos debidamente diligenciado; acuse Vital; Lista de chequeo revisión de requisitos mínimos para la solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos; Fotocopia de la cédula de ciudadanía; RUT del señor Fernando Jiménez Roa; documento técnico del proyecto; documento estudio hidrológico; Planos que indican la ubicación detallada; Plano de detalle de la obra a ejecutar; constancia de pago; CD.

Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, es competente para otorgar esta clase de Licencia y/o permiso ambiental de conformidad con lo contemplado en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Como corolario de lo anterior, la Dirección Territorial Centro de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, analizando y evaluando la información presentada por el solicitante:

544

	AUTO INICIO DE TRAMITE	Código: F-CAM-102
		Versión: 7
		Fecha: 18 Jul 16

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Dar inicio de trámite a la solicitud de permiso de ocupación de cauce con el fin de realizar la construcción de un boxculvert de 13 metros de longitud, 3,15 metros de alto y 5,40 metros de ancho, obra a construir sobre la vía identificada con el código 45hl10 que del Centro Poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A en el Municipio de Suaza en el Departamento del Huila. Conforme a la solicitud presentada por el señor FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.192.340 de Garzón - Huila, en calidad de persona natural.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el presente auto al señor FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.192.340 de Garzón - Huila, en calidad de persona natural, advirtiéndole que contra el mismo no procede ningún recurso en sede administrativa.

ARTÍCULO TERCERO. - Ordenar la práctica de una visita técnica al lugar respectivo, para lo cual se fijará fecha y hora. De dicha visita se elaborará concepto técnico sobre la viabilidad o no de la solicitud presentada.

PARAGRAFO. - Para la realización de la visita se requerirá el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas al peticionario por medio de este Auto.

ARTÍCULO CUARTO. - Publicar auto de inicio del trámite en la gaceta ambiental de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 en la página de esta Corporación para efectos de garantizar la oposición de terceros que resultaren afectados con su otorgamiento.

ARTÍCULO QUINTO. - El presente Auto rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra este no procede recurso alguno en Sede Administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


RODRIGO GONZÁLEZ CARRERA
 Director Territorial Centro

Proyecto: Dagoberto Castro Muñoz – Profesional Universitario
 Radicado: 2022330039602
 Expediente: POC-00011-23

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAR
 DTC Fecha: 27-02-2023
 Hora: 3:10 pm
 El señor Fernando Jimenez Roa
 identificado con C.C. No. 12.192.340
 con el fin de presentar la solicitud de
 el Auto de Inicio
 Notificado DP

Página 2 de 2

**SOLICITUD PROPIETARIO DISPOSICION RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION**

Suaza, Huila 7 de febrero de 2023

SEÑORES:
FERNANDO JIMENEZ ROA

Contratista de obra CONTRATO 1354 DE 2022: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.

Asunto: Solicitud de disposición de residuos de demolición y construcción

Cordial saludo.

Mediante la presente me permito solicitar que se realice disposición de residuos de demolición y construcción que producto de las actividades del contrato de la referencia se generen, con el fin de mejorar el terreno en predio de mi propiedad con las siguientes características:

- Predio denominado "LA PEDRA DEL RAYO"
- Ubicado en la vereda Guayabal del municipio de Suaza, Huila
- Matricula inmobiliaria numero 202-52-809
- Cedula catastral 417700002000000010109000000000
- Extensión superficial de tres hectáreas (3 has)

Agradeciendo su atención y colaboración

Sin otro particular,

Jhon Jairo Hernandez Cuellar
JHON JAIRO HERNANDEZ CUELLAR
C.C. 17.647.042 DE FLORENCIA

Anexo. Copia escritura. Copia de cedula de ciudadanía

GOBERNACION DEL HUILA



GOBERNACION DEL HUILA
Calle Enrique Olaya Barrantes
CORTESIA



GOBERNACION DEL HUILA



GOBERNACION DEL HUILA
Calle Enrique Olaya Barrantes
CORTESIA



GOBERNACION DEL HUILA
Calle Enrique Olaya Barrantes
CORTESIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CERTIFICA


Que conforme al tiempo de ejecución del proyecto cuyo objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila", como sitios de disposición final de residuos de construcción se tendrá en cuenta las certificaciones de nivelación topográfica expedidas por el municipio de Suaza

Que la disposición final de los residuos de construcción del proyecto, se realizará en predios de particulares previa aprobación del municipio y será conformado por el contratista del proyecto con una distancia promedio de 5km

Esta certificación se expide teniendo en cuenta las respectivas certificaciones presentadas por el Municipio y la respectiva certificación suscrita por la Geóloga Andrea Danitza Ramos Gomez y que hacen parte del proyecto.

Esta certificación se expide en cumplimiento a la ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y la Guía de Orientaciones Transitorias para la gestión de proyectos de inversión del Sistema General de Regalías

Para constancia se firma en el municipio de Neiva - Departamento del Huila, a los 07 días del mes de Febrero de 2022


JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
Secretario de Vías e Infraestructura

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de



ISO 9001
SC4353-1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



República de Colombia



Aa059371178

Ca319071105

ESCRITURA NÚMERO: SEISCIENTOS NUEVE (609) -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: MAYO DIECISIETE (17) DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) -----

MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO: 202-52809 -----

• CEDULA CATASTRAL: 417700002000000010109000000000 -----

• UBICACIÓN DEL PREDIO: VEREDA GUAYABAL -----

• NOMBRE O DIRECCIÓN: PREDIO RURAL LA PIEDRA DEL RAYO -----

• MUNICIPIO: SUAZA - HUILA -----

NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO: VENTA - -----

PERSONAS QUE INTERVIENE EN EL ACTO: -----

VENDEDOR: MIGUEL ANGEL MONTES c.c. 4.939.070 -----

COMPRADOR: JHON JAIRO HERNANDEZ CUELLAR c.c. 17.647.042. -----


CUANTIA: \$12.000.000 venta -----

En la ciudad de Garzón, Departamento del Huila, República de Colombia, a los diecisiete (17) - días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), ante mí, YANETH OSSA SUAREZ, Notaria Primera Encargada de este Círculo, según Resolución número 5373 del 26 de abril de 2019 de la Superintendente Delegada para el Notariado de la Superintendencia de Notariado y Registro, en esta fecha, se otorga la escritura pública que se consigna en los siguientes términos: -----
compareció el señor **MIGUEL ANGEL MONTES**, varón, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Suaza Huila, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.939.070 expedida en Suaza Huila, de estado civil, soltero con unión marital de hecho, , quien manifestó: **PRIMERO:**.-Que mediante el presente público instrumento transfiere a -----



Aa059371178

Ca319071105



NOTARIA OSSA SUAREZ

15-11-18

Cedena 24 10/05/2019 07-01-18

título de venta real y legal a favor del señor **JHON JAIRO HERNANDEZ CUELLAR**, el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente bien inmueble: Un predio rural, lote de terreno denominado "LA PIEDRA DEL RAYO", ubicado en la Vereda Guayabal, jurisdicción del Municipio de Suaza Huila, con extensión superficiaria de TRES HECTÁREAS (3 HAS), determinado conforme a título antecedente (Esc. No. 0534 de fecha 28-04-2006) bajo los siguientes linderos: "Norte y Occidente, linda con predios de Humberto Soto; Sur, linda con predio de Helena Toledo y Oriente, linda con predio del vendedor Douglas Durán Silva". -----

PARAGRAFO: Este inmueble se encuentra involucrado en la cedula catastral número 417700002000000010109000000000, correspondiente al predio de mayor extensión y denominado "SAN ISIDRO", hasta tanto el "IGAC" no efectúe la mutación catastral correspondiente.-----

SEGUNDO.- TRADICIÓN. Este inmueble lo adquirí por compra que efectué al señor DOUGLAS DURAN SILVA, mediante la escritura pública número 0534 de fecha 28-04-2006, , otorgada en la notaria primera del círculo notarial de Garzón Huila, la cual fue debidamente registrada en la oficina de registro de Instrumentos Públicos del mismo círculo notarial al folio de matrícula inmobiliaria número **202-52809** -----

TERCERO.- Que el precio o valor del inmueble materia del presente contrato es la cantidad de **DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000.00)** Moneda Legal Colombiana, cantidad que declara el vendedor tener recibida del comprador con anterioridad a esta fecha en dinero efectivo y a su entera satisfacción.-----

CUARTO.- Declara el vendedor que el inmueble objeto de la presente venta lo garantiza libre de censo, hipoteca, embargo, arrendamiento, hipoteca, anticresis, demanda civil registrada, pleito pendiente y patrimonio de familia inembargable constituido por escritura pública.



República de Colombia



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de notas de escritura pública, constitución y cancelación del crédito notarial

condiciones resolutorias del dominio, limitaciones del mismo y en general libre de todo gravamen, exceptuando el gravamen hipotecario que pesa sobre el inmueble y constituido a favor de la entidad crediticia **BBVA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA COLOMBIA**, mediante la escritura pública número 1316 de fecha 19-09-2006, otorgada en la Notaria Primera de Garzón Huila, gravamen éste que conoce el vendedor y lo acepta y asume con su firma en el presente público instrumento; pero que en todo caso se compromete a salir al saneamiento de lo vendido conforme a la ley.-----


QUINTO.- Que desde esta misma fecha hace entrega real y material del inmueble al comprador, dejándolo en posesión real y material del mismo junto con todas sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres que legal y materialmente le corresponde sin reserva ni limitación alguna y en el estado en que se encuentra.-----

SEXTO.- Declara el compareciente vendedor que el inmueble que por el presente público instrumento transfiere en venta no se encontraba afectado a vivienda familiar.-----

ACEPTACIÓN.- Presente el comprador, señor **JHON JAIRO HERNANDEZ CUELLAR**, varón, mayor de edad, vecino de la ciudad de Florencia Caquetá, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 17.647.042 expedida en Florencia, de estado civil, soltero con unión marital de hecho, manifestó: A.- Que acepta la presente escritura pública, sus declaraciones y consecuentemente la venta en ella contenida a su favor por estar a su satisfacción. B.- Que pagó su valor y se encuentra en posesión quieta y pacífica del inmueble que por el presente público instrumento adquiere. **C.- CONSTANCIA SOBRE AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR:** Dando cumplimiento a la ley 258 de 1996, modificada por la ley 854 del 2003 Que el inmueble que adquiere mediante este público instrumento no tiene sobre el erigida -----



Ca310071104



10772-HOBNAYVHAA

16-11-18

Cedencia Notario

Cedencia Notario 07-03-19

construcción alguna y está dedicado para las labores propias del Agro, en consecuencia no lo afecta a vivienda familiar.-----

SE ADVIRTIÓ A LOS CONTRATANTES QUE LA LEY ESTABLECE QUE QUEDARAN VICIADOS DE NULIDAD ABSOLUTA LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DESCONOZCAN LA AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR. -----

DECLARACION JURAMENTADA: -----

APLICACIÓN ARTÍCULO 53 – LEY 1943/18 -----

CONSTANCIA: Declaran las partes otorgantes VENDEDOR Y COMPRADOR que conocen el texto y alcance del Artículo 53 de la Ley 1943/2018 por lo que, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por el sólo hecho de la firma, que el precio incluido en esta escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente, que no existen sumas que hayan convenido o facturado por fuera de la misma. La Notaría advierte que, en el caso de existir pactos, deberá informarse el precio convenido en ellos o de lo contrario deberán manifestar su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta como la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro (4) veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del Notario de reportar la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin detrimento de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, para determinar el valor real de la transacción. -----

Fue presentado para su protocolización el certificado de Paz y salvo predial expedido por la Secretaria de Hacienda de Suaza de fecha 07 de mayo de 2019, con vigencia al 31 de diciembre de 2019, sobre el predio 417700002000000010109000000000, extensión 11has, avaluado en

55L



República de Colombia



\$14.511.000.-EN MAYOR EXTENSION -----


Se advirtió a los otorgantes de esta escritura de la obligación que tienen de leer la totalidad de su texto a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra la aprobación total del texto. En consecuencia, la Notaría no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidos con posterioridad a la firma de los otorgantes y de la Notaria. En tal caso esta debe ser corregida mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragado por los mismos (Artículo 35 del Decreto Ley 960 de 1970. =====

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE: -----

- 1.- Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, su real estado civil, número correcto de sus documentos de identificación, dirección, descripción, cabida, linderos, matrícula inmobiliaria del inmueble y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado.-----
- 2.- Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en consecuencia, asumen la responsabilidad de cualquier inexactitud.-----
- 3.- Conocen la ley y saben que el Notario responde solo de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento.-----
- 4.- Se conocieron personal y directamente antes de comparecer a la Notaria para el otorgamiento de esta escritura. -----
- 5.- Las partes verificaron que es realmente la titular del derecho y posesión real y material inmueble que se transfiere, pues tuvo la



Ca319071103



107710SPAVIHAMH

16-11-18

Ca319071103

Ca319071103

precaución de establecer su real situación jurídica con base en los documentos de identidad de la parte vendedora y documentación pertinente tales como copias de escrituras y certificado de Tradición y Libertad, etc. y demás indagaciones conducentes para ello. -----

6.- Solo solicitaran correcciones, aclaraciones o modificaciones al texto de la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la ley. *-*-*-

7.- Los otorgantes manifiestan expresamente para efectos propios de la Ley de Extinción de Dominio y aquellas normas que la adicionen, modifiquen o reformen, que los bienes materia u objeto del presente acto o contrato, así como los dineros con que se satisfacen las prestaciones derivadas de él, provienen o se originan en el ejercicio de actividades lícitas. -----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION. * * * * *

Leído, Aprobado y Firmado por los comparecientes este instrumento, que elaboró conforme a su voluntad, sus declaraciones e instrucciones, se les hicieron las advertencias de Ley y en especial la relacionada con la necesidad de inscribir este acto escriturario en la Oficina de Registro correspondiente en el termino de SESENTA (60) días, contados a partir de la firma de la presente escritura y su incumplimiento acarreará intereses por mes o fracción. El Notario lo autoriza y da fe de ello.-----

DERECHOS NOTARIALES \$ 55.689 DCTO: 0188/2013 . RES. 0691/2019.

RECAUDO POR IVA \$ 28.327 DCTO 397/ 1.984.- ART. 4.-

FONDO: \$ 9300 SUPER: \$ 9300

RETENCION: \$120.000 DECRETO 2509/85

Esta escritura se extendió en el papel notarial número Aa059371178, Aa059-371177, Aa059371176, Aa059371175. TODO LO ESCRITO EN LETRA DIFERENTE SI VALE.-----



República de Colombia



A059371175

Ce319071098

EL VENDEDOR


Miguel Angel Montes
MIGUEL ANGEL MONTES
c.c. 4439070
Tel. 320343674
Dir. *guemaldas*
Act. Económica: *agropecuaria*

EL COMPRADOR

Jhon Jairo Hernandez Cuellar
JHON JAIRO HERNANDEZ CUELLAR
c.c. 17677072
Tel. 3203430614
Dir. *calle 16 con Cra 10.*
Act. Económica: *Comercio*

LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA

[Firma]
YANETH OSSA SUAREZ



A059371175

Ce319071098



10775241144V001

16-11-18

16-11-18

16-11-18

Cadencia 07-03-19

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el notario.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAZA Nit 891.180.191-2		 Libertad y Orden
	CERTIFICACIÓN		
Fecha : 17/02/2011	Versión: 2	Código: F4-GD13-01-001	Página 1 de 1

Suaza Huila, 07 Mayo 2019

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que en la base de datos del impuesto predial del Municipio de suaza Huila figura un predio con la cedula catastral 417700002000000010109000000000 y anterior 000200010109000 a nombre de DOUGLAS DURAN SILVA, con cedula de ciudadanía No 7692239

Dirección: SAN ISIDRO

Extensión: 11 HAS 0 M2 0 AC

Avaluó: \$ 14.511.000

Este predio Se encuentra a **PAZ Y SALVO** en la Secretaria de Hacienda del lugar, con vigencia hasta treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil Diecinueve (2019).


KARLA YADIRA TRUJILLO OCHOA
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaborado por: Apoyo Secr. de Hacienda	Revisado por: Secretaria De Hacienda	Aprobado por: Secretaria De Hacienda
Nombre: Ivonne S Rojas Orozco	Nombre: Karla Yadira Trujillo Ochoa	Nombre: Karla Yadira Trujillo Ochoa
Firma:	Firma:	Firma:



"CON TODOS EN ALIANZA, SUAZA AVANZA"
 Calle 7ª No. 3 - 07. Telefax 8324036 - Código Postal: 416080
www.suaza-huila.gov.co / Email: alcaldia@suaza-huila.gov.co

556



Ca310071097

40

FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1971

TULUA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

20-ABR-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-4400100-00174852-M-0017647042-20090903

0015666408A 2

8100000469

República de Colombia

Este documento es una copia de un documento original emitido por el Registrador Nacional.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17 MAR 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.647.042

HERNANDEZ CUELLAR

APELLIDOS

JHON JAIRO


NOMBRES

Jhon Jairo Hernandez Cuellar

FIRMA



Ca310071097



Cadencia SA. No. 0000000000 07-03-18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÓDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.939.070**
MONTES

APellidos
MIGUEL ANGEL

NOMBRES

Miguel Amontes

FIRMA



IDENTIFICACION PERSONAL
CÓDULA DE CIUDADANIA
Escriba en este espacio los datos de su identificación personal
Nombre y Apellido: **MIGUEL ANGEL MONTES**
Fecha de Nacimiento: **26-NOV-1960**
Lugar de Nacimiento: **SUAZA (HUILA)**
Escriba en este espacio los datos de su identificación personal
Fecha y Lugar de Expedición: **04-NOV-1981 SUAZA**
Escriba en este espacio los datos de su identificación personal
Escriba en este espacio los datos de su identificación personal

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1960**
SUAZA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-NOV-1981 SUAZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIEL GARCIA TORRES

DOCUMENTO *Primera* 609
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
FOLIO *Primo 2012* 5
DE DOMICILIO *antecedente*

VALIDEZ HASTA **2018**
RENOVABLE

21 MAY 2018



A: 1907600-00254330-M-0004939070-20100907

0023808607A 2

33584044

[Handwritten signature]

ANEXO 3. DOCUMENTACION LEGAL CANTERA

**RESOLUCION No. 2627
(6 de Diciembre de 2011)****POR LA CUAL SE APRUEBA E IMPONE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A
ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE**

El Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99/93; el Decreto 2820 de 2011 y las otorgadas por la Dirección General según Resolución No. 434/05 y

CONSIDERANDO

Que entre el INGEOMINAS Y LA CORPORACION se suscribió el convenio No. 026 del 25 de Noviembre de 2010, cuyo objeto es : *"Realizar las acciones técnicas y administrativas encaminadas a definir la viabilidad ambiental de las solicitudes de legalización relacionadas en el listado adjunto, el cual hace parte integral del presente convenio , ubicadas en el departamento de Huila, en los términos establecidos por el artículo 10º del Decreto 2390 de Octubre 24 de 2002, reglamentario del artículo 165 de la Ley 685 de 2001, con el fin de lograr que dichas explotaciones mineras sean viables desde el punto de vista ambiental"*.

Que en cumplimiento al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 026 de Noviembre 25 de 2010, la CAM suscribió con la empresa SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS LTDA. S.G.I. LTDA el contrato para la Elaboración de Ocho (08) Planes de Manejo Ambiental y Una (01) Visita de Evaluación para la Legalización de la Minería de Hecho

Que mediante radicado No. 83988 de septiembre 28 de 2011, la Empresa S.G.I LTDA, presenta ante la CAM, el Plan de manejo Ambiental-PMA de la Solicitud de Minería de Hecho No. FLV- 082, para la Explotación de Materiales de Construcción a nombre de ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE, ubicada en jurisdicción del municipio de Tesalia, Departamento del Huila.

Que mediante Auto No. 051 del 03 de Noviembre de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena dio inicio al trámite de la solicitud de aprobación e imposición del Plan de Manejo Ambiental PMA, de la Minería de Hecho No. FVL 082, para la explotación de Materiales de Construcción a nombre de ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.895.027, ubicada en Jurisdicción del Municipio de Tesalia, Departamento del Huila.

Que en cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena practicó la visita de verificación cuyo informe fue expedido el día 25 de noviembre de 2011, del cual se extracta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1 560

Fecha: 10 Dic 07

El proyecto consiste en la explotación un yacimiento de Materiales de Construcción localizado en la vereda Espinal, jurisdicción del municipio de Tesalia, departamento de Huila con una extensión de 53,7993 hectáreas, comprendidos en una única zona de acuerdo al área solicitada en la legalización minera FLV-082 y delimitación del área de explotación. El área otorgada esta alindada así: PUNTO ARCIFINIO: Localizado en las siguientes coordenadas (ver figura de ubicación):

Norte: 761.625,8

Este: 1.161.448,8

ALINDERACION DEL AREA SOLICITADA

PUNTO	NORTE	ESTE
PA - 1	761.625.80	1.161.448.80
1 - 2	760.221.00	1.160.891.00
2 - 3	760.542.00	1.160.147.00
3 - 4	759.852.00	1.159.916.00
4 - 1	759.597.00	1.160.566.00

ASPECTOS DEL PROYECTO. El proyecto consiste en la explotación de materiales de construcción mediante las siguientes actividades

SISTEMA DE EXPLOTACION

Clase de Minería. La clase de minería que se desarrolla en este sector es de cielo abierto.

Método de Explotación. El sistema de explotación de material por franjas paralelas, consiste en la extracción de material, mediante la utilización de retroexcavadora oruga; Para la conformación de las franjas, se localiza la playa, la orientación (largo y ancho) se deduce determinando un alineamiento perpendicular a la dirección preferencial del flujo hidráulico

Una vez orientadas las piscinas y el canal intercomunicador, se debe desarrollar la secuencia de extracción del material que contiene la franja, posicionando la retroexcavadora en la parte más septentrional de las playas con frente de avance hacia la parte más meridional de la misma siguiendo el orden de las piscinas y construyendo el canal en forma simultánea, realizando el avance extractivo hacia aguas arriba (como aparece en el mapa minero del capítulo-2 del PMA presentado para la realización de las labores en los frentes actuales y futuros.

Como desarrollo del método de explotación se plantea un diseño de franjas que permite un



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

Fecha: 10 Dic 07

501

aprovechamiento racional del yacimiento, un manejo de los tiempos de explotación y una intervención mínima en el terreno

Para la explotación del material conservará como mínimo 5.0 m de distancia entre las orillas del lecho del cauce del Río, esto con el fin de disminuir los niveles de turbidez del agua y el bajar los sólidos suspendidos, y conservar el recurso Agua con alteración lo menor posible

La secuencia y dirección de la explotación se hará de tal manera que genere el menor número de impactos negativos sobre el cauce, sin exponer la integridad física del personal, ni poner en riesgo de pérdida de la maquinaria. Se conservará el encauzamiento actual, manteniendo el equilibrio hidráulico y la dinámica fluvial.

DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LAS LABORES MINERAS A CIELO ABIERTO

Vías de Acceso. La vía de acceso desde la zona de explotación hasta la carretera principal está en regular estado debido a la temporada invernal que se presento, es necesario realizarle mantenimiento con el fin de minimizar los tiempos para entrar y salir a la zona de explotación

Labores de desarrollo y preparación

Estas labores para el tipo de explotación que se realiza son principalmente las vías de acceso al frente de explotación, la cual ya se encuentra operativa, en buen estado, adicionalmente se realiza la limpieza en el sector de trabajo, por que el Río en sus crecientes deposita mucho material vegetal.

Labores de Explotación

La explotación se realiza con retroexcavadora, consiste en arrancar el material de una vez que el material se arranca del frente es cargado a la volqueta que lo transporta en los sitios de consumo

La explotación se desarrolla bajo los siguientes criterios:

COTAS DE PROFUNDIZACIÓN:	Hasta 1,5 m.
COTA DE NIVEL FREÁTICO:	Entre 0,9 y 1 m.
PROFUNDIZACIÓN A PARTIR DEL NIVEL FREÁTICO:	Hasta 1 m.
DIRECCIÓN DE FRENTES DE AVANCE:	Sur y Sureste
DIRECCIÓN DE AVANCE LATERAL:	E-W ó W-E
VOLUMEN A EXPLOTAR	2.500 m ³ /mes
DIMENSIONES DE LA FRANJA	35m. Largo por 6 m
Ancho.	

Secuencia de labores de extracción

1. Identificar los playones con base en el levantamiento topográfico, como aparece en el mapa minero, definir los sectores de explotación.
2. delimitar los playones al sistema de explotación de interés y establecer el sentido de la explotación.
3. Respetar las distancias de conservación ambiental (lamina de agua del cauce



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

Fecha: 10 Dic 07

512

permanente y zonas de transición entre el espejo de agua y las franjas proyectadas)

4. Realizar la explotación continua en forma secuencial y ordenada conforme se ha planteado en el mapa minero.
5. Dirección del frente de avance será SE (aguas abajo - aguas arriba) y Dirección del avance lateral será: WE - EW
6. Controlar la dimensión y profundidad de explotación hasta 1.5 metros de profundidad.
7. La secuencia extractiva de material, se efectuará de aguas abajo hacia aguas arriba, con el fin de tener bajo control la seguridad del personal antes posibles crecientes
8. Una vez terminadas las labores de extracción del material de los playones se realizará la limpieza de los materiales extraños al cauce

Ciclos de Trabajo

Conforme a los niveles de producción que se tienen para el desarrollo del presente proyecto, se trabaja en un solo turno en el que la maquinaria es la que realiza labores de adecuación, extracción y cargue de los materiales de construcción. Con la proyección de producción de 2,500 m³ mensuales se espera que diariamente se haga la operación para 100 m³ en los que la maquinaria arrancara y cargara 10 viajes de volqueta con capacidad de 10 m³

Personal

TURNO	ACTIVIDAD	H T	OBSERVACIONES
UNICO TURNO LABORAL 8 A.M. A 4 P.M.	Arranque y Cargue	2	En la zona definida realizar la extracción y cargue en la volqueta.
	Administración	1	Supervisa las actividades mineras y lleva un permanente control del proyecto.
	Celaduría	1	Vigilar todo el sector de explotación
	TOTAL PERSONAL	4	En toda la explotación

Operaciones básicas

Para el proyecto las operaciones básicas que se llevan a cabo son las siguientes, teniendo en cuenta la ubicación de la mina, la facilidad de extracción del mineral, las vías de acceso



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

563

Fecha: 10 Dic 07

existentes y los equipos a utilizar:

- **Descapote:** La capa vegetal que se presenta en la zona de explotación es casi nula. Se espera a futuro lograr recuperar la vegetación nativa que fue afectada por la avalancha que se presento en el año 2.008 por el Río Páez
- **Arranque.** Se llevará a cabo por medio de maquinaria, consiste en aprovechar la disposición y la consistencia de las arcillas desprendiéndola con el brazo de la retroexcavadora de forma ordenada logrando bajar la pared frontal de la franja uniformemente hasta el piso de la misma

La capa vegetal que se presenta en la zona de explotación es casi nula. Se espera a futuro lograr recuperar la vegetación nativa que fue afectada por la avalancha que se presento en el año 2.008 por el Río Páez

- **Cargue.** Se espera que la maquinaria realice las labores de extracción a la par con las de cargue, teniendo en cuenta que la maquinaria con la que se hacen los trabajos es alquilada
- **Transporte.** Consiste en transportar el material desde la rivera del Río hacia los sitios de disposición final (obras de ingeniería ó depósito de materiales) La volqueta se desplazará hasta el sitio de explotación por la vía de acceso habilitada para ello. La volqueta se ubicará en reversa de modo que no tenga que maniobrar excesivamente para salir del área de explotación, ni deba internarse en aguas del Río. Para cargues consecutivos, la siguiente volqueta se ubicará lateralmente y por fuera de la franja de transporte (acceso) a una distancia de 10 m de la primera volqueta, facilitando así el desplazamiento del equipo cargado. Una vez se logre la capacidad recomendada,
- se procederá al cubrimiento del material con carpa y posterior transporte hasta el área de distribución o selección

Maquinaria

Las labores mineras se realizan con maquinaria que actualmente el solicitante alquila generalmente se ha realizado con una maquina CAT 416 Con capacidad de carga de 1 a 1,1 m³ de material de arrastre y con un brazo que puede bajar hasta los 3,5 m. y elevarse para el proceso de carga 3 m.

Las volquetas que normalmente llevan el material de construcción a los sitios de acopio o de disposición final son de 6 a 10 m³ las cuales realizan entre 10 a 17 viajes, dependiendo de la capacidad ya que no siempre son las mismas volquetas las que cargan. El tiempo de cargue esta en el orden de los 10 a 17 minutos.

Beneficio

Para esta solicitud de minería de hecho no se realizara ningún tipo de beneficio, ya que la totalidad de los materiales de construcción son vendidos en crudo, adicionalmente el titular ni ha contemplado la instalación de una planta de beneficio debido a su alto costo de inversión y la variabilidad del mercado que se presenta en el Municipio.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

Fecha: 10 Dic 07

564

AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA Y DE MANEJO (ZONIFICACIÓN DE ÁREAS)

- Revisado el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Tesalia el proyecto se desarrolla sobre terrenos con uso rural destinados a la actividad pecuaria, con mejoramiento de potreros semi-intensiva de tipo silvopastoril y de uso agrícola (compatible con el proyecto minero)
- De acuerdo a las áreas protegidas del departamento del Huila se establece que el proyecto no intervine zonas de exclusión para la minería.
- Una vez evaluado las condiciones físicas y sociales presentada en el proyecto se establece que el proyecto intervine las siguientes áreas (mapa de zonificación ambiental)
- **Zona de exclusión.** Comprende la ronda de protección de drenajes. En esta área no se permite ninguna actividad excepto el de protección ambiental y desarrollo de programas de reforestación
- **Zona Intervención con Restricción.** Corresponde al cauce del río Páez por el cual debe obtenerse el permiso de ocupación de cauce
- **Zona Intervención sin Restricción.** Corresponde a rastrojos, sector geotécnicamente estable. En esta área se permite la explotación de materiales de construcción.

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

En el cuadro siguiente se detallan los principales impactos ambientales generados por las actividades a los diferentes elementos ambientales.

FACTORES AMBIENTALES		Indicador	Probabilidad de Ocurrencia	Importancia	PREVENIBLE	MITIGABLE	CORREGIBLE	COMPEMSABLE
	ELEMENTOS							
CATEGORIA FÍSICA	SUELO	Remoción	Segura	Alta	Si	Si	Si	Si
		Erosión	Alta	Alta	Si	Si	Si	Si
		Contaminación	Baja	Alta	Si	Si	Si	Si
	AGUA SUPERFICIALES	Alteración de drenajes menores	Segura	Alta	Si	Si	Si	Si
		Calidad	Alta	Alta	Si	Si	Si	No
		Cantidad	—	—	-	-	-	-
	AIRE	Emisión de sólidos	Segura	Alta	No	Si	Si	Si



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

565

Fecha: 10 Dic 07

		Generación de ruidos	Segura	Alta	No	Si	No	Si
		Emisión de gases	Segura	Baja	No	Si	No	Si
CATEGORÍA BIÓTICA	FLORA	Remoción de capa vegetal	—	—	-	-	-	-
		Afectación de la vegetación arbórea	—	—	-	-	-	-
		Afectación de la vegetación arbustiva	—	—	-	-	-	-
		Desplazamiento de especies	Segura	Media	No	Si	No	Si
	FAUNA	Desplazamiento de especies	Segura	Media	No	Si	No	Si
CATEGORÍA SOCIO-ECONÓMICA	SALUD	Condiciones de salubridad	Segura	Alta	Si	Si	Si	Si
		Riesgos laborales	Segura	Alta	Si	Si	Si	Si
	EMPLEO	Generación de empleos temporales	Segura	Alta				
		Cambio de valor	Media	Alta				
	TIERRAS	Cambio de uso	Segura	Alta	No	No	No	Si
		Incentivo Industria	Segura	Alta				
	ECONOMÍA	Turismo	Alta	Media	No	Si	No	Si
		Paisajismo	Segura	Alta	No	Si	No	Si

Acciones que generan mayor impacto

1. Preparación-Adecuación vía acceso
2. Explotación - Arranque de material
3. Tráfico previsto vía principal y acceso

Acciones que generan impactos positivos

1. Fase de explotación. favorece el valor de los predios, empleo y mejoramiento de la red vial).

Factores ambientales más afectados

1. Calidad del aire por gases
2. Calidad del aire por ruido
3. Calidad del agua superficial
4. Seguridad industrial
5. Empleo
6. Red vial

Factores ambientales negativos

1. Calidad del agua por partículas en suspensión: durante el arranque del material.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

Fecha: 10 Dic 07

566

2. calidad del aire por gases: durante el arranque y transporte de materiales.
3. Calidad de aire por ruido: durante el arranque y transporte de materiales.
4. Calidad del agua superficial: durante el arranque del material.
5. Seguridad industrial: durante el arranque, transporte.

Factores ambientales positivos

1. Empleo: Durante la explotación.
2. Mejor acceso a servicios básicos: Durante la operación.

IMPACTOS POR COMPONENTES

Componente Hídrico. El impacto por la Sedimentación de la quebradas y drenajes

Componente suelo

- **Remoción y pérdida del suelo.** No se presenta impactos en este componente
- **Cambio en el uso del suelo.** Este impacto está referido a la alteración y pérdida de la capacidad de uso del suelo debido a la adecuación de las vías de acceso y a los frentes de explotación.
- **Activación de Procesos Erosivos.** Este impacto se generará por los movimientos de tierra asociados a la adecuación de las vías y al los frentes de explotación en general por la aceleración de los procesos erosivos.
- **Generación de Residuos Sólidos Domésticos.** Durante la fase de explotación los residuos sólidos que se generan serán de carácter doméstico procedente de los trabajadores que permanecen en el frente de trabajo.
- **Contaminación del suelo con grasas y aceite.** Provenientes de la maquinaria necesaria para el desarrollo minero

Componente aire

- **Generación de material particulado, gases e incremento en los niveles de ruido.**
 - Transporte de equipos, insumos y materiales. Debido a la combustión generada por los motores de los vehículos, así como por el levantamiento de partículas del tráfico de vehículos por los todas las vías de acceso (pavimentadas y destapadas).
 - Movimiento de tierra. Esta actividad genera principalmente levantamiento de emisiones de partículas por las distintas actividades inherentes al movimiento de tierras, tales como carga y descarga de material, excavaciones, etc.
 - Emisión de gases de combustión (CO, CO₂), asociadas al funcionamiento de la maquinaria y vehículos diesel.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

507

Fecha: 10 Dic 07

Componente biótico

Remoción y pérdida de cobertura vegetal. El principal grupo afectado será la avifauna identificada en el área de influencia del proyecto ya que la actividad se desarrolla en área de rastrojos bajos

- **Afectación sobre comunidades faunísticas.** Este impacto se genera por el tránsito constante de volquetas alterando el hábitat natural de la fauna.

Componente socioeconómico

Riesgo de Accidentalidad. Este impacto está asociado con el tráfico de vehículos por las vías, donde existe la posibilidad de ocasionar accidentes.

- **Generación de Empleo.** Este impacto está referido a la generación de puestos de trabajo durante el desarrollo de la actividad minera. La ocupación de mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, generando mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, lo que a su vez, se traducirá en una mejora en el nivel de vida de la población beneficiada. La contratación de mano de obra contribuirá a que se reduzcan los niveles de desempleo existentes; trayendo una mejora en la calidad de vida, en el bienestar de la población y en la economía local.
- **Mejoramiento de la infraestructura vial.** Este impacto se debe a que el continuo tránsito de los vehículos hacia y desde la mina incidirá en la decisión de su propietario para mejorar y mantener las condiciones actuales de la vía.

Componente paisajístico

La zona del proyecto conserva características naturales importantes en su composición; sin embargo, no se califica como una zona privilegiada visualmente. La zona tiene una presencia antrópica, lo que lleva al escenario a aceptar una nueva actividad con un diseño apropiado.

CONFLICTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS (BIOFISICOS Y SOCIOECONOMICOS)

Para el desarrollo del proyecto se identificaron los siguientes conflictos:

- **Conflictos biofísicos.** Las áreas de ronda de drenajes existentes
- **Conflictos sociales.** No se presentó o radicó ante la Corporación oposición de la comunidad asentada en el sector al desarrollo del proyecto minero.

DEMANDA DE RECURSOS

En el cuadro siguiente se detallan los recursos naturales necesarios para el proyecto



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1.

SLB

Fecha: 10 Dic 07

RECURSO NATURAL REQUERIDO	SI	NO	DESCRIPCIÓN
Aguas Superficiales		X	Para el desarrollo del proyecto no se requiere el aprovechamiento de este recurso.
Aguas Subterráneas		X	Para el desarrollo del proyecto no se requiere permiso de aprovechamiento de aguas subterráneas, por lo tanto no se requiere la perforar de ningún pozos para hacer captación de aguas dentro del área concesionada
Vertimientos		X	No se realiza ningún tipo de vertimiento de agua residual industrial ni doméstica en el area concesionada
Utilización de Materiales		X	No se prevé la compra de materiales pétreos para la adecuación y/o construcción de vías, tales como gravas y arenas. La compra de otros recursos necesarios para las obras relacionadas con construcción y adecuación de vías, campamento o áreas de servicios, cruces de fuentes, se realizará a proveedores de la región legalmente constituidos y que cuenten con los permisos ambientales y legales necesarios de llegar a ser necesario para el desarrollo del proyecto.
Ocupación de Cauces	X		Se solicita permiso para ocupación de cauces, por lo tanto se solicita la concesión de aguas superficiales en el río Páez aledaño al proyecto, la ocupación de cauce se realizara según lo descrito en el capítulo 2 del presente estudio. Para permitir el avance de las labores de explotación, estas serán solicitadas, mediante realización de los trámites respectivos ante la autoridad ambiental pertinente
Aprovechamiento Forestal		X	No se solicita permiso de aprovechamiento forestal para el área concesionada.
Emisiones Atmosféricas		X	De ser necesario se solicitará el permiso para la operación de los patios de acopio de mineral.
Manejo de residuos			Los residuos generados se manejarán de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación se enumeran las medidas de manejo ambiental propuesta por el solicitante así como también las medidas adicionales impuestas a manera de condicionantes.

MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS

En el cuadro siguiente se relacionan las medidas ambientales propuestas en el PMA. Las medidas ambientales impuestas serán descritas en la parte motiva de la presente Resolución.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1 569

Fecha: 10 Dic 07

PROGRAMA		FICHA DE MANEJO	
MEDIO ABIÓTICO			
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	2	Manejo de los cuerpos de agua	
	3	Manejo del material particulado y gases	
MANEJO DEL AIRE	4	Manejo del ruido	
	5	Manejo de aguas lluvias	
MANEJO DEL SUELO	6	Manejo de las aguas residuales domésticas, industriales y minera	
	7	Manejo de combustibles	
	8	Manejo del suelo	
	9	Control de la erosión	
	10	Manejo de la erosión y voladura	
	11	Manejo de Estériles y escombros	
	12	Programa de adecuación, construcción y manejo de vías	
	13	Manejo del Transporte y Señalización	
	14	Manejo de los Residuos sólidos	
	15	Manejo Paisajístico	
	16	Plan de Recuperación	
MEDIO BIÓTICO			
MANEJO DE LA FLORA Y LA FAUNA	17	Compensación Forestal	
	18	Manejo de la fauna	
	19	Programa de Protección y conservación de hábitats	
	20	Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas con algún grado de vulnerabilidad ambiental	
MEDIO SOCIOECONÓMICO			
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL	21	Información y participación comunitaria	
	22	Educación ambiental	
	23	Fortalecimiento institucional	
	24	Arqueología preventiva	
	25	Contratación de la mano de obra	

Que de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA es competente para aprobar el Plan de Manejo Ambiental.

Que el funcionario comisionado para el análisis de la solicitud con base en la visita técnica realizada al proyecto y al estudio de impacto ambiental presentado, otorga concepto favorable para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA para la exploración de materiales de construcción, localización de la Minería de Hecho No. FLV 082 e imponerlo para su cumplimiento al señor ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE.

Que el concepto técnico de fecha 25 de Noviembre de 2011, es el fundamento para que esta Subdirección en virtud de las facultades otorgadas por la Dirección General según Resolución



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1 570

Fecha: 10 Dic 07

No. 0434 del 5 de abril de 2005, y previo el cumplimiento de los requisitos legales, expida la Resolución que aprueba el Plan de Manejo Ambiental.

En consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), para la explotación de materiales de construcción, localizado en la vereda Espinal, jurisdicción del municipio de Tesalia (Huila), del proceso de legalización de la minería de hecho No FVL-082, e imponerlo para su cumplimiento al señor ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.895.027.

ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se aprueba por el término de la vigencia del contrato de concesión que la Autoridad Minera (INGEOMINAS) establezca en el proceso de legalización No FVL-082, desde la inscripción del Título minero en el Registro Minero Nacional (RMN). Se debe allegar a la Corporación copia del Título minero y el certificado del Registro Minero Nacional.

ARTICULO TERCERO: El Plan de Manejo Ambiental queda condicionado al área de explotación dentro del título minero para la Minería de Hecho No FVL-082.

ARTÍCULO CUARTO: En caso de terminar el contrato de Concesión y/o la Licencia Minera No FLV - 082 en forma anticipada por caducidad, renuncia, mutuo acuerdo o imposibilidad de ejecución, también terminará la vigencia del Plan de manejo Ambiental

ARTICULO QUINTO: El Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluye el permiso de ocupación de cauce del Río Páez.

ARTICULO SEXTO: Restringir la actividad minera dentro del área de la alínderación minera, autorizándose ambientalmente únicamente los frentes de explotación en el área establecida en el Programas de Trabajos y Obras - PTO, de acuerdo al Mapa Minero (secuenciamiento de Labores de Preparación y Explotación), el cual se encuentra inmerso en el capítulo-2 del PMA presentado

ARTICULO SEPTIMO: El aprovechamiento de los materiales quedará condicionado al sistema de explotación autorizado en programas de Trabajo y Obras (PTO) y lo contemplado en capítulo-2 del PMA presentado

ARTICULO OCTAVO: El Beneficiario ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE, se compromete a cumplir y establecer las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y las medidas adicionales impuestas a manera de condicionantes (referidas a continuación y en el concepto Técnico), además de cumplir con el programa de seguimiento y monitoreo establecido en el PMA y numeral 5.1 del mismo concepto. Además está obligado a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos adversos que



puedan surgir por las actividades del proyecto. Las medidas ambientales además de las propuestas la Corporación impone las siguientes:

MEDIDAS AMBIENTALES IMPUESTAS

- Compensación, Reforestación y recuperación de la zona.
 - Conservar permanentemente en todo el trayecto longitudinal del área de explotación la zona o ronda de protección de las quebradas y/o cauces existentes en el área de la alinderación y circundante del título minero y sus márgenes protectoras a ambos lados del cauce.
 - Debe realizar un programa de reforestación como compensación ambiental, consistente en una reforestación y mantenimiento con la siembra de 4000 plántulas de especies nativas de la región principalmente en las rondas de protección del río Páez, esta reforestación se realizara los primeros cuatro años (1000 plántulas por año) y con su mantenimiento hasta dos años.
- Manejo de material particulado y gases.
 - La ubicación del patio de acopio en sitios estratégicos que quede por fuera del área de influencia de las fuentes de emisión de polvo, utilizando como criterio básico la dirección dominante de los vientos.
 - Para el tránsito de vehículos (volquetas) se implementaran métodos de control de velocidad (se instalarán instrucciones y reductores de velocidad en la vía de acceso).
 - Los vehículos de transporte de materiales (volquetas) que salgan con el producto de los sitios o frentes de explotación, deberán cubrir la carga con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente y estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.
- Manejo de la Erosión.
 - Realizar el control de los efectos erosivos en la vía de acceso (canales y alcantarillas para el manejo de agua de escorrentía)
 - Realizar las obras de bioingeniería necesarias para el control de erosión en los taludes una vez el frente sea abandonado
 - Realizar la cobertura vegetal (gramíneas) con especies nativas de la región a medida que se vaya abandonando y/o profundizando los frentes.
- Manejo del Suelo.
 - Almacenar la cobertura orgánica previo descapote proveniente del frente de explotación de cantera, para posteriormente reutilizarlo en los taludes y bermas del frente de explotación en la fase de abandono.
 - Realizar la cobertura vegetal (gramíneas) con especies nativas de la región de los suelos para evitar su erosión.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1

572

Fecha: 10 Dic 07

- Para el almacenamiento de suelos se deben establecer pilas con formas apropiadas y ajustadas al espacio disponible, teniendo presente no acumular demasiado suelo en un mismo sitio, ya que con alturas excesivas en el suelo mas interior, se inhibe la capacidad de intercambio gaseoso y la posibilidad de conservar la microfauna, con lo cual su estructura y enriquecimiento orgánico se verían seriamente afectados por la generación de condiciones anaerobias.
- Hacer cerramiento de la pila e instalar una valla o señal informativa, en la cual se indique que se trata de suelo recuperado para actividades de restauración.
- Instalar canales perimetrales en las pilas para evitar su erosión

➤ Manejo de Hundimientos y/o deslizamientos

- Se deben identificar las filtraciones de agua hacia la mina y todas las posibles fallas geológicas existentes en el yacimiento, así como la resistencia de las rocas y el depósito mineral de interés, para predecir el comportamiento de los taludes.
- Se debe evitar la infiltración de las aguas subsuperficiales y superficiales hacia el yacimiento y su contacto con el material estéril y el depósito del mineral, ya que puede provocar saturaciones del terreno, generando desestabilización y procesos erosivos.
- Se debe hacer monitoreo trimestral a las geoformas naturales existente en el área con el fin de detectar indicadores de hundimiento o deslizamientos preventivamente.
- Prevenir la accidentalidad en zona minera mediante un programa óptimo de salud ocupacional y teniendo presente la normatividad vigente que exista en las labores de explotación minera.
- En los sitios en donde se detecten grietas superficiales se debe utilizar alguna técnica de sellamiento o cubrimiento utilizando material de limo o arcillas, telas impermeables o geotextiles, gravas y limos.

➤ Manejo de Vías. Durante la fase de operación se deberán hacer las siguientes acciones:

- Se deberá realizar todas las acciones y/ obras necesarias para el control de los procesos erosivos y estabilidad a largo plazo de la vía de acceso a la mina.
- Se debe proteger la vía de acceso con rellenos de material estéril firme, para evitar su erosión y la formación de cárcavas..
- El transporte de material deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción y demolición, y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. También se tendrá en cuenta la normatividad para emisión de material particulado y gases.
- Se mantendrá en constante mantenimiento el tramo del acceso hacia la mina y se harán las obras de control y mitigación necesarias para mantenerla estable geotécnicamente (control de erosión y fenómenos de remoción en masa).

➤ Manejo de Material Particulado y emisiones:



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1 573

Fecha: 10 Dic 07

- Durante los días que se realice el transporte de los materiales de los sitios de extracción hacia los lugares a utilizar, se procederá a realizar riego de la vías y/o accesos con agua al menos dos (2) veces al día a través de carrotanque, con sistema acondicionado para tal fin, principalmente en los sitios donde hay comunidad asentada a lo largo de la vía y/o acceso.
- Los vehículos de transporte de materiales (volquetas) que salgan con el producto de los sitios o frentes de explotación, deberán cubrir la carga con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente y estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.

➤ Manejo de Flora y Fauna.

- Establecer un programa de protección de la flora y fauna del sector mediante las siguientes medidas: Prohibir a los trabajadores las prácticas de tala, cacería o captura de animales en el área; Instalar tres (03) avisos prohibiendo la cacería y promulgando la conservación de los recursos naturales. Estos avisos se instalarán en predios de la mina con vista a la carretera principal y vía de acceso en el primer año; Adelantar anualmente una charla de concientización a los trabajadores de la mina, en donde se enuncie sobre las implicaciones y el valor que tiene la fauna y vegetación presente; Denunciar las practicas de quema y caza que se hagan en la zona.

➤ Manejo Plan de Gestión Social

Se debe ejecutar un plan de Gestión Social durante toda la fase del proyecto que promueva las relaciones armónicas. Este Programa es el eje conductor de toda la Gestión Ambiental, se basa en el principio de responsabilidad social empresarial y tiene como objetivo construir la sostenibilidad integral del proyecto. Las medidas que se deben contemplar para el plan de gestión social son:

- Programa de Información y participación comunitaria (conforme al Artículo 30 del 1728/02 del Minambiente) – Informar a la comunidad sobre los impactos ambientales generados y las medidas establecidas para mitigarlos, controlarlos y/o compensarlos
- Programa de educación ambiental (sensibilización y concientización) – capacitación anuales dirigido a las comunidades asentadas en la zona del proyecto y al personal vinculado al proyecto.
- Programa de fortalecimiento institucional.
 - Armonizar las relaciones internas, al igual que las externas con Alcaldías municipales en su área de influencia, el departamentos, la CAM, El INGEOMINAS y otras entidades del sector público y privado de interés
 - Buscar mecanismos de concertación entre la administración municipal, la comunidad y el proyecto minero; de tal forma que se aclaren las participaciones económicas, las responsabilidades, los deberes y los derechos
- Programa de contratación de mano de obra – haciendo énfasis y/o prioridad al personal local de la región.



- Divulgación de las necesidades de mano de obra que puedan ser cubiertas por personal de la zona. Tratar el tema de contratación de personal, en reuniones con la comunidad y con sectores organizados de la misma (Juntas de Acción Comunal, Cooperativas y otro tipo de organización local comunitaria). También es recomendable asesorarse de las autoridades locales y de la personería municipal.

➤ Manejo Plan de Educación Ambiental

La educación ambiental, es la base de una buena gestión ambiental, ya que facilita la planeación y ejecución del manejo ambiental y posibilita la disminución de los efectos negativos que puede generar el proyecto, desde la construcción y montaje de la obra, hasta su cierre y abandono. Por lo tanto, el proyecto minero, debe incluir un programa de educación ambiental, dirigido: a las comunidades asentadas en la zona del proyecto y al personal vinculado al proyecto consistente en:

- Cursos y/o charlas semestral de Concientización y educación ambiental, de todos los empleados relacionados directa o indirectamente con el proyecto y con la comunidad asentada en el área de influencia (anuales), para los cuales se debe tener en cuenta temas como:

- Normatividad legal ambiental
- Gestión Ambiental
- Importancia de los recursos naturales renovables sobre el paisaje regional y sus funciones ecológicas de beneficio
- Normatividad existente sobre participación ciudadana, metodología estratégica y herramientas que le permitan al minero interactuar adecuadamente con la comunidad.
- Importancia del cumplimiento ambiental.
- Consecuencias del incumplimiento ambiental y de una gestión y desempeño deficientes.

➤ Manejo Plan de Recuperación y abandono.

- Proceder con el modelado y estabilización de los taludes, para lograr una armonía morfológica acorde con el entorno fisiográfico e la implantación de una cobertura vegetal sobre los mismos.
- Revegetación general de la zona para su integración en el entorno.
- Retiro y/o eliminación de la maquinaria existente

Además está obligado a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos adversos que puedan surgir por las actividades del proyecto

ARTICULO NOVENO: El beneficiario se obliga a implementar el Plan de Contingencia Ambiental establecido en el PMA con acciones dirigidas a la disminución de los riesgos que atenten contra la integridad física del personal que labora en el área (una capacitación anual). Además se debe tener en cuenta las siguientes acciones:



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1 575

Fecha: 10 Dic 07

- Riesgos naturales: Capacitación en: Movimientos telúricos, Incendios forestales y Tormentas eléctricas.
- Riesgo por incendio
 - Capacitación del personal sobre manejo de combustibles, aceites y lubricantes
 - Diseño de un plan o ruta de evacuación en caso de emergencia
 - Señalización de áreas críticas (instalar mínimo 4 avisos).
- Riesgos Por Salud.
 - Se realizarán exámenes médicos a los trabajadores y ciclos de vacunación
 - Se dispondrá en la planta de un botiquín de primeros auxilios
 - Se dotará al personal de elementos básicos de protección personal como cascos, botas, guantes, mascarillas contra polvo y protectores auditivos
- Riesgos por accidentes.
 - Capacitación al personal en el uso adecuado de la maquinaria y equipo
 - Capacitación del personal en primeros auxilios
 - Disposición permanente de vehículos en la mina para el transporte de accidentes
 - Dotación en la mina de equipo de comunicación y de listado de centros de asistencia
 - Se tendrá un plan de evacuación para el caso de emergencias
 - Capacitación del personal sobre riesgos de temblor, inundaciones y otras emergencias
- Desarrollar un programa de seguridad, higiene y salud ocupacional dirigido a establecer normas de carácter preventivo para la convivencia en ambientes laborales seguros y protección al trabajador, contra peligros y disminución de riesgos que puedan desencadenar en accidentes generados por la dinámica misma del proyecto, a través de las siguientes acciones:
 - Dotación de todos los elementos básicos de protección personal como casco, botas, guantes, protectores auditivos, etc.
 - Capacitación (anual) y mejoramiento de las condiciones de seguridad personal dictando al personal cursos de primeros auxilios, manejo de extinguidores y control de incendios, mantenimiento de equipos, normas de seguridad minera en explotaciones, y manejo adecuado de explosivos
 - Elaboración de un reglamento de higiene y seguridad industrial
 - Afiliación de todos los trabajadores a un sistema de Seguridad Social a través de una Entidad Promotora de Salud (EPS) y al Sistema de Riesgos Profesionales
 - Elaboración e implementación de un panorama de riesgos (sitio de extracción).
 - Instalar seis (6) avisos en el área de maniobras de la explotación (frente, patio de acopio) alusivas a la seguridad industrial (preventivos, prohibitivos e informativos)

El beneficiario del Plan de Manejo Ambiental se compromete a cumplir y establecer las medidas de seguimiento y monitoreo establecidas en PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO propuesto en el Plan de Manejo Ambiental – PMA

ARTICULO DECIMO: El beneficiario de la legalización de la minería de hecho No FVL-082 deberá presentar a esta Corporación cada año, un INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL (ICA) que incluya análisis comparativo de los impactos ambientales previstos y los que se han presentado en la ejecución del proyecto, dificultades presentadas en la aplicación de las medidas de manejo ambiental y las medidas adoptadas para superarlas, ponderación de la eficacia de las medidas de manejo ambiental, análisis de los resultados de las medidas de



compensación, análisis de los resultados de los monitoreos realizados, incluyendo el análisis de resultados y conclusiones, comparando con la línea base presentada en los estudios ambientales, recomendaciones a la gestión ambiental del proyecto y balance de la gestión social desarrollada en el año anterior. Igualmente se informara sobre las contingencias que se presenten, de las cuales se llevara un registro mensual a esta Corporación. Para la elaboración del anterior informe se le recomienda a la empresa que se guíe por los ICA incluidos en el manual de seguimiento ambiental de proyectos elaborados por el Ministerio. Para efecto del cumplimiento al PMA la Corporación le realizara un seguimiento anual a la actividad y/o en el caso que la situación lo amerite

ARTICULO UNDECIMO: El beneficiario de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) deberá realizar las acciones, obras de control y mitigación por los impactos adversos que llegasen a surgir y/o a causar durante la explotación, estén considerados o no dentro del plan de manejo ambiental

ARTICULO DUODECIMO: El Plan de Manejo Ambiental (PMA) impuesto queda condicionado a los impactos ambientales adicionales a los ya identificados en el estudio y como resultado del seguimiento que realice la Corporación. Por consiguiente la Corporación podrá requerir la actualización y/o ajuste del estudio y la modificación del PMA cuando lo crea pertinente.

ARTICULO DECIMOTERCERO: En todos los casos de terminación del título o licencia minera, el beneficiario de la licencia ambiental estará obligada a hacer las obras y poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y frentes de trabajo.

ARTICULO DECIMOCUARTO: El beneficiario del Plan de Manejo Ambiental antes de iniciar la fase de desmantelamiento y abandono deberá presentar a la Corporación para su análisis y aprobación, y por lo menos con tres (3) meses de anticipación un estudio que contenga:

- La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase.
- El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes.
- Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono.
- Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación.
- Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Se debe obtener las servidumbres que necesite el proyecto antes de su intervención. Además las indemnizaciones a que haya lugar por el ejercicio de la servidumbre, así como las controversias que se susciten entre los interesados se regirán por las disposiciones del código civil y de procedimiento civil



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Versión: 1 *577*

Fecha: 10 Dic 07

ARTICULO DECIMOSEXTO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Resolución y en el concepto técnico No. 048 del 25 de Noviembre de 2011 además de las señaladas en el Código de Minas dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo proceso sancionatorio adelantado por la Autoridad Ambiental.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Notificar en los términos del Artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, el contenido de la presente Resolución al señor **ANUNCIACION TRUJILLO ANDRADE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.895.027, indicándole que contra esta procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO DECIMOOCCTAVO: El Beneficiario deberá publicar la parte resolutive de la presente Resolución en la Gaceta de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, requisito que se entiende surtido con el pago de los derechos de publicación correspondientes.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ALAIN HOYOS HERNANDEZ

Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental.

Sanchez/MC

Notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico: *anunciacion.trujillo@autoridadambiental.gov.co*

En la fecha: 09 Diciembre de 2011

A las 9:30 pm se presentó ante el Sr. Subdirector

Anunciación Trujillo Andrade

Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4895027

Se le notificó el contenido de la presente Resolución

Resolución No. 027 de

de 09 Diciembre 2011

[Firma]
BETIV C.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$$

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: a control group (C) and an experimental group (E). The control group received a standard treatment (C), while the experimental group received a treatment (E) that was designed to be more effective than the standard treatment. The results of the experiment are shown in the table below.

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in [1, 2], \quad f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in [2, 4].$$
[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the α -transition temperature of the polymer. The concentration of the polymer was 0.1 g/dl. The concentration of the polymer was 0.1 g/dl. The concentration of the polymer was 0.1 g/dl.

ATP

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

ARTICULO SEPTIMO. El presente Reglamento entrara en vigor el dia 1 de mayo de 1991.

PRINCIPAL INVESTOR: THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ART. 20. - REDAZIONE - La presente legge, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà osservata e osservata in tutte le sue parti.

1. The first of the two main parts of the report is a general survey of the situation in the country. This part is divided into two sections: the first section deals with the general situation, and the second section deals with the situation in the various regions of the country.

[illegible][illegible]



REPUBLICA DE CHILE - SERVICIO

COMPTROLLER GENERAL

VALPARAISO

1985

ARTICULO QUINTO: El presente Reglamento tiene vigencia a partir de la fecha de su promulgación, debiendo ser cumplido en todo lo que no se oponga a la Constitución y a las leyes.

ARTICULO SEXTO: El presente Reglamento es aplicable a los funcionarios públicos que desempeñen funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales que regulen el régimen de los funcionarios de carrera y de los funcionarios de confianza.

ARTICULO SEPTIMO: El presente Reglamento es aplicable a los funcionarios públicos que desempeñen funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales que regulen el régimen de los funcionarios de carrera y de los funcionarios de confianza.

PARAGRAFOS: El presente Reglamento es aplicable a los funcionarios públicos que desempeñen funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales que regulen el régimen de los funcionarios de carrera y de los funcionarios de confianza.

NOTIFICARE PARLORES Y CUMPLARE

RAMIRO OSORIO MARTINEZ



1985

Fecha de 23-12-2013

Hora: 11:50:41

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO		Expediente: FLV-082
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)		RMN: FLV-082
Vigencia Desde: Diciembre 23 de 2013	Hasta: Diciembre 22 de 2043	Fecha y Hora de registro: Diciembre 23 de 2013 11:50:00

TITULARES

TRUJILLO ANDRADE ANUNCIACION

IDENTIFICACIÓN

CC 4895027

AREA TOTAL: 53 Hectareas y 8109 Metros Cuadrados
 GENERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCION

MUNICIPIOS: PAICOL (HUILA)
 TESALIA (HUILA)

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA 1
 PUNTO ARCIFINIO: CENTRO ALCANTARILLA VIA TESALIA-NEIVA SOBRE EL ZANJON DEL AHORCADO
 NORTE: 761625,7900
 ESTE: 1161448,8200
 PLANCHA IGAC: 344

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
761625,7900	1161448,8200
760220,7550	1160890,7300
759597,0640	1160566,1280
759851,6090	1159915,5990
760542,0850	1160147,0550

ANOTACIONES

Anotación : 1
 Tipo Anotación : CONTRATO UNICO DE CONCESION
 Documento : CONTRATO
 Expedido por : PAR CENTRO
 Lugar : BOGOTA D.C.
 Especificación : INSCRIPCION CONTRATO DE CONCESION PARA LA EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION No. FLV-082 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM - Y ANUNCIACION TRUJILLO

Fecha Anotación: 23 de Diciembre de 2013
 Fecha Ejecutoria: 17 de Diciembre de 2013
 Número: FLV-082 Fecha: 17 de Diciembre de 2013

***** FIN DE ESTE DOCUMENTO *****



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

VICERREINADO DE COCHABAMBA Y TITULACIÓN
GERENCIA DE CATASTRO Y MANTENIMIENTO

Código de expediente ELV-082
 Código MTA ELV-082
 No. de folios Carta
 Tipo de documento Intención Carta de Concesión
 o instrumento destino Expte. para Carlos del m. m.
 Fecha 2012 12 23
Año Mes Día

No. de expediente

Procedimiento



Carlos Bravo

José Pineda



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO

IFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 1 de 13


PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO
EN EL TRAMO DE LA VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE
GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.**

CONTRATO 1354 DE 2022

**INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA EXTERNA 1364 DE 2022**

**GALLARDO, SUAZA
FEBRERO 2023**

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 2 de 13

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. ALCANCE	5
2. OBJETIVOS	5
3. RECURSO HUMANO	6
4. SEGURIDAD SOCIAL	7
5. INDUCCIONES A PERSONAL	8
6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	8
7. SEÑALIZACIÓN DE AREAS	9
8. INSTALACIÓN Y CONTROL KIT DE EMERGENCIAS	11
9. ACIDENTALIDAD/ENFERMEDAD LABORAL	13
9.1. Atenciones médicas en campo	13
9.2. Ausentismo por accidente laboral	13
10. HIDRATACION	13

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 3 de 13

ANEXOS

ANEXO 1. CHARLA- CAPACITACION

ANEXO 2. AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 3. INDUCCIONES

ANEXO 4. ENTREGA EPP

ANEXO 5. INSPECCION KIT EMERGENCIAS

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 4 de 13

INTRODUCCIÓN

FERNANDO JIMENEZ ROA suscribió con la Gobernación del Huila el Contrato 1354 de 2022 para el MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE LA VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

El presente informe mensual denominado "INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023, se realiza con el fin de reportar y dar a conocer la gestión adelantada en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se cuenta con la ejecución de actividades de verificación de las condiciones de seguridad en obra orientadas en la prevención y protección de los trabajadores con el fin de evitar y disminuir la ocurrencia de incidentes y accidente de trabajo y optimizar el bienestar del personal vinculado a la ejecución de actividades del contrato.

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 5 de 13

1. ALCANCE

El presente informe, corresponde al periodo comprendido entre el 01 febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 en el cual se consolidan las acciones desarrolladas en el marco de ejecución del área de la seguridad y salud en el trabajo.

2. OBJETIVOS

- Mantener actualizada la información referente a las actividades en campo por parte del FERNANDO JIMENEZ ROA en los temas de Seguridad y Salud en el trabajo
- Generar información verídica, confiable y completa con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos.
- Evidenciar el cumplimiento de las normas y requerimientos legales referente a las actividades ejecutadas por FERNANDO JIMENEZ ROA

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 6 de 13

3. RECURSO HUMANO

FERNANDO JIMENEZ ROA para la ejecución de sus actividades cuenta con el personal necesario para la ejecución de medidas de manejo en las diferentes actividades realizadas en el proyecto, a continuación, se relaciona el personal de obra vinculado a la fecha a FERNANDO JIMENEZ ROA:

Tabla 1. Personal vinculado

ITEM	TRABAJADOR VINCULADO	PROCEDENCIA	CARGO	INGRESO	RETIRO	OBSERVACIONES
1	FERNANDO JIMENEZ ROA	Garzón- Huila	DIRECTOR DE OBRA	02-2023	-	-
2	LEONARDO ANDRES RUIZ MALDONADO	Garzón- Huila	RESIDENTE DE OBRA	02-2023	-	-
3	FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	Garzón- Huila	INSPECTOR DE OBRA	02-2023	-	-
4	JAIRO QUIROGA PENAGOS	Garzón- Huila	TOPOGRAFO	02-2023	-	-
5	CARLOS HERRAN TRUJILLO	Garzón- Huila	CADENERO	02-2023	-	-
6	RUBEN JOVEN PEÑA	Gallardo- Suaza	CADENERO	02-2023	-	-
7	LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	Garzón- Huila	AMBIENTAL	02-2023	-	-
8	EDWINARLEY TOLEDO PAIBA	Garzón- Huila	OPERADOR	02-2023	-	-
9	SEBASTIAN POLO GOMEZ	Garzón- Huila	OPERADOR	02-2023	-	-
10	SEBASTIAN CLAROS	Garzón- Huila	CONDUCTOR	02-2023	-	-
11	LEONARDO PEÑALOSA RAMIREZ	Garzón- Huila	CONDUCTOR	02-2023	-	-
12	NATALIA ALEJANDRA DUARTE	Gallardo, Suaza	CONTROLADORA VIAL	02-2023	-	-

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Fecha:	28 de febrero de 2023
					No Informe:	01
					Periodo:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
					Página:	Página 7 de 13
13	LEONILDE DORADO	Gallardo, Suaza	CONTROLADORA VIAL	02-2023	-	-
14	DUNKAN VERGARA	Garzón, Huila	CONDUCTOR	02-2023	-	Relazó Actividades esporádicas durante el mes.




Durante este periodo se realizó charla- capacitación durante la jornada del día 24 de febrero (Ver Anexo 1. Charla- Capacitación).

4. SEGURIDAD SOCIAL

Todo el personal vinculado cuenta con afiliaciones (ARL, EPS, AFP). (Ver Anexo 2. Afiliaciones personales).

Tabla 2. Relación Seguridad Social

ITEM	TRABAJADOR VINCULADO	EPS	AFP	ARL
1	FERNANDO JIMENEZ ROA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	28 de febrero de 2023
			No Informe:	01
			Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
			Página:	Página 8 de 13


2	LEONARDO ANDRÉS RUIZ MALDONADO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
3	FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
4	JAIR QUIROGA PENAGOS	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
5	CARLOS HERRAN TRUJILLO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
6	RUBEN JOVEN PEÑA	ASMETSALUD	PORVENIR	POSITIVA
7	LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
8	EDWINARLEY TOLEDO PAIBA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
9	SEBASTIAN POLO GOMEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
10	SEBASTIAN CLAROS	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
11	LEONARDO PEÑALOSA RAMIREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
12	NATALIA ALEJANDRA DUARTE	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA
13	LEONILDE DORADO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA
14	DUNKAN VERGARA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA

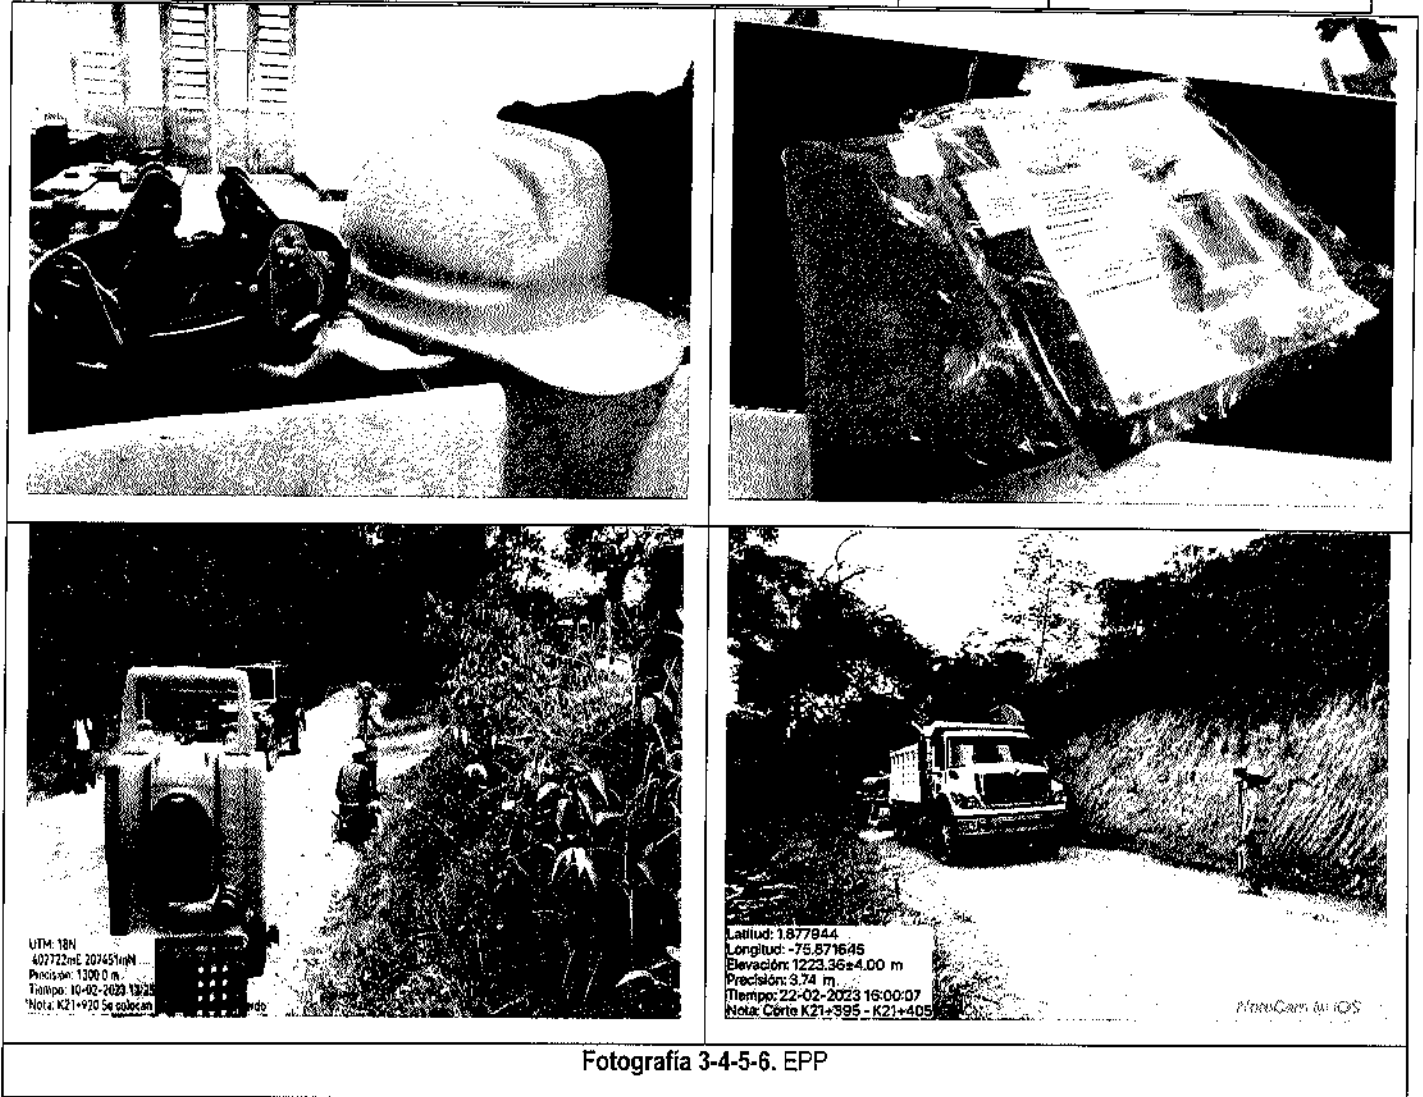
5. INDUCCIONES A PERSONAL

De acuerdo a la contratación se realizan las inducciones iniciales a cada trabajador, en donde se comunican las actividades que se realizarán durante la ejecución del contrato, los horarios de trabajo, los peligros y riesgos asociados a dichas actividades, la importancia del uso adecuado de dotación y EPP. (Ver Anexo 3. Inducciones)

6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante esta jornada se realizó entrega de elementos de protección personal (EPP). (Ver Anexo 4. Entrega EPP)

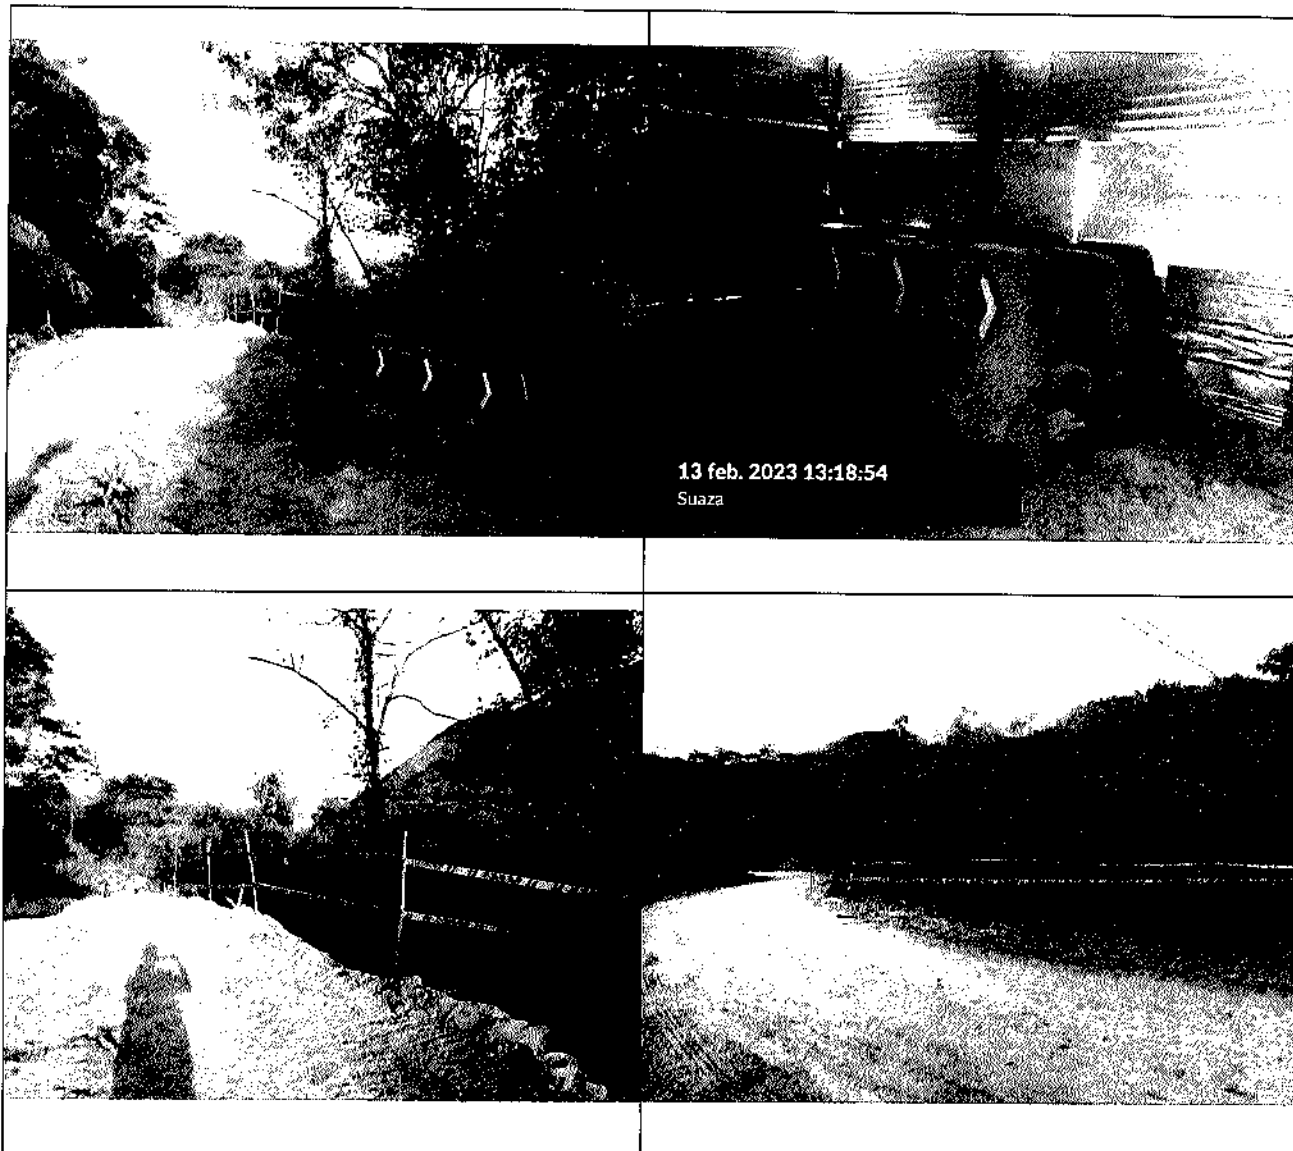
	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha:	28 de febrero de 2023
			No Informe:	01
			Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
			Página:	Página 9 de 13



7. SEÑALIZACIÓN DE AREAS

Durante este periodo se realizó la colocación de colombinas de señalización vial, cinta peligro y ubicación de maletines viales en las áreas intervenidas durante actividades de obra. Esta actividad se realiza diariamente cuando se requiere y finalizando la jornada laboral.

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 10 de 13

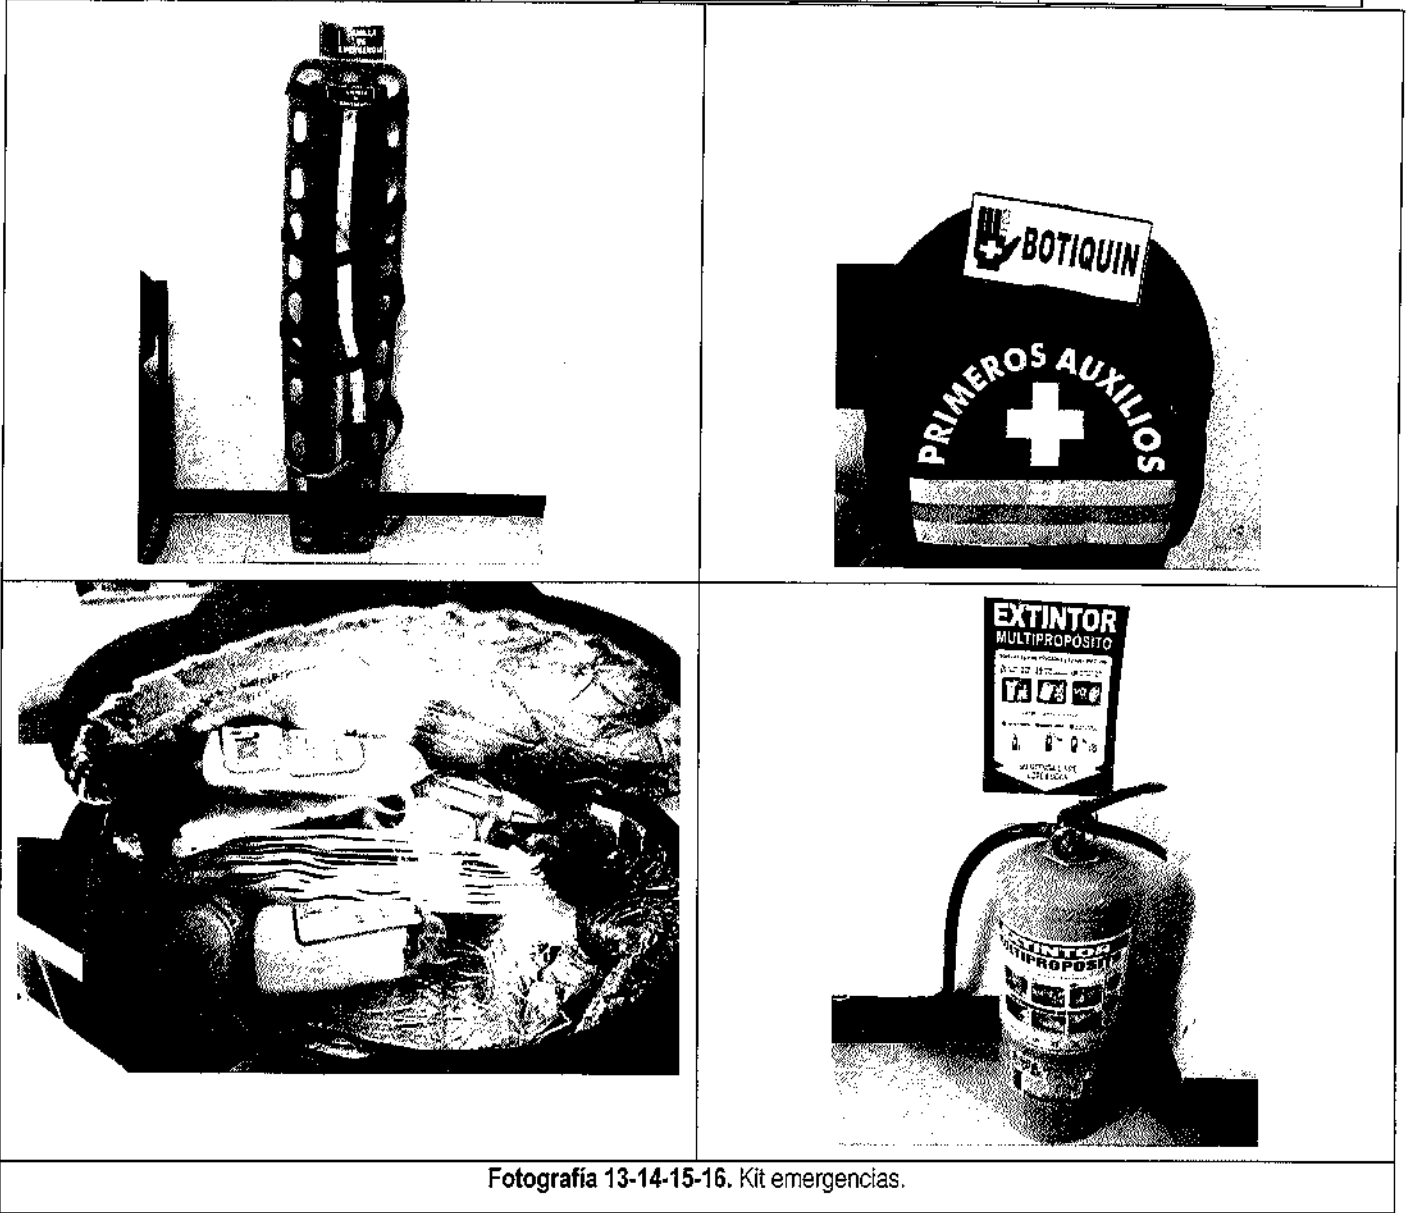


	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 11 de 13
			
		Fotografía 7-8-9-10-11-12. Señalización general en obra	

8. INSTALACIÓN Y CONTROL KIT DE EMERGENCIAS

Para el presente periodo se contó con Kit de Emergencias que estuvo ubicado inicialmente en oficina ubicada en Centro Poblado Gallardo debido a la no operatividad de sitio de campamento del contrato durante estos primeros días del contrato. Se realizará la reubicación de los mismos para la funcionalidad de dichos elementos en obra.

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 12 de 13



Fotografía 13-14-15-16. Kit emergencias.

	INFORME MENSUAL AVANCE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	28 de febrero de 2023
		No Informe:	01
		Período:	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
		Página:	Página 13 de 13

9. ACIDENTALIDAD/ENFERMEDAD LABORAL

Durante el periodo en mención no se presentó Accidente o enfermedad Laboral

9.1. Atenciones médicas en campo

Como parte de las actividades contempladas y de acuerdo con los lineamientos dados por la normatividad vigente durante este periodo no se realizaron atenciones médicas al personal

DIAGNOSTICOS	No. Casos
0	0
0	0
Total	0

9.2. Ausentismo por accidente laboral

No se presentó ausentismo laboral durante este periodo por accidente laboral

9.3. Ausentismo por enfermedad común

No se presentó ausentismo laboral durante este periodo por enfermedad común

10. HIDRATACION

Teniendo en cuenta el traslado del personal constantemente durante la jornada laboral por las actividades propias de la obra, se realiza durante el inicio de la jornada la entrega de hidratación (bolsas de agua) a cada uno de los operadores para almacenar en sus equipos, la comisión de topografía y controladoras viales cuentan con un termo de almacenamiento que movilizada de acuerdo a sus actividades programadas.



Fotografía 17. Hidratación

ANEXO 1. CHARLA- CAPACITACION



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ASISTENCIA Y PARTICIPACION

VERSION
001
CODIGO
SIG-TH-F-01
PAGINA
1 DE 1

TEMAS TRATADOS :

- Uso adecuado y obligatoriedad de Casco en obra (epps).
- Entrega hidratación
- Riesgos Asociados a la Actividad "Correr de talud / caída de roca."

TIPO DE ACTIVIDAD

- Reunión ☐
- Curso Capacitación ☐
- Entrenamiento ☐
- Reinducción ☐
- Inducción de Personal ☐
- Taller ☐
- Charla Capacitación ☒
- Charla Integral ☐
- Difusión ☐
- Charla EDT ☐
- A Integrantes ☐
- A Líderes Directos ☐

Hora de Inicio: 7:30 am

Hora Final: 8:00 am

Nº PARTICIPANTES: 11

DURACION (hrs.): 0.5 horas

LUGAR : Compendio

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	AREA	FIRMA
1.	Natalia Alejandra Cuello D	FJR	Controladora Val	Operativa	Natalia A Cuello
2.	Agro (Ch. Roca)	FJR	Topógrafo	OTR	FJR
3.	Gabriel Toledo	FJR	operador	operativa	Gabriel Toledo
4.	Sebastián J. J.	ATP	operador		Sebastián J. J.
5.	Sebastián J. J.	FJR	conductor	Via	Sebastián J. J.
6.	Sebastián J. J.	FJR	conductor	Via	Sebastián J. J.
7.	Ruben J. J.	FJR	conductor	Via	Ruben J. J.
8.	Carlos J. J.	FJR	conductor	Via	Carlos J. J.
9.	Carlos J. J.	FJR	conductor	Via	Carlos J. J.
10.	Fernando Jimenez	FJR	Inspector	Via	Fernando Jimenez
11.	LUIS TOLO (Guzmán)	FJR	MBIC 332	OPERATIVA	LUIS TOLO
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR : LUIS TOLO (Guzmán) CARGO : AMPIC 332 FIRMA : [Firma] FECHA : 24/02/23

 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION
		001
	ASISTENCIA Y PARTICIPACION	CODIGO
		SIG-TH-F-01
		PAGINA
		1 DE 1

TEMAS TRATADOS :	TIPO DE ACTIVIDAD
1. CONTROL VIAL 2. COMUNICACIÓN CONTROL VIAL 3. PERSONAL OPERATIVO	Reunión ☐ Curso Capacitación ☐ Entrenamiento ☐ Reinducción ☐ Inducción de Personal ☐ Taller ☐ Charla Capacitación ☒ Charla Integral ☐ Difusión ☐ Charla EDT ☐ A Integrantes ☐ A Líderes Directos ☐

Hora de Inicio: 7:00 am	Hora Final: 3:30 pm	Nº PARTICIPANTES: 1
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

DURACION (hrs.): 05 horas	LUGAR: COMPLETUM
----------------------------------	-------------------------

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	AREA	FIRMA
1.	María Alexandra Cullor	EXR	Controladora Vial	Operadora	María Alexandra Cullor
2.	Ignacio Roberto Vives	EXR	Controlador Vial	Operador	Ignacio Roberto Vives
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:	CARGO:	FIRMA:	FECHA:
USKATOLO	LIBERIAL	[Firma]	20/11/2012

ANEXO 2. AFILIACIONES

602



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
 Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
 Dirección: KR 7 9 47
 Departamento: HUILA Municipio: GARZON
 Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
 Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
 CC 12192340

Nombres y Apellidos del Usuario
 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 11	06/02/2023	CC 83182410	TOLEDO PAIVA EDWIN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_3_3_005

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

CEE79C45612C855D65AB79054E0FEF17

Certificado impreso el día 2/4/2023 9:42:02 AM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



El emprendimiento es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



603

EDWIN ARLEY

TOLEDO PAIVA
83182410

FERNANDO JIMENEZ ROA
12192340

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.176.043-7

CERTIFICA QUE:

EDWINARLEY TOLEDO PAIVA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **83.182.410**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes





NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 07/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5388835	07/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	83182410	EDWINARLEY TOLEDO PAIVA	1732828	OPERADOR DE CARGADORA,	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario **Nombres y Apellidos del Usuario**
CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 23	09/02/2023	CC 1077869634	VERGARA QUINTERO DUNKAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:35:49 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170.
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mi emprendimiento



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 338 7000**.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



DUNKAN

VERGARA QUINTERO

1077869634

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340

607

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 600.224.808-6

CERTIFICA QUE:

DUNKAN VERGARA QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.869.634**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023**DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA Municipio: GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
CC 12192340

Nombres y Apellidos del Usuario
FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 20	09/02/2023	CC 1075265954	POLO GUZMAN LAURA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:09:23 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170.
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

MinHacienda



610

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

LAURA NATHALIE

POLO GUZMAN

1075265994

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LAURA NATHALIE POLO GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.075.265.994**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400643	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1075265994	LAURANATHALIE POLO GUZMAN	1500000	INGENIERO AMBIENTAL	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
 CC 12192340

Nombres y Apellidos del Usuario
 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 25	09/02/2023	CC 1077859432	PEÑALOZA RAMIREZ LEONARDO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:41:34 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mi hacienda



614

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

LEONARDO FABIO**PEÑALOZA RAMIREZ**

1077859432

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.809-3

CERTIFICA QUE:

LEONARDO FABIO PENALOZA RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.859.432**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400676	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1077859432	LEONARDO FABIO PEÑALOZA RAMIREZ	1382828	CONDUCTOR VOLQUETA	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 13/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
 Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
 Dirección: KR 7 9 47
 Departamento: HUILA Municipio: GARZON
 Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
 Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
 CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 26	14/02/2023	CC 36288084	DORADO VIVEROS LEONILDE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

B63B2BAA8FFCDE0A9E51617F041C751B

Certificado impreso el día 2/13/2023 3:04:30 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCel PositivaColombia



El emprendimiento
 es de todos

Mimacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



LEONILDE

DORADO VIVEROS

36298084

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340

618



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5415516	13/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	36288084	LEONILDE DORADO VIVEROS	1160000	OBRAERO DE CONSTRUCCION	2023-02-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 13/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
 Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
 Dirección: KR 7 9 47
 Departamento: HUILA Municipio: GARZON
 Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
 Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
 CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 27	14/02/2023	CC 1004158514	CUELLAR DUARTE NATALIA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B63B2BAA8FFCDE0A9E51617F041C751B

Certificado impreso el día 2/13/2023 3:08:17 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros
 @PositivaCol
 PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



62

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

NATALIA ALEJANDRA

CUELLAR DUARTE

1004158514

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) CUELLAR DUARTE NATALIA ALEJANDRA identificado(a) con CC número 1.004.158.514 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de noviembre de 2022 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 13 de febrero de 2023.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com

10/02/2023 10:10



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5415497	13/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1004158514	NATALIAALEJANDRA CUELLAR DUARTE	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-02-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA ECONÓMICA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI Número de documento: 12192340 Cédula Usuario: CC 12192340
 Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
 Dirección: KR 7 9 47
 Departamento: HUILA Municipio: GARZON
 Correo electrónico: FERNANDJIMENEZROA@GMAIL.COM
 Teléfono: 8332529 Tarifa: 6.960
 Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario
 CC 12192340 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 22	09/02/2023	CC 1077966257	CLAROS ESPINOSA SEBASTIAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 5:33:52 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
 es de todos

Mi hacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



SEBASTIAN

CLAROS ESPINOSA


1077868257

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340

625

626



porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SEBASTIAN CLAROS ESPINOSA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.866.257**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400855	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1077866257	SEBASTIAN CLAROS ESPINOSA	1382828	CONDUCTOR VOLQUETA	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento: NI **Número de documento:** 12192340 **Cédula Usuario:** CC 12192340
Nombre: FERNANDO JIMENEZ ROA
Dirección: KR 7 9 47
Departamento: HUILA **Municipio:** GARZON
Correo electrónico: FERNANDOJIMENEZROA@GMAIL.COM
Teléfono: 8332529 **Tarifa:** 6.960
Actividad Económica: 5411101 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METALICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario
 CC 12192340

Nombres y Apellidos del Usuario
 FERNANDO JIMENEZ ROA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 19	09/02/2023	CC 1077873988	POLO GOMEZ JUAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

A2229CA9E9A64FDF015AD303D57E15CF

Certificado impreso el día 2/8/2023 11:01:31 AM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
 Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Mihacienda



629

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

JUAN SEBASTIAN

POLO GOMEZ

1077873988

FERNANDO JIMENEZ ROA

12192340



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 09/02/2023, el empleador FERNANDO JIMENEZ ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12192340 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5400496	09/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1077873988	JUANSEBASTIAN POLO GOMEZ	1500000	OPERADOR DE CARGADORA,	2023-02-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIAN POLO GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.077.873.988, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 27 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ANEXO 3. INDUCCIONES



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ASISTENCIA Y PARTICIPACION

VERSIÓN

001

CODIGO

SIG-TH-F-01

PAGINA

1 DE 1

TEMAS TRATADOS :

Inducción general
actividades / riesgos asociados
operaciones / procedimientos FJR

TIPO DE ACTIVIDAD

- Reunión ☐
 Curso Capacitación ☐
 Entrenamiento ☐
 Reinducción ☐
 Inducción de Personal ☒
 Taller ☐
 Charla Capacitación ☐
 Charla Integral ☐
 Difusión ☐
 Charla EDT ☐
 A Integrantes ☐
 A Líderes Directos ☐

Hora de Inicio: 1:30 PM

Hora Final: 4:00 PM

Nº PARTICIPANTES: 10

DURACIÓN (hrs.): 2.5 horas

LUGAR : Oficina 647001

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	ÁREA	FIRMA
1.	Edwin Orley Tieda	FJR	operador	operativo	[Firma]
2.	Sebastian Polo Gomez	FJR	operador	operativo	[Firma]
3.	Jairo (Puro) G.D.	FJR	Topógrafo	operativo	[Firma]
4.	Sebastian claud G.	FJR	conductor	operativo	[Firma]
5.	Ruben Joven	FJR	conductor	operativo	[Firma]
6.	Carlos J. Hernandez	FJR	conductor	operativo	[Firma]
7.	Fernando Jimenez	FJR	Inspector	operativo	[Firma]
8.	Leonardo penolosa	FJR	conductor	operativo	[Firma]
9.	Natalia Alexandra Beltrán	FJR	Administrativa	operativa	[Firma]
10.	Leonilde Claudio	FJR	Controlador	operativa	[Firma]
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

NOMBRE DEL INSTRUCTOR :

CARGO :

FIRMA :

FECHA :

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Febrero 4/23

ANEXO 4. ENTREGA EPP


**ANEXO 4. ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS CORTE
DE TALUD**

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VICINIDAD		CÓDIGO MASPS-MM-IN-3-FR-4
	VERSIÓN 1	PÁGINA 1 DE 5	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vicinidad de Seguimiento	FECHA 13 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			
2. DATOS DEL PREDIO			
Ubicación:	Departamento HUILA	Municipio SUAZA	Vereda GALLARDO
Dirección	N/A		Teléfonos -
Nombre de la persona que atiende la visita: CC No. -			
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: CC No. -			
Edad de la construcción	-	No. de Apartamentos	-
No. de Hogares	-	No. total residentes	-
Niños (menores de 14 años)	-	Adultos mayores (más de 60 años)	-
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. SI; 2. No			
PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Acueducto	SI	NO	Observaciones del estado de las redes: No se logró establecer si la vivienda cuenta o no con la totalidad de los servicios públicos
2. Alcantarillado			debido a que durante los días de visita no se encontró residentes de la vivienda que alendaran la visita para el levantamiento del acta de vecindad.
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
7. Otros			Cuál?
DESTINACIÓN ECONÓMICA			
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salud	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐
ACCESOS VEHICULARES			
		Garaje	SI ☐ NO ☒
		Uso del garaje:	

Firma 	Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoria	Nombre: Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
C.C. O NIT:	
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vicinidad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	

64

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO MASPS-MIN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA 13 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Callosos 5. Concreto ciclópeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro,Cuál?		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cerchas metálicas 6. Entramado en madera 7. No aplica 8. Otro,Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente 4. Prefabricados en concreto 5. Mampostería confinada 6. Mampostería reforzada 7. Mampostería no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Muros en bahareque 12. Muros en tapia pisada 13. Muros en adobe 14. Muro en concreto 15. Construcción improvisada 16. Mixto 17. Otro,Cuál?	
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		TIPOLÓGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro,Cuál? GUADA		1. Reformas (sí / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 8. Otro,Cuál?		1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro,Cuál?	
Observaciones: DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA.					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO		ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO	
GRIETAS FISURAS		X HUMEDAD		BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCIÓN VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA FACHADA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CON REPELLO, SE EVIDENCIAN FISURAS A LO LARGO DE ESTA					
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:					
GRIETAS FISURAS		X HUMEDAD		BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCIÓN VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE LA VIVIENDA CUENTA CON UN SITIO DESTINADO A JARDIN O UN TIPO DE ALMACENAMIENTO					
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:					
GRIETAS FISURAS		X HUMEDAD		BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCIÓN VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EL ACCESO A LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN TIERRA PARA EL INGRESO DE POR LO MENOS MOTO, EL ANDEN DE APROXIMADAMENTE 50 CM ES EN CONCRETO Y PRESENTE ALGUNAS FISURAS					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA EMBALADA POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA CERCA VIVA		BUENO MURO	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCIÓN VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE ESTA VIVIENDA NO CUENTA CON CERRAMIENTO PERIMETRAL					


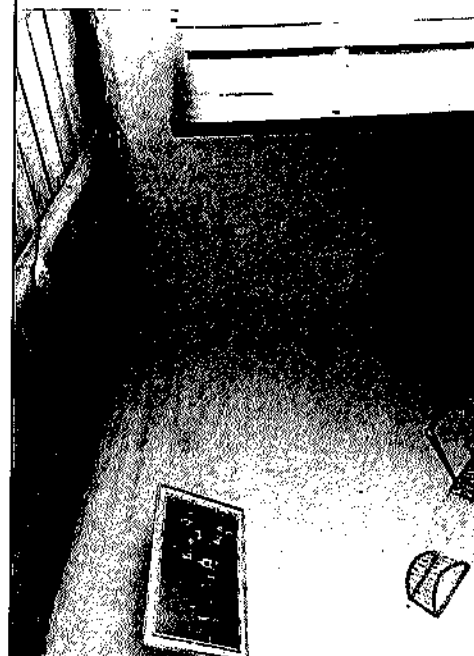
	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASS-MN-IN-3-FR-4	
			VERSION	1			
			PÁGINA	4 DE 5			
			FECHA		(Día / Mes / Año)	13 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.3 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL 10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de		Inicio	Sequitentlo
				6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
							
							
Notas:							
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.							
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.							
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.							

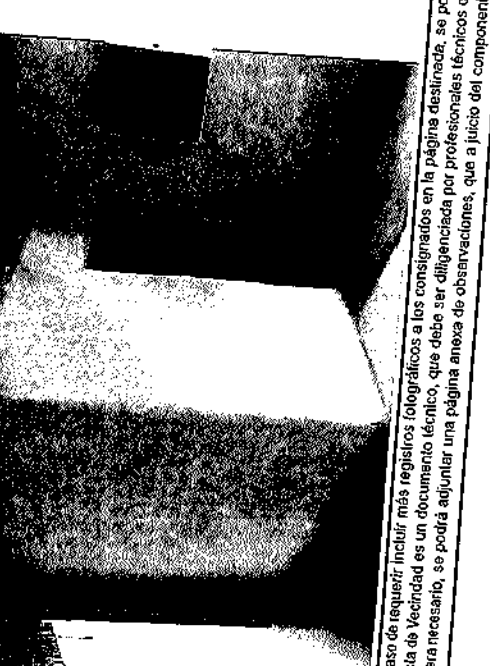
	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMENEZ ROA			PÁGINA	5 DE 5
	ACTA DE VECINDAD			FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inició	Sequitó	(Día / Mes / Año)
					13 FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN					
<div style="border: 1px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div>					
VIA _____					
FIRMAS					
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O.NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Original: Contratista, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIRENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		VERSIÓN	1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento		PÁGINA	1 DE 3
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO			
				Ubicación: Departamento: HUILA Municipio: SUAZA Vereda: GALLARDO PR: 21+118 MI			
				Dirección: N/A		Teléfonos: 3235754521	
				Nombre de la persona que atiende la visita: AMPARO JOVEN		CC No. 26,542,351	
				Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
				Nombre del responsable / propietario de la construcción: ALCELMO ZAMBRANO CABRERA		ICC No.	
				Edad de la construcción: 20		No. de pisos: 1	
				No. de Hogares: 1		Mujeres jefes de hogar: 0	
				Niños (menos de 14 años): 0		Personas en situación de discapacidad: 0	
				CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural		RURAL	
				ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3	
				CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. Si; 2. No		2	
				PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano; 2. Ordeñado; 3. Escarpado		1	
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				Observaciones del estado de las redes: LA VIVIENDA CUENTA PARA SUS AGUAS RESIDUALES CON POZO SEPTICO			
				1. Acueducto		SI NO	
				2. Alcantarillado		X	
				3. Energía		X	
				4. Gas		X	
				5. Teléfono		X	
				6. Televisión cable		X	
				7. Internet		X	
				8. Otros		X	
				DESTINACIÓN ECONÓMICA			
				1. Residencial		X	
				2. Comercial		X	
				3. Industrial		X	
				4. Minero		X	
				5. Agropecuario		X	
				6. Recreacional		X	
				7. Educativo		X	
				8. Salud		X	
				9. Cultural		X	
				10. Religioso		X	
				11. Institucional		X	
				12. Otro		X	
				ACCESOS VEHICULARES			
				Garaje		SI NO	
				Uso del garaje:		X	

Firma: Amparo Joven		Firma: [Signature]	
Nombre: Amparo Joven		Nombre: [Signature]	
Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría	
Matrícula profesional No. 26542351		Matrícula profesional No. [Signature]	
C.C. O HIT:		C.C. O HIT:	
Notas:		Notas:	
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.	
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	


	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD		CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4		
			VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2 DE 7			
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vejidad de	Inicio Seguimiento	FECHA (Día / Mes / Año)	
				13	FEBRERO 2023	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL						
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		IRREGULARIDAD EN PLANTA		
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Irregularidad alta		
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Irregularidad media		
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Irregularidad baja o inexistente		
4. Caissons		4. Vigas metálicas				
5. Concreto ciclopeo		5. Cerchas metálicas				
6. Pilotes		6. Enframado en madera				
7. Placa de cimentación		7. No aplica		IRREGULARIDAD EN ALTURA		
8. No identificada		8. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta		
9. No existe				2. Irregularidad media		
10. Otro, Cuál?				3. Irregularidad baja o inexistente		
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION		
1. Placa en concreto		1. Reformas (si / no)		1. Edificaciones con reforzamiento especial		
2. Placa en Steel deck		2. En altura: No. de pisos adicionales		2. Edificaciones reforzadas		
3. Estructura metálica y leja		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		3. Mampostería reforzada		
4. Estructura de madera y leja		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas		
5. Otro, Cuál? MADERA, GUADUA Y ZINC		8. Otro, Cuál?		5. Estructuras ligeras		
Observaciones: Teniendo en cuenta				6. Construcciones simples		
				7. Otro, Cuál?		
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO						
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO		BUENO		
GRIETAS		FISURAS		DANOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		
		X		REGULAR		
		HUMEDAD		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
				MALO		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: EN MATERIAL DE BAREQUE EN UN ESTADO ENTRE BUENO Y REGULAR POR AREAS, CON PRESENCIA DE FISURAS - EL PREDIO CUENTA EN SU PARTE LATERAL DERECHA CON UNA CONSTRUCCION EN LADRILLO						
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:						
GRIETAS		FISURAS		BUENO		
		X		DANOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		
		HUMEDAD		REGULAR		
				DANOS EN PUERTA Y VENTANAS		
				MALO		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES: EN MATERIAL DE BAREQUE EN UN ESTADO ENTRE BUENO Y REGULAR POR AREAS, CON PRESENCIA DE FISURAS- EL PREDIO CUENTA EN SU PARTE LATERAL DERECHA CON UNA CONSTRUCCION EL LADRILLO						
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:						
GRIETAS		FISURAS		BUENO		
X		X		DISTANCIA DE CONSTRUCCION A VIA		
		HUMEDAD		1.5		
				GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)		
				5 CM		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: EL ACCESO A LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN TIERRA PARA EL INGRESO DE POR LO MENOS MOTO, EL ANDEN DE APROXIMADAMENTE 50 CM ES EN CONCRETO Y PRESENTE ALGUNAS FISURAS Y GRIETAS						
ESTADO DE CERRAMIENTOS:						
MALLA EMBONADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO		
		POSTES DE MADERA		X		
		CERCA VIVA		MURO		
				REGULAR		
				MALO		
				OTROS		
CUENTA CON CERRAMIENTO EN POSTES DE MADERA EN MAL ESTADO CON LINEAS DE ALAMBRE DE PUA EN ESTADO REGULAR						

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA			PÁGINA	21 DE 2
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA			
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 204 EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		(Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Veclidad de	Inició	13	FEBRERO 2023
		Seguimiento ☒			
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
Notas:					
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.					
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.					
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

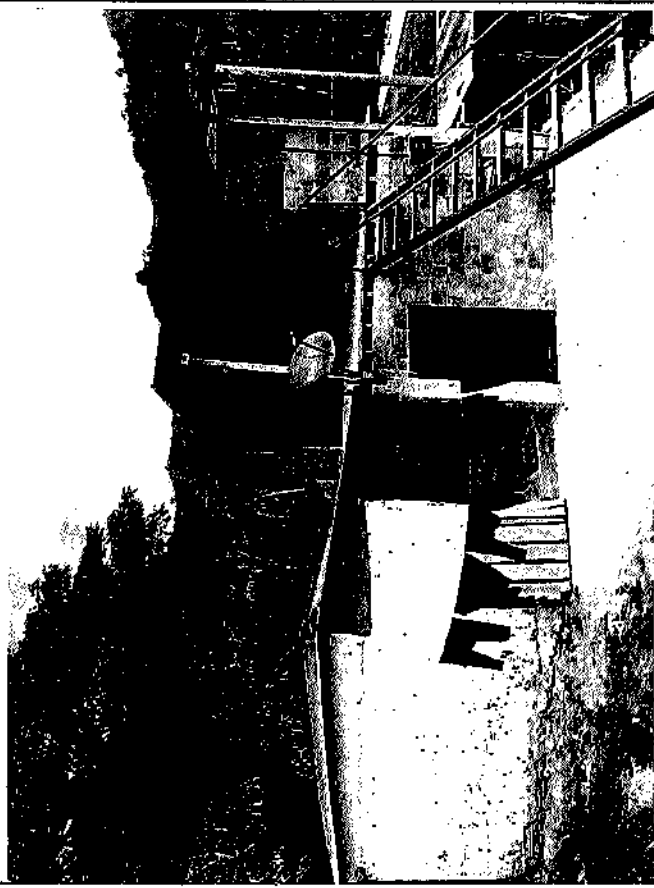
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	5 DE 7	
			FECHA	(Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HC 19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Contrato de Obra No. 1354 / 2022			Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		
			Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento		
6. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					

No las:



5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 6 DE 7</p>
<p>CÓDIGO</p>	<p>FECHA</p>	<p>13 FEBRERO 2023</p>
<p>VERSIÓN</p>	<p>Acta de Vecindad de</p>	<p>Inicio</p>
<p>PÁGINA</p>	<p>Acta de Vecindad de</p>	<p>Secuimiento</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>		
<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA</p>		
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>6. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>
		
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>		

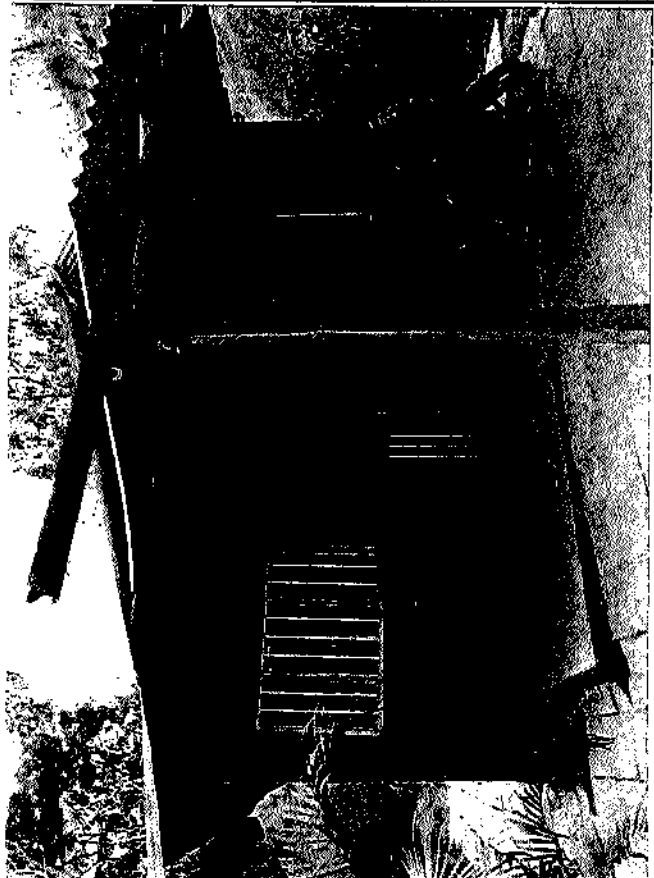
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1					
	PÁGINA	2 DE 2					
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento	FECHA	(Día / Mes / Año)	
					13	FEBRERO 2023	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN							
<div><div>BAÑOS</div><div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div></div><div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div></div><div>BAÑOS</div><div>APTO 2</div></div>							
VIA							
FIRMAS							
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Testigo C.C. O.NIT:	
Ambario Jarama 26547351		[Signature]		[Signature]		[Signature]	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).							

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicial Sequitifinito ☒		PÁGINA 1 DE 5
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA					
					
2. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento HUILA	Municipio SUAZA	Vereda GALLARDO	PR 21+230 MI	
Dirección	N/A		Teléfonos 3143207698		
Nombre de la persona que atiende la visita: LICETH VELA COLLAZOS			CC No. 1,077,842,609		
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva Nombre del responsable / propietario de la construcción: CC No. - 2					
Edad de la construcción		NIS	No. de Apartamentos	2	1 Y 2 PISOS
No. de Hogares		1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar 0
Niños (menores de 14 años)		1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad 0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural 2					
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Grs. 3. Terminado 3 Y 2					
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. SI; 2. No 2					
PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado 2					
SERVICIOS PÚBLICOS					
1. Acueducto		SI	NO	Observaciones del estado de las redes: LA VIVIENDA CUENTA PARA SUS AGUAS RESIDUALES CON POZO SEPTICO	
2. Alcantarillado		X			
3. Energía		X			
4. Gas		X			
5. Teléfono		X			
6. Televisión cable		X			
7. Internet		X			
8. Otros		X			
DESTINACIÓN ECONÓMICA					
1. Residencial		X		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial				Garaje SI ☐ NO ☒	
3. Industrial				Uso del garaje:	
4. Minero					
5. Agropecuario					
6. Recreacional					
7. Educativo					
8. Salud					
9. Cultural					
10. Religioso					
11. Institucional					
12. Otro					

Firma Liceth Vela Collazos	Firma Ing. Residente Interventoría	Firma Ing. Residente Interventoría
Nombre: Liceth Vela Collazos	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Ing. Residente Interventoría
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
C.C. O NIT:		C.C. O NIT:
Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		


	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>		<p>MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 21 DE 5</p>
<p>CÓDIGO</p>	<p>FECHA</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>PÁGINA</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio Seguintiente ☒ ☐</p>
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>6. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	<p>13 FEBRERO 2023</p>	<p>(Día / Mes / Año)</p>
			
			
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podría adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueran tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASS-MN-IN-3-FR-4
	S. SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMÉNEZ ROA			PÁGINA	5 DE 5
	ACTA DE VECINDAD			FECHA	13 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta de Vecindad de	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1455 / 2022			Inicio	Seguimiento
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN					
<div><div>VIA</div><div><div>SALA COMEDOR</div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div></div><div><div>LAVADERO</div><div>AREA DESTINADA A PROCESO DE CAFÉ</div></div></div>					
FIRMAS					
Firma Nombre: <u>Aracely Collores</u> Responsable Unidad Social C.C. O MIT:		Firma Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD				CODIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1485 / 2022	Acta de Vejeidad de Seguimiento ☒	FECHA (Dia / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA					
					
2. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento HUILA	Municipio SUAZA	Vereda GALLARDO	PR 21+400 MI	
Dirección	N/A		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA CONSUELO MEDINA			CC No.	55,069,821	
Tipo de tenencia de la vivienda:			1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No. 55,069,821		
Edad de la construcción			7 AÑOS	No. de Apartamentos	1
No. de Hogares			1	No. total residentes	5
Niños (menores de 14 años)			0	Adultos mayores (más de 60 años)	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:			1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:			1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			1. Si; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO			1. Plano; 2. Ordulador; 3. Escarpado		
SERVICIOS PUBLICOS					
1. Acueducto		SI	NO	Observaciones del estado de las redes: EL AGUA PARA CONSUMO LA CAPTA DESDE UN NACEDERO CERCAÑO, Y CUENTA CON POZO SEPTICO PARA LAS AGUAS RESIDUALES	
2. Alcantarillado		☒	☒		
3. Energía		☒	☒		
4. Gas		☒	☒		
5. Teléfono		☒	☒		
6. Televisión cable		☒	☒		
7. Internet		☒	☒		
8. Otros		☒	☒		
DESTINACIÓN ECONOMICA					
1. Residencial		☒	7. Educativo	☐	
2. Comercial		☐	8. Salubridad	☐	
3. Industrial		☐	9. Cultural	☐	
4. Minero		☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario		☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional		☐	12. Otro	☐	
ACCESOS VEHICULARES					
				Garaje	
				SI ☐ NO ☒	
				Uso del garaje:	



Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Ing. Residente Interventoria	Ing. Residente Interventoria	Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Notas:		
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vejeidad corresponde a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vejeidad suscrita entre las partes.		

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECONDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
						VERSIÓN	1			
						PÁGINA	2 DE 6			
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARCO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						FECHA	(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento		13		FEBRERO 2023		
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL										
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA				
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado		1. Irregularidad alta				
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto		2. Irregularidad media				
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Sistema combinado en concreto		3. Irregularidad baja o inexistente				
4. Caissons		4. Vigas metálicas		4. Prelabricados en concreto						
5. Concreto delgado		5. Cercas metálicas		5. Mampostería confinada		IRREGULARIDAD EN ALTURA				
6. Pilotes		6. Entramado en madera		6. Mampostería reforzada		1. Irregularidad alta				
7. Placa de cimentación		7. No aplica		7. Mampostería no reforzada		2. Irregularidad media				
8. No identificada		8. Otro,Cuál?		8. Pórticos en acero		3. Irregularidad baja o inexistente				
9. No existe		9. Otro,Cuál?		9. Pórtico arriostrado en acero						
10. Otro,Cuál?		10. REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN				
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros		especial				
		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque		2. Edificaciones reforzadas				
		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en teja pisada		3. Mampostería reforzada				
		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe		4. Estructuras con confinamiento				
		5. Otro,Cuál? MADERA, GUADUA Y ZINC		15. Construcción improvisada		5. Estructuras ligeras				
				16. Mito		6. Construcciones simples				
				17. Otro,Cuál?		7. Otro,Cuál?				
Observaciones: Teniendo en cuenta										
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO										
GRIETAS		FISURAS		X		HUMEDAD		BUENO		
						DESPLAZAMIENTO		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
								X		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
LA FACHADA DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUÍDA EN BLOQUE, CUENTA CON PINTURA EN ACEITE, PRESENTA ALGUNAS FISURAS										
ESTADO DE LAS FACHADAS: LATERALES Y CONTRAFACHADAS:										
GRIETAS		FISURAS		X		HUMEDAD		BUENO		
						DESPLAZAMIENTO		DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
								X		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:										
LA FACHADA LATERAL DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUÍDA EN BLOQUE, CUENTA CON PINTURA EN ACEITE, PRESENTA ALGUNAS FISURAS										
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:										
GRIETAS		X		FISURAS		X		HUMEDAD		
								DESPLAZAMIENTO		
								DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
								X		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
EL ACCESO A LA VIVIENDA DESDE LA VÍA ES ATRAVÉS DE UN PENTE ARTESANAL CONSTRUÍDO CON GUADUA Y TIERRA. EL ANDÉN DE LA VIVIENDA TIENE GRIETAS Y SE ENCUENTRA LEVANTADO EN ALGUNAS PARTES										
ESTADO DE CERRAMIENTOS:										
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO		
								MURO		
								X		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
NO CUENTA CON CERRAMIENTO HACIA LA VÍA										

	DEPARTAMENTO DEL YUCATÁN SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
			VERSION	1	
			PÁGINA	4 DE 6	
			FECHA	13 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL YUCATÁN			Acta de Vecindad de		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022			Control de Interventoría No. 1485 / 2022		
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			Inicio	Seguimiento	☒
					
					



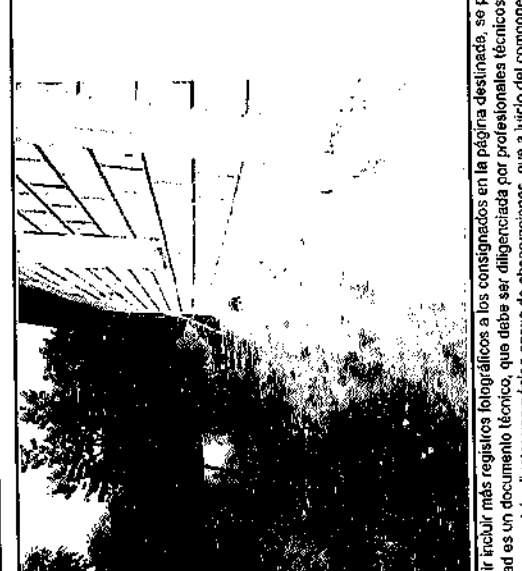
Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	6 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio	Acta de Vecindad de Seguimiento		(Día / Mes / Año)	13 FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN						
<div><div>VIA</div><div>FUENTE HIDRICA</div><div>LAVADERO</div><div>COCINA</div><div>HABITACIO</div><div>SALA</div><div>HABITACIO</div><div>HABITACIO</div><div>HABITACION</div></div>						
FIRMAS						
<div><div> Firma Nombre: Juan Luis Ruiz Responsable Unidad Social C.C. O.NIT: Original: Contratista</div><div> Firma Nombre: Ing. Residente Matrícula profesional No.: C.C. O.NIT: Original: Contratista</div><div> Firma Nombre: Ing. Residente Matrícula profesional No.: C.C. O.NIT: Original: Contratista</div></div>						

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023		VERSIÓN 1		PÁGINA 1 DE 5	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento 2		2. DATOS DEL PREDIO	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA		Ubicación: Departamento HUILA Municipio SUAZA		Vereda GALLARDO		PR 214650 MI	
		Dirección N/A		Teléfono 3144751530		CC No. 1,003,876,089	
Nombre de la persona que atiende la visita: MILTON FABIAN VERA MOSQUERA		Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		ENCARGADO		CC No. -	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: YEINER ALEXANDER PERDOMO		Edad de la construcción 2 AÑOS		No. de Apartamentos 1		No. de pisos 1	
No. de Hogares 1		No. total residentes 3		Mujeres jefes de hogar 1		Personas en situación de discapacidad 0	
Niños (menos de 14 años) 1		Adultos mayores (más de 60 años) 0		1. Urbano; 2. Rural		2	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		ESTADO DEL PREDIO: 1. Si; 2. No		PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		3	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		SERVICIOS PÚBLICOS		Observaciones del estado de las redes:			
1. Acueducto		SI NO		Observaciones del estado de las redes:			
2. Alcantarillado		X					
3. Energía		X					
4. Gas		X					
5. Teléfono		X					
6. Televisión cable		X					
7. Internet		X					
8. Otros		X					
DESTINACIÓN ECONOMICA		7. Educativa		ACCESOS VEHICULARES		Garaje	
1. Residencial		X		SI NO		X	
2. Comercial		X		Uso del garaje:			
3. Industrial		X					
4. Minero		X					
5. Agropecuario		X					
6. Recreacional		X					
FIRMAS		Firma		Firma		Firma	
Milton Fabian Vera		Nombre: Ing. Residente Interventoría		Nombre: Ing. Residente Interventoría		Nombre: Ing. Residente Interventoría	
1083876889		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		2. Una vez firmado y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	


	DEPARTAMENTO DEL IQUIITOS SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VICINIDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL IQUIITOS			FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Intervención No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL				
SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		
1. Placa maciza de concreto		1. Irregularidad alta		
2. Placa aligerada de concreto		2. Irregularidad media		
3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Irregularidad baja o inexistente		
4. Vigas metálicas		IRREGULARIDAD EN ALTURA		
5. Caissons		1. Irregularidad alta		
6. Concreto ciclopao		2. Irregularidad media		
7. No aplica		3. Irregularidad baja o inexistente		
8. No existe		TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN		
9. No identificada		1. Edificaciones con reforzamiento		
10. Otro: Cuál?		especial		
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		3. Mampostería reforzada		
1. Reformas (si / no)		4. Estructuras con confinamiento		
2. En altura: No. de pisos adicionales		5. Estructuras híbridas		
3. En extensión: metros de ancho		6. Construcciones simples		
4. En profundidad: metros de fondo		7. Otro: Cuál?		
5. Otro: Cuál?				
SISTEMA DE CUBIERTA				
1. Placa en concreto				
2. Placa en Steel deck				
3. Estructura metálica y teja				
4. Estructura de madera y teja				
5. Otro: Cuál?				
Observaciones: LA VISITA FUE ATENDIDA POR EL SEÑOR MILTON FABIAN VERA, QUIEN MANIFESTÓ SER LA PERSONA ENCARGADA Y DELEGADA POR EL PROPIETARIO QUIEN NO RESIDE EN EL PAIS, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE REALIZAR INSPECCION INTERIOR DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL ARRENDATARIO NO SE ENCONTRABA. LA INFORMACION CONSIGNADA EN LA PRESENTE ACTA FUE SUMINISTRADA POR EL SEÑOR MILTON FABIAN VERA				
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO				
ESTADO DE LAS FACHADAS:				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE VENTANAS
FACHADA EN LADRILLO (OBRA GRIS) SIN VENTANAS NI VIDRIOS, SOLO CUENTA CON LAS PUERTAS DE ACCESO				
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:				
EN LADRILLO OBRA GRIS				
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE VENTANAS
Cuenta con un andén y rampa pequeña para acceso en la puerta de la vivienda. El acceso desde la vía es en pendiente en tierra				
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				
MALLA ESABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ MURO OTROS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:				
NO CUENTA CON CERRAMIENTO				

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4</p> <p>VERSIÓN 1</p> <p>PÁGINA 4 DE 5</p>
<p>FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023</p>		
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>INICIO ☒ SIGUIENTE</p>
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio</p>
<p>6. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>		
		
		
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>		

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1				
	PÁGINA	5 DE 5				
OBJETO DEL PROYECTO				FECHA		
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 DUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				(Día / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio	☒	13	FEBRERO 2023	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN						
<div>VIA</div> <div></div>						
FIRMAS						
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Firma Nombre: Testigo C.C. O.NIT:		
Milton Fabian Vera		[Firma]		[Firma]		
1-0828276889		[Firma]		[Firma]		
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).						



DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
FERNANDO JIMENEZ ROA
ACTA DE VICINIDAD



CÓDIGO: MASPS-MN-IN-3-FR-4

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 de 6

OBJETO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 201A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Contrato de Obra No. 1334 / 2022 / 2022

Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022

Acta de Vicinidad de Seguimiento ☒ X

FECHA

(Día / Mes / Año)

16 FEBRERO 2023

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	HUILA	SUAZA	GALLARDO	21+690 ml
Dirección	N/A			
Nombre de la persona que afunde la visita:		EZEQUIEL PLAZA		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		EZEQUIEL PLAZA		
Edad de la construcción		18		
No. de Hogares		1		
Niños (menos de 14 años)		0		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Si; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒ X	☐
2. Alcantarillado	☒ X	☐
3. Energía	☒ X	☐
4. Gas	☒ X	☐
5. Teléfono	☒ X	☐
6. Televisión cable	☒ X	☐
7. Internet	☒ X	☐
8. Otros	☒ X	☐

Observaciones del estado de las redes: LA VIVIENDA REALIZA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA QUEBRADA EL SALADO

DESTINACIÓN ECONOMICA

1. Residencial	☒ X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salud	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐



ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒ X
--------	-----------------------------	--

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Controlista	Ing. Residente Interventoria
C.C. O NIT:	Matricula profesional No.:	C.C. O NIT:
<p>1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.</p> <p>2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.</p>		

		DEPARTAMENTO DEL HULLA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VICINDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HULLA		FECHA (Día / Mes / Año) 16 FEBRERO 2023		PÁGINA 2 DE 6	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Inicio Seguimiento 16 FEBRERO 2023	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Látina colaborante (Steel deck)		3. Irregularidad baja o inexistente	
4. Caissons		4. Vigas metálicas			
5. Concreto ciclopeo		5. Cercas metálicas			
6. Pilotes		6. Enframado en madera			
7. Placa de cimentación		7. No aplica			
8. No identificada		8. Otro,Cuál?			
9. No existe					
10. Otro,Cuál?					
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
1. Placa en concreto		1. Reformas (si / no)		1. Irregularidad alta	
2. Placa en Steel deck		2. En altura: No. de pisos adicionales		2. Irregularidad media	
3. Estructura metálica y teja		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		3. Irregularidad baja o inexistente	
4. Estructura de madera y teja		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)			
5. Otro,Cuál?		5. Otro,Cuál?			
Observaciones:					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
GRIETAS		X	FISURAS	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		LA FACHADA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN BAREQUE, CUENTA CON PINTURA Y SE EVIDENCIAN FISURAS			
ESTADO DE LAS FACHADAS:					
GRIETAS		X	FISURAS	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:					
LA FACHADA LATERAL DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE Y SE EVIDENCIAN FISURAS Y GRIETAS					
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:					
GRIETAS		X	FISURAS	X	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
EL ACCESO A LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN TIERRA Y EL ANDEN EN CEMENTO (PISO ROJO) SE EVIDENCIAN FISURAS Y GRIETAS EN EL ANDEN					
ESTADO DE GERRAMIENTOS:					
MALLA ESAGONADA			POSTES DE CONCRETO	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
EL CERRAMIENTO DE LA VIVIENDA ESTA ELABORADO EN POSTES DE MADERA EN LAS ESTADO Y ALAMBRE DE PUA EN MAL ESTADO					

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	4 DE 6		
OBJETO DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022			Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022			Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
						
Notas:						
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.						
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.						
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASPS-MH-IN-3-FR-4 VERSIÓN 1 PÁGINA 5 DE 6</p>
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SHL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	FECHA
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	(Día / Mes / Año) 16 FEBRERO 2023
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		 
Notas:		

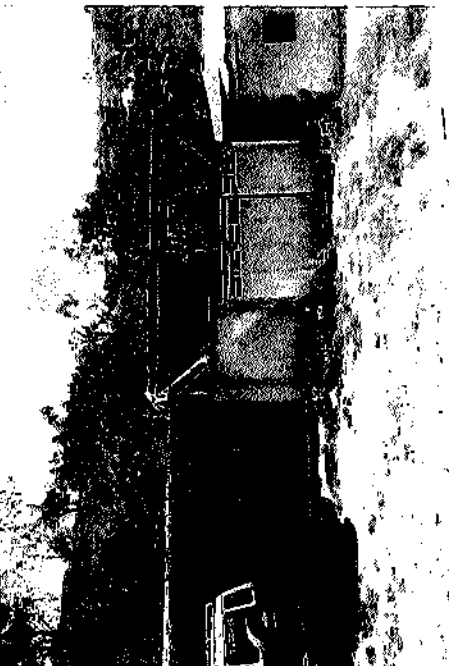
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


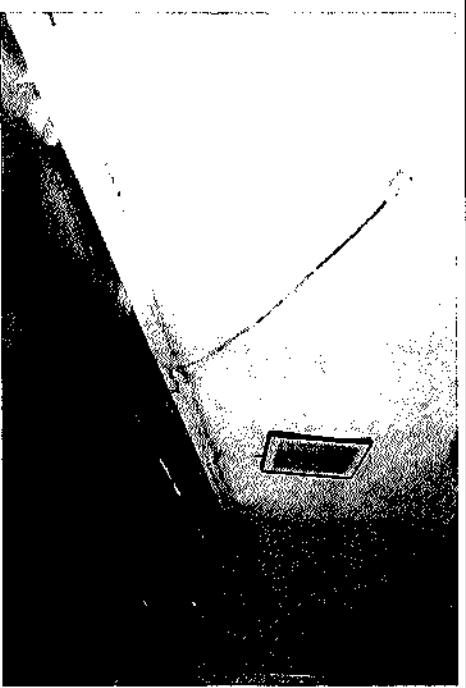

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSION	1
			PAGINA	6 DE 6
			FECHA	(Dia / Mes / Año) 16 FEBRERO 2023
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Control de Interventoria No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
<div><div><div>BAÑOS</div><div>LAVADERO</div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div></div><div>VIA</div></div>				
FIRMAS				
Firma Nombre: <u>Elequiel Plaza</u> Responsable Unidad Social C.C. O.N.T. Original: Contratista Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).		Firma Nombre: <u>[Signature]</u> Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: Firma Nombre: <u>[Signature]</u> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: C.C. O.N.T.		







		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 21 FEBRERO 2023		VERSIÓN 1		PÁGINA 1 DE 6
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Inicio Seguinte		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA EAGHADA						
Ubicación: Huila		Municipio: SUAZA		Vereda: GALLARDO		PR: 21+695 MI
Dirección: N/A		Teléfonos: 3144751530		CC No. 1,083,876,889		
Nombre de la persona que atiende la visita: MILTON FABIAN VERA MOSQUERA						
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: MILTON FABIAN VERA MOSQUERA		CC No. 1,083,876,889				
Edad de la construcción: 15 AÑOS		No. de Apartamentos: 1		No. de pisos: 1		
No. de Hogares: 1		No. total residentes: 4		Mujeres jefes de hogar: 1		
Niños (menores de 14 años): 1		Adultos mayores (más de 60 años): 0		Personas en situación de discapacidad: 0		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural		2				
ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gts. 3. Terminado		3				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1. SI; 2. No		2				
PENDIENTE DEL TERRENO: 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		1				
SERVICIOS PUBLICOS						
Observaciones del estado de las redes: PTICO PARA LAS AGUAS RESIDUALES						
1. Acueducto		SI	NO			
2. Alcantarillado		X				
3. Energía		X				
4. Gas		X				
5. Teléfono		X				
6. Televisión cable		X				
7. Internet		X				
7. Otros				Cual?		
DESTINACIÓN ECONOMICA						
1. Residencial		X				
2. Comercial						
3. Industrial						
4. Minero						
5. Agropecuario						
6. Recreacional						
7. Educativo						
8. Salubridad						
9. Cultural						
10. Religioso						
11. Institucional						
12. Otro						
ACCESOS VEHICULARES						
Garaje		SI	X	NO		
Uso del garaje: VEHICULAR						

Firma:		Firma:	
Nombre: Milton Fabian Vera		Nombre: Ing. Residente Interventoría	
Responsable Unidad Social: 1083876889		Matrícula profesional No.:	
C.C. O.NIT: 1083876889		C.C. O.NIT:	
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CODIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45-H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA (Dia / Mes / Año) 21 FEBRERO 2023		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	☒		
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Caissons 5. Concreto ciclopeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cual?		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cerchas metálicas 6. Enlucado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cual?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		1. Pórticos en concreto reforzado 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prefabricados en concreto 5. Mampostería confinada 6. Mampostería reforzada 7. Mampostería no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos y paneles en otros 12. Muros en bahareque 13. Muros en teja pisada 14. Muros en adobe 15. Construcción improvisada 16. Mixto 17. Otro, Cual?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
SISTEMA DE CUBIERTA		1. Rejillas (si / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro, Cual?		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION 1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cual?	
Observaciones:					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:	
GRIETAS		FISURAS		FISURAS	
X		X		X	
HUMEDAD		HUMEDAD		HUMEDAD	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
FACHADA LATERAL EN BAREQUE EN ESTADO REGULAR		FACHADA LATERAL EN BAREQUE EN ESTADO REGULAR		FACHADA LATERAL EN BAREQUE EN ESTADO REGULAR	
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:	
GRIETAS		GRIETAS		GRIETAS	
X		X		X	
HUMEDAD		HUMEDAD		HUMEDAD	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
CERCA VIVA		CERCA VIVA		CERCA VIVA	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		POSTES DE MADERA	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:		ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MURO		MURO		MURO	
X		X		X	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
MURO		MURO			

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	4 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO			MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
			FECHA			(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio	21	FEBRERO 2023	
		Seguimiento ☒				
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VEJIDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	5 DE 6		
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA					FECHA		(Día / Mes / Año)	
					21		FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022					Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Veclidad de Seguimiento ☒	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
								
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Veclidad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Veclidad.</p>								

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> <p>SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA</p> <p>FERNANDO JIMENEZ ROA</p> <p>ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4															
				VERSIÓN	1															
				PÁGINA	6 DE 6															
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 46HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)															
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento ☒	21	FEBRERO	2023														
<p>7. PLANO DE LA CONSTRUCCION</p> <p>BAÑOS</p> <div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div><div>COMEDOR</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>GARAJE</div></div> <p>VIA</p>																				
<p>FIRMAS</p> <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: Milton Fabian Vera</td><td>Nombre:</td></tr><tr><td>Responsable Unidad Social</td><td>Ing. Residente Interventoría</td></tr><tr><td>C.C. ONT: 1083876889</td><td>Matrícula profesional No.:</td></tr><tr><td>Original: Contratista</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).</td></tr></table>									Firma	Firma	Nombre: Milton Fabian Vera	Nombre:	Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	C.C. ONT: 1083876889	Matrícula profesional No.:	Original: Contratista		Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	
																				
Firma	Firma																			
Nombre: Milton Fabian Vera	Nombre:																			
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría																			
C.C. ONT: 1083876889	Matrícula profesional No.:																			
Original: Contratista																				
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).																				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN 1			PÁGINA 1 DE 5	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA 13 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	2. DATOS DEL PREDIO		
			Ubicación: Departamento: HUILA Municipio: SUAZA Vereda: GALLARDO PR: 21+710		
			Dirección: N/A Teléfonos: -		
			Nombre de la persona que atiende la visita: CC No.		
			Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA			Nombre del responsable / propietario de la construcción: CC No.		
Edad de la construcción			No. de Apartamentos	No. de pisos	1
No. de Hogares			No. total residentes	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menores de 14 años)			Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:			1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:			1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			1. Si; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO			1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
1. Acueducto			SI	NO	SERVICIOS PÚBLICOS Observaciones del estado de las redes: PTICO PARA LAS AGUAS RESIDUALES
2. Alcantarillado					
3. Energía					
4. Gas					
5. Teléfono					
6. Televisión cable					
7. Internet					
7. Otros			Cual?		
1. Residencial			DESTINACIÓN ECONÓMICA		
2. Comercial			7. Educativo	ACCESOS VEHICULARES	
3. Industrial			8. Salud	Garaje	SI ☐ NO ☐
4. Minero			9. Cultural	Uso del garaje:	
5. Agropecuario			10. Religioso		
6. Recreacional			11. Institucional		
			12. Otro		

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Ing. Residente Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Notas:		
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará el propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VICINIDAD			CÓDIGO MASPS-MIN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL-10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA 13 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vicinidad de Inicio Seguimiento		
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL				
CIMENTACIÓN:		SISTEMA ESTRUCTURAL		
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Caissons 5. Concreto ciclopeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro,Cuál?		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámmina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cerchas metálicas 6. Enclavado en madera 7. No aplica 8. Otro,Cuál?		
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro,Cuál?		1. Reformas (sí / no) 2. En altura, No. de pisos adicionales 3. En extensión, metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad, metros de fondo (perpendicular a la vía) 5. Otro,Cuál?		
Observaciones: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VICINIDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA				
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO				
ESTADO DE LAS FACHADAS:				
GRIETAS	FISURAS	X	HUMEDAD	BUENO DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA FACHADA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN BAREQUE, SE EVIDENCIAS FISURAS A LO LARGO DE ESTA				
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:				
GRIETAS	FISURAS	X	HUMEDAD	BUENO DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA FACHADA LATERAL DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA EN BAREQUE, SE EVIDENCIAS FISURAS A LO LARGO DE ESTA				
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				
GRIETAS	FISURAS		HUMEDAD	BUENO DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA 3,5
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCION VISUAL DEL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LA VIVIENDA CUENTA CON ANDEN EN CONCRETO Y PRESENTA FISURA, EL ACCESO DESDE LA VÍA ES EN TIERRA				
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				
MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	BUENO MURO
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: NO CUENTA CON CERRAMIENTO				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MAFPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	14 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	13 FEBRERO 2023
6. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Sequimiento	13 FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
<div style="border: 1px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div>				
VIA				
FIRMAS				
Firma Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				



DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
FERNANDO JIMENEZ ROA
ACTA DE VECINDAD



CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4

VERSIÓN 1

PÁGINA 2 DE 5

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Acta de Vecindad de 1465 / 2022
Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Inicio Seguimiento
FECHA	13 FEBRERO 2023
	(Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL	
CIMENTACIÓN:	SISTEMA ESTRUCTURAL
1. Zapatas	1. Placa maciza de concreto
2. Vigas corridas	2. Placa aligerada de concreto
3. Sistema mixto	3. Sistema combinado en concreto
4. Calissons	4. Prefabricados en concreto
5. Concreto ciclopao	5. Mampostería confinada
6. Pilotes	6. Mampostería reforzada
7. Placa de cimentación	7. Mampostería no reforzada
8. No identificada	8. Pórticos en acero
9. No existe	9. Pórtico artiescrito en acero
10. Otro, Cuál? BASE- VIGAS DE AMARRE	10. Pórticos y paneles en madera
	11. Muros en bahareque
	12. Muros en lapia pisada
	13. Muros en adobe
	14. Muros en adobe
	15. Construcción improvisada
	16. Mixto
	17. Otro, Cuál?
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA	
1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro, Cuál?	
TIPOLÓGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro, Cuál?	

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO	
ESTADO DE LAS FACHADAS:	ESTADO DE LAS FACHADAS:
GRIETAS	FISURAS
	HUMEDAD
	DESPLAZAMIENTO
	BUENO
	REGULAR
	DAÑOS EN REPELO, PINTURA Y/O ENCHAPE
	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:	
SE ENCUENTRA EN OBRA GRIS, CONSTRUIDA EN LADRILO, LAS VENTANAS CUENTAN CON VIDRIOS (ESPEJO) EN BUEN ESTADO	

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:	
GRIETAS	FISURAS
	HUMEDAD
	DESPLAZAMIENTO
	BUENO
	REGULAR
	DAÑOS EN REPELO, PINTURA Y/O ENCHAPE
	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:	
SE ENCUENTRA EN OBRA GRIS, CONSTRUIDA EN LADRILO	

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:	
GRIETAS	FISURAS
	HUMEDAD
	DESPLAZAMIENTO
	BUENO
	REGULAR
	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA
	GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)

ESTADO DE CERRAMIENTOS:	
MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO
	POSTES DE MADERA
	CERCA VIVA
	MURO
	REGULAR
	DAÑOS
	OTROS

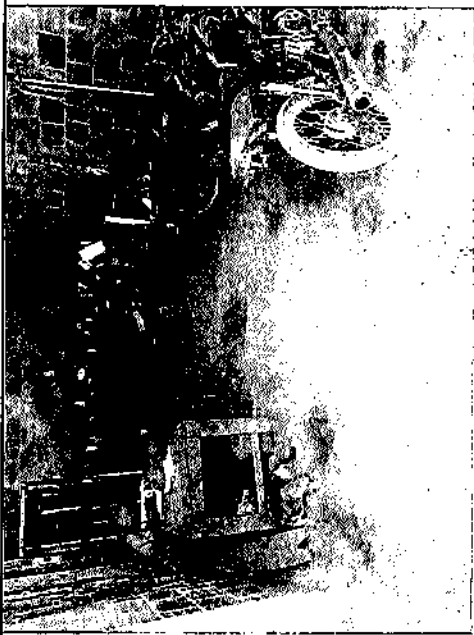
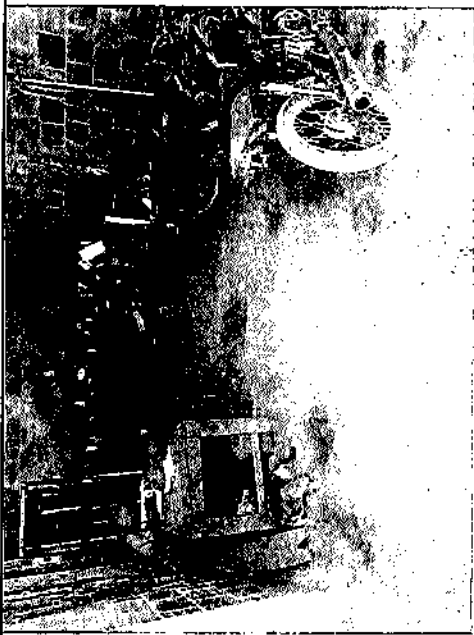
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:	
NO CUENTA CON CERRAMIENTO PERIMETRAL	

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD					CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSION	1						
	PAGINA	3 DE 6						
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						FECHA	(Dia / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento				
6. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO								
ESTADO DE PISOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO				
NO CUENTA CON PISOS EN MATERIAL - LOS PISOS SON EN TIERRA								
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO				
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: LAS PAREDES ESTAN EN OBRA GRIS, LADRILLO								
ESTADO DE TECHOS		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO				
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS: EL TECHO ES METALICO Y TEJA DE ZINC								
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO				
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:								
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO				
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:								
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO				
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:								
ESTADO DE PAREDES		(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)		BUENO		DANOS EN REPULLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO				
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:								
FIRMAS								
Firma		Firma		Firma		Firma		
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría		C.C. O NIT:		
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		C.C. O NIT:		
Notas:								
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)								
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.								

FLOYO plaza.


Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:


Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	4 DE 5
OBJETO DEL PROYECTO				FECHA	(Día / Mes / Año)
				13 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	CÓDIGO		1	
	VERSIÓN		5 DE 15	
	PÁGINA		13	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA	
Contrato de Obra No. 1354	Contrato de Interventoría No. 1465	Acta de Vecindad de	(Día / Mes / Año)	
1	1	1	13 FEBRERO 2023	
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN				
<div>BAÑOS</div> <div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div><div>SALA</div></div> <div>VIA</div>				
FIRMAS				
<div><div>Firma</div><div>Nombre:</div><div>Ing. Residente Contraloría</div><div>Matrícula profesional No.:</div><div>12248120</div></div> <div><div>Firma</div><div>Nombre:</div><div>Ing. Residente Interventoría</div><div>Matrícula profesional No.:</div><div>4848</div></div>				
Copia: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO MASPS-MH-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUIZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	FECHA (Día / Mes / Año)	14 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 3354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1495 / 2022	Acta de Velocidad de Seguimiento	1 DE 5
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA			
2. DATOS DEL PREDIO			
Ubicación:	Departamento HUILA	Municipio SUIZA	Vereda GALLARDO
Dirección	N/A		
Nombre de la persona que atiende la visita: GUSTAVO FIERRO			
Tipo de tenencia de la vivienda:			
1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			
GUSTAVO FIERRO			
Edad de la construcción			
6 MESES			
No. de Hogares			
1			
Niños (menores de 14 años)			
0			
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:			
1. Urbano; 2. Rural			
ESTADO DEL PREDIO:			
1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			
1. Si; 2. No			
PENDIENTE DEL TERRENO			
1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			
SERVICIOS PÚBLICOS			
Observaciones del estado de las redes: NO CUENTA CON NINGUNO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. REALIZA VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIRECTAMENTE EN LA FUENTE HIDRICA			
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			
DESTINACIÓN ECONÓMICA			
1. Residencial			
2. Comercial			
3. Industrial			
4. Minero			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			
7. Educativo			
8. Salud			
9. Cultural			
10. Religioso			
11. Institucional			
12. Otro			
ACCESOS VEHICULARES			
Garaje			
SI NO			
Uso del garaje:			
SI NO			
FIRMAS			
Firma			
Nombre			
Ing. Residente Interventoría			
Matrícula profesional No.			
Firma			
Nombre			
Ing. Residente Interventoría			
Matrícula profesional No.			

Gustavo Fierro
Firma:
Nombre: Gustavo Fierro
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. 7.670.872

Gustavo Fierro
Firma:
Nombre: Gustavo Fierro
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. 7.670.872


1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Velocidad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de velocidad suscrita entre las partes.


	DEPARTAMENTO DEL ILLINOIS		MASPS-MN-IN-3-FR-4		
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		VERSION 1		
	FERNANDO JIMENEZ ROA		PAGINA 2 DE 5		
ACTA DE VELOCIDAD					
OBJETO DEL PROYECTO					
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad do	Inicio Seguimiento	FECHA (Dia / Mes / Año)	
				14	FEBRERO 2023
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Laminas colaborante (Steel deck)	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metalicas	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
5. Concreto colado	☐	5. Cerchas metalicas	☐	1. Irregularidad alta	☐
6. Pilotes	☐	6. Enramado en madera	☐	2. Irregularidad media	☐
7. Placa de cimentacion	☐	7. No aplica	☒	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
8. No identificada	☐	8. Otro, Cual?		TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
9. No existe	☐			1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
10. Otro, Cual? BASE-VCEMENTO	☐			2. Edificaciones reforzadas	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		3. Mamposteria reforzada	☐
1. Placa en concreto	☐	1. Reformas (si / no)	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
2. Placa en Steel deck	☐	2. En altura: No. de pisos adicionales (paralelo a la via)	☐	5. Estructuras ligeras	☐
3. Estructura metalica y teja	☐	3. En extension: metros de ancho	☐	6. Construcciones simples	☐
4. Estructura de madera y teja	☒	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la via)	☐	7. Otro, Cual?	☐
5. Otro, Cual? GUADUA	☐	8. Otro, Cual?		Observaciones: Teniendo en cuenta	
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:	
GRIETAS	☐	FISURAS	☐	BUENO	☒
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
FACHA EN LARILLO SIN TERMINAR		FACHA EN LARILLO SIN TERMINAR		FACHA EN LARILLO SIN TERMINAR	
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:					
GRIETAS	☐	FISURAS	☐	BUENO	☒
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES:					
LATERALES EN LADRILLO					
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:					
GRIETAS	☐	FISURAS	☐	BUENO	☒
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:					
NO CUENTA CON ANDEN, ACCESO EN TIERRA					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA ESLABONADA	☐	POSTES DE CONCRETO	☐	BUENO	☒
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:					
CUENTA CON CERRAMIENTO EN GUADUA EN MAL ESTADO					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSION	1				
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON COTINGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA	(Dia / Mes / Año) 15 FEBRERO 2023		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento ☒ 1	2. DATOS DEL PREDIO			
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA						
			Ubicación:	Departamento HUILA	Municipio SUAZA	
			Dirección:	NIA		
			Nombre de la persona que atiende la visita: ENELIA PLAZAS PLAZAS		Vereda GALLARDO	PR 21+750 MD
			Tipo de tenencia de la vivienda:		Teléfonos	
			Nombre del responsable / propietario de la construcción: ENELIA PLAZAS PLAZAS		CC No. 26,575,713	
			Edad de la construcción		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva	
			No. de Hogares		CC No. 26,575,713	
			Niños (menores de 14 años)		No. de pisos	
			CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		No. total residentes	
			ESTADO DEL PREDIO:		Mujeres jefes de hogar	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		Personas en situación de discapacidad				
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Urbano; 2. Rural				
1. Acueducto		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				
2. Alcantarillado		1. SI ; 2. No				
3. Energía		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				
4. Gas		SERVICIOS PUBLICOS				
5. Teléfono		Observaciones del estado de las redes:				
6. Televisión cable						
7. Otros						
1. Residencial		SI NO				
2. Comercial		7. Educativo				
3. Industrial		8. Salubridad				
4. Minero		9. Cultural				
5. Agropecuario		10. Religioso				
6. Recreacional		11. Institucional				
		12. Otro TIENDA				
		Qual?				
		ACCESOS VEHICULARES				
		Garaje				
		SI NO				
		Uso del garaje:				

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoria	Nombre
C.C. O.NIT: 26.925.713	Matrícula profesional No.:	Testigo
C.C. O.NIT:		
Notas:		
1. Se firmó en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN 1	
				PÁGINA 2 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZUA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA (Día / Mes / Año) 15 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1485 / 2022		Acta de Velocidad de Seguimiento ☒	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL					
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas ☐ 2. Vigas corridas ☐ 3. Sistema mixto ☐ 4. Caissons ☐ 5. Concreto ciclopeo ☐ 6. Pilotes ☐ 7. Placa de cimentación ☒ 8. No identificada ☐ 9. No existe ☐ 10. Otro, Cuál? ☐		1. Placa maciza de concreto ☐ 2. Placa aligerada de concreto ☐ 3. Lámina colaborante (Steel deck) ☐ 4. Vigas metálicas ☐ 5. Cercas metálicas ☐ 6. Enramado en madera ☐ 7. No aplica ☒ 8. Otro, Cuál? ☐		1. Pórticos en concreto reforzado ☐ 2. Muros estructurales en concreto ☐ 3. Sistema combinado en concreto ☐ 4. Prelabricados en concreto ☐ 5. Mampostería confinada ☐ 6. Mampostería reforzada ☐ 7. Mampostería no reforzada ☐ 8. Pórticos en acero ☐ 9. Pórtico arriostrado en acero ☐ 10. Pórticos y paneles en madera ☐ 11. Muros en bahareque ☐ 12. Muros en tapia pisada ☐ 13. Muros en adobe ☐ 14. Construcción improvisada ☐ 15. Mixto ☐ 16. Otro, Cuál? ☐	
SISTEMA DE CUBIERTA:		REFORMAS (si / no)		TIPOLÓGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
1. Placa en concreto ☐ 2. Placa en Steel deck ☐ 3. Estructura metálica y teja ☐ 4. Estructura de madera y teja ☒ 5. Otro, Cuál? ☐		1. En altura, No. de pisos adicionales (paralelo a la vía) ☐ 2. En extensión: metros de fondo (perpendicular a la vía) ☐ 3. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) ☒ 4. Otro, Cuál? ☐		1. Edificaciones con reforzamiento especial ☐ 2. Edificaciones reforzadas ☐ 3. Mampostería reforzada ☐ 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas ☐ 5. Estructuras ligeras ☐ 6. Construcciones simples ☐ 7. Otro, Cuál? ☐	
Observaciones: Teniendo en cuenta					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO		ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO	
GRIETAS ☐		FISURAS ☐		BUENO ☐	
FISURAS ☐		X		X	
HUMEDAD ☐		X		X	
DESPLAZAMIENTO ☐		X		X	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		X		X	
LA VIVENDA PRESENTA FISURAS EN LA FACHADA CONSTRUIDA EN BAREQUE (REPELLADA)					
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:					
GRIETAS ☐		FISURAS ☐		BUENO ☐	
FISURAS ☐		X		X	
HUMEDAD ☐		X		X	
DESPLAZAMIENTO ☐		X		X	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		X		X	
LA VIVENDA PRESENTA FISURAS EN LA FACHADA LATERAL CONSTRUIDA EN BAREQUE					
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:					
GRIETAS ☐		FISURAS ☐		BUENO ☐	
FISURAS ☐		X		X	
HUMEDAD ☐		X		X	
DESPLAZAMIENTO ☐		X		X	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		X		X	
CUESTA CON ANDEN EN CONCRETO, SE EVIDENCIAN FISURAS					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA EMBALADA ☐		POSTES DE CONCRETO ☐		BUENO ☐	
FISURAS ☐		X		X	
HUMEDAD ☐		X		X	
DESPLAZAMIENTO ☐		X		X	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		X		X	
CERRAMIENTO EN GUADUA EN ESTADOREGULAR					
ESTADO DE CERRAMIENTOS:					
MALLA EMBALADA ☐		POSTES DE MADERA ☐		BUENO ☐	
FISURAS ☐		X		X	
HUMEDAD ☐		X		X	
DESPLAZAMIENTO ☐		X		X	
DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE ☐		X		X	
CERRAMIENTO EN GUADUA EN ESTADOREGULAR					

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	11 DE 6.	
					FECHA	(Día / Mes / Año) 15 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALÁNDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZTA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento			
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
							
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>							

		DEPARTAMENTO DEL HUILA		CÓDIGO	MA-SPS-MIN-IN-3-FR-4
		SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	1
		FERNANDO JIMÉNEZ ROA		PÁGINA	5 DE 6
		ACTA DE VECINDAD		FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		(Día / Mes / Año)	
		Acta de Vecindad de		15 FEBRERO 2023	
		Inicio			
		Seguimiento			
		6. REGISTRO FOTOGRAFICO			
					
					
Notas:					
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.					
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.					
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

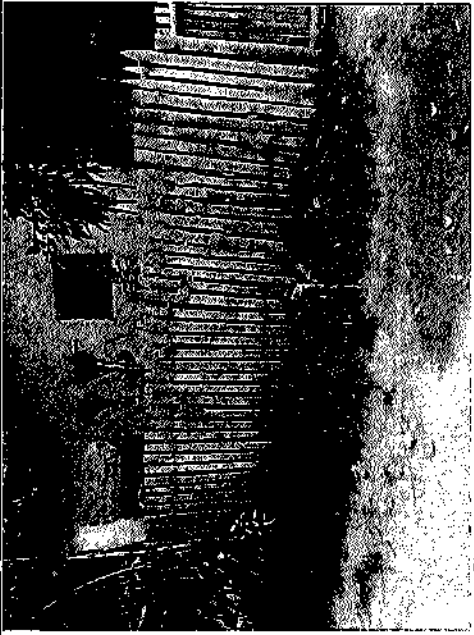
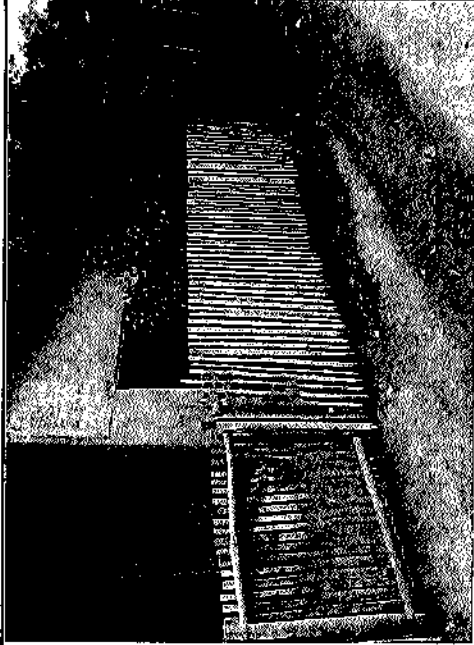
700

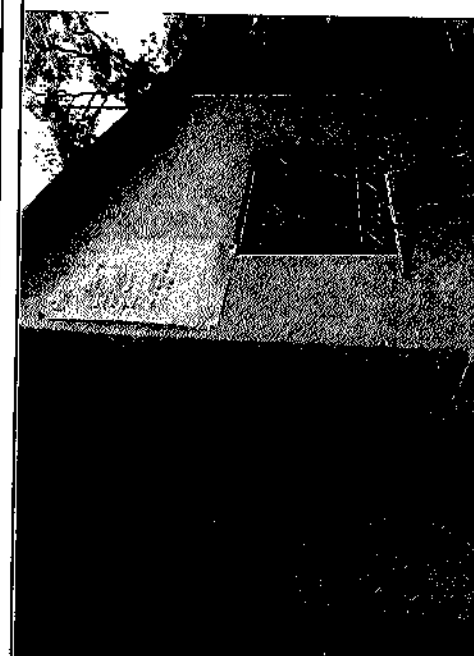
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JINEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.3 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			VERSIÓN 1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	PÁGINA 6 DE 6
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN		FECHA 15 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)		
<div><div>BAÑOS- LAVADERO</div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA COMEDOR</div><div>VIA</div></div>				
FIRMAS				
Firma Nombre: <u>Patricia Plaza P.</u> Responsable Unidad Social C.C. O NIT: <u>26 585 713.</u>		Firma Nombre: <u>[Firma]</u> Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: <u>[Firma]</u>		
Original: Contralista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECHIDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			VERSIÓN 1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento 14	FECHA (Día / Mes / Año)	PAGINA 1 DE 6
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				
2. DATOS DEL PREDIO				
Ubicación: Departamento HUILA Municipio SUAZA Vereda GALLARDO		PR 21+760 MD		
Dirección N/A		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita: DURANTE LOS DÍAS DE VISITA NO SE LOCALIZÓ HABITANTES				
Tipo de tenencia de la vivienda:		CC No.		
1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		
No. de Hogares		No. total residentes		
Niños (menores de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. NO		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS				
1. Acueducto		Observaciones del estado de las redes:		
2. Alcantarillado				
3. Energía				
4. Gas				
5. Teléfono				
6. Televisión cable				
7. Internet				
7. Otros		Cual?		
DESTINACIÓN ECONÓMICA				
1. Residencial		7. Educativo		
2. Comercial		8. Salubridad		
3. Industrial		9. Cultural		
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		
ACCESOS VEHICULARES				
Garaje SI NO				
Uso del garaje:				

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contraloría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT.	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Notas:		
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad correspondió a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4					
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RÍCIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023							
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	Inicio 14 FEBRERO 2023						
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL									
CIMENTACIÓN:		SISTEMA ESTRUCTURAL							
1. Zapatas	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta					
2. Vigas corridas	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media					
3. Sistema mixto	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente					
4. Caissons	☐	4. Prefabricados en concreto	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA					
5. Concreto colado	☐	5. Mampostería confinada	☐	1. Irregularidad alta	☐				
6. Pilotes	☐	6. Mampostería reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐				
7. Placa de cimentación	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐				
8. No identificada	☐	8. Pórticos en acero	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN					
9. No existe	☐	9. Pórtico arriostrado en acero	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐				
10. Otro, Cuál?	☐	10. Pórticos y peneles en madera	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐				
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		11. Pórticos y peneles en otros	☐	3. Mampostería reforzada	☐				
1. Reformas (sí / no)	☐	12. Muros en bahareque	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	☐				
2. En altura: No. de pisos adicionales	☐	13. Muros en tapia pisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐				
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	☐	14. Muros en adobe	☐	6. Construcciones simples	☐				
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	☐	15. Construcción improvisada	☐	7. Otro, Cuál?	☐				
5. Otro, Cuál?	☐	16. Mixto	☐	Observaciones: DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA					
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO									
GRIETAS	X	FISURAS	X	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	X
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA VIVIENDA, LA FACHADA ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE Y CUENTA CON PINTURA VERDE EN ESTADO REGULAR Y CON FISURAS									
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:									
GRIETAS		FISURAS		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA VIVIENDA, LA FACHADA ESTA CONSTRUIDA EN BAREQUE Y CUENTA CON PINTURA VERDE EN ESTADO REGULAR Y CON FISURAS									
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:									
GRIETAS		FISURAS		BUENO	REGULAR	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	
TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA VIVIENDA, CUENTA CON ANDÉN EN CONCRETO									
ESTADO DE CERRAMIENTOS:									
MALLA EMBONADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO	REGULAR	MURO		OTROS	X
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VECINDAD NO SE LOCALIZÓ A PROPIETARIOS NI HABITANTES, DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL DE LA VIVIENDA, CUENTA CON CERRAMIENTO EN GUADUA EN ESTADO REGULAR									

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSION	1	
				PÁGINA	4 DE 6	
				FECHA	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍCIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
Contrato de Obra No. 1354	L. 2022	Contrato de Interventoría No. 1465	/	2022	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	5 DE 6		
			FECHA		(Día / Mes / Año)	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

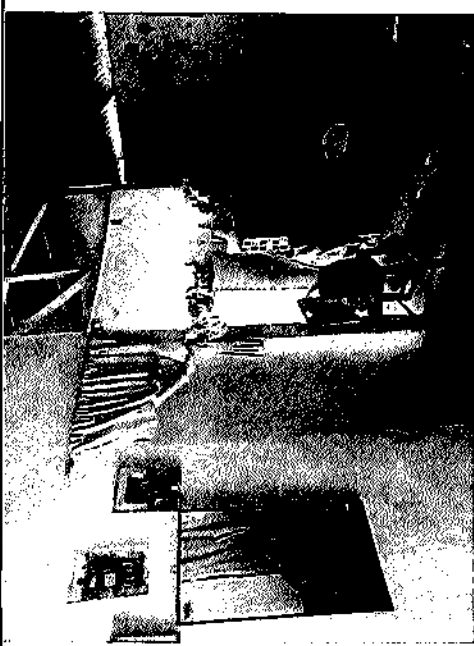

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA				VERSIÓN	1	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio	Acta de Vecindad de Seguimiento		PÁGINA	1 DE 6	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA							
							
Utilización:		Departamento	Municipio	Vereda	PR		
Dirección		HUILA	SUAZA	GALLARDO	217760 MI		
Nombre de la persona que atiende la visita:		N/A		Teléfonos	3125615093		
Nombre de la persona que atiende la visita:		ROGELIO PLAZAS		CC No.	17,698,898		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		ROGELIO PLAZAS		CC No.	17,698,898		
Edad de la construcción		8	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1	
No. de Hogares		1	No. total residentes	5	Mujeres Jefes de hogar	0	
Niños (menos de 14 años)		2	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	0	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		2			
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		3			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		2			
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		1			
SERVICIOS PÚBLICOS		Observaciones del estado de las redes:					
1. Acueducto		SI	NO				
2. Alcantarillado							
3. Energía		X					
4. Gas		X					
5. Teléfono							
6. Televisión cable							
7. Internet							
7. Otros							
DESTINACIÓN ECONÓMICA		Cual?		ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		☒		Garaje		SI ☐ NO ☒	
2. Comercial		☐		Uso del garaje:			
3. Industrial		☐					
4. Minero		☐					
5. Agropecuario		☐					
6. Recreacional		☐					
7. Educativo		☐					
8. Salubridad		☐					
9. Cultural		☐					
10. Religioso		☐					
11. Institucional		☐					
12. Otro		☐					

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O.NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.			
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

		<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JUENEZ ROA ACTA DE VECINIDAD</p>				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4				
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49LW QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Intervención No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento		13 FEBRERO 2023				
ESTADO DE		PISOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS		X	FISURAS	X	HUMEDAD	X	BUENO	☐ REGULAR	☒ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
GRIETAS			FISURAS	X	HUMEDAD		BUENO	☒ REGULAR	☒ MALO	☒ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		LAS PAREDES DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS EN BAREQUE CON REPELLO EN CEMENTO Y PINTURA, LA CUAL PRESENTA FISURAS								
ESTADO DE		TECHOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		BUENO	☐ REGULAR	☒ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:		EL TECHO DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDO EN MADERA Y TEJAS DE ZINC, SE EVIDENCIA DETERIORO								
ESTADO DE		PISOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
ESTADO DE		PISOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
ESTADO DE		PISOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
ESTADO DE		PISOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
ESTADO DE		PISOS		ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO						
GRIETAS			FISURAS		HUMEDAD		BUENO	☐ REGULAR	☐ MALO	☐ DANOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
FIRMAS										
Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		
Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Contratista		
Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:		
17698898		17698898		17698898		17698898		17698898		
Notas:										
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).										
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sirvan los antecedentes establecidos.										

4.4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JINEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSION	1	
				PAGINA	4 DE 6	
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p> <p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>				FECHA		
				(Dia / Mes / Año)		
Contrato de Obra No. 1364 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	13	FEBRERO	2023
<p>6. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>						
						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSION	1	
				PAGINA	5 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 48H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	
				☒	☐	
6. REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueren tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>						

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>		MASPS-MN-IN-3-FR-4	
			CÓDIGO	
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	6 DE 6
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48HL'0 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	FECHA (Día / Mes / Año) 13 FEBRERO 2023	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

BAÑOS	
SALA	HABITACION
COCINA	HABITACION
HABITACION	HABITACION



VIA FIRMAS

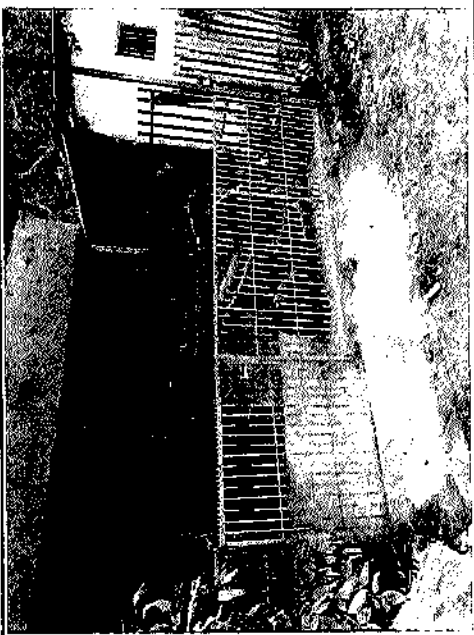

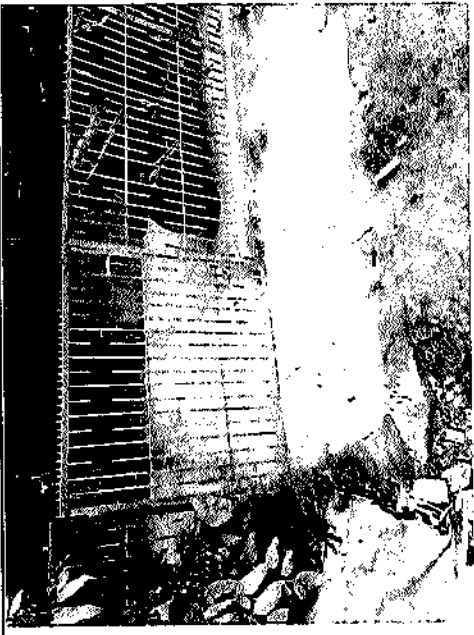
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Testigo C.C. O NIT:
Rogelio Plata 17698898			

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Cesación del Contrato (Subdirección Administrativa).

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		VERSIÓN 1	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		PÁGINA 1 DE 5.		
FECHA 14 FEBRERO 2023				
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				
2. DATOS DEL PREDIO				
Ubicación: Departamento: HUILA Municipio: SUAZA Vereda: GALLARDO PR: 21+766 MD				
Dirección: N/A		Teléfonos: CC No.		
Nombre de la persona que atiende la visita: EL PROPIETARIO NO ATENDIÓ LA VISITA				
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: EVELIO PLAZAS				
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		
No. de Hogares		No. total residentes		
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. NO		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS				
1. Acueducto		SI NO		
2. Alcantarillado				
3. Energía				
4. Gas				
5. Teléfono				
6. Televisión cable				
7. Internet				
7. Otros		Cuál?		
1. Residencial		7. Educativo		
2. Comercial		8. Salud		
3. Industrial		9. Cultural		
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		
ACCESOS VEHICULARES				
		Garaje SI NO		
		Uso del garaje:		

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O.NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Notas:		
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	3 DE 5			
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H170 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	Inicio	14 FEBRERO 2023	
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO					
ESTADO DE PISOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
NO SE TUVO ACCESO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA					
ESTADO DE PAREDES	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE TECHOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PAREDES	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE TECHOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PISOS	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
ESTADO DE PAREDES	(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)	DESPLAZAMIENTO	BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
FISURAS	HUMEDAD		BUENO	REGULAR	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:					
FIRMAS					
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Nombre: Ing. Residencia Comunal Matrícula profesional No.:		Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:		Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros). 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	14 DE 5.			
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49H.10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1954 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad do ☒ Inicio ☐ Seguimiento		
5. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
					
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4
	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			VERSIÓN	1
	FERNANDO JIMENEZ ROA			PÁGINA	5 DE 5
	ACTA DE VECINDAD			FECHA	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZUA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inició	(Día / Mes / Año)	
			Secundamiento	14	FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
<div>VIA</div>					
FIRMAS					
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
C.C. O.N.T.	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JINEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45N.10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		VERSION	1	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Iniciado	PAGINA	1 DE 5.	
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO					
		Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR	
			HUILA	SUAZA	GALLARDO	21-767	
		Dirección	N/A			Teléfonos	
		Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.		
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva					
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.					
Edad de la construcción		No. de Apartamentos					
No. de Hogares		No. total residentes					
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)					
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural					
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado					
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No					
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado					
SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones del estado de las redes:					
1. Acueducto		SI NO					
2. Alcantarillado							
3. Energía							
4. Gas							
5. Teléfono							
6. Televisión cable							
7. Internet							
7. Otros		Cuál?					
DESTINACIÓN ECONOMICA		ACCESOS VEHICULARES					
1. Residencial		Garaje					
2. Comercial		SI NO					
3. Industrial		Uso del garaje:					
4. Minero							
5. Agropecuario							
6. Recreacional							
12. Otro							

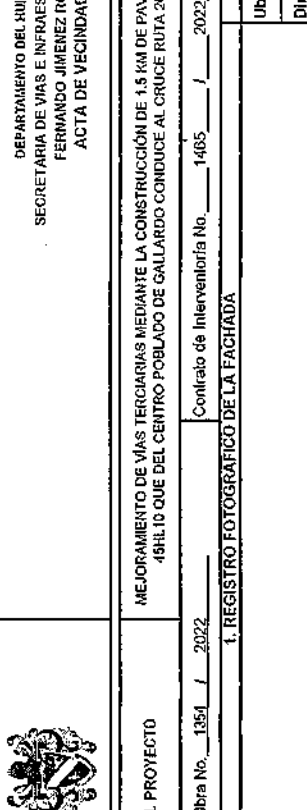
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contraloría	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:
Notas:			
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.			
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MIN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	VERSIÓN 1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022			Acta de Vecindad de ☒ Inicio ☒ Seguimiento	PÁGINA 2 DE 5.
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL				
SISTEMA DE ENTREPIESO:				
SISTEMA ESTRUCTURAL				
IRREGULARIDAD EN PLANTA				
IRREGULARIDAD EN ALTURA				
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN				
Observaciones: DURANTE LOS DÍAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA QUE FUERAN MAYORES DE EDAD Y PUDIERAN ATENDER LA VISITA				
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO				
ESTADO DE LAS FACHADAS:				
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:				
ESTADO DE CERRAMIENTOS:				
DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL AL EXTERIOR DE LA VIVIENDA CUENTA CON ANDÉN EN CONCRETO EN BUEN ESTADO, SE EVIDENCIAN ALGUNAS FISURAS				
DE ACUERDO A INSPECCIÓN VISUAL AL EXTERIOR DE LA VIVIENDA SE EVIDENCIA QUE, ESTA NO CUENTA CON CERRAMIENTO Y EL ACCESO DESDE LA VÍA ES EN TIERRA				

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4																
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	VERSÓN 1																
Contrato de Obra No. 1354 / 2022			Acta de Vechindad de	PÁGINA 3 DE 5																
Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022			Inicio Seguimiento																	
5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO																				
ESTADO DE PISOS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
ESTADO DE PAREDES (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
ESTADO DE TECHOS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
ESTADO DE FISURAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
ESTADO DE FISURAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
ESTADO DE FISURAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
ESTADO DE FISURAS (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)																				
GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE																
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: DURANTE LOS DIAS DE VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD NO SE LOGRÓ LOCALIZAR AL PROPIETARIO O RESIDENTES DE LA VIVIENDA POR TANTO NO SE PUDO TENER INGRESO A LA VIVIENDA NO SE TIENE REFERENCIA NI REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MISMO																				
FIRMAS																				
<table><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre:</td><td>Nombre:</td><td>Nombre:</td><td>Nombre:</td></tr><tr><td>Responsable Unidad Social</td><td>Ing. Residente</td><td>Interventoría</td><td>Testigo</td></tr><tr><td>C.C. O NIT:</td><td>Matrícula profesional No.</td><td>Matrícula profesional No.</td><td>C.C. O NIT:</td></tr></table>					Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Responsable Unidad Social	Ing. Residente	Interventoría	Testigo	C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT:
Firma	Firma	Firma	Firma																	
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:																	
Responsable Unidad Social	Ing. Residente	Interventoría	Testigo																	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT:																	
Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros) 4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.																				

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> <p>SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA</p> <p>FERNANDO JIMENEZ ROA</p> <p>ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	14 DE 5.
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA			
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SHL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		(Día / Mes / Año)			
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	14 FEBRERO 2023	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>					


	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1					
	PÁGINA	5 DE 5.					
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Seguimiento	FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023				
7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN							
<div></div>							
VIA							
FIRMAS							
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Tosilio C.C. O NIT:				
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).							


	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 48HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		
		Ubicación:		Departamento HUILA
		Municipio SUAZA		Vereda GALLARDO
		Dirección N/A		Teléfonos 2+775 MI
		Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA EMILCE SILVA		CC No. 1,080,362,153
		Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable (propietario de la construcción): PEDRO ANDRÉS PLAZAS		CC No. 83,240,087		
Edad de la construcción		1 AÑO	No. de Apartamentos	1
No. de Hogares		1	No. total residentes	5
Niños (menos de 14 años)		3	Adultos mayores (más de 60 años)	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. SI; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS		Observaciones del estado de las redes:		
1. Acueducto		SI	NO	
2. Alcantarillado			X	
3. Energía		X		
4. Gas		X		
5. Teléfono			X	
6. Televisión cable			X	
7. Internet			X	
7. Otros			X	
DESTINACIÓN ECONÓMICA		Cuál?		
1. Residencial		X		
2. Comercial				
3. Industrial				
4. Minero				
5. Agropecuario				
6. Recreacional				
7. Educativo				
8. Salubridad				
9. Cultural				
10. Religioso				
11. Institucional				
12. Otro				
ACCESOS VEHICULARES		Garaje		
		SI	X	NO
Uso del garaje:				

Firma	Maxia Emilce Silva	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contabilista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O.NIT:	1080367153	Mátrícula profesional No.:		Mátrícula profesional No.:	
<p>1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Veracidad corresponde a la realidad.</p> <p>2. Una vez firmado y conformado, se entregará al monitador del medio, contra el acta de veracidad suscrita entre las partes.</p>					
Notas:					

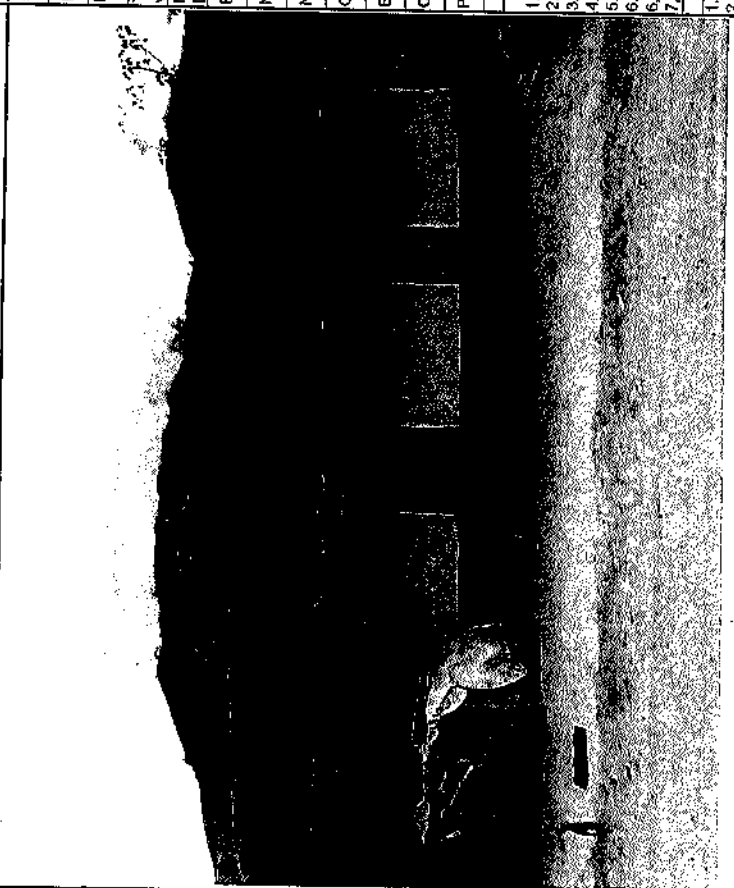
		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H.10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUZÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		14	FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento		(Día / Mes / Año)	
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado		1. Irregularidad alta	
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto		2. Irregularidad media	
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Sistema combinado en concreto		3. Irregularidad baja o inexistente	
4. Calsonits		4. Vigas metálicas		4. Prefabricados en concreto			
5. Concreto ciclopeo		5. Cercas metálicas		5. Mampostería confinada			
6. Pilotes		6. Enframado en madera		6. Mampostería reforzada			
7. Placa de cimentación		7. No aplica		7. Mampostería no reforzada			
8. No existe		8. Otro, Cuál?		8. Pórticos en acero			
9. No existe				9. Pórtico arriostrado en acero			
10. Otro, Cuál?		PIEDRA-CEMENTO		10. Pórticos y paneles en madera			
				11. Pórticos en bahareque			
				12. Muros en bahareque			
				13. Muros en tapia pisada			
				14. Muros en adobe			
				15. Construcción improvisada			
				16. Muro			
				17. Otro, Cuál?			
SISTEMA DE CUBIERTA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA				TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
1. Placa en concreto		1. Reformas (si / no)				1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Placa en Steel deck		2. En altura, No. de pisos adicionales				2. Edificaciones reforzadas	
3. Estructura metálica y leja		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)				3. Mampostería reforzada	
4. Estructura de madera y leja		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)				4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
5. Otro, Cuál?		5. Otro, Cuál?				5. Estructuras ligeras	
						6. Construcciones simples	
						7. Otro, Cuál?	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
GRIETAS		ESTADO DE LAS FACHADAS:		BUENO		REGULAR	
		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
GRIETAS		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		BUENO		REGULAR	
		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DANOS EN PUERTA Y VENTANAS	
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:							
GRIETAS		ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:		BUENO		REGULAR	
		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	
						3,5	
EL ANDEN DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDO EN PLACA DE CEMENTO, SE EVIDENCIAN GRIETAS Y FISURAS SOBRE ESTA							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:							
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		BUENO		REGULAR	
		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO	
						X	
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:							
MURO EN LADRILLO A LA VISTA DE ALTURA APROXIMADA DE 0.68 MTS (CERRAMIENTO LATERAL DERECHO SOLAMENTE)							

226

	DEPARTAMENTO DEL JUJILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL JUJILA.		VERSIÓN 1	PÁGINA 21 DE 6
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐	FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
				
Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.				


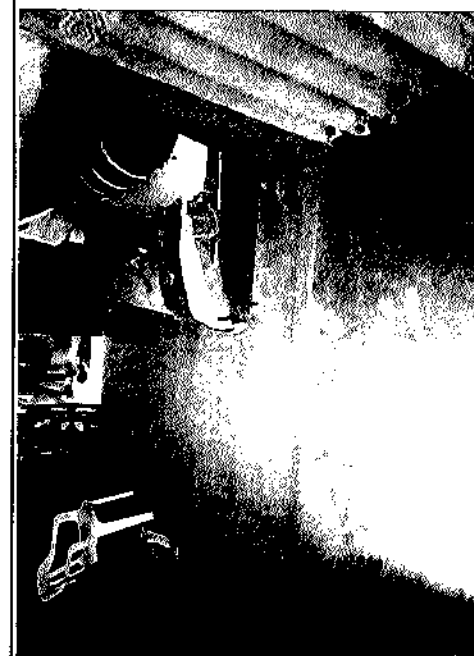
	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4</p> <p>VERSIÓN 1</p> <p>PÁGINA S DE 6</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023</p>
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento</p>
<p>6. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		
		
		
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podría adjuntar una página anexa a la página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>		

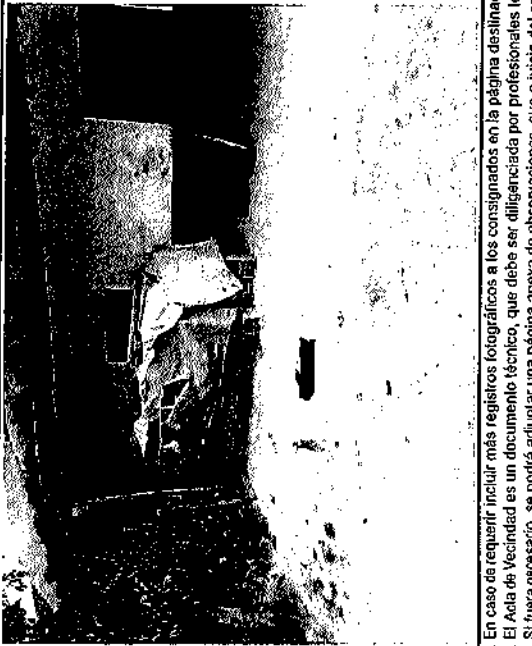
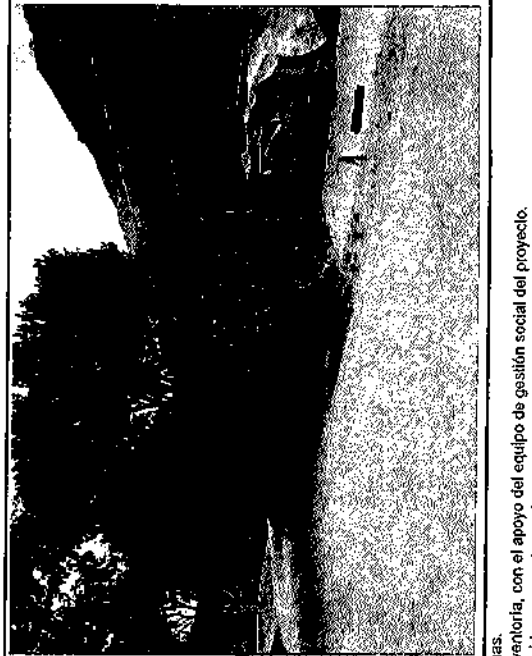
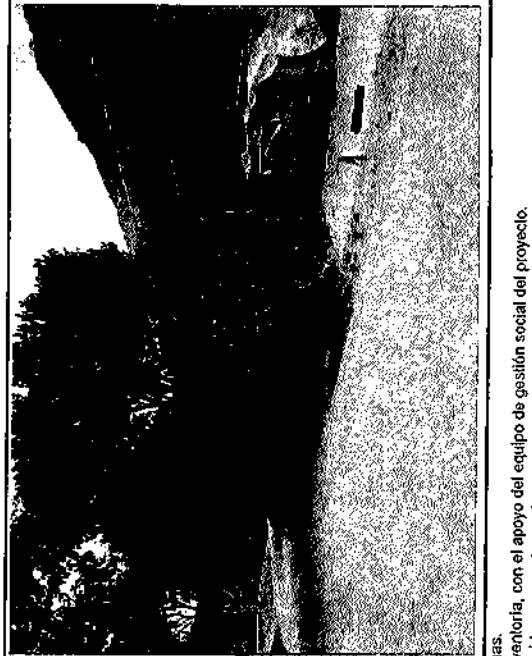
	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
	VERSIÓN	1				
	PÁGINA	6 DE 6				
	FECHA	(Día / Mes / Año)				
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		14 FEBRERO 2023		
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Control de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento			
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION						
<div><div>COCINA</div><div>PATIO</div><div>SALA</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div></div> <div>VIA</div>						
FIRMAS						
Firma Nombre: <u>Maria Emilee Silva</u>		Firma Nombre: <u>[Firma]</u>	Firma Nombre: <u>[Firma]</u>	Firma Nombre: <u>[Firma]</u>	Firma Nombre: <u>[Firma]</u>	
Responsable Unidad Social C.C. O NIT: <u>1080362153</u>		Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Ing. Residente Testigo C.C. O NIT:		
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).						

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECHIDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HC-19 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA		1 DE 6
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vechidad de Seguimiento		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA				2. DATOS DEL PREDIO		
				Ubicación: Departamento HUILA, Municipio SUAZA, Vereda GALLARDO, PR		
				Dirección N/A		21-779 MD
				Nombre de la persona que atiende la visita: DEMETRIO PLAZAS		Teléfonos
				Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		CC No. 12,295,016
				Nombre del responsable / propietario de la construcción: DEMETRIO PLAZAS		CC No. 12,295,016
				Edad de la construcción 50		No. de pisos 1
				No. de Hogares 1		No. de lotes residentes 4
				Niños (menos de 14 años) 0		Mujeres jefes de hogar 0
				CLASIFICACIÓN CATASTRAL: 1. Urbano; 2. Rural		Personas en situación de discapacidad 0
				ESTADO DEL PREDIO: 1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
				CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 1. Si; 2. No		
				PENDIENTE DEL TERRENO 1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
				SERVICIOS PUBLICOS		
				Observaciones del estado de las redes:		
				1. Acueducto SI NO		
				2. Alcantarillado SI NO		
				3. Energía SI NO		
				4. Gas SI NO		
				5. Teléfono SI NO		
				6. Televisión cable SI NO		
				7. Internet SI NO		
				7. Otros SI NO		
				DESTINACIÓN ECONOMICA		
				1. Residencial SI NO		
				2. Comercial SI NO		
				3. Industrial SI NO		
				4. Minero SI NO		
				5. Agropecuario SI NO		
				6. Recreacional SI NO		
				7. Educativo SI NO		
				8. Salud SI NO		
				9. Cultural SI NO		
				10. Religioso SI NO		
				11. Institucional SI NO		
				12. Otro SI NO		
				ACCESOS VEHICULARES		
				Garaje SI NO		
				Uso del garaje: SI NO		

Firma		Firma	
Nombre: Demetrio Plazo		Nombre: [Signature]	
Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría	
Matrícula profesional No. 12 295016		Matrícula profesional No. [Signature]	
C.C. O NIT:		C.C. O NIT:	
Notas:			
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vechidad corresponde a la realidad.			
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del predio copia del acta de vechidad suscrita entre las partes.			

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSION 1		PAGINA 2 DE 6	
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA (Dia / Mes / Año)		14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento No. 14			
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL							
CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Caissons 5. Concreto ciclopeo 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cual? PIEDRA-CEMENTO		1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámina colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cercas metálicas 6. Enfilamado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cual?		1. Pórticos en concreto reforzado 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prefabricados en concreto 5. Mampostería confinada 6. Mampostería reforzada 7. Mampostería no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos y paneles en otros 12. Muros en bahareque 13. Muros en tapia pisada 14. Muros en adobe 15. Construcción improvisada 16. Mixto 17. Otro, Cual?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		SISTEMA DE CUBIERTA		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION		IRREGULARIDAD EN ALTURA	
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro, Cual?		1. Reformas (si / no) 2. En altura: No. de pisos adicionales 3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía) 4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía) 8. Otro, Cual?		1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cual?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente	
Observaciones:							
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO							
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:	
GRIETAS		FISURAS		FISURAS		FISURAS	
X		X		X		X	
HUMEDAD		HUMEDAD		HUMEDAD		HUMEDAD	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:		DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:	
CONSTRUCCION EN BAREQUE DE 50 AÑOS, CUENTA CON PINTURA CAFÉ Y AZUL.		CONSTRUCCION EN BAREQUE DE 50 AÑOS, CUENTA CON PINTURA CAFÉ Y AZUL.		CONSTRUCCION EN BAREQUE DE 50 AÑOS, CUENTA CON PINTURA CAFÉ Y AZUL.		CONSTRUCCION EN BAREQUE DE 50 AÑOS, CUENTA CON PINTURA CAFÉ Y AZUL.	
CONSTRUCCION EN BAREQUE DE 50 AÑOS							
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:							
GRIETAS		FISURAS		FISURAS		FISURAS	
X		X		X		X	
HUMEDAD		HUMEDAD		HUMEDAD		HUMEDAD	
EL ANDEN DE LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDO EN PLACA DE CONCRETO PARA SECAR CAFÉ							
ESTADO DE CERRAMIENTOS:							
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	
DESCRIPCION DE LAS AVERIAS:							
LA VIVIENDA NO CUENTA CON CERRAMIENTO, SIN EMBARGO EL PREDIO SIN EDIFICAR CUENTA CON CERCO DE POSTES DE MADERA EN ESTADO REGULAR Y ALAMBRE DE PUA EN ESTADO REGULAR, ADEMAS EL ACCESO EN EL LATERAL IZQUIERDO D ELA VIVIENDA CUENTA CON REJA METALICA							

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4 VERSIÓN 1 PÁGINA 21 DE 6</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023</p>
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐</p>
<p>6. REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>		
		
		
<p>Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>		

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p>CÓDIGO MASP5-MN-JN-3-FR-4 VERSIÓN 1 PÁGINA 5 DE 6.</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023</p>
<p>Contrato de Obra No. 1384 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de Inicio ☒ Seguimiento ☐</p>
<p>6. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		
		
		
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contralista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>		

734

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	6 DE 6			
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	14	FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
<div><div>LAVADERO</div><div>COCINA</div><div><div>HABITACION</div><div>SALA</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div><div>HABITACION</div></div><div>VIA</div></div>					
FIRMAS					
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O.NIT:		Firma Nombre: Ing. Residente Contralista Metrícula profesional No.:		Firma Nombre: Testigo C.C. O.NIT:	
Demetrio plaza		[Firma]		[Firma]	
12 295016		[Firma]		[Firma]	
Original: Contralista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD				CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año)		14 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Velocidad de Seguimiento		1
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA						
2. DATOS DEL PREDIO		Ubicación: Departamento: HUILA, Municipio: SUAZA, Vereda: GALLARDO, PR: 21+800 MI, Dirección: N/A, Teléfonos: CC No. 12,295,016				
Tipo de tenencia de la vivienda:		1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		DEMETRIO PLAZA				
Edad de la construcción		No. de Apartamentos				
No. de Hogares		No. total residentes				
Niños (menores de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)				
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		1. Si; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO		1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				
1. Acueducto		SI NO				
2. Alcantarillado		SI NO				
3. Energía		SI NO				
4. Gas		SI NO				
5. Teléfono		SI NO				
6. Televisión cable		SI NO				
7. Internet		SI NO				
8. Otros		Cual?				
DESTINACIÓN ECONOMICA		7. Educativo, 8. Salud, 9. Cultural, 10. Religioso, 11. Institucional, 12. Otro				
1. Residencial		SI NO				
2. Comercial		SI NO				
3. Industrial		SI NO				
4. Minero		SI NO				
5. Agropecuario		SI NO				
6. Recreacional		SI NO				
ACCESOS VEHICULARES		Garaje: SI NO				
Uso del garaje:		SI NO				

Firma: Demetrio Plaza		Firma: [Signature]	
Nombre: Demetrio Plaza		Nombre: [Signature]	
C.C.O. NIT: 12245016		C.C.O. NIT: [Signature]	
Ing. Residente Contralista		Ing. Residente Interventoría	
Matrícula profesional No.:		Matrícula profesional No.:	
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Velocidad corresponde a la realidad.		1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Velocidad corresponde a la realidad.	
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de velocidad suscrita entre las partes.		2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de velocidad suscrita entre las partes.	

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	11 DE 5	
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCERAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	14	FEBRERO 2023	
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
Notas:						
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.						
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contraloría y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.						
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.						

229

	DEPARTAMENTO DEL HUILA			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			VERSION	1
	FERNANDO JIMENEZ ROA			PAGINA	5 DE 5
ACTA DE VECINDAD					
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
OBJETO DEL PROYECTO	Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio	Seguimiento
				14	FEBRERO 2023
FECHA (Día / Mes / Año)					
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
<div style="text-align: center;">LOTE</div> <div style="text-align: center;">VIA</div>					
FIRMAS					
Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Interventoría		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O.NIT:		Matrícula profesional No.		Matrícula profesional No.	
Original: Contabilista		Original: Contabilista		Original: Contabilista	
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).		Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).		Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD			CÓDIGO	MASPS-MH-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 204 EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA	(Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Velocidad No. 1485 / 2022	Inició Seguimiento	14	FEBRERO 2023
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA					
2. DATOS DEL PREDIO					
Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR	
Dirección	HUILA	SUAZA	GALLARDO	214815 MI	
Nombre de la persona que atiende la visita:	N/A		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita: JORGE OVIEDO			CC No.	1,080,366,486	
Tipo de tenencia de la vivienda:			1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No. 1,080,366,486		
Jorge Oviedo					
Edad de la construcción	1 AÑOS	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menores de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:			1. Urbano; 2. Rural		
ESTADO DEL PREDIO:			1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			1. SI; 2. No		
PENDIENTE DEL TERRENO			1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
SERVICIOS PÚBLICOS			1		
1. Acueducto	SI	NO	Observaciones del estado de las redes: NO CUENTA CON NINGUNO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LO HACE ATRAVES DE TUBERIA QUE CRUZA LA VIA EXISTENTE POR PREDIO DEL SEÑOR DEMETRIO PLAZAS HASTA LA FUENTE INDICA		
2. Alcantarillado	X				
3. Energía	X				
4. Gas	X				
5. Teléfono	X				
6. Televisión cable	X				
7. Internet	X				
8. Otros	X				
DESTINACIÓN ECONOMICA			¿Cuál?		
1. Residencial	X				
2. Comercial					
3. Industrial					
4. Minero					
5. Agropecuario					
6. Recreacional					
ACCESOS VEHICULARES			Garaje		
			SI ☐ NO ☒		
			Uso del garaje:		

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:
1080366486		
Notas:		
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Velocidad corresponde a la realidad.		
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de velocidad suscrita entre las partes.		

		DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VEJECIDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4			
						VERSIÓN	1			
						PÁGINA	2 DE 6			
OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						FECHA	(Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1405 / 2022		Acta de Vejeidad de Seguimiento						
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL										
CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTRENQUE:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA				
1. Zapatas		1. Placa maciza de concreto		1. Pórticos en concreto reforzado		1. Irregularidad alta				
2. Vigas corridas		2. Placa aligerada de concreto		2. Muros estructurales en concreto		2. Irregularidad media				
3. Sistema mixto		3. Lámina colaborante (Steel deck)		3. Sistema combinado en concreto		3. Irregularidad baja o inexistente				
4. Caissons		4. Vigas metálicas		4. Prefabricados en concreto						
5. Concreto ciclopeo		5. Cercas metálicas		5. Mampostería confinada						
6. Pilotes		6. Entramado en madera		6. Mampostería reforzada						
7. Placa de cimentación		7. No aplica		7. Mampostería no reforzada						
8. No identificada		8. Otro, Cuál?		8. Pórticos en acero		1. Irregularidad alta				
9. No existe				9. Pórtico arriostrado en acero		2. Irregularidad media				
10. Otro, Cuál? CEMENTO-PIEDRA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera		3. Irregularidad baja o inexistente				
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros						
		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque						
		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada						
		4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe						
		5. Otro, Cuál?		15. Construcción improvisada						
				16. Mixto						
				17. Otro, Cuál?						
Observaciones:										
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO										
ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		ESTADO DE LAS FACHADAS:		
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
FACHADA TERMINADA CON GRANIPLAST EN BUEN ESTADO										
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:										
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES:										
LATERALES EN LADRILLO										
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:										
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES:										
ANDEN EN CONCRETO Y LADRILLO EN BUEN ESTADO- ACCESO EN TIERRA										
ESTADO DE CERRAMIENTOS:										
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		
DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:										
NO CUENTA CON CERRAMIENTO										

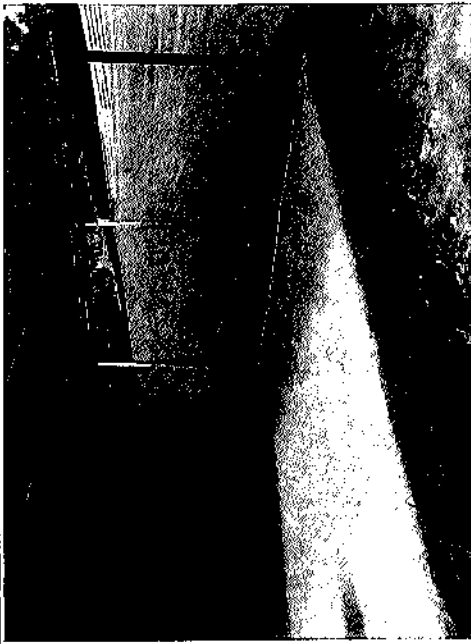
	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD</p>	<p></p>	<p>MASPS-MN-IN-3-FR-4 1 A DE S.</p>
<p>OBJETO DEL PROYECTO</p>	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 49HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</p>	<p>FECHA (Dia / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023</p>	
<p>Contrato de Obra No. 1354 / 2022</p>	<p>Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022</p>	<p>Acta de Vecindad de</p>	<p>Inicio Suplemento ☒</p>
<p>6. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>			
			
			
<p>Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto. 7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1			
	PÁGINA	5 DE 5			
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1485 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	14	FEBRERO 2023
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION					
<p>BAÑOS Y LAVADERO</p> <div><div>HABITACION</div><div>COCINA</div><div>HABITACION</div><div>SALA</div><div>TIENDA</div></div> <p>VIA</p>					
FIRMAS					
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C.O.NIT: 1080366486	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Tasligo C.C.O.NIT:		
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).					

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMÉNEZ ROA ACTA DE VECINDAD				CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	OBJETO DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		VERSIÓN	1
Contrato de Obra No. 1354 / 2022		Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022		Acta de Vecindad de Seguimiento	PÁGINA	1 DE 5.
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA				FECHA		
				(Día / Mes / Año)		
				14 FEBRERO 2023		
				2. DATOS DEL PREDIO		
				PR		
				Vereda		
				GALLARDO		
				21+825 MI		
				Municipio		
				SUAZA		
				N/A		
				Dirección		
				N/A		
				Teléfonos		
				CC No.		
				Nombre de la persona que atiende la visita:		
				1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
				Tipo de tenencia de la vivienda:		
				Nombre del responsable / propietario de la construcción:		
				CC No.		
				Edad de la construcción		
				No. de Apartamentos		
				No. de pisos		
				1		
				No. de Hogares		
				No. total residentes		
				Mujeres jefes de hogar		
				Niños (menores de 14 años)		
				Adultos mayores (más de 60 años)		
				Personas en situación de discapacidad		
				CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		
				1. Urbano; 2. Rural		
				2		
				ESTADO DEL PREDIO:		
				1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado		
				3		
				CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		
				1. SI; 2. NO		
				PENDIENTE DEL TERRENO		
				1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado		
				1		
				SERVICIOS PÚBLICOS		
				Observaciones del estado de las redes:		
				1. Acueducto		
				2. Alcantarillado		
				3. Energía		
				4. Gas		
				5. Teléfono		
				6. Televisión cable		
				8. Internet		
				7. Otros		
				Cual?		
				DESTINACIÓN ECONÓMICA		
				1. Residencial		
				2. Comercial		
				3. Industrial		
				4. Minero		
				5. Agropecuario		
				6. Recreacional		
				7. Educativo		
				8. Salud		
				9. Cultural		
				10. Religioso		
				11. Institucional		
				12. Otro		
				ACCESOS VEHICULARES		
				Garaje		
				SI NO		
				Uso del garaje:		
				SI NO		
				FIRMAS		

Firma		Firma	
Nombre:	Ing. Residente Contralista	Nombre:	Ing. Residente Interventoría
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.:	Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.:
C.C. O NIT:		C.C. O NIT:	
Notas:			
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.			
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.			

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VELOCIDAD		CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL 40 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023	VERSION 1 PAGINA 2 DE 5
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Velocidad de Inicio Seguimiento 31	
3. DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL			
CIMENTACION:		SISTEMA ESTRUCTURAL	
1. Zapatas 2. Vigas corridas 3. Sistema mixto 4. Carsoons 5. Concreto colúmpao 6. Pilotes 7. Placa de cimentación 8. No identificada 9. No existe 10. Otro, Cuál?	SISTEMA DE ENTRENPO:		
1. Placa maciza de concreto 2. Placa aligerada de concreto 3. Lámia colaborante (Steel deck) 4. Vigas metálicas 5. Cercas metálicas 6. Enramado en madera 7. No aplica 8. Otro, Cuál?		1. Pórticos en concreto reforzado 2. Muros estructurales en concreto 3. Sistema combinado en concreto 4. Prelabricados en concreto 5. Mampostería confinada 6. Mampostería reforzada 7. Mampostería no reforzada 8. Pórticos en acero 9. Pórtico arriostrado en acero 10. Pórticos y paneles en madera 11. Pórticos y paneles en otros 12. Muros en bahareque 13. Muros en lagia pisada 14. Muros en adoba 15. Construcción improvisada (perpendicular a la vía) 16. Mixto 17. Otro, Cuál?	
SISTEMA DE CUBIERTA		TPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
1. Placa en concreto 2. Placa en Steel deck 3. Estructura metálica y teja 4. Estructura de madera y teja 5. Otro, Cuál?	1. Edificaciones con reforzamiento especial 2. Edificaciones reforzadas 3. Mampostería reforzada 4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida 5. Estructuras ligeras 6. Construcciones simples 7. Otro, Cuál?		1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente 1. Irregularidad alta 2. Irregularidad media 3. Irregularidad baja o inexistente
Observaciones: NO SE TUVO INFORMACION DE LA VIVIENDA DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO NO RESIDE ALLI. SOLAMENTE LOS FINES DE SEMANA QUE EL SITIO COMERCIAL ES ABIERTO AL PUBLICO			
4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO			
GRIETAS	FISURAS	DESPLAZAMIENTO	BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
ESTADO DE LAS FACHADAS:			
GRIETAS	FISURAS	DESPLAZAMIENTO	BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:			
GRIETAS	FISURAS	DESPLAZAMIENTO	BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERNA DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE LOS LATERALES DE ESTA SON EN LADRILLO EN BUEN ESTADO			
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:			
GRIETAS	FISURAS	DESPLAZAMIENTO	BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:			
GRIETAS	FISURAS	DESPLAZAMIENTO	BUENO DANOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: DE ACUERDO A INSPECCION VISUAL DE LA PARTE EXTERNA DE LA VIVIENDA SE LOGRA EVIDENCIAR QUE CUENTA CON ANDEN EN LADRILLO Y CONCRETO EN BUEN ESTADO, EL ACCESO POR LA VIA ES DESTAPADO			
ESTADO DE CERRAMIENTOS:			
MALLA ELABORADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	BUENO MURO
DESCRIPCION DE LAS AFECTACIONES: NO CUENTA CON CERRAMIENTO			

	<p>DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> <p>SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA</p> <p>FERNANDO JIMENEZ ROA</p> <p>ACTA DE VECINDAD</p>				CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4	
					VERSION	1	
					PAGINA	14 DE 5.	
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HIL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				FECHA	(Dia / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoria No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento	14 FEBRERO 2023			
<p>6. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>							
							
							
<p>Notas:</p> <p>5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.</p> <p>6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.</p> <p>7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.</p>							

	DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA FERNANDO JIMENEZ ROA ACTA DE VECINDAD			CÓDIGO MASPS-MN-IN-3-FR-4
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍSIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 4SHL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			FECHA (Día / Mes / Año) 14 FEBRERO 2023
Contrato de Obra No. 1354 / 2022	Contrato de Interventoría No. 1465 / 2022	Acta de Vecindad de Inicio Seguimiento ☒		
7. PLANO DE LA CONSTRUCCION				
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>				
VIA _____				
FIRMAS				
Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.:	Firma Nombre: Tasligo C.C. O NIT:	
Original: Contratista. Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).				



CONTRATO No. 1354 DE 2022

ACTA DE PERMISO DE OBRA PARA CORTE DE TALUD.

Fecha

15 02 2023

LUGAR:

BRASUETO/GALLARDO/SUAZA

DD MM AA

PR:

214613 AL PR 214614 HADSEN PICHUERO

ASISTENTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO
LUKA YOD GIMAN	SOCIO AMBIENTAL
DAIRO QUIROGA	TOPOGRAFIA

PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR

NOMBRE	CARGO
DEMETRIO PLAZAS	PROPIETARIO

Siendo las 08:30 AM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes para tratar los temas relacionados con

TEMAS A TRATAR

Solicitud de permiso al Señor (a) DEMETRIO PLAZAS; en calidad de PROPIETARIO del predio denominado REALIZAR ACTIVIDADES DE CORTE DE TALUD PARA EMULACION DE VIA; para

; y demás obras requeridas en la ejecución del Contrato 1354 DE 2022 para "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, Las obras del predio en mención se encuentran localizadas en el PR 214613 AL 214614 costado PROPIETARIO de la vía que de GALLARDO conduce a 20A. El contrato esta siendo ejecutado por FERNANDO JIMENEZ ROA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Esta actividad en ningún caso representa una afectacion predial por parte del DEPARTAMENTO HUILA y las obras ejecutadas en mi predio no seran causal de pago por compensacion economica.

(Firma) [Firma](Nombre) LUKA YOD GIMAN
Contratista

(Firma)

(Nombre) LUKA YOD GIMAN
Contratista(Firma) Demetrio plazas H.(Nombre) Demetrio plazas H.
Propietario(Firma) [Firma]
(Nombre) JUAN V. HAYONDO 1206 ASSESOR

Representante de Interventoria

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista



CONTRATO No. 1354 DE 2022

ACTA DE PERMISO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS

Fecha

15 02 2023
DD MM AA

LUGAR:

PR:

PARQUEO 16 ALVARADO/ROSA
21+530. AL PR. 21+614 MARQUEO IZQUIERDO.

ASISTENTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO
LUISA FLORENTINO	SOCA ASISTENTE
JARRO QUIROGA	TOPOGRAFO

PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR

NOMBRE	CARGO
ERNESTO PLATA	PROPIETARIO
DENISIO PLATA	ENCARGADO

Siendo las 08:30 AM se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes para tratar los temas relacionados con

TEMAS A TRATAR

Solicitud de permiso al Señor (a) ERNESTO PLATA; en calidad de PROPIETARIO del predio denominado RESERVA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBOS PARA IMPLANTACION DE VIA

; y demás obras requeridas en la ejecución del Contrato 1354 DE 2022 para "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20 A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Las obras del predio en mención se encuentran localizadas en el 21+530 AL 21+614 costado IZQUIERDO de la vía que de GALLARDO conduce a RUTA 20A. El contrato esta siendo ejecutado por FERNANDO JIMENEZ ROA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Esta actividad en ningún caso representa una afectacion predial por parte del DEPARTAMENTO HUILA y las obras ejecutadas en mi predio no seran causal de pago por compensacion economica.

(Firma)

(Nombre)

Contratista

(Firma)

(Nombre)

Contratista

(Firma)

(Nombre)

Propietario

(Firma)

(Nombre)

Representante de Interventoria

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

ANEXO 5. INSPECCIONES KIT EMERGENCIAS

 FERNANDO JIMENEZ ROA INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 001
	INSPECCIONES BOTIQUIN Y CAMILLA		Código: SIG-GM-F-15
			Página: 1 De 1

FECHA INSPECCIÓN : 10/02/2023 TIPO DE BOTIQUIN: FIJO ☒ PORTATIL ☐
 UBICACIÓN / AREA O VEHICULO: ALMACEN PLACA: X


BOTIQUIN						
ITEM	ELEMENTO	SI	NO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Material para Limpieza y Protección Tejidos						
1	Apósitos oclusivos o Apósitos oculares	X		1	X	
2	Microporex (Grueso / Delgado)					
3	Gasas en paquetes Individuales					
4	Curitas o banditas					
5	Apósitos o toallas higiénicas					
6	Esparadrapo tela	X		1	09/2024	
7	Algodón 5x5x10x5	X		1	02/2024	
8	Aplicadores (Copitos)	X		5	X	
Soluciones Para Limpieza y Desinfección						
9	Isodine solución (ml - cc)	X		100ml	10/2024	
10	Isodine espuma (ml - cc)					
11	Suero fisiológico o solución salina (ml-cc)	X		1	10/2023	
12	Alcohol (ml-cc)	X		350ml	02/2024	
Material para Inmovilizar						
13	Baja lenguas	X	10	10	seg 010	
14	Vendaje elastico con ganchos					
15	Inmovilizador para cuello o collarin					
Material de Apoyo						
16	Tapabocas					
17	Guantes de latex desechables (M-L)	X		10	01/2026	
18	Salas de hidratación (suero bebble)					
19	Jeringas desechables	X		1	02/26	
20	Preservativos	X		2	10/26	
21	Tijeras	X		1	X	Bisturi
22	Manual de primeros auxilios					
23	Pito	X		1		
Otros						
24	Antiséptico para manos	X		1	10/2023	2x 500ml
25	Antiséptico para heridas	X		1	X	
26	Gel (antibacteriano)	X		1	X	

CAMILLA					
ítem	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	
1	Orden y Aseo	X			
2	Condiciones Físicas	X			
3	Cinturones	X			
4	Agarraderas	X			
5	Señalización	X			

FIRMA RESPONSABLE
 Nombre: WILSON GONZALEZ
 Cargo: ALMACEN

INSPECCIONADO POR:
 Nombre: WILSON GONZALEZ
 Cargo: ALMACEN

FECHA. 1/09/2017	ELABORO. PROFESIONAL HSEQ	REVISO. GERENTE	APROBO. GERENTE
DOCUMENTO CONTROLADO			



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO PROGRAMACIÓN DE OBRA

[illegible]




FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO

FLUJO DE CAJA SEMANAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 1 de 9

FECHA: 31 DE ENERO DE 2023	HORA INICIO: 10:00 AM
LUGAR: PARQUE CENTRAL DE GALLARDO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SOCIALIZACION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila".	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: SOCIALIZACION EN CENTRO POBLADO DE GALLARDO	
Agenda de la Reunión: <ul style="list-style-type: none"> - Presentación. - Descripción del contrato. - Socialización general de actividades. - Intervenciones a realizar. - Conformación de la Veeduría. 	

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 2 de 9

En el Centro poblado de Gallardo del municipio de Suaza, Departamento del Huila, se reunieron: Por parte del Contratista de obra, El ingeniero Fernando Jiménez Roa en calidad de Contratista y el Ingeniero Leonardo Ruiz Maldonado en calidad de Residente de Obra; Por parte de la Interventoría de Obra, Luis Miguel Perdomo en calidad de Interventor; y la comunidad del corregimiento de Gallardo relacionada en la asistencia de la presente reunión, con el fin de socializar el proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN:

Dando inicio hacen presencia: Representación de supervisión del contrato, Interventoría, Contratista, administración municipal y comunidad general, la supervisión informa de manera general la descripción del contrato. Seguidamente el contratista de obra indica las actividades a desarrollarse, la disposición de personal, equipo y maquinaria, además manifiesta la necesidad de contar con personal de la zona, y realiza la presentación de su equipo de trabajo. La interventoría del contrato en cabeza del Ingeniero Luis Miguel Perdomo interviene indicando el personal que realizará la interventoría, y continúa la intervención el coordinador de interventoría, quien manifiesta que el acta de inicio de obra tendrá inicio el día 01 de febrero de 2023. Continúa la intervención de la comunidad, quienes manifiestan sus expectativas con la ejecución del contrato. La administración municipal en cabeza del Señor Alcalde manifiesta que existe un tramo de aproximadamente 300 mts. del tramo del proyecto en mención que no cuenta con Red de alcantarillado, y que esta

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN		Código: SIG-GE-F-01
			Página: 3 de 9

<p>actividad debe programarse, gestionarse y realizarse, pero a nivel se realizarán las gestiones y programaciones necesarias por parte de la Administración Municipal.</p> <p>- Durante la Socialización se manifestó por parte de la Comunidad sus inquietudes respecto al control del tráfico, y se indicó los horarios de trabajo y en los que podrá haber tránsito.</p> <p>- Finalizada la Socialización por parte de la comunidad se postularon integrantes de ellos para la conformación de la Veeduría Ciudadana del Contrato, se firmó el acta de conformación para posteriormente notificar en persona al Municipio de Suiza.</p> <p>- El Contratista de obra también manifestó que ya se están realizando las gestiones para la solicitud del Permiso de Ocupación de Calles para la construcción de Boxwheeler ubicado en el 21 + 520. del proyecto.</p>
--

CONFORMACION VEEDURIA CIUDADANA:

1. Guillermo Melina Cepeda.	Ced. 4.881.107 de Acevedo.
2. Orlando Perez.	Ced. 17.640.694 de Florencia.
3. Moises Quesada Quintero.	Ced: 83.086.559 de Guadalupe.
4. Miguel Melina Antun	Ced. 83.182.312 de Acevedo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA
obra Alcantarillado 200mts.	Alcaldía Suiza.		
Permiso ocupación de calles.	Contratista obra.		Resolución.

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 4 de 9

ASISTENTES:

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	José Eissenhauer Velasco	José E Velasco
2	Guillermo M. Siron	Guillermo M. Siron
3	Narceniza Quesada	Narceniza Quesada
4	Orlando Perez	Orlando Perez
5	M. Ruby Rivera	M. Ruby Rivera
6	Alvaro	Alvaro
7	Luz Marina	Luz Marina Avevalo
8	ARMANDO VARGAS PLAZAS.	ARMANDO VARGAS PLAZA
9	Gilberto Silva	Gilberto Silva
10	Edgar Plaza U.	Edgar Plaza U.
11	ISIDORO	B
12	Luis Eduardo Plaza V.	Luis Eduardo Plaza V.








Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 5 de 9

13	Jose A Rivera	JAR
14	Adelson Silva	Adelson
15	Evelio Ramirez	Evelio Ramirez
16	Edilberto Ramirez	Edilberto Ramirez
17	Miguel Medina	Miguel Medina
18	Olivia Ramos Silva	Olivia R S
19	JOHN CARUATAI	JA
20	Luis Corra	Luis Corra
21	Lucila Plaza	Lucila Plaza
22	Guillermo Plazas	Guillermo Pl
23	Edgar Medina	Edgar Medina
24	Carlos Alino Anaya	Carlos Alino Anaya
25	Tulio Gillo	Tulio Gillo
26	Luis Emilio Correa	Luis Correa





Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 6 de 9

NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA
27	esteban medina	
28	cristian andres ortiz	
29	wilson Rojas H	
30	IVAN DURAN	
31	Anibal Valenzuela	
32	Juan Sebastian Cuellar Valenzuela	
33	Olmedo Pozo	
34	Maria Adela castro.	Maria Adela castro.
35	Luis B. Bermudez P.	
36	Marcelo Silva E.	Marcelo Silva E.
37	Ricardo Silva	
38	José Angel Vieda Pardo	
39	SHAN FREDY MAYUNBO WELLAN	

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 7 de 9

40	Luis Polys Fonseca	
41	Jhonatan Adolfo Duran	
42	Leonardo A. Ruiz Maldonado	
43	Walter Polo Guevara	
44	Fernando Jimenez Roa	
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 8 de 9

53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 9 de 9

66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultaria-Interventoria-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 1 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila	FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
ING. DIEGO VARGAS	APOYO SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA -GOBERNACION DEL HUILA
DR. MOISESE ORTIZ ALARCON	ALCALDE DE SUAZA
DR. DUBER ALEXANDER RAMOS C.	SECRETARIO PLANEACION MUNICIPIO DE SUAZA
ING. FENANDO JIMENEZ ROA	R.L. DEL CONTRATO DE OBRA
ING. LEONARDO RUIZ MALDONADO	RESIDENTE DE OBRA
FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ	INSPECTOR DE OBRA
LAURA NATHALIE POLO GUZMAN	APOYO AMBIENTAL Y SISO
ING . LUIS MIGUEL PERDOMO V.	CONTRATISTA - INTERVENTOR
ING. LUIS CARLOS FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO	CORDINADOR DE INTERVENTORIA
ING. JHON FREDY MAYUNGO CUELLAR	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. JHONATAN ADOLFO DURAN	INSPECTOR DE INTERVENTORIA
	COMUNIDAD DEL CENTRO POBLADO GALLARDO

Nota: Se adjunta listados de asistentes a socialización

OBJETO DE LA REUNION:

Socialización por parte de la Gobernación del Huila del contrato de obra No. 1354 de 2022 que tiene por objeto: **MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza. DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 2 de 9
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

A las 10:00 A.M del día 31/01/2023; como se tenía programado se da inicio a la socialización de proyecto en el centro poblado Gallardo en el Municipio de Suaza; Toma la palabra el Ing. DIGO VARGAS por parte de la Gobernación del Huila – Secretaria de vías E infraestructura, quien agradece la asistencia del equipo de obra e interventoría, señor alcalde del Municipio de Suaza, Secretario de Planeación del Municipio de Suaza y de la comunidad en general que hace presencia en el polideportivo cubierto del centro poblado.

Toma la palabra el Ing. LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO, para hacer la presentación del contratista de obra con su equipo de apoyo; como también hace la presentación del equipo de apoyo de la interventoría encabezado por su coordinador general el Ing. JAMES ANDRADE ZAMBRANO.

Posteriormente le seden la palabra al contratista de obra e interventoría quienes hacen la presentación de sus equipos de trabajo quienes van estar a cargo del proyecto.

Seguidamente toma la palabra el ingeniero FERNANDO JIMENEZ ROA, contratista de obra quien explica el alcance del proyecto y manifiesta que los trabajos que se van a realizar son los siguientes:

- Tramo a intervenir 1.5 km
- Conformación de calzada existente.
- Suministro e instalación de base granular de 0,15 m.
- Pavimento Rígido MR-40, espesor (0,20) m, juntas de dilatación selladas, texturizado, pasadores transversales en hierro liso de 1" de diámetro, longitud 0,35 m, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0,85 m separadas 1,20 m, curado con antisol.
- Construcción de Bordillo
- Reposición de 9 alcantarillas.
- Construcción de un Box Coulvert.
- Línea de demarcación.
- Tachas reflectivas.

Toma la palabra el señor alcalde del Municipio de Suaza, quien da un cordial saludos a los asistentes, seguidamente argumenta que el tramo en 300 ml llegando al centro el poblado requiere el cambio de alcantarillado, por tal motivo le pide respetuosamente al contratista de obra e interventoría, que hasta tanto no se haga el cambio de alcantarillado, no se intervenga este tramo, igualmente manifiesta el compromiso de la Administración Municipal de realizar la restitución del alcantarillado con el apoyo de la comunidad en mano de obra.

Seguidamente toma la palabra el Ing. James Andrade Zambrano coordinador de la interventoría, manifiesta que el plazo de ejecución del proyecto es de 6 meses y que es importe el compromiso que deben de tener todos los partes vinculados en este proyecto para sacarlo adelante, igualmente le recomienda al señor alcalde del Municipio de Suaza gestionar los recursos lo más pronto posible para poder realizar el cambio de alcantarillado y así poder intervenir el tramo de 300 ml a que hizo referencia. Agrega el Ing. Andrade

GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	SOCIALIZACION DEL PROYECTO			Página 3 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA: Día: 31 Mes:01 Año: 2023

Zambrano que para tener la claridad para la inversión de los recursos públicos en el objeto del contrato de obra No. 1354 de 2022; solicitara mediante comunicación escrita a la Alcaldía de Suaza el estado de las redes secas y húmedas del corredor objeto del mejoramiento. Dejando claro en esta acta de socialización que los recursos destinados por el contrato de obra No. 1354 de 2022; no se utilizaran para adelantar trabajos de redes de infraestructura de dicho corredor vial. Concluye el Ing. Andrade Zambrano la importancia para la comunidad crear la veeduría ciudadana para la vigilancia de los trabajos que se van a ejecutar, al mismo tiempo hace las aclaraciones a las dudas correspondientes que manifiesta la comunidad.

Toma la palabra el señor Alcalde para manifestar que una vez termine la socialización del proyecto se reunirá con la comunidad para abordar el tema del alcantarillado a restituir; mirando lo más conveniente para la ejecución del mismo; una propuesta rápida sería abordar la compra de la tubería como un suministro y mirarían la forma para su instalación.

Toma la palabra el fontanero para comunicar a los asistentes que se debe tener cuidado con una algunas tuberías que se encuentran superficiales en el tramo del proyecto a intervenir; como también hay que tener cuidado con la red eléctrica que surte la energía eléctrica al Colegio; red que se encuentra superficial al momento de cruzar la vía en la cual se realizaran los trabajos.

La comunidad en general agradece la disposición por parte de la Gobernación del Huila por adelantar los trabajos en este sector del municipio; solicitando que ojalá la obra se construya dentro del tiempo estipulado en el contrato; el cual corresponde a seis (6) meses.

Una vez terminada la intervención de todas las personas vinculadas en el proyecto, se procede a conformar el comité de veeduría ciudadana por parte de la comunidad que asisten a la socialización.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1354 de 2022:

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FERNANDO JIMENEZ ROA		
	NIT / C.C.:	12.192.340		
	DIRECCIÓN:	Carrera 7 No. 9-47 Casa 1	TEL:	8332529
	CIUDAD:	Garzón -Huila		
	REPR. LEGAL	FERNANDO JIMENEZ ROA		
	C. C. No. :	12.192.340 de Garzón – Huila		

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 4 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila.		
VALOR DE CONTRATO:	\$ 3.450.118.172 VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO:	Se acordó que será el 1 de febrero siempre y cuando el contratista de obra presente toda la documentación solicitada por parte de la interventoría.		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	DICIEMBRE 19 de 2022	No. Póliza:	560-74-994000028832
		No. Póliza:	560-74-9940000156756
		Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:	DICIEMBRE 7 de 2022		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464 DE 2022:

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO		
	NIT / C.C.:	7697592		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 10 A 134B 82 AP 303	TEL:	31558641874
	CIUDAD:	Neiva		
	REPR. LEGAL	LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO		
	C. C. No. :	7.697.592 de Neiva		

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 5 de 9
	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
VALOR DE CONTRATO:	\$280.602.000		
	VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.		
FECHA DE INICIO:	ENERO 20 DE 2023		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NOVIEMBRE 17 de 2022	No.Póliza Extracontractual:	NV-100014452
		No.Póliza cumplimiento	NV-100077194
		Aseguradora:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:	NOVIEMBRE 11 DE 2022		

Para terminar el proceso de socialización la interventoría externa hace entrega a la Administración Municipal como a la comunidad de un juego de los documentos del contrato de obra No. 1354 de 2022 y del contrato de interventoría No. 1464 de 2022.

NOTA: Hace parte integral de la presente acta de socialización el listado de asistencia en cuatro (4) folios adjuntos.

No siendo más el motivo de la reunión se da por terminada a las 12:15 P.M.

GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 6 de 9
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila	FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023

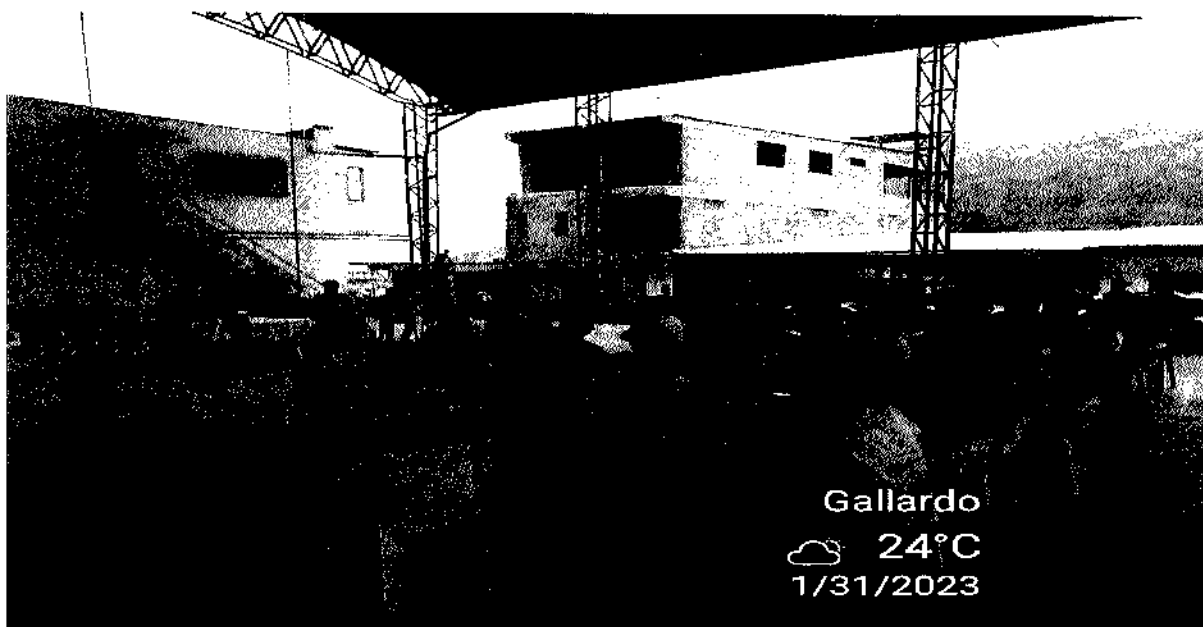
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila.



GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 7 de 9
CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila	FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023




GOBERNACION DEL HUILA	SOCIALIZACION DEL PROYECTO		Página 8 de 9
	<p>- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA</p> <p>- INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022</p> <p>OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila</p>		FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023



GOBERNACION DEL HUILA CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	Página 9 de 9
	<p>- CONTRATISTA: FERNANDO JIMENEZ ROA - INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1464/ 2022 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA</p>	<p>FECHA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2023</p>




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 4 de 9

ASISTENTES:


	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	José Eusebio del Velasco	José E. Velasco
2	Guillermo M. Sison	Guillermo M. Sison
3	Encarna Rueda	Encarna Rueda
4	Edgardo Pérez	Edgardo Pérez
5	M. R. R. R.	M. R. R. R.
6	Alvaro	Alvaro
7	Luzmaria	Luzmaria Arce
8	ARMANDO VARGAS PIAZAS.	ARMANDO VARGAS PIAZAS
9	Edgardo Silva	Edgardo Silva
10	Edgardo Plaza	Edgardo Plaza
11	ISIDORO	ISIDORO
12	José Eusebio Plaza V.	José Eusebio Plaza V.

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 5 de 9

13	José A. Páez	JAP
14	Adilson Silva	Adilson
15	EUSEBIO RAMIREZ	EUSEBIO RAMIREZ
16	Edilberto Ramirez	Edilberto Ramirez
17	Miguel Medina	Miguel Medina
18	Alma Ramos Silva	Alma R
19	JOHN CAPUATA	JA
20	Rodrigo	Rodrigo
21	Luis Plaza	Luis Plaza
22	Guillermo Plaza	Guillermo P
23	Edgardo Ramirez	Edgardo Ramirez
24	Carlos Alonzo Cordero	CA
25	Tulio Gillo	Tulio Gillo
26	Luis Emilio Correa	Luis Correa

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 6 de 9

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
27	WILSON ROSAS M.	
28	CRISTIAN ANTONIO GONZALEZ	
29	WILSON ROSAS M.	
30	WILSON ROSAS M.	
31	Andrés Valenzuela	Andrés Valenzuela
32	Juan Sebastián Cuéllar Valenzuela	Juan Sebastián Cuéllar Valenzuela
33	Olmedo Pozo	Olmedo Pozo
34	María Adela Castro	María Adela Castro
35	Enrique Bermúdez	Enrique Bermúdez
36	Narciso Silva	Narciso Silva
37	Ricardo Silva	Ricardo Silva
38	José Ángel Medina Pardo	José Ángel Medina Pardo
39	Enrique Bermúdez	Enrique Bermúdez

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 7 de 9

40	<i>Indice</i>	<i>[Signature]</i>
41	<i>Indice</i>	<i>[Signature]</i>
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales-Construcción-Consultaría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

ANEXO DOCUMENTOS DE CONFORMACIÓN DE VEEDURIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO – PERSONERÍA
NIT: 891180191-2



08 de febrero de 2023, Suaza Huila

Señores,
VEEDORES COMUNITARIOS
FERNANDO JIMENEZ MARTINES
fernandojimenezroa1@gmail.com
Suaza Huila

Oficio No. 020-2023

Ref: RECONOCIMIENTO VEEDURIA CIUDADANA.

Cordial saludo,


Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacerle entrega de copia autentica de la Resolución No.004 del 08 de febrero de 2023. Por medio de la cual, se reconoce la inscripción en el registro público de La Personería Municipal de Suaza, veeduría ciudadana del CONTRATO N° 1354 DE 2022, denominada "VEEDURIA AL CONTRATO N° 1354 DE 2022".

Lo anterior de acuerdo a lo solicitado por usted mediante oficio de fecha 01 de febrero de 2023, para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo dos (2) folios.

Atentamente,

DIONEL MARIA VARGAS CASTRO
Personero Municipal



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO – PERSONERÍA
NIT: 891180191-2



RESOLUCIÓN No.004

(08 Febrero de 2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE VEEDURIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SUAZA HUILA"

EL PERSONERO MUNICIPAL DE SUAZA HUILA,

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el artículo 3 de la Ley 850 de 2003 y,

CONSIDERANDO:

Que el día primero (01) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), fue presentada ante esta personería el acta de constitución de Veeduría ciudadana, denominada "VEEDURIA AL CONTRATO N° 1354 DE 2022", cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20° EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, con el fin de solicitar la inscripción, constituida dentro de la organización civil.

Que una vez revisada el acta de constitución cuya inscripción se solicita, se establece que se encuentran reunidos los requisitos señalados en el artículo 3 de la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003.


RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Inscribir el acta de constitución de Veeduría ciudadana, denominada "VEEDURIA AL CONTRATO N° 1354 DE 2022", constituida dentro de la organización civil plural de personas, en el registro Público bajo el número 2023-03.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer Personería para los efectos propios de la Ley 850 de 2003, en calidad de veedores comunitarios del contrato N° 1354 de 2022", cuyo objeto es mantenimiento de vías terciarias mediante la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO – PERSONERIA
NIT: 891180191-2



construcción de 1.5 KM de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del Centro Poblado Gallardo conduce al cruce ruta 20ª en el municipio de Suaza, Departamento del Huila a:

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
GUILLERMO MEDINA CERQUERA	4.881.107	GALLARDO/3115313181
MOISES QUESADA QUINTERO	83.056.559	GALLARDO/3188856827
ORLANDO PEREZ	17.640.694	GALLARDO/3107620375
MIGUEL MEDINA ANTURI	83.182.312	GALLARDO/3203869850

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha, con una vigencia de seis meses o la duración del contrato de obra N°1354 de 2022 sin exceder el término de un (1) año y contra ella procede por vía gubernativa el recurso de reposición. En firme remítase copia a las autoridades administrativas encargadas de la vigilancia del Proyecto.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del Señor Personero Municipal de Suaza Huila, el ocho (08) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023).

DIONEL MARIA VARGAS CASTRO
Personero Municipal

Suaza - Huila, 31 de enero de 2023

Señores

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SUAZA
Aten. DIONEL MARÍA VARGAS CASTRO
Personero Municipal
Calle 7a No 3-07
Ciudad

Asunto: Solicitud inscripción de Veeduría Ciudadana.

Cordial saludo.

Adjunto a la presente comunicación el Acta mediante la cual los abajo firmantes solicitamos sea inscrita veeduría denominada: VEEDURÍA AL CONTRATO No.1354 DE 2022, con el objeto de ejercer la vigilancia y control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, en el registro de veedurías de la Personería de Suaza, conforme a lo consagrado en la ley 850 de 2003.

Agradecemos nos sea notificado el registro solicitado en:

Correo electrónico: fernandojimenezroa1@gmail.com

Teléfono: 313 297 3657

Atentamente,

Firma:

Nombre: Fernando Jimenez Martinez -

CC. 1.007.605.211 de Garzon

ACTA NÚMERO 01 CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Suaza- Huila, a los (31) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en asamblea general las personas abajo firmantes en el corregimiento de Gallardo; quienes manifestaron su intención de conformar una veeduría ciudadana y ejercer vigilancia sobre la gestión pública, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes sobre participación ciudadana.

Para presidir la asamblea fue elegido(a) Guillermo Medina Cezquera.
, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.881.107. de Acevedo

En desarrollo de la reunión, se acuerdan los siguientes puntos:

1. Los aquí presentes se constituirán de manera autónoma e independiente en una veeduría ciudadana denominada: VEEDURIA AL CONTRATO No.1354 DE 2022 y conformada por habitantes del municipio de Suaza, Departamento del Huila con el objeto de ejercer la vigilancia y control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
2. Se ha dispuesto elegir como integrantes de la veeduría a los siguientes ciudadanos:

NOMBRE COMPLETO	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN COMPLETA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Guillermo Medina C.	CC. 4.881.107.	Gallardo	3115313181	—
Moses Quesada A.	CC. 83.056.559.	Gallardo.	3188856823	—

NOMBRE COMPLETO	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN COMPLETA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Orlando Perez-	Cc. 17.640.694	Gallardo	3107620375	—
Miguel Medina	Cc. 83.182.312	Gallardo	3203669850	—

3. Se ha acordado que la Veeduría aquí solicitada, se constituirá por un periodo de seis 6 meses o la duración del contrato de obra No. 1354 de 2022, contados a partir de la inscripción de la misma ante la Personería Municipal de Suaza.
4. La Veeduría citada tendrá como domicilio principal la siguiente dirección Cruce Timaná - Diagonal Iglesia Gallardo del municipio de Suaza, Departamento del Huila, con Correo electrónico maisesquesndequintero@gmail.com
5. El ámbito de ejercicio o nivel de vigilancia de la veeduría será en la vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de suaza, Departamento del Huila.
6. Manifestamos de manera libre y espontánea que SI (X) NO () aceptamos ser notificados por medio del Correo electrónico:
7. Como soporte del debido registro de los veedores, anexamos las respectivas aceptaciones individuales de su designación como veedor y las fotocopias del documento de identificación de cada uno de ellos.
8. Nuestra acción en el ejercicio constitucional de participar en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública se registrará por los principios de representatividad, democratización, autonomía, transparencia, igualdad, responsabilidad, neutralidad política y legalidad.
9. Nuestros actos serán públicos y con carácter propositivo y preventivo para evitar la desviación de las acciones y demás aspectos relacionados con esta veeduría y colaborar así en asegurar la eficacia social.

10. La función de esta veeduría será autónoma y su finalidad lograr la mayor eficacia y control ciudadano; y el ejercicio de las funciones como veedores no generará para los integrantes de la veeduría ninguna contraprestación económica por parte del Estado.

11. Los resultados de nuestra gestión serán periódicamente informados a la comunidad y a los organismos de control.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 11:50 AM. del día 31 de enero de 2023, y para constancia se firma por quienes participaron en la conformación y constitución de la Veeduría Ciudadana.

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
GUILLERMO MEDINA CERQUEZA	4881107	<i>Guillermo Medina Cerqueza</i>
MOISES QUESADO QUINTANA	83056559	<i>Moses Quesado</i>
ORLANDO PEREZ	13640694	<i>Orlando Perez</i>
MIGUEL MEDINA ANTUN	83182312	<i>Miguel Medina</i>

Anexos:

- Formatos de aceptación del cargo
- Copia documentos de identidad

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo GUILLERMO MEDINA CEAQUELA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4881107 de ACUERO, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.

Guillermo Medina Ceaquela
Nombre: Guillermo Medina Ceaquela
C.C. No. 4881107

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.881.107
MEDINA CERQUERA

APELLIDOS
GUILLERMO

NOMBRES

Guillermo Medina
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1957

TELLO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

17-ENE-1978 ACEVEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

VO DE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1907600 0013541G M-0004881107-20081209 0007823847A 3 21034881

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo MOISES QUESADA QUINTANA, identificado con cedula de ciudadanía No. 83056559 de CONDOLUPE, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.

Moisés Quesada

Nombre: Moises Quesada
C.C. No. 83056559

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 83.056,559

QUESADA QUINTERO

APELLIDOS
MOISES

NOMBRES

Moises Quesada
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 20-ABR-1968

GUADALUPE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-1986 GUADALUPE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1007600-00213554-M-0083056559-20100206 0020756356A 2 28286464

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo ORLANDO PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17640694 de FLORENCIA, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.



Nombre: Orlando Perez

C.C. No. 17640694

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.640.694
PEREZ

APELLIDOS
ORLANDO

NOMBRES
Orlando Perez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-OCT-1964
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-ENE-1985 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-4400100-00648345-M-0017640694-20141120 0041401100A 8083164920

ACEPTACION DEL CARGO VEEDOR

Yo MIGUEL MEDINA ANTORI, identificado con cedula de ciudadanía No. 83182312 de AGUERO, por medio de la presente, manifiesto mi voluntad libre y espontanea de aceptar el cargo de veedor ciudadano con el objeto de ejercer control social al CONTRATO DE OBRA No. 1354 DE 2022; CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VÍA IDENTIFICADA CON CÓDIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, durante seis (06) meses o la duración del contrato.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta de aceptación.

Miguel Medina
Nombre: Miguel Medina
C.C. No. 83182312

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 83.182.312

APELLIDOS
MEDINA ANTURI

NOMBRES
MIGUEL

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-SEP-1974

ACEVEDO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 ACEVEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL BANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1900100-00195470-M-0083182312-20091110 0017884849A 1 6700471021

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 4 de 9

ASISTENTES:

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	José Eisenhower Velasco	José E. Velasco
2	Guillermo M. Lima	Guillermo M. Lima
3	Alexandra Pareda	Alexandra Pareda
4	Orlando Perez	Orlando Perez
5	M. Ruby Rivera	M. Ruby Rivera
6	Alvaro	Alvaro
7	Luzmarina	Luzmarina Arzuola
8	ARMANDO VARGAS PIAZAS.	ARMANDO VARGAS PIAZAS
9	Gilberto Silva	Gilberto Silva
10	Edgar plaza v.	Edgar plaza v.
11	ISIDORO	B
12	Luis Eduardo Plaza v.	Luis Eduardo Plaza v.


Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			








780
800

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 5 de 9

13	Jose A River	JAR
14	Adelson Silva	Adelson
15	Eduardo Ramirez	Eduardo
16	Edilberto Ramirez	Edilberto Ramirez
17	Miguel Medina	Miguel Medina
18	Odina Ramos Silva	Odina RS
19	JOHN CARLOS JAI	JA
20	Luis	Luis
21	Lucila Plaza	Lucila Plaza
22	Guillermo Plaza	Guillermo P
23	Edgar Arredondo	Edgar Arredondo
24	Carlos Alino Orrego	Carlos
25	Tulio Gillo	Tulio Gillo
26	Luis Emilio Correa	Luis Correa

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN	Código: SIG-GE-F-01
		Página: 6 de 9

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
27	ayala b. mediano	
28	crislian andres ortiz	
29	wilson rotas H	
30	duvan duvan	
31	Anibal Valenzuela	
32	Juan Sebastian Cuellar Valenzuela	
33	Olmedo Pizarro	
34	Maria Adela castro.	
35	Juan B. Bermudez P.	
36	Marcela Silva E.	
37	Ricardo Silva	
38	José Angel Vieda Pardo	
39	SHAN FREDY MAYORCA WELLMAN	

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
----------------------	------------------------------	--------------------	--------------------


DOCUMENTO CONTROLADO

802

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 001
	ACTA DE REUNIÓN		Código: SIG-GE-F-01
			Página: 7 de 9

40	Wils Polys Funes	<i>[Signature]</i>
41	Jonathan Adolfo Duran	<i>[Signature]</i>
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Fecha: 01-09-2017	Elaboró: Profesional HSEQ	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO			



FERNANDO JIMENEZ ROA
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS

-Diseños estructurales- Construcción-Consultoría-Interventoría-Estudios de impacto ambiental-Proyectos

803

ANEXO

POLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZADAS

804

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607076055

PÓLIZA No: 560-47-994000156756 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA	COD. AGENCIA: 560	RAMO: 47						
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>11</td> <td>2022</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	08	11	2022
DIA	MES	AÑO						
08	11	2022						
		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	13	12	2022
DIA	MES	AÑO						
13	12	2022						
		FECHA DE EXPEDICIÓN						
		FECHA DE IMPRESIÓN						

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA	IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340
DIRECCIÓN: KR 7 N 9 47 CA 2	CIUDAD: GARZON, HUILA
	TÉLEFONO: 6088332529

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4
BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	28/10/2022	07/09/2023	690,023,634.40
ANTICIPO	28/10/2022	07/09/2023	1,725,059,086.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/10/2022	07/03/2026	345,011,817.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	690,023,634.40

BENEFICIARIOS

NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SE ADJUNTA CLAUSULADO GENERAL No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4.QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA.

APLICAN LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015 No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *3,450,118,172.00	\$ *****26,837,193	\$ *****9,000.00	\$ ****5,100,777	\$ *****31,946,970

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ	8958	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)770186100019(8020)80000000007000560707605

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0F08FA7E5A



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607076055

PÓLIZA No: 560-47-994000156756 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA**

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **MODIFICACION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
15 12 2022
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
15 12 2022
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **FERNANDO JIMENEZ ROA**

IDENTIFICACIÓN: CC **12.192.340**

DIRECCIÓN: **KR 7 N 9 47 CA 2**

CIUDAD: **GARZON, HUILA**

TELÉFONO: **6088332529**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **GOBERNACION DEL HUILA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

BENEFICIARIO: **GOBERNACION DEL HUILA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO

28/10/2022

07/09/2023

690,023,634.40

ANTICIPO

28/10/2022

07/09/2023

1,035,035,452.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

28/10/2022

07/03/2026

345,011,817.20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VER NOTA ACLARATORIA

690,023,634.40

BENEFICIARIOS

NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION

SE HACE NECESARIO LA MODIFICACION DE LA GARANTIA BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO YA QUE EN EL CONTRATO SE ESPECIFICA QUE ES EL 30%. LAS DEMAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION ALGUNAS.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ * (690,023,634.00)

VALOR PRIMA:
\$ *****(-2,374,437)

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****0.00

IVA:
\$ ***(-451,143)

TOTAL A PAGAR:
\$ ***** (2,825,581)

NOMBRE INTERMEDIARIO
BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ

CLAVE
8958

%PART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)0000000007000560707605

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 6 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0E0DFC7C5D



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

806

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000156756 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA

IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340

ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

TEXTO ITEM 1

SE ADJUNTA CLAUSULADO GENERAL No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4. QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA.

APLICAN LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015 No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4.

CLIENTE

507

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607076055

PÓLIZA No: 560-47-994000156756 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA**

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESIÓN**

DIA MES AÑO
16 12 2022
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
16 12 2022
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **FERNANDO JIMENEZ ROA**

IDENTIFICACIÓN: CC **12.192.340**

DIRECCIÓN: **KR 7 N 9 47 CA 2**

CIUDAD: **GARZON, HUILA**

TÉLEFONO: **6088332529**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **GOBERNACION DEL HUILA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

BENEFICIARIO: **GOBERNACION DEL HUILA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.913-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO

28/10/2022 07/09/2023

690,023,634.40

ANTICIPO

28/10/2022 07/09/2023

1,035,035,452.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

28/10/2022 08/07/2026

345,011,817.20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VER NOTA ACLARATORIA

690,023,634.40

BENEFICIARIOS

NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

*****OBJETO DE LA MODIFICACION*****

SEGUN CONTRATO SE HACE NECESARIO HACER PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE VIGENCIA DE GARANTIA PAGO DE SALARIO PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR (60) DIAS, LAS DEMAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACION ALGUNAS.

*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45H110 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ *2,760,094,538.00

VALOR PRIMA:
\$ ***403,617**

GASTOS EXPEDICION:
\$ ***5,000.00**

IVA:
\$ ***77,637**

TOTAL A PAGAR:
\$ ***486,254**

NOMBRE INTERMEDIARIO
BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ

CLAVE
8958

%PART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000560707605

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE



CBDE207F0E0DFC775A

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIO/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

808

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000156756 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ ROA

IDENTIFICACIÓN: CC 12.192.340

ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

TEXTO ITEM 1

SE ADJUNTA CLAUSULADO GENERAL No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4.QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA.

APLICAN LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015 No. 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 V.4.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

809

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
5607078481

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000028832 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA			COD. AGE: 560			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
09	11	2022	28	10	2022	23:59	30	05	2023	23:59	214	13	12	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			A LAS			A LAS			DÍAS			TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN		

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DÍAS
VIGENCIA DEL ANEXO	28	10	2022	23:59	30	05	2023	23:59	214
	VIGENCIA DESDE		A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS		

DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE:	FERNANDO JIMENEZ ROA	IDENTIFICACIÓN:	CC 12.192.340
DIRECCIÓN:	KR 7 N 9 47 CA 2	CIUDAD:	GARZON, HUILA
		TELÉFONO:	6088332529

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
ASEGURADO:	FERNANDO JIMENEZ ROA	IDENTIFICACIÓN:	CC 12.192.340
DIRECCIÓN:	KR 7 N 9 47 CA 2	CIUDAD:	GARZON, HUILA
		TELÉFONO:	6088332529
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN:	NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ASEGURADO:	FERNANDO JIMENEZ ROA
CC :	12192340

ITEM: 1	DEPARTAMENTO: HUILA	CIUDAD: SUAZA
DIRECCIÓN: SEGUN CONTRATO		
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA		
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL	MANZANA:

DESCRIPCIÓN	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLÍMITE
CONTRATO		\$ 400,000,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		400,000,000.00		
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				
BENEFICIARIOS				
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS				

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1354 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO:	FERNANDO JIMENEZ ROA C.C. 12.192.340 Y/O GOBERNACION DEL HUILA NIT: 800.103.913-4
BENEFICIARIO:	GOBERNACION DEL HUILA NIT: 800.103.913-4 Y/O TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ****400,000,000.00	\$ *****703,562	\$*****0.00	\$ *****133,677	\$ *****837,238

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
BENJAMIN SANABRIA GUTIERREZ	8958	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000560707848	FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá	MACUNARPATRI 0
--	----------------

CBDE207F0F08F47A57

CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000028832

ANEXO: 0

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

PAGINA: 2

TOMADOR: FERNANDO JIMENEZ ROA

IDENTIFICACION: 12.192.340

ASEGURADOS							
ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	FERNANDO JIMENEZ ROA	12192340	SEGUN CONTRATO	SURZA	400,000,000.00	703,562	837,238
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					703,562	837,238	



fernando jimenez roa
INGENIERO CIVIL
U. NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS


-Diseños estructurales- Construcción- Consultoría- Interventoría- Estudios de impacto ambiental- Proyectos

B11

ANEXO

CARACTERIZACION DE MATERIALES GRANULARES

- **BASE GRANULAR**
- **MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO**



MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM MUESTRA FÍSICA	DESCRIPCIÓN FÍSICA DE MUESTRA	N° DE MUESTRA	ESQUEMA DE CASA (M)	DISEÑO Y MATERIALES										ANÁLISIS DE MATERIALES										ANÁLISIS DE AGUAS										CARGA DE MUESTRA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				MATERIALES				MATERIALES				MATERIALES				MATERIALES				MATERIALES				MATERIALES				MATERIALES				CARGA DE MUESTRA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460

OSCAR WILDE

John F. Sanchez
John F. Sanchez, Chairman

OSCAR FERNANDO
AREVALO PEÑALTA
NIT. 7.741.398
Mecánica de Sólidos,
Cimentación y Microfísica

Geological Laboratory
U.S. Army Corps of Engineers

MSPC OFA 003.23
OFA 003.23

Oficina: 2 No. 2-59 Valiente, Obispo - Michoacán México. Teléfono: 310510037 - 315311532 Fax: 310510037 e-mail: electronic@nigab.net info@nigab.net ventas@nigab.com

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR		CODIGO	OFA-EC-14
		TAMIZADO Y LÍMITES DE		VERSIÓN	2
		CONSISTENCIA		FECHA	30-jul.-18

OBRA:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de 1,5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila				
UBICACIÓN:	STOCK PLANTA - GUACANAS	FECHA:	16 de enero de 2023		
MUESTRA:	#1 BASE GRANULAR	NORMA:	INVIAS-13 / NTC / NSR-10		
FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	ENSAYO:	E-123-E125-E126 - NTC 4630		
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	CODIGO:	MSPC OFA 003-23		
		REMISIÓN:	OFA 009-23	2 de 20	

LÍMITES DE CONSISTENCIA

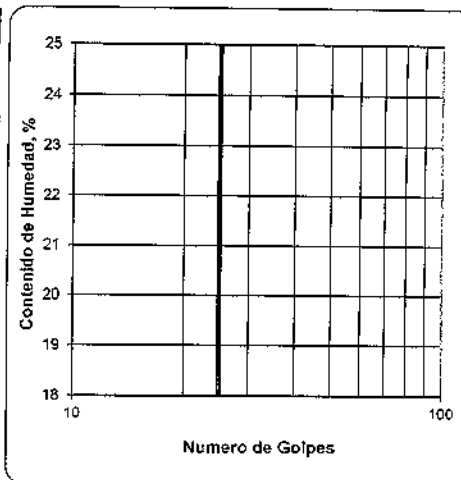
LÍMITE LÍQUIDO			
Prueba No. 1	1	2	3
No. Golpes			
Recipiente No.			
Vidrio + Suelo Húmedo, gm			
Vidrio + Suelo Seco, gm	NL	NL	NL
Peso del Agua, gm			
Peso vidrio, gm			
Peso Suelo Seco, gm			
Contenido de agua, %			

LÍMITE PLÁSTICO	
1	2
NP	NP

GRADACIÓN

P1 = 10881 P2 = 9879,0


TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% PASA	BASE GRANULAR BG 35 ART. 330-13
2"	0,0	0,0	100,0	100
1 1/2"	0,0	0,0	100,0	100
1"	715,0	6,6	93,4	70-100
3/4"	1.352,0	12,4	81,0	60-90
1/2"	949,0	8,7	72,3	-
3/8"	1.110,0	10,2	62,1	45-75
No. 4	1.234,0	11,3	50,7	30-60
No. 10	1.238,0	11,4	39,4	20-45
No. 40	1.695,0	15,6	23,8	10-30
No. 200	1.585,0	14,6	9,2	5-15
Pasa No. 200	1002,0	9,2		
TOTAL	10881	100,0		



49,3	41,5	9,2
GRAVAS	ARENAS	FINOS
% Fracción menor del Tamiz No. 200		9,21

D10	0,1	COEFICIENTE UNIFORMIDAD (Cu)	101,2	HUMEDAD NATURAL
D30	0,8			
D60	8,7			
		COEFICIENTE CURVATURA (Cc)	0,9	5,8%
PRUEBA LÍMITE DE CONTRACCIÓN				

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS	
Límite Líquido (%)	NL
Límite Plástico (%)	NP
Índice de Plasticidad (%)	0,00
Índice de Consistencia	0,00
Índice de grupo	0
AASHO	A-1a
USCS	GW-GM



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



**OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
NIT. 7.650.209-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Y LIMITES DE CONSISTENCIA

CODIGO	OFA-EC-14
VERSION	2
FECHA	30-jul.-18

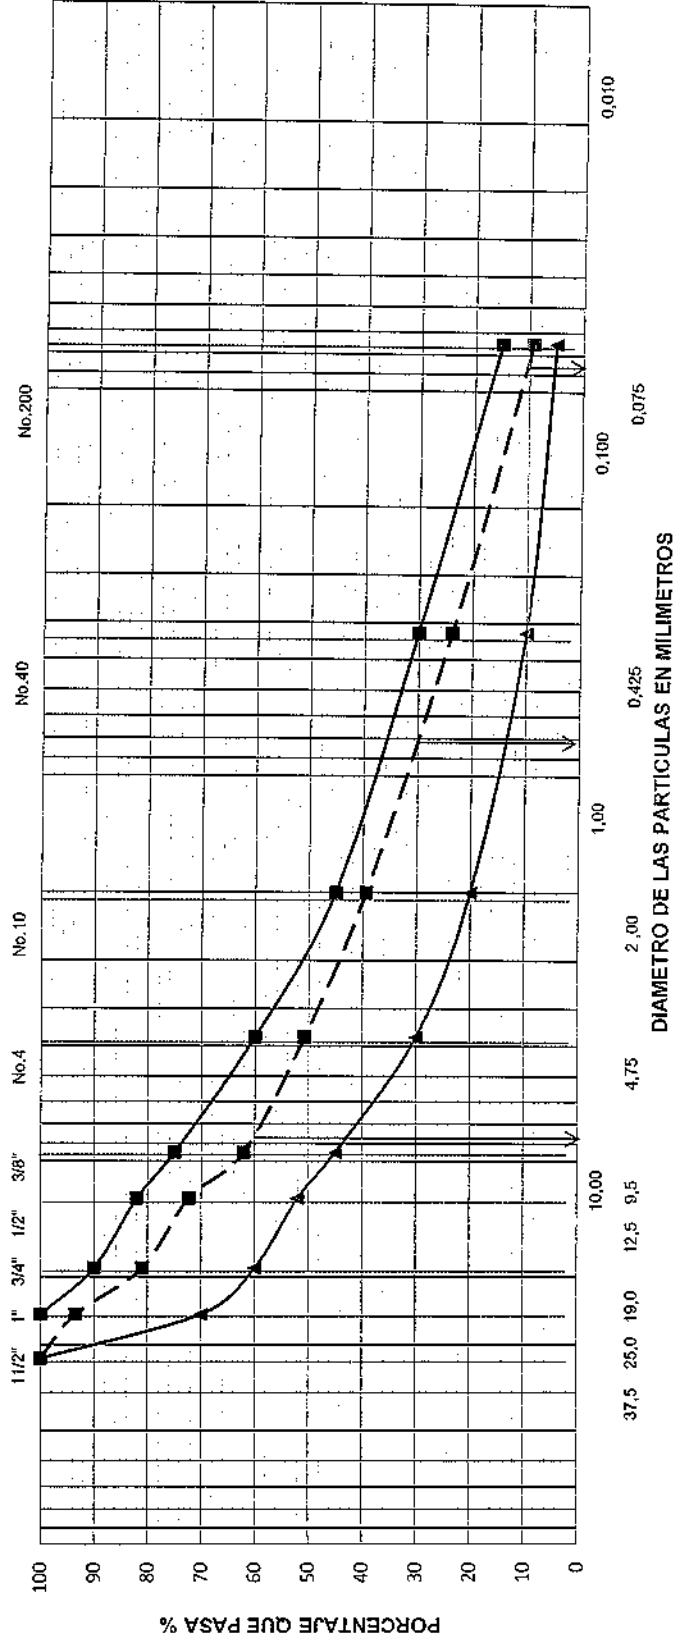
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1 BASE GRANULAR
16 de enero de 2023

PROYECTO:
MUESTRA:
FECHA:

CODIGO: MSPC OFA 003-23
REMISION: OFA 009-23
HOJAS: 3 de 20

TAMICES STANDARD U.S.A



815

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	EQUIVALENTE DE ARENA	CODIGO	OFA EA-14
		VERSIÓN	2
		FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330 INVIAS/13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-133

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO REMISIÓN: OFA 009-23


PAGINAS: 4 de 20

ENSAYO	1	2	3	4
PROBETA No.	A	B	C	D
LECTURA DE ARENA, A	3,2	3,3	3,2	
LECTURA DE ARCILLA, B	10,5	10,8	10,5	
EQUIVALENTE DE ARENA, $C = A * 100 / B$	30,48	30,56	30,48	

% EQUIVALENTE DE ARENA =	30,50
---------------------------------	--------------

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Mínimo
Sub Base			25%
Base Granular	X		30%
Sello de Arena Asfalto			50%
Lechada Asfáltica			50%
Mezcla densa en frío gradación combinada			50%
Mezcla densa en caliente MDC 0 - 3			50%
Fresado pavimento existente en frío			30%
Fresado pavimento existente en caliente			50%
Concretos			60%

OBSERVACIONES




Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.654.1239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo

Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3156938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	RELACIÓN HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	CODIGO:	OFA-EPM-14
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	20-may.-16

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR

FUENTE: PLANTA - GUACANAS

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ

FECHA: 16-ene.-23

NORMA: Art. 330/13 INVIAS

ENSAYO: E-142

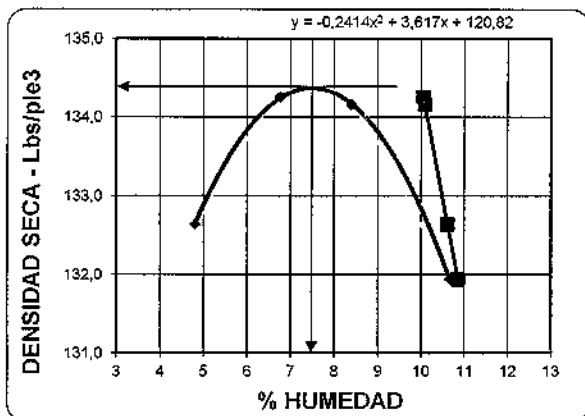
CODIGO: MSPC OFA 003-23

REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 5 de 20

DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
Humedad Natural	3,2	3,2	3,2	3,2
Agua Añadida (c.c.)	0	120	240	360
Peso Molde + Muestra Humeda, g	10588	10735	10806	10826
Peso Molde, g	5854	5854	5854	5854
Peso Suelo Humedo, g	4734	4881	4952	4972
Volumen del Molde, cc	2125	2125	2125	2125
Densidad Humeda, g/cc	2,228	2,297	2,330	2,340
Humedad, %	4,8	6,8	8,4	10,7
Densidad Seca, lbs/pe3	132,6	134,3	134,2	131,9
Curva de saturación 100%	10,6	10,1	10,1	10,9

HUMEDAD				
Capsula No.	1	2	3	4
Peso Capsula + Suelo humedo, gm	356,7	408,5	420,9	471,1
Peso Capsula + Suelo Seco, gm	342,5	385,7	392,1	432,5
Peso agua, gm	14,2	22,8	28,8	38,6
Peso Capsula	47,6	48,7	49,2	70,6
Humedad, %	4,8	6,8	8,4	10,7



CLASIFICACION DEL SUELO

A.A.S.H.O. A-1a

U.S.C.E. GW-GM

Índice de Grupo 0

Densidad Max. 134,3 Lbs/Pulg³

Humedad Optima 7,5 %

OBSERVACIONES

Densidad Maxima 2,152

grs/cm³



**OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
NIT. 7.450.239-B
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

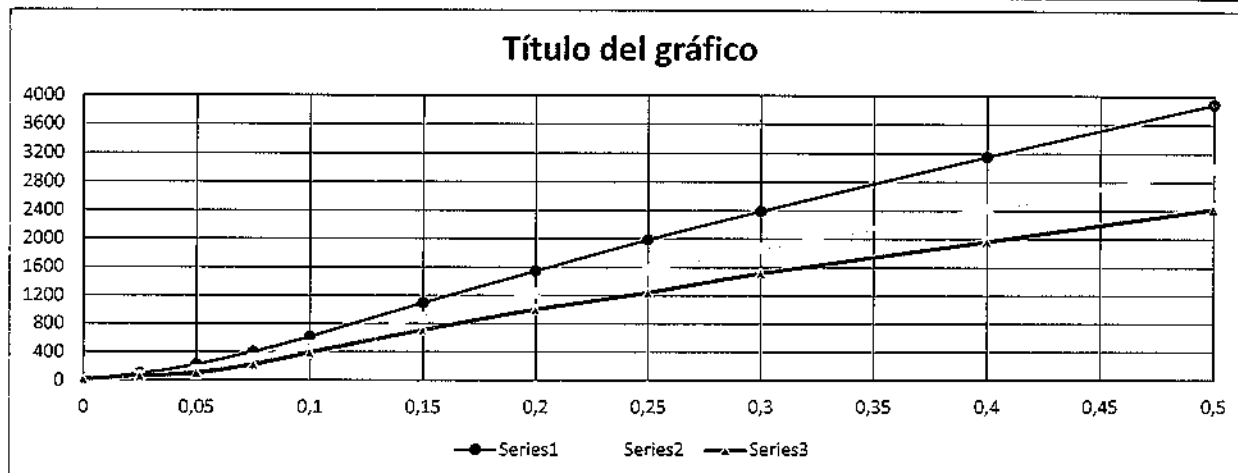
John Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CBR DEL SUELO COMPACTADO EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS		CODIGO	OFA-CBR-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	METODO:	No.1. E-148/13 INVIAS
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	FECHA:	16 de enero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 009-23 6 de 20

MOLDE No		1			3			9					
No de golpes		65			30			10					
Días de inmersión		2			2			2					
Expansión mm		0,00			0,00			0,00					
PENETRACIÓN		Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR
Pulgadas	Tiempo (min)		Psi	%		psi	%		Psi	%		Psi	%
0,025	00:30	121	89		83	61		65	48				
0,050	1:00	298	219		182	134		125	92				
0,075	1:30	546	401		422	310		285	209				
0,100	2:00	832	611	61,1	649	477	47,7	514	378	37,8			
0,150	3:00	1.486	1.092		1.206	886		956	703				
0,200	4:00	2.096	1.540	102,7	1.670	1.227	81,8	1.352	994	66,2			
0,250	5:00	2.699	1.983		2.126	1.562		1.685	1.238				
0,300	6:00	3.248	2.387		2.536	1.864		2.065	1.518				
0,400	8:00	4.286	3.150		3.299	2.424		2.689	1.976				
0,500	10:00	5.286	3.885		4.056	2.981		3.325	2.443				
HUMEDAD PENETRACION %		7,5			9,2			11,3					



CBR a 0,1" =	Carga Unitaria Leida a 0,1" * 100%	CBR Corregido a 0,1" =	61,1	47,7	37,8
	1000				
CBR a 0,2" =	Carga Unitaria Leida a 0,2" * 100%	CBR corregido a 0,2" =	102,7	81,8	66,2
	1500				

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13	TERRAPLENES >10-5-3%Min.	AFRIMADO >15%Min.	SUB BASE >30%Min.	BASE >100%Min.
-------------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	----------------

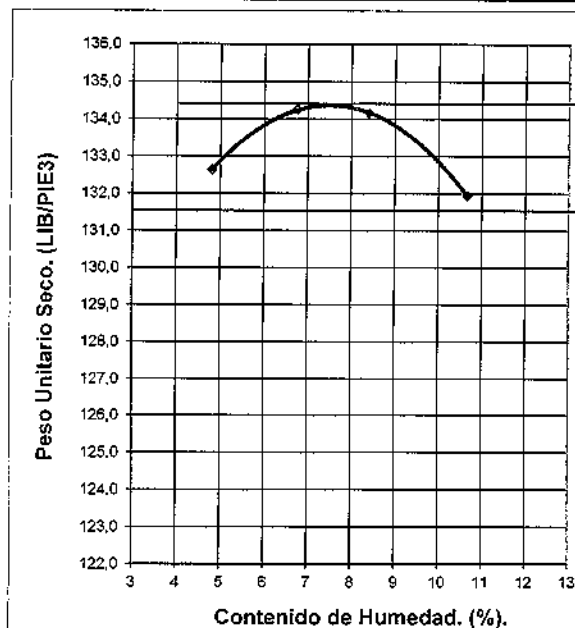
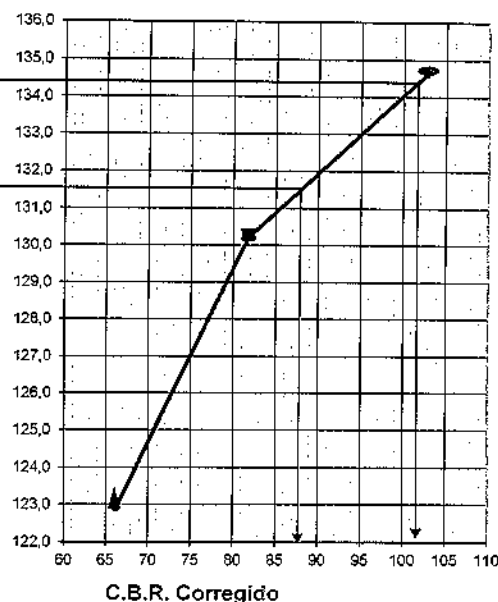
B18

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA <small>MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS</small>	CBR DEL SUELO COMPACTADO EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS		CODIGO:	OFA-CBR-14
			VERSIÓN:	2
			FECHA:	30-jul.-18

FUENTE:	PLANTA - GUACANAS	METODO:	No.1, E-148/13 INVIAS
MUESTRA:	# 1 BASE GRANULAR	OBRA:	CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ	FECHA:	16 de enero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 009-23 7 de 20

MOLDE NUMERO	2	2	2	2
NUMERO DE GOLPES POR CAPA	55	55	55	55
VOLUMEN cc	2,125	2,125	2,125	2,125
PESO MOLDE + MUESTRA COMPACTADA (g)	10,588	10,735	10,806	10,828
PESO MOLDE (gr)	5,854	5,854	5,854	5,854
PESO MUESTRA COMPACTADA (g)	4,734	4,881	4,952	4,972
DENSIDAD HUMEDAD (g/cc)	2,228	2,297	2,330	2,340
RECIPIENTE NUMERO	47,6	48,7	49,2	70,6
PESO MUESTRA HUMEDAD + RECIPIENTE (g)	356,7	408,5	420,9	471,1
PESO MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)	342,5	385,7	392,1	432,5
CONTENIDO DE HUMEDO (%)	4,8	6,8	8,4	10,7
PESO UNITARIO SECO (Kg / m3)	2,126	2,152	2,150	2,114
PESO UNITARIO SECO (Lbs / Pies³)	132,6	134,3	134,2	131,9

1	2	3
65	30	10
2,367	2,381	2,379
12,442	12,484	11,958
6,949	7,140	6,917
5,493	5,344	5,041
2,320	2,245	2,119
70,2	70,2	70,2
512,3	512,3	512,3
481,2	481,2	481,2
7,6	7,6	7,6
2,157	2,087	1,970
134,6	130,2	122,9



CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD.	7.5
PESO UNITARIO SECO MAXIMO.Lbr/pulg³	134.3
C.B.R. CORREGIDO / 100%.	101.8%
C.B.R. CORREGIDO + 98%.	87.8%

●	65 GOLPES / CAPA.
■	30 GOLPES / CAPA.
▲	10 GOLPES / CAPA.


Jhon Fredy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.490.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA <small>MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS</small>	PROCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS A UNA CARA		CODIGO	OFA CF-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA,

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: INVIAS-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-227


FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGANICA COLOR CAFE REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 8 de 20

TAMIZ		PESO DE LA MUESTRA	PESO DE LA MUESTRA FRACTURADA	% DE CARAS FRACTURADAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	CÁLCULO FINAL
PASA	RETENIDO	(Grs)	(Grs)	(B/A X 100)	(%)	(C X D)
A	B	C	D	E		
1" ½	1"	1.052,0	425,2	40,4	6,6	265,6
1"	¾"	749,0	413,0	55,1	12,4	685,1
¾"	½"	1.110,0	549,0	49,5	8,7	431,4
½"	⅜"	634,0	406,0	64,0	10,2	653,3
TOTAL		3.545,0	1.793,2	209,1	37,9	2035,4
PORCENTAJE UNA CARA FRACTURADA = $\frac{\text{TOTAL E}}{\text{TOTAL D}}$ = 53,7 %						
ESPECIFICACIÓN-13		AGREGADO	UNA CARA	DOS CARAS	Cumple/No Cumple	
		BASE GRANULAR	70% MÍNIMO	50% MÍNIMO	Cumple	
		MEZCLA ASFÁLTICA	85% MÍNIMO	75% MÍNIMO		
		CONCRETOS	60% MÍNIMO	NA		

OBSERVACIONES:



Jhen-Predy Sanchez Ospitian


Técnico profesional Obras Civiles - SENA


**OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.050.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo

Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA <small>MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS</small>	PROCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS A DOS CARAS		CODIGO	OFA CF-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA. FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: INVIAS-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-227

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGANICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 9 de 20

TAMIZ		PESO DE LA MUESTRA	PESO DE LA MUESTRA FRACTURADA	% DE CARAS FRACTURADAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	CÁLCULO FINAL
PASA	RETENIDO	(Grs)	(Grs)	(B/A X 100)	(%)	(C X D)
A	B	C	D	E		
1" ½	1"	1.052,0	333,0	31,7	6,6	208,0
1"	¾"	749,0	387,0	51,7	12,4	642,0
¾"	½"	1.110,0	345,0	31,1	8,7	271,1
½"	⅜"	634,0	378,0	59,6	10,2	608,2
TOTAL		3.545,0	1.443,0	174,0	37,9	1729,3
PORCENTAJE DOS CARAS FRACTURADA = $\frac{\text{TOTAL E}}{\text{TOTAL D}}$ = 45,6 %						
ESPECIFICACIÓN-13		AGREGADO	UNA CARA	DOS CARAS	Cumple/No Cumple	
		BASE GRANULAR	70% MÍNIMO	50% MÍNIMO	Cumple	
		MEZCLA ASFÁLTICA	85% MÍNIMO	75% MÍNIMO		
		CONCRETOS	60% MÍNIMO	NA		

OBSERVACIONES:



Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



**OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
NIT. 7.650.239-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE FORMA		CODIGO	OFA PPG-14
	PARTICULAS PLANAS		VERSIÓN	2
	AGREGADO GRUESO		FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA. FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-230

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 10 de 20


INICIAL		PARTICULAS PLANAS (grs)	% PARTICULAS PLANAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	% PROMEDIO PARTICULAS PLANAS
TAMIZ	RETENIDO (grs)				
1"	1052,0	221,0	21,01	6,6	1,38
3/4"	749,0	102,5	13,68	12,4	1,70
1/2"	1110,0	98,6	8,88	8,7	0,77
3/8"	634,0	96,5	15,22	10,2	1,55
TOTAL		518,60	58,80	37,92	5,41

% PARTICULAS APLANADAS:	14,3
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Base granular	X		35%
Mezcla densa en caliente			30%
Fresado pavimento existente			30%
Concretos			25%

OBSERVACIONES


Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE FORMA PARTICULAS LARGAS AGREGADO GRUESO		CODIGO	OFA PPG-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: DEPARTAMENTO DEL HUILA FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-230

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 11 de 20

INICIAL		PARTICULAS LARGAS (grs)	% PARTICULAS LARGAS	% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL	% PROMEDIO PARTICULAS LARGAS
TAMIZ	RETENIDO (grs)				
1"	1052,0	236,5	22,48	6,6	1,48
3/4"	749,0	215,4	28,76	12,4	3,57
1/2"	1110,0	312,4	28,14	8,7	2,45
3/8"	634,0	212,4	33,50	10,2	3,42
TOTAL		976,70	112,89	37,92	10,92

% PARTICULAS ALARGADAS:	28,8
--------------------------------	-------------

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Base granular	X		35%
Mezcla densa en caliente			30%
Fresado pavimento existente			30%
Concretos			25%

OBSERVACIONES



Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos


Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN AGREGADO GRUESO		CODIGO	OFA PEG-14
				VERSIÓN	2
				FECHA	20-ago.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA:	<u>16-ene-23</u>
OBRA:		NORMA:	<u>Art. 630/P501 FAA</u>
FUENTE:	<u>STOCK PLANTA - GUACANAS</u>	ENSAYO:	<u>ASTM C138/E-222-13</u>
MUESTRA:	<u># 1 BASE GRANULAR</u>	CODIGO:	<u>MSPC OFA 003-23</u>
		REMISIÓN:	<u>OFA 009-23</u>
		PAGINAS:	<u>12 de 20</u>

PRUEBAS	1	2
Peso en el aire de muestra seca(g), A	1581,2	1219,3
Peso Superficialmente Seco, en el aire(g), B	1597,6	1232,6
Peso en la canastilla, en el agua(g), C	954,2	735,9
Gs. Bulk Seca = $A/(B+S-C)$	2,458	2,455
Gs. Bulk(s.s.s.) = $S/(B+S-C)$	2,483	2,482
Gs. Aparente = $A/(B+A-C)$	2,522	2,522
Absorción (%) = $(B-A)*100/A$	1,04	1,09
GS. BULK SECA =	2,456	
% DE ABSORCIÓN =	1,06	
T° del agua para la ejecución del ensayo	23°C	

Observaciones: _____



Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA
 NIT. 7.630.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	ANGULARIDAD DEL AGREGADO Y CONTENIDO DE VACIOS EN FINOS NO COMPACTADOS	CODIGO: OFA-AF041
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 20-may.-14

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: INVIAS-13 / NTC / NSR-10

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR CÓDIGO: MSPC OFA 003-23

FUENTE: PLANTA - GUACANAS REMISIÓN: OFA 009-23 13 de 20

PRUEBAS		1	2	3	4
METODO		A	A	A	A
SERIE GRANULOMETRICA					
TAMIZ PASA	TAMIZ RETIENE	grs	grs	grs	grs
No. 8	No. 16	44	44		
No. 16	No. 30	57	57		
No. 30	No. 50	72	72		
No. 50	No. 100	17	17		
Total Agregados en grs		190	190		

PESO ESPECIFICO ARENA	2,584	2,584		
(P. RECIPIENTE + AGREGADO FINO) - P. RECIPIENTE	142,5	143,2		

Cumplido Cumple

$$\%U = 100 \cdot \frac{V - (F/G)}{V} \quad \%U = \begin{matrix} 43,4 & 43,1 & 43,3 & \text{Cumple} \end{matrix}$$

Donde:


V = Volumen del medidor ml

F= Masa en bruto del agregado fino

G= Peso específico del agregado

ESPECIFICACIONES INVIAS 2013	VALOR MINIMO		
MEZCLA DENSA EN CALIENTE	CLASE C NT1	CLASE B NT2	CLASE A NT3
Mezcla Densa en Caliente	40%	45%	45%
Mezcla Densa en Frio	40%	45%	45%
Reciclado en Frio / Caliente	35% a 40%	35% a 45%	35% a 45%
Sello Arena Asfalto	45%	45%	-
Base Granular	-	35%	35%
PAVIMENTOS HIDRAULICOS			
Concretos			30%

OBSERVACIONES: _____



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de suelos,
 pavimentos y concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio



Jhon Freddy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO - METODO COLORIMETRICO	CODIGO	OFA-CMO-14
		VERSIÓN	1
		FECHA	20-oct.-13

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR

FUENTE: PLANTA - GUACANAS

FECHA: 16-ene.-23

NORMA: INVIAS-13 / NTC / NSR-10

ENSAYO: E-212

CODIGO: MSPC OFA 003-23

REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 14 de 20

EQUIPO :


- * Frascos incoloros
- * Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 3%
- * Tabla de colores No.815 ASTM C-40 con Número de referencia Orgánica de 1 a 5 en el cual el número 3 es el COLOR NORMAL DE REFERENCIA a comparar.


REGISTRO INICIO DE ENSAYO	REGISTRO ENSAYO DESPUES DE LAS 24H
	

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Se considera que la arena contiene componentes orgánicos perjudiciales, cuando el color que sobrenada por encima de la muestra de ensayo es mas oscuro que el COLOR NORMAL DE REFERENCIA

RESULTADO CUALITATIVO	Agregado	Tolerancia	Cumple	No Cumple	Numero de referencia Orgánica
	Terraplen				
Afirmado					
Sub base granular					
Base granular			X		
Concreto					
MDC					


Jhon Fredy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

Oficina calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelosofa.com

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PERDIDA EN ENSAYOS DE SOLIDEZ EN SULFATOS		CODIGO	OFA PSG-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el municipio de Suaza, Departamento del Huila FECHA: 16 de enero de 2023

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: E-220 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR CODIGO: MSPC OFA 003-23

FUENTE: PLANTA - GUACANAS REMISIÓN: OFA 009-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ PAGINAS: 15 de 20

SULFATO UTILIZADO:		MAGNECIO		No. DE CICLOS:		CINCO	
DIA Y HORA DE INMERSION:		30-may-22	10:00:00 a. m.	TERMINACION ENSAYO:		4-jun-22	10:00:00 a.m
INICIAL		PESO INICIAL grs	TAMIZ FINAL	PESO FINAL grs	PERDIDAS (%)	%RETENIDO GRADACIÓN	PROMEDIO PERDIDAS%
PASA	RETENIDO						
1 1/2"							
1"	3/4"	1502,8	5/8"	1495,3	0,50	19,00	0,09
3/4"	3/8"	1001,4	5/16"	992,1	0,93	18,92	0,18
3/8"	No. 4	300,5	No. 5	290,8	3,23	11,34	0,37
TOTAL		2804,7		2778,2	4,66	49,26	0,64

PERDIDAS EN SULFATO SODIO $\frac{\text{PROM. PERDIDAS} \times 100}{\text{TOTAL RET. GRAD. ORIG.}}$ = $\frac{63,7}{49,3}$ = **1,29%**

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES INV-13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Maximo
Afirmado			12%
Sub Base			12%
Base granular	X		18%
Mezcla densa en caliente			12%
Fresado pavimento existente			12%
Concretos			12%



Jhon Fredy Sanchez Ospitan
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.441.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	PERDIDA EN ENSAYOS DE SOLIDEZ EN SULFATOS		CODIGO	OFA PSA-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 16 de enero de 2023

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: E-220 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR CODIGO: MSPC OFA 003-23

FUENTE: STOCK PLANTA - GUACANAS REMISIÓN: OFA 009-23

DESCRIPCION: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO PAGINAS: 16 de 20

INORGÁNICA COLOR CAFÉ


SULFATO UTILIZADO:		MAGNECIO		No. DE CICLOS:		CINCO	
DIA Y HORA DE INMERSION:		30-may-22	10:00:00 a. m.	TERMINACION ENSAYO:		4-jun-22	10:00:00 a.m
INICIAL		PESO INICIAL grs	TAMIZ FINAL	PESO FINAL grs	PERDIDAS (%)	%RETENIDO GRADACIÓN	PROMEDIO PERDIDAS%
PASA	RETENIDO						
3/8"	No. 4	300,0	No. 4	291,3	2,90	10,20	0,30
No. 4	No. 8	100,0	No. 10	97,1	2,90	9,23	0,27
No. 8	No. 16	100,0	No. 40	96,4	3,60	6,39	0,23
No. 16	No. 30	100,0	No. 10	95,2	4,80	5,83	0,28
No. 30	No. 50	100,0	No. 40	87,6	12,40	3,85	0,48
TOTAL		700,0		667,6	26,60	35,50	1,55

PERDIDAS EN SULFATO SODIO $\frac{\text{PROM. PERDIDAS} \times 100}{\text{TOTAL RET. GRAD. ORIG.}}$ = $\frac{155,06}{35,5}$ = 4,37%

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES INV-13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Maximo
Afirmado			12%
Sub Base			12%
Base granular	X		18%
Mezcla densa en caliente			12%
Fresado pavimento existente			12%
Concretos			12%


 Jhon Freddy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.950.209-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Ing. Jefe de Laboratorio

calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3105510987 - 3158938582 Pitalito / correo electronico info.laboratorio@mecanicadesuelos.co


 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DESGASTE DE LOS AGREGADOS MAQUINA DE LOS ANGELES RELACIÓN HUMEDO/SECO		CODIGO	OFA DAG-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA: 16 de enero de 2023
OBRA:	UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS	NORMA: Art. 330/13 INVIAS
MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR	FUENTE: PLANTA - GUACANAS GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO	ENSAYO: E-218 y E-219
DESCRIPCIÓN: INORGÁNICA COLOR CAFÉ	CODIGO: MSPC OFA 003-23	REMISIÓN: OFA 009-23
		PAGINAS: 17 de 20

PRUEBAS	1	2	3	4
Gradación usada	A	A		
No. de esferas	12	12		
No. de revoluciones	100	500		
Pa = Peso muestra seca antes del ensayo (grs)	5000,5	5000,5		
Pb = Peso muestra seca lavado sobre tamiz No.12 (grs)	4512,3	3366,4		
Perdida (grs) = Pa - Pb	388,2	1634,1		
% Desgaste = (Pa - Pb) * 100/Pa	7,8	32,7		
Especificación: menor de	8	40		
	SECO	SECO		

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
75,0mm - 3"	63,0mm - 2 1/2"							
63,0mm - 2 1/2"	50,0mm - 2"					2500±50		
50,0mm - 2"	37,5mm - 1 1/2"					2500±50	5000±50	
37,5mm - 1 1/2"	25,5mm - 1"					5000±50	5000±25	5000±25
25,5mm - 1"	19,0mm - 3/4"	1250±25						5000±25
19,0mm - 3/4"	12,5mm - 1/2"	1250±25						
12,5mm - 1/2"	9,50mm - 3/8"	1250±10	2500±10					
9,50mm - 3/8"	6,30mm - 1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
6,30mm - 1/4"	4,75mm - No. 4			2500±10				
4,75mm - No. 4	2,36mm - No. 8				5000±10			
No. Esferas		12	11	8	6	12	12	12
No. Revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

ESPECIFICACIONES INV-13			
Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Afirmado			50%
Sub Base			50%
Base granular y Concretos	X		40%
Mezcla abierta en frío rodadura			35% Base - 25% Rodadura
Mezcla densa en caliente			35% Base - 25% Rodadura
Fresado material existente			35% Base - 25% Rodadura



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.989.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DESGASTE DE LOS AGREGADOS POR ABSORCIÓN EN EL EQUIPO MICRO DEVAL		CODIGO	OFA-MD 040
			VERSIÓN	1
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 16-ene.-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-238

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA REMISIÓN: OFA 009-23

COLOR CAFÉ PAGINAS: 18 de 20

PRUEBAS	1	2	3	4
Gradación usada	7,2	7,2		
No. de esferas	5000	5000		
No. de revoluciones	12000	12000		
Pa = Peso muestra seca antes del ensayo (grs)	1500,2	1500,9		
Pb = Peso muestra	1373,3	1375,1		
Perdida (grs) = Pa - Pb	126,9	125,8		
% Desgaste = (Pa - Pb) * 100/Pa	8,5	8,4		
Especificación: menor de	8,42			
Especificación: menor de	25	25		

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

Tipo de Gradación		7,2	7,3	7,4				
	Retenido	max. Nominal 25mm	max. Nominal 12,5mm	max. Nominal 9,5mm				
19,0mm - 3/4"	16,0mm - 5/8"	375g						
16,0mm - 5/8"	12,5mm - 1/2"	375g						
12,5mm - 1/2"	9,50mm - 3/8"	750g	750g					
9,50mm - 3/8"	6,70mm - 0,265"		375g	750g				
6,70mm - 0,265"	6,30mm - 1/4"		375g	750g				
6,30mm - 1/4"	4,75mm - No. 4		375g	750g				
4,75mm - No. 4	1,18mm - No. 16							
Peso muestra (grs)		1500±5	1500±5	1500±5				
Peso esferas (grs)		5000±5	5000±5	5000±5				
Tiempo rotación		105±1	95±1	95±1				
No. Revoluciones		12000±100	10500±100	9500±100				

ESPECIFICACIONES INV-13

Tipo de Agregado	Cumple	No Cumple	Máximo
Afirmado			N/A
Sub Base			30%
Base granular y Concretos	X		30%
Mezcla abierta en frío rodadura			35% Base - 25% Rodadura
Mezcla densa en caliente			35% Base - 25% Rodadura
Fresado material existente			40% Frío - 25% Caliente
Concretos			10%



Jhon Fredy Sanchez Ospitian
Técnico profesional Obras Civiles - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.450.339-B
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	EVALUACION DE LA RESISTENCIA MECANICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL METODO DE 10% DE FINOS		CODIGO	OFA-RMA-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	30-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL10 QUE DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA. FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: ASTM C31 / E-218 E-219

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO INORGÁNICA COLOR CAFÉ REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 19 de 20

		PESO EN GRAMOS	
		SECO	HUMEDA
Ma	Material que pasa 3/8" y retiene 1/2"	2865,3	2913,1
Mr	Material Retenido N° 8	2586,3	2563,6

ESTADO DEL AREGADO		SECO	HUMEDO
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDO	fi %	9,7	12,0
VALOR DE LA CARGA	X1	298,7	289,3
CARGA NECESARIA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS	C10	304,57	253,29


KN
KN

RELACION HUMEDO SECO	83,2%
----------------------	-------

ESPECIFICACION INVIAS/13 P501 FAA	SECO		RELACION HUMEDO/SECO		
	RODADURA	110 Kn min.	RODADURA	110 Kn min.	75% min.
	BASE	70 Kn min.	BASE	75 Kn min.	
	CONCRETO	75 Kn min.	CONCRETO	75 Kn min.	


Jhon Fredy Sanchez Ospitian
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.760.239-8
 Mecánica de suelos,
 pavimentos y concretos


Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS		CODIGO	OFA TAD-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	20-may.-14

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido en el tramo de vía identificada con código 45HL10 que del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Municipio de Suaza, Departamento del Huila

OBRA: _____ FECHA: 16-ene-23

UBICACIÓN: STOCK PLANTA - GUACANAS NORMA: Art. 330-13 INVIAS

MUESTRA: # 1 BASE GRANULAR ENSAYO: E-211

FUENTE: PLANTA - GUACANAS CODIGO: MSPC OFA 003-23

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON TRAZAS DE LIMO REMISIÓN: OFA 009-23

PAGINAS: 20 de 20

FRACCIÓN GRUESA						
Fracción		Gradación Original (%)	Peso Fracción Ensayada (g)	Peso Retenido después Ensayo (g)	Pérdida Total (%)	Pérdida Corregida (%)
Pasa	Retiene					
	37.5 mm (1 1/2")	0				
37.5 mm (1 1/2")	19 mm (3/4")	19,0	3000	2998,0	0,07	0,01
19 mm (3/4")	9.51 mm (3/8")	18,9	2000	1996	0,20	0,04
9.51 mm (3/8")	4.76 mm (No. 4)	10,2	1000	989,0	1,10	0,11
TOTALES		48,1	6000,0	5983,0	1,4	0,16
FRACCIÓN FINA						
4.76 mm (No. 4)	1.19 mm (No. 16)	15,6	100,0	98,2	1,80	0,28
TOTALES		15,6	100,0	98,2	1,8	0,28

$$p = \frac{M - R}{M}$$

p = porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznable, masa de la muestra de ensayo. Para los agregados finos, corresponde a la masa de la porción más gruesa que el tamiz de 1.18 mm (No. 16), como se describe en la Sección 4.3. Para los agregados gruesos, corresponde a la masa de la fracción respectiva.


R = masa de las partículas retenidas sobre el tamiz designado, determinada de acuerdo con la Sección 5.2.

REQUISITO NORMA INVÍAS/13			OBSERVACIONES:
MATERIAL	Partículas de Arcilla y deleznaibles		
	Finos	Gruesos	
CONCRETOS	1%	0,25%	
SUB BASE-BASE GRANULAR	2%	2,00%	


 Jhon Fredy Sanchez Osbitan
 Técnico profesional Obras Civiles - SENA

 **OSCAR FERNANDO
AREVALO PERALTA**
 NIT. 7.650.399-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio



 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LÍMITES DE CONSISTENCIA		CODIGO	OFA-EC-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	20-may.-16

MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido - tramo de vía del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Mpio de Suaza, DPT. del Huila

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido - tramo de vía del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Mpio de Suaza, DPT. del Huila

UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ

MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO

FUENTE: CANTERA MASSEQ

DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA
COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA

FECHA: 20 de febrero de 2023

NORMA: INVIAS-13 / NTC / NSR-10

ENSAYO: E-123-E125-E126 - NTC 4630

CODIGO: MSPC OFA 003-23

REMISIÓN: OFA 042-23 2 de 10

LÍMITES DE CONSISTENCIA

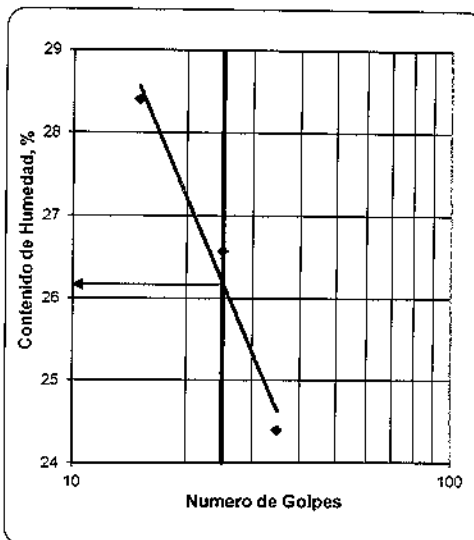
LÍMITE LÍQUIDO			
Prueba No. 1	1	2	3
No. Golpes	35	25	15
Recipiente No.	20	26	27
Vidrio + Suelo Húmedo, grm	30,26	32,15	30,26
Vidrio + Suelo Seco, grm	25,55	26,72	24,88
Peso del Agua, grm	4,71	5,43	5,38
Peso vidrio, grm	6,24	6,28	5,94
Peso Suelo Seco, grm	19,31	20,44	18,94
Contenido de agua, %	24,39	26,57	28,41

LÍMITE PLÁSTICO	
1	2
33	27
30,12	29,25
26,32	25,52
3,80	3,73
6,00	5,48
20,32	20,04
18,70	18,61

GRADACIÓN

P1 = 7061 6578 6248,9

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% PASA	ART. 220-13
3"	0			
2 1/2"	0	0,0	100,0	
2"	0,0	0,0	100,0	
1 1/2"	170,1	2,4	97,6	
1"	601,2	8,5	89,1	
3/4"	326,6	4,6	84,5	
1/2"	614,0	8,7	75,8	
3/8"	378,7	5,4	70,4	
No. 4	1047,0	14,8	55,6	
No. 10	1323,0	18,7	36,8	<80%
No. 40	1338,2	19,0	17,9	
No. 200	450,1	6,4	11,5	<20%
Pasa No. 200	812,1	11,5		
TOTAL	7061	100,0		



44,4	44,1	11,5
GRAVAS	ARENAS	FINOS

% Fracción menor del Tamiz No. 200 11,50

D10	0,90	COEFICIENTE UNIFORMIDAD (Cu)	12,0	HUMEDAD NATURAL
D30	6,80			
D60	10,8	COEFICIENTE CURVATURA (Cc)	4,8	11,3%
PRUEBA LÍMITE DE CONTRACCIÓN		LC	R	CV

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS	
Límite Líquido (%)	26,20
Límite Plástico (%)	18,66
Índice de Plasticidad (%)	7,54
Índice de Consistencia	3,47
Índice de grupo	-3
AASHO	A-2-4
USCS	GC

Jhon Fredy Sanchez Ospitia

Técnico profesional en construcción - SENA

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
NIT. 7.410.219-8
Mecánica de Suelos,
Pavimentos y Concretos
Oscar Fernando Arevalo
Jefe de Laboratorio



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
INGENIERO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Y LIMITES DE CONSISTENCIA

CODIGO	OFA-EC-14
VERSION	2
FECHA	20-may.-16

PROYECTO:

MUESTRA:

FECHA:

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO -
TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA,
DPT. DEL HUILA

1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO

20 de febrero de 2023

CODIGO:

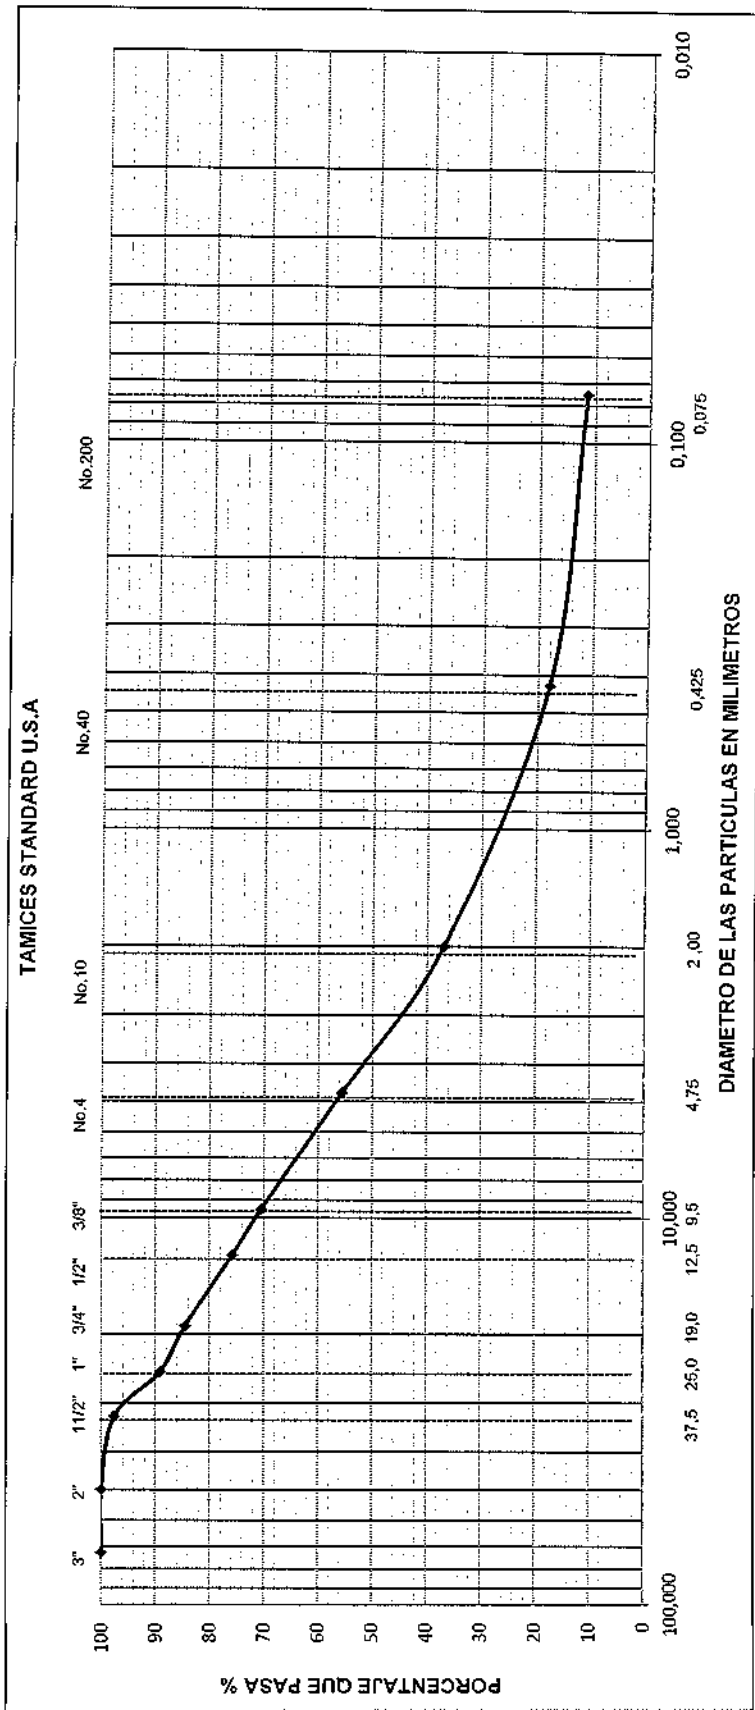

REMISION:

HOJAS:

MSPC OFA 003-23

OFA 042-23

3 de 10

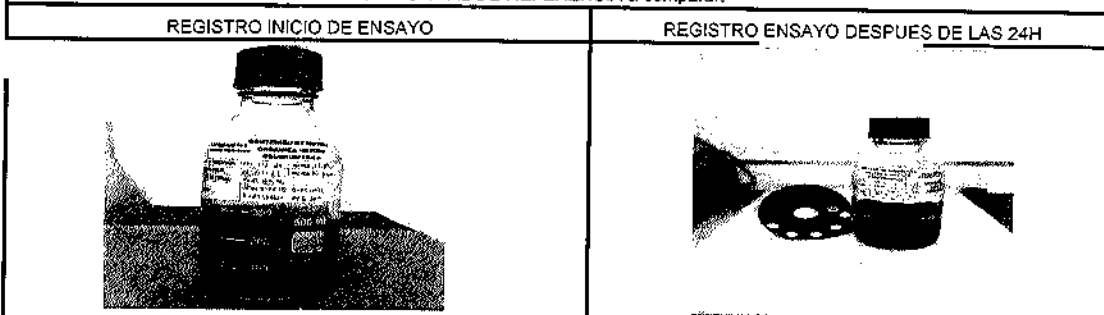


 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO - METODO IGNICIÓN		CODIGO	OFA-CMO-14
			VERSIÓN	1
			FECHA	20-oct.-13

OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias mediante la construcción de 1.5 km de pavimento rígido - tramo de vía del centro poblado de Gallardo conduce al cruce Ruta 20A en el Mpio de Suaza, Dpt. del Huila	FECHA:	20-feb.-23
UBICACIÓN:	STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ	NORMA:	INVIAS-13
MUESTRA:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	ENSAYO:	E-121
FUENTE:	CANTERA MASSEQ	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.	REMISIÓN:	OFA 042-23
		PAGINAS:	4 de 10

EQUIPO :

- * Frascos incoloros
- * Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 3%
- * Tabla de colores No.815 ASTM C-40 con Número de referencia Orgánica de 1 a 5 en el cual el número 3 es el COLOR NORMAL DE REFERENCIA a comparar.



INTERPRETACION DE RESULTADOS:

Se considera que la arena contiene componentes orgánicos perjudiciales, cuando el color que sobrenada por encima de la muestra de ensayo es mas oscuro que el COLOR NORMAL DE REFERENCIA

RESULTADO CUALITATIVO	Agregado	Tolerancia	Cumple	No Cumple	Número de referencia Orgánica
	Terraplen				
	Afirmado		X		
	Sub base granular				
	Base granular				
	Concreto				
	MDC				


Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Tecnico profesional en construcción - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.480.239-8
 Mecánica de suelos, pavimentos y concretos
 Oscar Fernando Arevalo
 Ing. Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE COLAPSO	CODIGO:	OFA-DM-08
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	4-ene-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE
 GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT.
 DEL HUILA

OBRA: _____ FECHA: 20-feb-23

UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ NORMA: IINV E157-13


MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO CÓDIGO: MSPC OFA 003-23

FUENTE: CANTERA MASSEQ REMISIÓN: OFA 042-23

PAGINAS: 5 de 10

MASA INICIAL (g)		ALTURA INICIAL (Pulg)	
95,92		0,0866	
TIEMPO (min)	CARGA (g)	DEFORMACIÓN AXIAL 0,0001"	ESFUERZO VERTICAL (KPa)
5	25	42	6
10	60	58	15
10	125	112	25
10	250	142	50
10	500	250	102
10	1000	219	200
10	2000	475	400
0,1	INUNDACION	479	400
0,25		480	400
0,5		481	400
1		481	400
2		482	400
4		482	400
8		482	400
15		483	400
30		483	400
60		483	400
120		483	400
240		483	400
APLICACION DE CARGA			
480	4000	488	800
960	8000	489	1600
1920		492	

OBSERVACIONES: Se determino el potencial de colapso para una capa de suelo 0.50m, aplicando un esfuerzo vertical de 400 Kpa, se obtuvo un indice de colapso de 0.66% que corresponde a un grado de colapso ligero. Se debe tener en cuenta que el ensayo no intenta reproducir ninguna condicion particular en campo, sino una correlacion directa del comportamiento del suelo mediante los datos obtenidos.



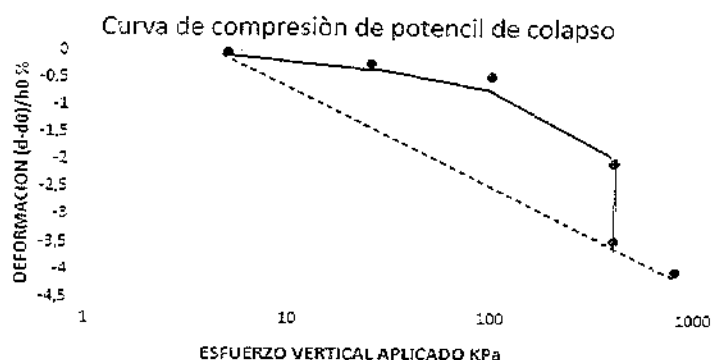
Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Técnico profesional en construcción - SENA

 **OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA**
 NIT: 7.650.239-P
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	INDICE DE COLAPSO	CODIGO:	OFA-DM-08
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	4-ene-18

OBRA: UBICACIÓN: MUESTRA: FUENTE:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO CANTERA MASSEQ	FECHA: NORMA: CÓDIGO: REMISIÓN: PAGINAS:	20-feb-23 IINV E157-13 MSPC OFA 003-23 OFA 042-23 6 de 10
--	--	---	---



$$I_e = \frac{df - d_i}{h_0} \times 100 = 0,92$$

GRADO DEL COLAPSO DEL ESPECIMEN	ÍNDICE DE COLAPSO I_e %
Ninguno	0
Ligero	0.1 a 2.0
Moderado	2.1 a 6.0
Moderadamente severo	6.1 a 10.0
Severo	> 10

OBSERVACIONES: Se determino el potencial de colapso para una capa de suelo 0,50m, aplicando un esfuerzo vertical de 400 Kpa, se obtuvo un índice de colapso de 0,66% que corresponde a un grado de colapso ligero. Se debe tener en cuenta que el ensayo no intenta reproducir ninguna condición particular en campo, sino una correlación directa del comportamiento del suelo mediante los datos obtenidos.



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
Técnico profesional en construcción - SENA



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.650.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
Jefe de Laboratorio

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CONTENIDO DE SALES SOLUBLES	CODIGO	OFA AM-14
		VERSIÓN	2
		FECHA:	20-jul.-18

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA		FECHA:	20-feb.-23
OBRA:	STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ	NORMA:	Art. 220-13
UBICACIÓN:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	ENSAYO:	E-157
MUESTRA:	CANTERA MASSEQ	CODIGO:	MSPC OFA 003-23
FUENTE	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.	REMISIÓN:	OFA 042-23
DESCRIPCIÓN:		PAGINAS:	7 de 10

ENSAYO	1	2	3
MUESTRA No.	1		
V = Contenido inicial del agua en el frasco, (ml)	500,0		
Ve= Volumen del extracto acuoso en cápsula, (ml)	100,0		
Mr= Masa del residuo en la cápsula, (g)	0,7		
Ms= Masa inicial del suelo introducido en el frasco, (g)	50,0		
S= Contenido de Sales Solubles (%)	0,1		

VALOR DE AZUL DE METILENO

=

0,07

ESPECIFICACIONES INVIAS - 13

		Maximo
Terraplenes	Cumple	2%
Mejoramiento de la Subrasante		2%
Relleno estructural		2%

PARAMENTOS DE ACEPTACION DEL ENSAYO	Calidad del agregado	Cumple	No Cumple	Rangos
	EXCELENTE	X		≤ 2
	MARGINALMENTE ACEPTABLE			4 a 6
	PROBLEMAS - POSIBLES FALLAS			8 a 10
	FALLADO			≥ 10

OBSERVACIONES:



Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Técnico profesional en construcción - SENA
 Oficina Calle 2 No. 2-59 Valvanera, Pitalito - Huila / Celular 3158938582 - 3105510987 / correo electronico: info.laboratorio@mecnicadesuelosofa.com



OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.600.239-8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

Oscar Fernando Arevalo
 Jefe de Laboratorio

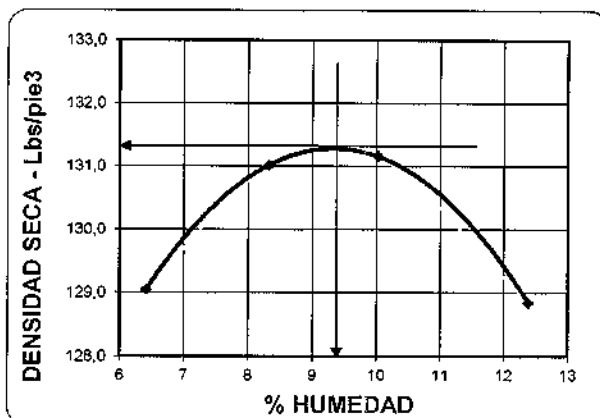
 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	RELACIÓN HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	CODIGO	OFA-EPM-14
		VERSIÓN	2
		FECHA	20-may.-16

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA
 UBICACIÓN: STOCK DE MATERIALES CANTERA CRUDO - MASSEQ
 MUESTRA: # 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO
 FUENTE: CANTERA MASSEQ
 DESCRIPCIÓN: GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.

FECHA: 20-feb.-23
 NORMA: Art. 220-230/13
 ENSAYO: E-142
 CODIGO: MSPC OFA 003-23
 REMISIÓN: OFA 042-23
 PAGINAS: 8 de 10

DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
Humedad Natural	5,0	5,0	5,0	5,0
Agua Añadida (c.c.)	120	240	360	480
Peso Molde + Muestra Humeda, g	10578	10729	10808	10824
Peso Molde, g	6067	6067	6067	6067
Peso Suelo Humedo, g	4511	4662	4741	4757
Volumen del Molde, cc	2050	2050	2050	2050
Densidad Humeda, g/cc	2,200	2,274	2,313	2,320
Humedad, %	6,4	8,3	10,0	12,4
Densidad Seca, lbs/pie ³	129,0	131,0	131,2	128,8

HUMEDAD				
Capsula No.	1	2	3	4
Peso Capsula + Suelo humedo, grm	659,3	625,0	619,9	690,0
Peso Capsula + Suelo Seco, grm	626,4	582,3	570,0	621,6
Peso agua, grm	32,9	42,7	49,9	68,4
Peso Capsula	113,0	69,3	72,5	69,3
Humedad, %	6,4	8,3	10,0	12,4



CLASIFICACION DEL SUELO

A.A.S.H.O. A-2-4
 U.S.C.E. GC
 Indice de Grupo -3

Densidad Max. 131,2 Lbs/Pulg³
 Humedad Optima 9,3 %

OBSERVACIONES
 Densidad Maxima 2,103
 grs/cm³

Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Tecnico profesional en construcción - SENA

OSCAR FERNANDO
 AREVALO PERALTA
 NIT. 7.150.139.8
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos

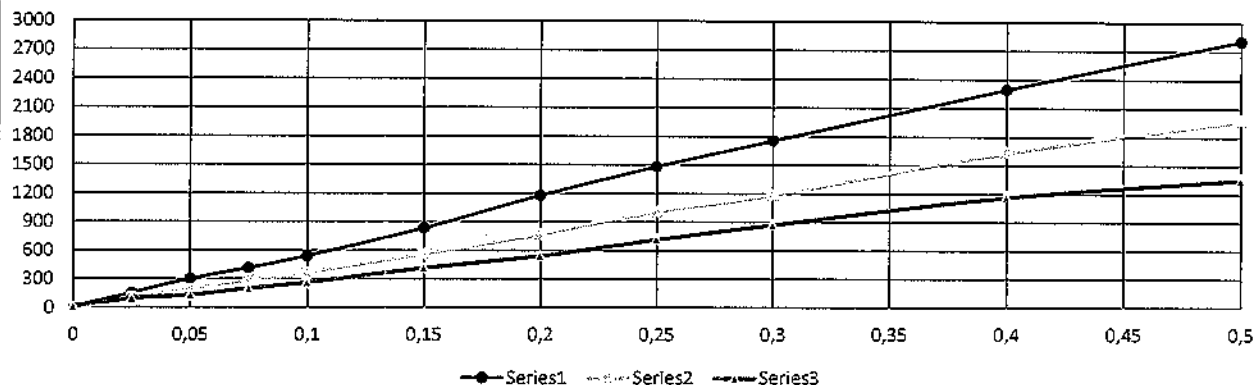
Oscar Fernando Arevalo
 Jefe de Laboratorio

	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CBR DEL SUELO COMPACTADO EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS		CODIGO OFA-CBR-14
				VERSIÓN 2
				FECHA 20-may.-16

FUENTE:	CANTERA MASSEQ	METODO:	No.1.
MUESTRA:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	OBRA:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.	FECHA:	20 de febrero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 042-23 9 de 10

MOLDE No		7			8			9					
No de golpes		65			30			10					
Días de inmersión		1			1			1					
Expansión mm		0,00			0,00			0,00					
PENETRACION		Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR	Lect.	Pres	CBR
Pulgadas	Tiempo (min)		Psi	%		psi	%		Psi	%		Psi	%
0,025	00:30	206	151		137	101		116	85				
0,050	1:00	409	301		250	184		165	121				
0,075	1:30	562	413		390	287		265	195				
0,100	2:00	733	539	53,9	489	359	35,9	350	257	25,7			
0,150	3:00	1.130	830		763	561		561	412				
0,200	4:00	1.602	1.177	78,5	1.044	767	51,1	737	542	36,1			
0,250	5:00	2.015	1.481		1.373	1.009		978	719				
0,300	6:00	2.386	1.753		1.618	1.189		1.191	875				
0,400	8:00	3.122	2.294		2.230	1.639		1.602	1.177				
0,500	10:00	3.821	2.808		2.702	1.986		1.866	1.371				
HUMEDAD PENETRACION %		11,3			13,6			14,4					

Título del gráfico



CBR a 0,1" = Carga Unitaria Leída a 0,1" * 100%
1000

CBR Corregido a 0,1" = 53,9 35,9 25,7

CBR a 0,2" = Carga Unitaria Leída a 0,2" * 100%
1500

CBR corregido a 0,2" = 78,5 51,1 36,1

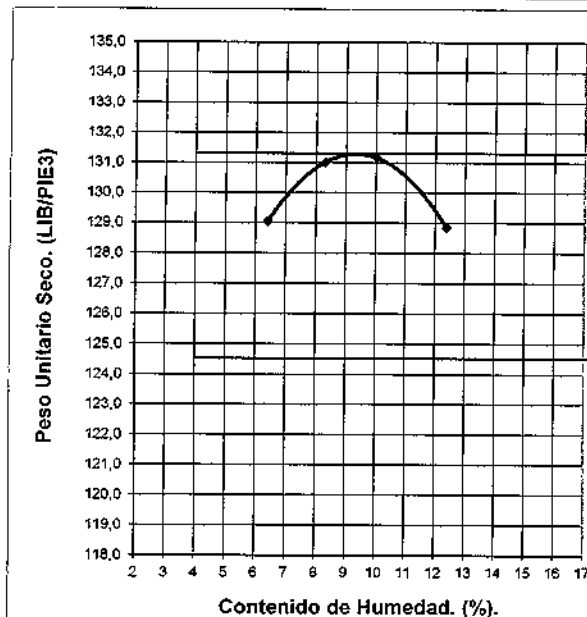
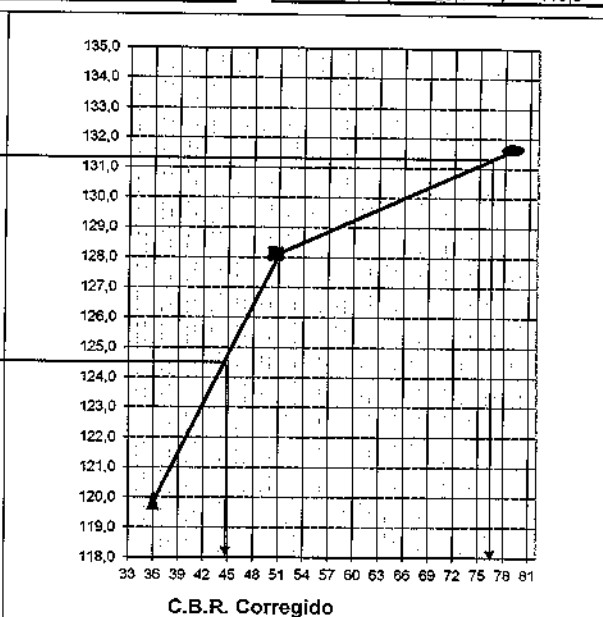
ESPECIFICACIONES INVIAS - 13	TERRAPLENES >10-5-3%Min.	AFRIMADO >15%Min.	SUB BASE >30%Min.	BASE >100%Min.
-------------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	----------------

 OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CBR DEL SUELO COMPACTADO EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS		CODIGO	OFA-CBR-14
			VERSIÓN	2
			FECHA	20-may.-16

FUENTE:	CANTERA MASSEQ	METODO:	No.1.
MUESTRA:	# 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS Y MEJORAMIENTO	OBRA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO - TRAMO DE VIA DEL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MPIO DE SUAZA, DPT. DEL HUILA
DESCRIPCIÓN:	GRAVA ARENOSA CON TRAZAS DE ARCILLA INORGANICA COLOR CAFÉ, VETA ROJIZA.	FECHA:	20 de febrero de 2023
OBSERVACIONES:		CODIGO:	MSPC OFA 003-23
		REMISIÓN:	OFA 042-23 10 de 10


MOLDE NUMERO	2	2	2	2
NUMERO DE GOLPES POR CAPA	55	55	55	55
VOLUMEN cc	2.050	2.050	2.050	2.050
PESO MOLDE + MUESTRA COMPACTADA (g)	10.578	10.729	10.808	10.824
PESO MOLDE (gr)	6.067	6.067	6.067	6.067
PESO MUESTRA COMPACTADA (g)	4.511	4.662	4.741	4.757
DENSIDAD HUMEDAD (g / cc)	2.200	2.274	2.313	2.320
PESO MUESTRA HUMEDAD + RECIPIENTE (g)	113,0	69,3	72,5	69,3
PESO MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)	659,3	625,0	619,9	690,0
CONTENIDO DE HUMEDO (%)	6,4	8,3	10,0	12,4
PESO UNITARIO SECO (Kg / m3)	2,068	2,099	2,102	2,065
PESO UNITARIO SECO . (Lbs / Pies³).	129,0	131,0	131,2	128,8


	2	8	9
	56	30	10
	2,322	2,322	2,313
	12,547	12,387	11,804
	7,203	7,181	6,954
	5,344	5,206	4,850
	2,901	2,242	2,097
	69,3	69,3	69,3
	738,8	738,8	738,8
	682,5	682,5	682,5
	9,2	9,2	9,2
	2,108	2,053	1,921
	131,5	128,1	119,8



CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD.	9,3
PESO UNITARIO SECO MAXIMO.Lbr/pulg³	131,2
C.B.R. CORREGIDO / 100%.	76,2%
C.B.R. CORREGIDO / 95%.	44,8%

●	65 GOLPES / CAPA.
■	30 GOLPES / CAPA.
▲	10 GOLPES / CAPA.


Jhon Fredy Sanchez Ospitia
 Tecnico profesional en construcción - SENA


OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA
 NIT. 7.700.209-2
 Mecánica de Suelos,
 Pavimentos y Concretos
 Oscar Fernando Arevalo Peralta
 Jefe de Laboratorio
