

INFORME SEMANAL

Semana Número: 14 Del: 27 de noviembre de 2023 Al: 3 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 105 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	27.00%		72.00%	Obra Física Ejecutada (%)	22.50%		62.50%
Valor básico de la Obra	\$ 88.503.765,59	\$	236.010.041,58	Valor básico de la Obra	73.753.137,99		204.869.827,76
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		Interventor:		GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S	
Contrato No.		1675 de 2023		Contrato No.		1708 DE 2023	
Valor Inicial:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Inicial:		\$ 352.258.326,00	
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial:		4 MESES 6 DIAS		Plazo Inicial:		4 MESES Y 21 DIAS	
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023		Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023	
Fecha de Vencimiento:		5 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Vencimiento:		20 DE DICIEMBRE DE 2023	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


fundida de placas con mortero para renovación
desmonte de cielo raso en área de atención al usuario y archivo bodega
desmonte de manto asfáltico en placas de entpiso
aseo en ventanería
instalación de láminas en fibra mineral para cielo raso



Renovación placa de terraza con mortero



Renovación placa de terraza con mortero

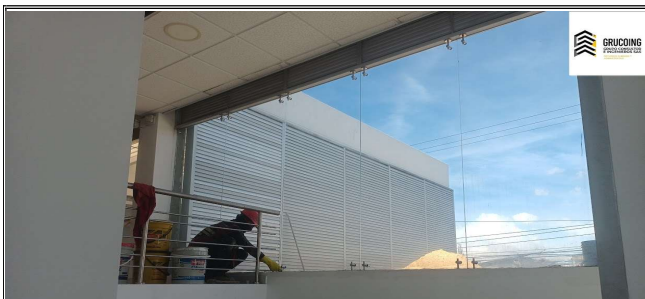



limpieza de ventaneria



desmonte de cielo raso en area de atencion al publico



desmonte de cielo raso hall.



instalacion de cielo raso en area de archivo fijo



preparacion de laminas para instalacion de cielo raso en fibra mineral



arena para mortero de renivelacion placas de terrazas

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
aseo en ventaneria	<div>Firma </div> <div>Nombre : J. Andres Melo G,</div> <div>Matricula No.: A201020555</div>
instalacion de laminas en fibra mineral para cielo raso	
desmonte de cielo rasos	
nivelacion de placas de entepiso para instalacion de mantos	
