


CONTRATO N°	211 DE 2024	PROYECTO N°	2020500010080
-------------	-------------	-------------	---------------

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN	
Contrato Obra N°	211 del 20 de febrero 2024	SUPERVISOR	WILSON EFRAIN CANO HERRERA
Objeto Obra	DESARROLLAR INTERVENCIONES CORRECTIVAS EN LA LINEA DE ADUCCION Y BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO CON ACCIONES DE REDUCCION Y MITIGACION DEL RIESGO		
Tiempo de Ejecución	DOS (02) MESES		
Valor inicial:	\$ 1.799.364.175,67		
Fecha Acta de inicio:	21 de febrero de 2024	JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO	

Dia Numero	2	Fecha	22/02/2024
------------	---	-------	------------

	Valor	%		Valor	%
Diario programado	\$ 2.095.475,76	0,12%	Diario ejecutado	\$ 2.095.475,76	0,12%
Acumulado programado	\$ 2.095.475,76	0,12%	Acumulado ejecutado	\$ 2.095.475,76	0,12%

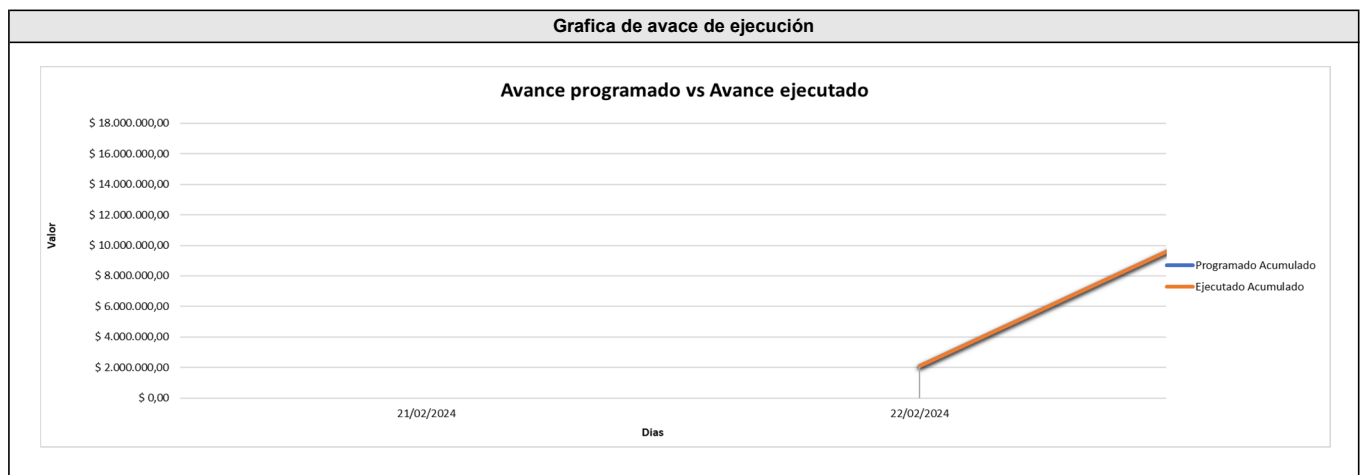

Reporte de actividades realizadas			
Actividad realizada	Maquina	Horas	Observaciones
Apertura de acceso vehicular a la Bocatoma	CAMABAJA OJT166	4	se transportaron la excavadora link belt 2183 #3 y la excavadora link belt 2179 #4 desde el patio galicia servimacons hasta la vereda la argentina via el acueducto y se regreso al patio servimacons
Apertura de acceso vehicular a la Bocatoma	Excavadora sobre oruga LINK - BELT 2183 #3	0	
Apertura de acceso vehicular a la Bocatoma	Excavadora sobre oruga LINK - BELT 2179 #4	0	
Apertura de acceso vehicular a la Bocatoma	Excavadora sobre oruga LINK - BELT 2180 #5	0	
Apertura de acceso vehicular a la Bocatoma	Bulldozer sobre oruga caterpillar 2766 #3	0	
Apertura de acceso vehicular a la Bocatoma	Volqueta articulada tipo dumper #3	0	

Observaciones Generales
se empezo el dia con el desplazamiento de las maquinas desde patio galicia servimacons hacia la vereda la argentina.

CONTRATO N°	211 DE 2024	PROYECTO N°	2020500010080
-------------	-------------	-------------	---------------

Vista General Del Avance De Ejecución



FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ	DIRECTOR DE PROYECTO	
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL DE SERVIMACONS SAS	
	SUPERVISIÓN	

		PLAN DE ACCION ESPECIFICO																								
CONTRATO No.: 211 - 2024		DESARROLLAR INTERVENCIONES CORRECTIVAS EN LA LINEA DE ADUCCIÓN Y BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO CON ACCIONES DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO																								
PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA		\$	1.059.906.245,60		<table><tr><td colspan="2">FECHA DE INICIO</td><td colspan="2">21/02/2024</td><td colspan="2">FECHA DE CORTE</td><td colspan="2">22/02/2024</td></tr><tr><td colspan="2">FECHA DE TERMINACION</td><td colspan="2">20/04/2023</td><td colspan="4"></td></tr></table>						FECHA DE INICIO		21/02/2024		FECHA DE CORTE		22/02/2024		FECHA DE TERMINACION		20/04/2023					
FECHA DE INICIO		21/02/2024		FECHA DE CORTE							22/02/2024															
FECHA DE TERMINACION		20/04/2023																								
PRESUPUESTO ALQUILER DE MAQUINARIA		\$	452.164.490,26																							
VALOR CONTRATO SIN IVA		\$	1.512.070.735,86																							
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA		\$	1.799.364.175,67																							

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			HORAS POR EJECUTAR				
					ITEM	TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR(4)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR(4)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR(4)	
					1	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO, INCLUIDOS ACCESOS CARRETEABLES Y APOYO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPARACIONES										
1	VILLAVICENCIO	BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO	ACCESO VEHICULAR, CANALES DE DESVIACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EN ARREGLOS DE LA LINEA DE ADUCCIÓN	DESPLAZAMIENTOS, INUNDACIONES	1,1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	30,00	\$ 440.226,00	\$ 13.206.780,00	4,00	\$ 440.226,00	\$ 1.760.904,00	26,00	\$ 440.226,00	\$ 11.445.876,00	
					1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X 2 CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	1440,00	\$ 445.107,83	\$ 640.955.275,20	0,00	\$ 445.107,83	\$ 0,00	1.440,00	\$ 445.107,83	\$ 640.955.275,20	
					1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D9K XL CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	480	\$ 428.633,73	\$ 205.744.190,40	0,00	\$ 428.633,73	\$ 0,00	480,00	\$ 428.633,73	\$ 205.744.190,40	
					1,4	IMPREVISTO Y EVENTUALIDADES PARA EQUIPOS BANCO DE MAQUINARIA GOBERNACIÓN	1,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	
						SUBTOTAL		\$ 1.059.906.245,60		SUBTOTAL	\$ 1.760.904,00		SUBTOTAL	\$ 1.058.145.341,60		
					2	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO, INCLUIDOS ACCESOS CARRETEABLES Y APOYO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPARACIONES LOCATIVAS										
					2,1	ALQUILER VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLAMDA 16,9 ME O EQUIVALENTE	686,00	\$ 659.131,91	\$ 452.164.490,26	0,00	\$ 659.131,91	\$ 0,00	686,00	\$ 659.131,91	\$ 452.164.490,26	
						SUBTOTAL		\$ 452.164.490,26		SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 452.164.490,26		
					TOTAL PROGRAMADO OPERACION DE MAQUINARIA		1950,00	100,00%	\$ 1.059.906.245,60	4,00	0,2%	\$ 1.760.904,00	1.946,00	99,83%	\$ 1.058.145.341,60	
					VALOR IVA (19%)				\$ 201.382.186,66			\$ 334.571,76			\$ 201.047.614,90	
VALOR ALQUILER DE MAQUINARIA		686,00	100,00%	\$ 452.164.490,26	0,00	0,00%	\$ 0,00	686,00	100,00%	\$ 452.164.490,26						
VALOR IVA (19%)				\$ 85.911.253,15			\$ -			\$ 85.911.253,15						
VALOR TOTAL DE CONTRATO		2636,00	100,00%	\$ 1.799.364.175,67	4,00	0,12%	\$ 2.095.475,76	2.632,00	99,88%	\$ 1.797.268.699,91						

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

ING.WILSON CANO
JEFE DE OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTOR DE PROYECTO


ASTRID PARRADO
APOYO A LA SUPERVISIÓN



REPORTE VISOR FEWS IDEAM




DIA REPORTADO	22 de febrero 2024
NOMBRE ESTACION	Pte. abadía automática
CODIGO ESTACIÓN	35037100
VARIABLE REPORTADA	Nivel

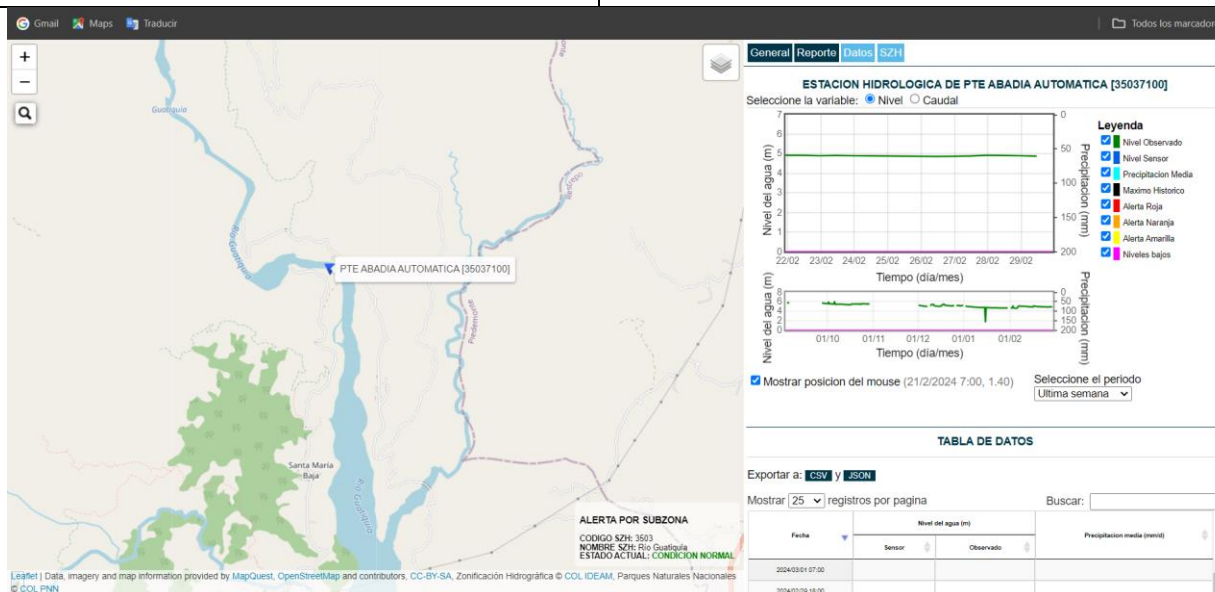

General Reporte Datos SZH

ESTACION HIDROLOGICA DE PTE ABADIA AUTOMATICA [35037100]

Seleccione la variable: ☒ Nivel ☐ Caudal

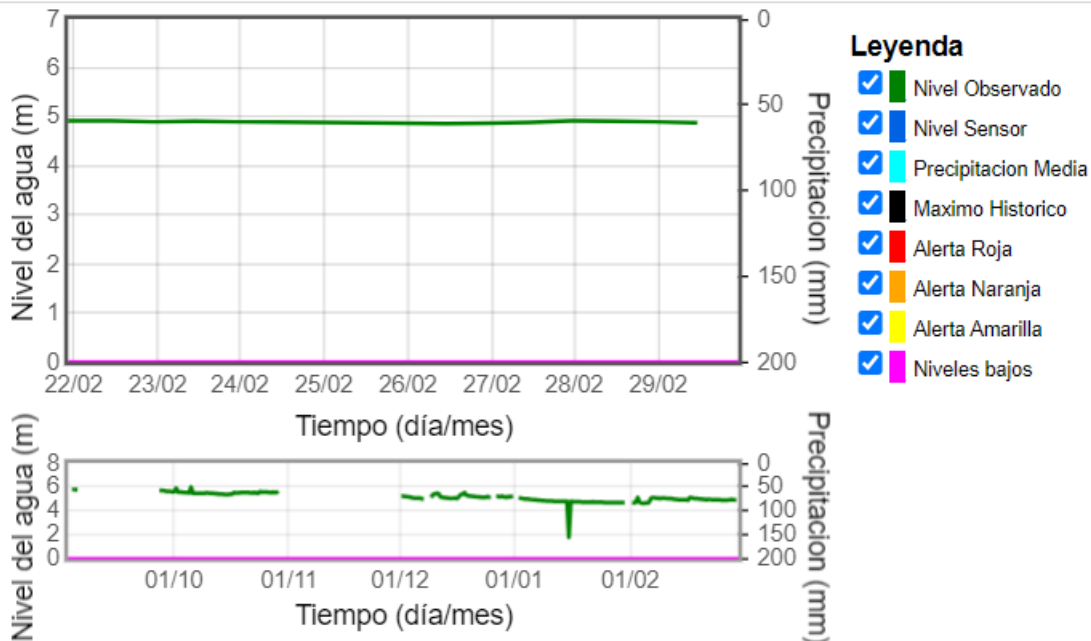

☒ Mostrar posición del mouse (1/3/2024 10:00, 0.62)

Seleccione el periodo


Ultima semana



REPORTE VISOR FEWS IDEAM




DIA REPORTADO	22 de febrero 2024
NOMBRE ESTACION	Pte. abadía automática
CODIGO ESTACIÓN	35037100
VARIABLE REPORTADA	Caudal

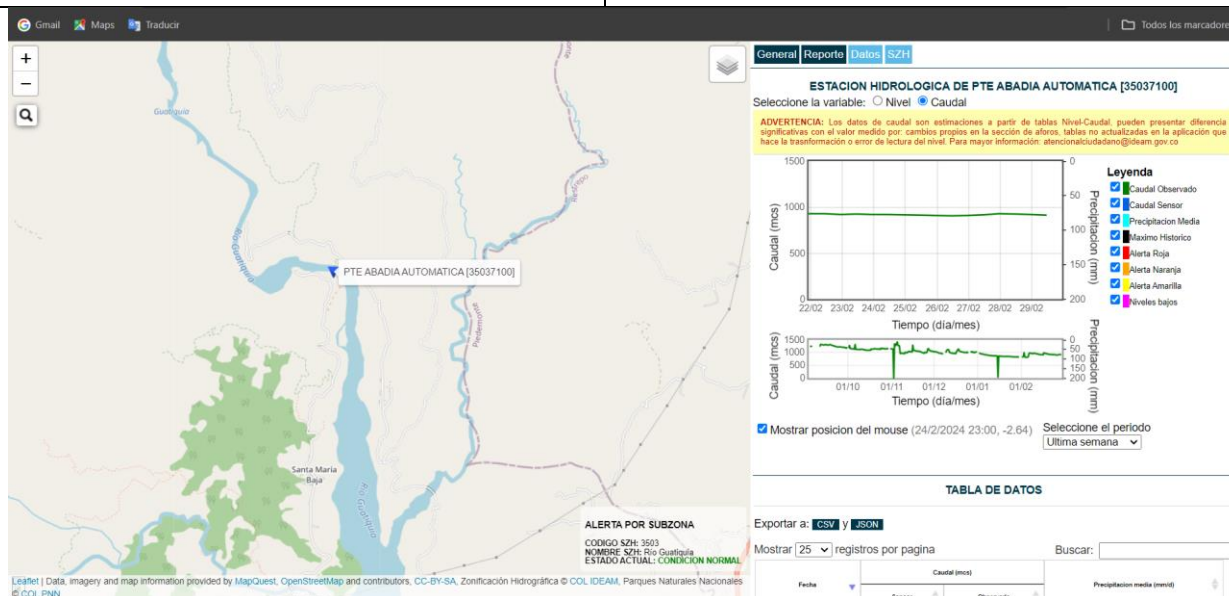

ESTACION HIDROLOGICA DE PTE ABADIA AUTOMATICA [35037100]

Seleccione la variable: ☐ Nivel ☒ Caudal

ADVERTENCIA: Los datos de caudal son estimaciones a partir de tablas Nivel-Caudal, pueden presentar diferencia significativas con el valor medido por: cambios propios en la sección de aforos, tablas no actualizadas en la aplicación que hace la transformación o error de lectura del nivel. Para mayor información: atencionalciudadano@ideam.gov.co

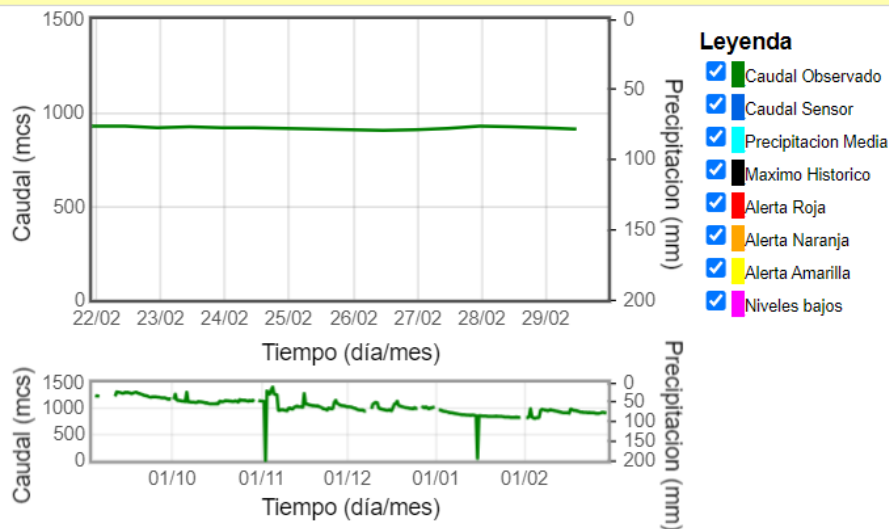

☒ Mostrar posición del mouse (26/2/2024 15:00, -584.21)

Seleccione el periodo
Última semana

ESTACION HIDROLOGICA
PTE ABADIA AUTOMATICA [35037100]

Categoria	Hidrologica Automatica Nivel - Precipitacion
Coordenadas	Latitud: 4° 14' 7.2" N, Longitud: 73° 38' 7.3" W
Altitud	523 m.s.n.m
Cota Cero	521.1762 m.s.n.m
Zona Hidrografica	Meta
Subzona Hidrografica	Río Guatiquía
Corriente	GUATIQUEIA
Centro Poblado	VILLAVICENCIO
Municipio	VILLAVICENCIO
Departamento	META
Estado	▼ Normal
Maximo Nivel observador/24hr	4.88 m

Imagen

