

[illegible]

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																			
DÍA	FECHA	MES	ACTIVIDADES																																																
viernes	5/07/2024	julio																																																	
sábado	6/07/2024	julio																																																	
domingo	7/07/2024	julio																																																	
lunes	8/07/2024	julio	Rocería, limpieza de calzada, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, poda, corte y retiro de árboles, entre los PR 55+0000 al PR 58+0000.																																																
martes	9/07/2024	julio	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, limpieza de bamba y borde de pavimento, limpieza de señales verticales y mojones, poda, corte y retiro de árboles, entre los PR 58+0000 al PR 61+0000.																																																
miércoles	10/07/2024	julio	Rocería, limpieza de bamba y borde de pavimento, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras y mantenimiento rutinario de puentes (PTE La Arenosa) entre los PR 61+0000 al PR 64+0000.																																																
jueves	11/07/2024	julio	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de defensas metálicas, limpieza bamba y borde pavimento, entre los PR 64+0000 al PR 67+0000.																																																
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																			
Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del tránsito.																																																			
X. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																			
TRAMO 6605, SECTOR PR 44+0000 A PR 88+00000																																																			
El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y la meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.																																																			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																			
<div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>5/07/2024</td><td></td><td></td></tr></table></div></div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>7/07/2024</td><td></td><td></td></tr></table></div></div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>9/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 59+0720</td><td>Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.</td></tr></table></div></div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>11/07/2024</td><td>Tramo 6606, PR 67+0000</td><td>Limpieza de defensas metálicas.</td></tr></table></div></div></div> <div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>6/07/2024</td><td></td><td></td></tr></table></div></div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>8/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 55+0500</td><td>Rocería</td></tr></table></div></div><div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>10/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 62+0600</td><td>Mantenimiento rutinario de puentes, Puente la Arenosa</td></tr></table></div></div><div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACION</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div></div>				FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	5/07/2024			FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	7/07/2024			FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	9/07/2024	Tramo 6605, PR 59+0720	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.	FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	11/07/2024	Tramo 6606, PR 67+0000	Limpieza de defensas metálicas.	FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	6/07/2024			FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	8/07/2024	Tramo 6605, PR 55+0500	Rocería	FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	10/07/2024	Tramo 6605, PR 62+0600	Mantenimiento rutinario de puentes, Puente la Arenosa	FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD			
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
5/07/2024																																																			
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
7/07/2024																																																			
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
9/07/2024	Tramo 6605, PR 59+0720	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.																																																	
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
11/07/2024	Tramo 6606, PR 67+0000	Limpieza de defensas metálicas.																																																	
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
6/07/2024																																																			
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
8/07/2024	Tramo 6605, PR 55+0500	Rocería																																																	
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	
10/07/2024	Tramo 6605, PR 62+0600	Mantenimiento rutinario de puentes, Puente la Arenosa																																																	
FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD																																																	

NOTA: Las actividades y metas programadas en el presente formato, son responsabilidad exclusiva del poseedor del contrato de mantenimiento rutinario.

VER: DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


FIRMA:

NOMBRE: JUAN JOSÉ OSORIO BELALCAZAR

Matrícula Profesional No.: 6350236751-0100

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Código: 000001-Ejecución, Subdivisión de Interventoría, Contratos, Interventoría y Obra de Mantenimiento



I. INFORMACIÓN GENERAL	
------------------------	--

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
-------------------	----------------------------

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO	

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026		
	RECURSOS POR VIGENCIA	400.000.000	400.000.000	400.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS		INDICADOR IC		ANTICIPOS	
Oturgado \$		En el mes:		Oturgado \$	
Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$	
Saldo \$				Saldo \$	

Meta Física Programada %	0,72%	Avance o Atraso Físico %	%
Meta Física Ejecutada %	0,72%		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

			Ejec	
* El Inversor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente en el avance físico mensual acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1:	6605, PR 44-0000 - PR 89-0000			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

<p>TRAMO Y/O SECTOR (n):</p> <p>-----</p>	<p>IV. GESTIÓN AMBIENTAL</p>
---	------------------------------

FUENTES DE MATERIALES	DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A	X
-----------------------	------------	---	----	----	-----	---

--	--

ESTADO: N. A. _____

VI. GESTION PREDIAL		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N. A.	OBSERVACIONES N. A.:

	VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
N. A.	

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				ACTIVIDADES
viernes	12/07/2024	julio	Rocería, limpieza de calzada, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, poda, corte y retiro de árboles, entre los PR 55+0000 al PR 58+0000.	
sábado	13/07/2024	julio	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.	
domingo	14/07/2024	julio	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.	
lunes	15/07/2024	julio	Rocería, limpieza de calzada, berrna y borde de pavimento, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 70+0000 al PR 73+0000.	
martes	16/07/2024	julio	Rocería, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de defensas metálicas, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, entre los PR 73+0000 al PR 76+0000.	
miércoles	17/07/2024	julio	Rocería, limpieza de berrna y borde de pavimento, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de defensas metálicas, entre los PR 76+0000 al PR 80+0000.	
jueves	18/07/2024	julio	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de berrna y borde de pavimento, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de defensas metálicas, limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 80+0000 al PR 83+0000.	

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del tránsito.			
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
<p>TRAMO 6605, SECTOR PR 44+0000 A PR 88+00000</p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>			
El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.			
X. REGISTRO FOTOGRAFICO			

12/07/2024 1:39 p. m.
TRAMO 6605 PR 69+0770

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
12/07/2024	Tramo 6605, PR 69+0770	Limpieza de safeles verticales y mojones.

13/07/2024 4:34 p. m.
TRAMO 6605 PR 60+0500

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
13/07/2024	Tramo 6605, PR 60+0500	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.

14/07/2024

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
14/07/2024	Tramo 6605, PR 54+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.

15/07/2024 7:40 a. m.
TRAMO 6605 PR 70+0450

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
15/07/2024	Tramo 6605, PR 70+0450	Rocería.

16/07/2024 9:44 a. m.
TRAMO 6605 PR 74+0700

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
16/07/2024	Tramo 6605, PR 74+0700	Poda, corte y retiro de árboles.

17/07/2024 2:02 p. m.
TRAMO 6605 PR 79+0550

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
17/07/2024	Tramo 6605, PR 79+0550	Limpieza de defensas metálicas.

18/07/2024 11:22 a. m.
TRAMO 6606 PR 82+0550

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
18/07/2024	Tramo 6606, PR 82+0550	Recolección de basuras.

FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD

<p>NOTA: Las actividades y servicios programados en el presente contrato, son responsabilidad exclusiva del proveedor del servicio.</p> <p>VI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p>		<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p>
<p>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RIVIAS.</p> <p>Copias: Archivo Electrónico, Subdirección de Inspección, Contratación, Interventoría y Oficina Técnica.</p>		<p>FIRMA</p> <p>NOMBRE: <u>JUAN JOSÉ OSÓRIO BELALCAZAR</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>6350238761 QND</u></p>

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
DÍA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	19/07/2024	julio	Limpieza de señales verticales y mojones, limpieza de berma, poda y retiro de árboles, entre los PR 54+0700 al PR 55+0800.
sábado	20/07/2024	julio	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	21/07/2024	julio	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	22/07/2024	julio	Rocería, limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, mantenimiento rutinario de puentes (PTE L a Colorado), entre los PR 83+0000 al PR 86+0000.
martes	23/07/2024	julio	Actividad de tapa-huecos, entre los PR 58+0250 al PR 72+0570.
miércoles	24/07/2024	julio	Actividad de tapa-huecos, entre los PR 75+0550 al PR 80+0000 y los PR 80+0000 al PR 81+0700.
jueves	25/07/2024	julio	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de berma y borde de pavimento, poda, corte y retiro de árboles, limpieza de defensas metálicas, limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 86+0000 al PR 88+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del tránsito.			

X. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO			
<p>TRAMO 6605, SECTOR PR 44+0000 A PR 88+0000</p> <p>El esquema gráfico será diseñado por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.</p>			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
19/07/2024	Tramo 6605, PR 55+0800	Limpieza de berma.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
20/07/2024	Tramo 6605, PR 79+0150	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
21/07/2024	Tramo 6605, PR 72+0200	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
22/07/2024	Tramo 6605, PR 83+0800	Mantenimiento rutinario de puentes.


FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
23/07/2024	Tramo 6605, PR 58+0675	Actividad de tapa-huecos.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
24/07/2024	Tramo 6605, PR 81+0060	Actividad de tapa-huecos.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
25/07/2024	Tramo 6606, PR 87+0480	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

<p>NOTA: Las actividades y acciones programadas en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del personal que presta el servicio.</p> <p>VI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</p>		<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <p> FIRMA NOMBRE: JUAN JOSÉ OSORIO BELALCAZAR Matrícula Profesional No.: 6350236791 QND </p>
<p><small>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RIVIAS. Copias: Archivo Ejecutor, Subdirección de Asesoramiento, Contratación, Asesoría y Oficina Técnica</small></p>		

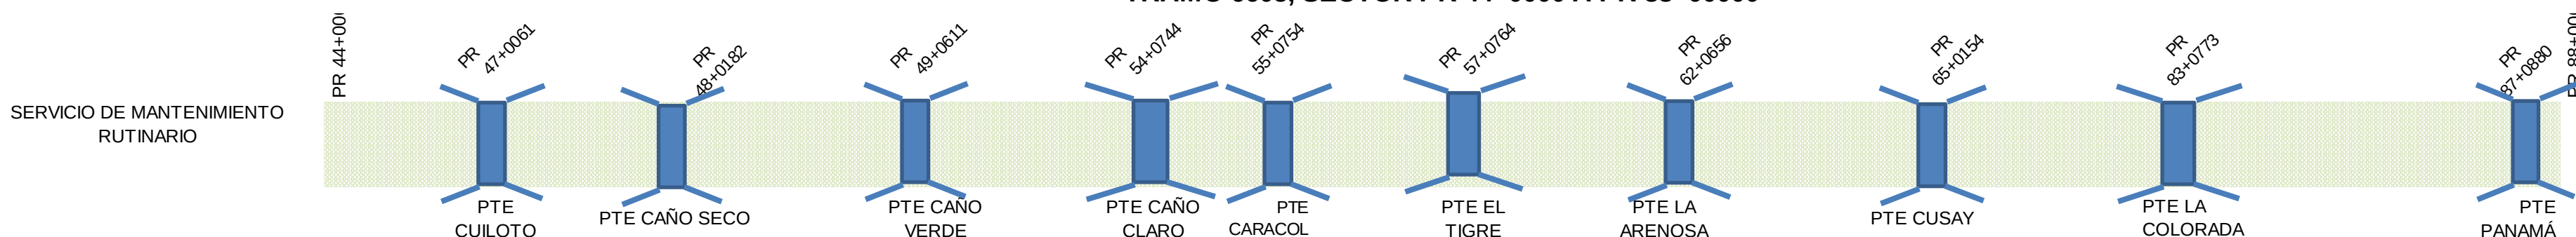VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																					
DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES																																																																		
viernes	26/07/2024	julio	Limpieza de señales verticales y mojones; limpieza de berma; poda, corte y retiro de árboles; recolección de basuras; capacitación, entre los PR 52+0930 al PR 59+0650.																																																																		
sábado	27/07/2024	julio	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.																																																																		
domingo	28/07/2024	julio	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.																																																																		
lunes	29/07/2024	julio	Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento; limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 55+0070 al PR 55+0100.																																																																		
martes	30/07/2024	julio	Limpieza y destape de huecos para pata-huecos (No llevo mezcla por parte del contrato 990 de 2022) , entre los PR 81+0700 al PR 83+0000.																																																																		
miércoles	31/07/2024	julio	Actividad de tapa-huecos, entre los PR 81+0700 al PR 84+0800.																																																																		
jueves	1/08/2024	julio	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole; limpieza de berma y borde de pavimento; poda, corte y retiro de árboles; limpieza de señales verticales y mojones, entre los PR 44+0000 al PR 47+0000.																																																																		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																					
Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del tránsito.																																																																					
X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																					
TRAMO 6605, SECTOR PR 44+0000 A PR 88+00000																																																																					
																																																																					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.																																																																					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																					
<div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>26/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 59+0560</td><td>Rcoleccion de basuras.</td></tr></table></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>27/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 57+0000</td><td>Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.</td></tr></table></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>28/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 61+0500</td><td>Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.</td></tr></table></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>29/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 55+0070</td><td>Limpieza de borde de pavimento.</td></tr></table></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>30/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 81+0840</td><td>Limpieza de huecos para tapa-huecos.</td></tr></table></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>31/07/2024</td><td>Tramo 6605, PR 81+0840</td><td>Actividad de tapa-huecos.</td></tr></table></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>ACTIVIDAD</th></tr><tr><td>1/08/2024</td><td>Tramo 6606, PR 87+0480</td><td>Rocería.</td></tr></table></div></div> <tr><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="4">NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</td></tr> <tr><td colspan="2">XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</td><td colspan="2">RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"><div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div><div> JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR 6320239791 QND</div></div></td></tr> <tr><td colspan="4">Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RMVG. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial</td></tr>				FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	26/07/2024	Tramo 6605, PR 59+0560	Rcoleccion de basuras.	FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	27/07/2024	Tramo 6605, PR 57+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.	FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	28/07/2024	Tramo 6605, PR 61+0500	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.	FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	29/07/2024	Tramo 6605, PR 55+0070	Limpieza de borde de pavimento.	FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	30/07/2024	Tramo 6605, PR 81+0840	Limpieza de huecos para tapa-huecos.	FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	31/07/2024	Tramo 6605, PR 81+0840	Actividad de tapa-huecos.	FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	1/08/2024	Tramo 6606, PR 87+0480	Rocería.									NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA				<div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div><div> JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR 6320239791 QND</div></div>		Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RMVG. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
26/07/2024	Tramo 6605, PR 59+0560	Rcoleccion de basuras.																																																																			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
27/07/2024	Tramo 6605, PR 57+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.																																																																			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
28/07/2024	Tramo 6605, PR 61+0500	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.																																																																			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
29/07/2024	Tramo 6605, PR 55+0070	Limpieza de borde de pavimento.																																																																			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
30/07/2024	Tramo 6605, PR 81+0840	Limpieza de huecos para tapa-huecos.																																																																			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
31/07/2024	Tramo 6605, PR 81+0840	Actividad de tapa-huecos.																																																																			
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD																																																																			
1/08/2024	Tramo 6606, PR 87+0480	Rocería.																																																																			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																																																					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA																																																																			
		<div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div><div> JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR 6320239791 QND</div></div>																																																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RMVG. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial																																																																					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1605 de 2024
PERIODO: 08 al 31 de julio de 2024
VÍA: TAME - COROCORO PR 44+0000 AL 88+0000



RESUMEN


ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUTADO
1	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	M2	411.840	55	82.368,00	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	ML	0	0	0,00	
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLE Y DESCOLE	MENSUAL	ML	385	25	156,75	100%
4	PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	CUANDO APLIQUE	UND	55	17	23,00	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES, PONTONES	MENSUAL	ML	163	6	13,07	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES, DE POSTES DE REFERENCIA	CUANDO APLIQUE	UND	252	22	100,50	100%
7	LIMPIEZA BORDE DE PAVIMENTO	CUANDO APLIQUE	ML	49.970	20	20.656,67	100%
8	TAPA - HUECOS	CUANDO APLIQUE	M3	21	44	1,91	100%
9	RECOLECCION DE BASURAS	MENSUAL	KG	75	9	25,83	100%
10	INSPECCION, VIGILANCIA, ATENCION DE EMERGENCIAS	MENSUAL	Km	440	0	0,00	100%
TOTAL					198		

OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR VIAL

Firma
Nombre: RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
R/L: C. T. A. LOS LIBERTADORES
NIT: 834.000.840-6

Vo. Bo:
Nombre: JUAN JOSE OSORIO BELALCAZAR
Matrícula No. 6320239791 QND
Ing. Residente GRUPO AMV 4 LOTE 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																															
			VERSIÓN	1																															
			PÁGINA	1 DE 1																															
			FECHA	02/agosto/2024 (Día / Mes / Año)																															
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																																
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																			
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de julio de 2024			PROYECTO: TAME - COROCORO																																
CONTRATO No. 1605 DE 2024			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES																																
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1998-2024			INTERVENTORÍA: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ																																
MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
HERRAMIENTA	N/A	N/A	BODEGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MAQUINARIA Y EQUIPO (5 GUADAÑAS)	ZENOAH	780 ML	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO	128 GB	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TRANSPORTE (VEHICULO)	FORD	3 pasajero	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL ACTIVO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESUMEN PERIODO / MES			No.	%		CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																													
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8	100%																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			8	100%																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			0	0%																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			0	0%																															
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																			
LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																			
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																			
<div><div>Firma  RUBÉN HERRERA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES NIT: 834.000.840-6</div><div>Firma  FRANCESCO ROMEO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CEDULA DE EXTRANJERIA N°425777</div></div>																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																			

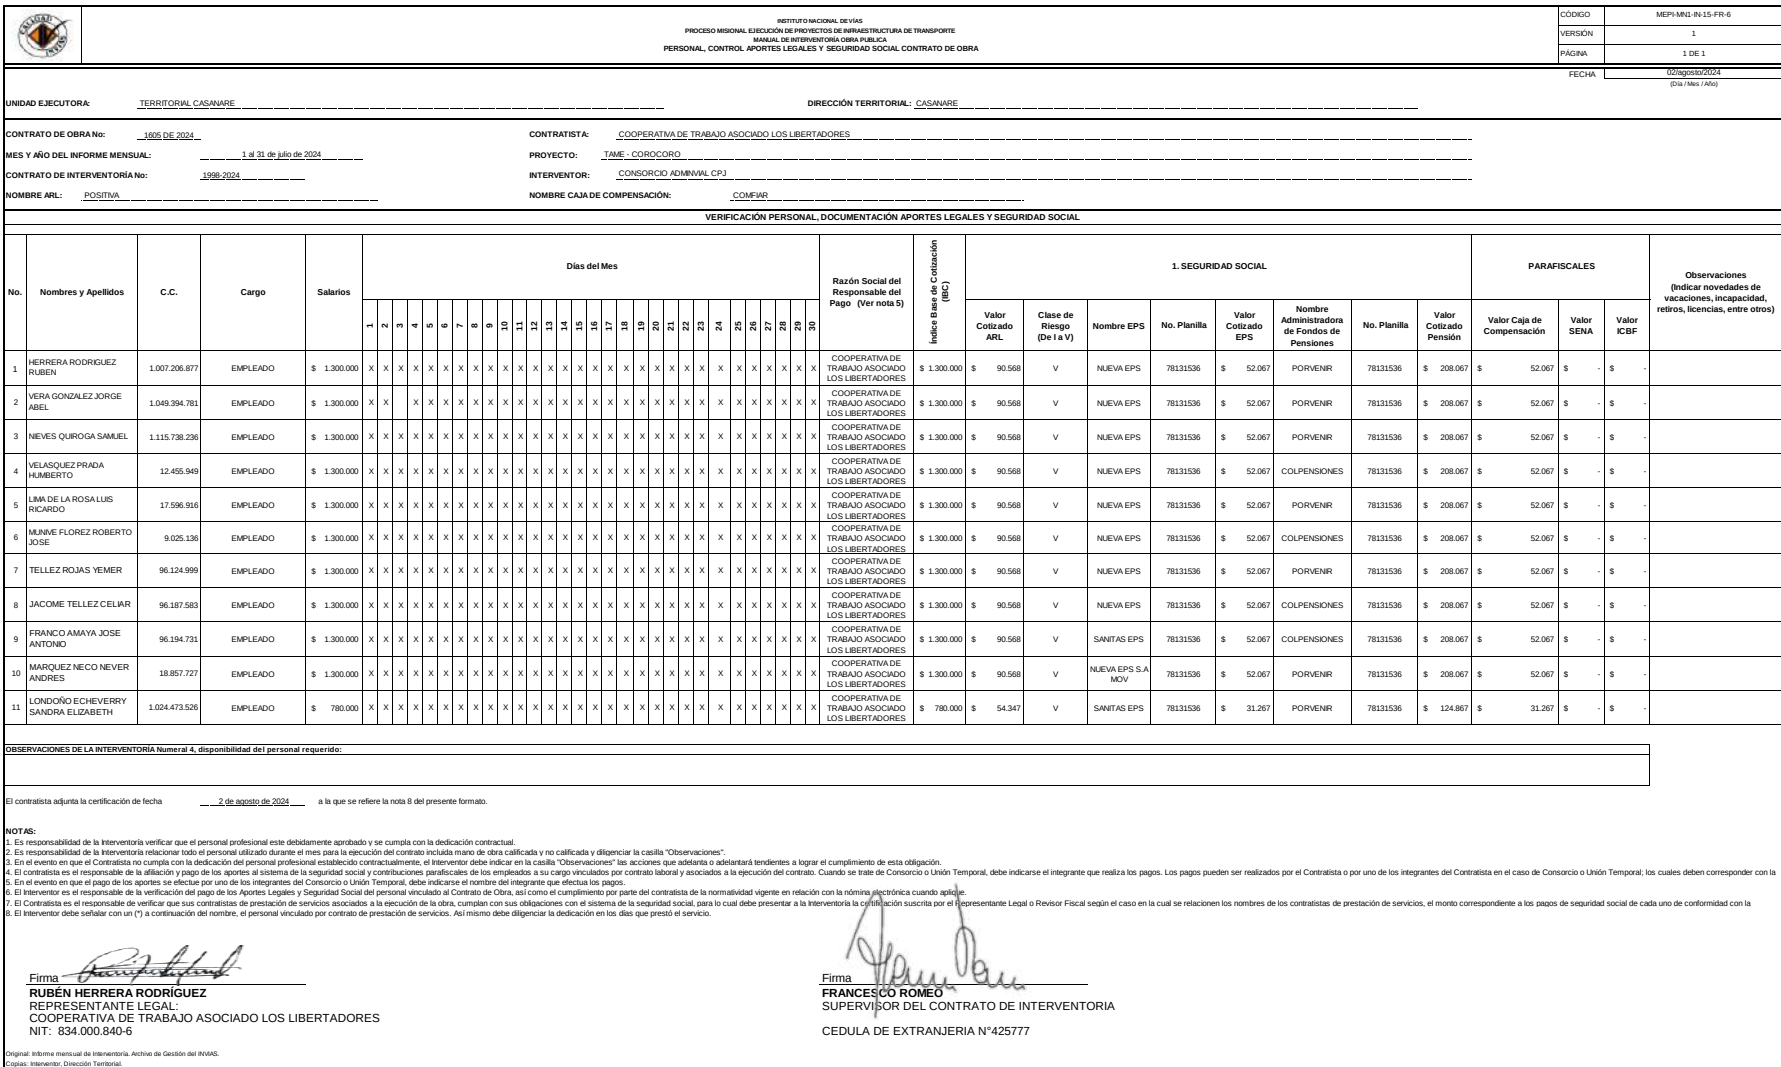

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA

02/agosto/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1605 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de julio de 2024

PROYECTO: TAME - COROCORO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1998-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0,00
Lluvias intensas																																0,00
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


Fuente: registro pluviometrico IDEAM, Estación MORICHAL COD. 36030030, periodo del 01 al 31 de julio de 2024. PARA ESTE PERIODO EL IDEAM REPORTO LLUVIAS
<http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>

PRECIPITACION



Firma 

RUBÉN HERRERA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
NIT: 834.000.840-6

Firma 

FRANCESCO ROMEO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CEDULA DE EXYRANJERIA N° 425777

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA

02

agosto

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

1605 DE 2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 – LOTE 11

FECHA DE INICIO:

04/junio/2024

PLAZO INICIAL:

31/julio/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/julio/2026

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 1.354.600.566,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.354.600.566,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1998-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 135.460.056,60	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			8	5	2024	27	2	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 27.092.013,20	8	5	2024	27	2	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ 406.380.169,80	8	5	2024	27	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

57-44- 101005192 23/5/2024

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

29/mayo/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 52.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			8	5	2024	27	8	2026

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

57-40- 101002432 24/5/2024

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

N/A

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

29/mayo/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento			Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

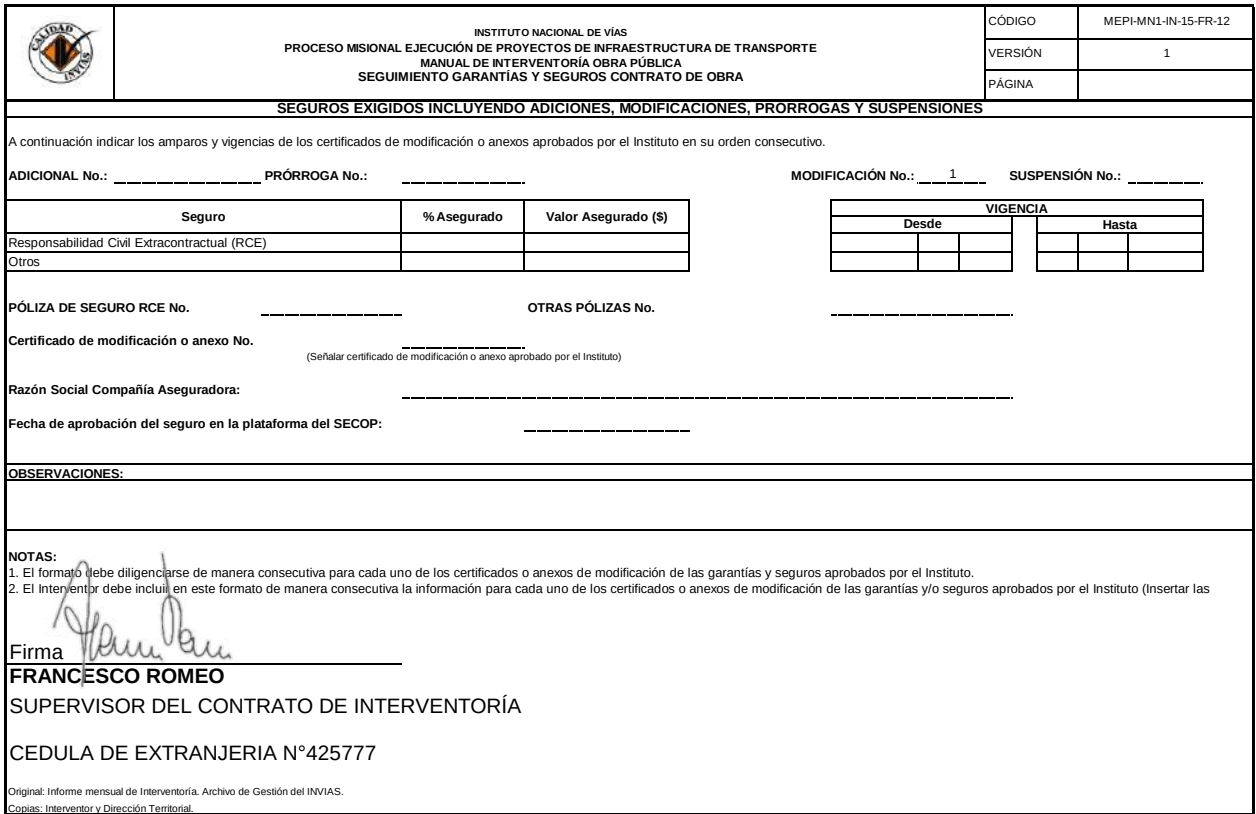

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	834000840-6	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES C		CALLE 18A 38 59	3107010212	cooptrilib2017@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-07	E	22/07/2024	78815807	11
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.358.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.300.000	0		0		0	0	0	0	1.300.000	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.456.000	0	0	0	0	0	0		1.456.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	995.500				995.500	0	0	995.500			9.955	995.500	11

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF67	Comfiar - Arauca					800219488-4	572.000	0	0
					Total a Pagar				
					11				

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
286.000	0	0	286.000	11
ICBF				
429.000	0	0	429.000	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.787.500	1.787.500
Pensión	2	2.288.000	2.288.000
Riesgos Laborales	1	995.500	995.500
CCF	1	572.000	572.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	429.000	429.000
MEN	0	0	0
SENA	1	286.000	286.000
TOTALES	9	6.358.000	6.358.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	834000840-6	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES C		CALLE 18A 38 59	3107010212	cooptralib2017@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ARAUCA	TAME	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/07/2024	78815807	\$6.358.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1007206877	HERRERA RODRIGUEZ RUBEN	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1049394781	VERA GONZALEZ JORGE ABEL	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
3	CC	1115738236	NIEVES QUIROGA SAMUEL	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
4	CC	12455949	VELASQUEZ PRADA HUMBERTO	1	0		N																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
5	CC	17596916	LIMA DE LA ROSA LUIS RICARDO	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
6	CC	9025136	MUNIVE FLOREZ ROBERTO JOSE	1	0		N																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
7	CC	96124999	TELLEZ ROJAS YEMER	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
8	CC	96187583	JACOME TELLEZ CELIAR	1	0		N																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	CC	96194731	FRANCO AMAYA JOSE ANTONIO	1	0		N																		25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	18857727	MARQUEZ NECO NEVER ANDRES	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	1024473526	LONDOÑO ECHEVERRY SANDRA ELIZABETH	1	0		N																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
