

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 11. Año: 2024

CONTRATO N°: 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

CONTRATISTA: RANDOM TECH S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 47.630.980,45

FORMA DE PAGO:

El contrato se pagará de acuerdo a los siguientes cortes, previa entrega de factura, certificación de aportes, planilla de pago, certificación bancaria y demás documentos necesarios para el trámite de pago:

- Corte parcial a 31 de mayo de 2024 con mínimo el 40% del valor del contrato, con cargo al PAC de junio de 2024.
- Corte final a 30 de septiembre de 2024 con el restante 60% con PAC octubre de 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 26 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL Y MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (MODIFICACIÓN DE PLAZO Y FORMA DE PAGO)

FECHA DE FIRMA: 30/09/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Prórroga en tiempo y modificación del PAC

FORMA DE PAGO:

El contrato se pagará de acuerdo a los siguientes cortes, previa entrega de factura, certificación de aportes, planilla de pago, certificación bancaria y demás documentos necesarios para el trámite de pago:

- Corte final a 30 de noviembre de 2024 con el restante 60% con PAC diciembre de 2024 y/o cxp 2025

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 7/03/2024 hasta el 30/11/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 93 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 98 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

A la fecha se realiza pago por valor de \$ 19.053.850,6 correspondiente al 40% del contrato. El pago se efectúa mediante factura No. FE 5

Porcentaje de pagos realizados: 40 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SERGIO MORENO ESCALONA	REPRESENTANTE LEGAL	N/A
JOSE EDUARDO LÓPEZ MEDINA	INGENIERO CIVIL - ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	021037-0618067 ATL
ALEXANDER ÁVILA MERCADO	OPERADOR LAVADO DE TANQUES	N/A
LUIS ANTONIO FONTALVO GÓMEZ	OPERADOR LAVADO DE TANQUES	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
Durante el mes de agosto se citó a la empresa RANDOM TECH S.A.S por posible incumplimiento, En referencia al oficio No FAC-S-2024-142500-CI del 23 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL, que tiene por asunto: "NOVEDADES EJECUCIÓNCONTRATO 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024" y el acta No. FAC-S-2024-061696-AG"AUDIENCIA PREVIA ARTICULO 86 LEY 80/93" del 2/8/2024. Respetuosamente me permito informar al Señor Teniente Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM3,que una vez surtido el plazo establecido 5/8/2024 durante la audiencia previa con el contratista RANDOM TECH de allegar los estudios de seguridad (ESP) de todo el personal técnico para dar continuidad a la ejecución del contrato, el contratista en mención no dio cumplimiento al compromiso pactado entre ambas partes; lo anterior está generando dilación a la ejecución del contrato y afectación al cronograma de ejecución de las actividades al interior del CACOM-3.Cabe mencionar mi Coronel, que la fecha de culminación del contrato es 30/09/2024 y presenta una ejecución del 51%, esto podría afectar la calidad en la ejecución de las actividades por la premura del tiempo

Mediante Acta No. FAC-S-2024-069160-AG del 26/08/2024 con asunto: AUDIENCIA ARTICULO 86 LEY 80/93 CONTRATO 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024, la cual fecha para el 30/08/2024 la lectura de la resolución.

En ese orden de ideas, se establece como fecha de materialización del incumplimiento el día 06 de agosto del año 2024, para efectos de establecer la tasación de la multa y como fecha final, el día de recepción de los documentos por parte del contratista el día 23 de agosto del 2024, para una totalidad de 17 días.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se procede a tasar la multa así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJO A REALIZAR	VALOR
1	SIPS Electrobomba tipo lapicero con motor de 10 HP 220 voltios trifásica Bomba de 9 etapas para 60 metros de profundidad. En acero inoxidable tanto impulsores como camisa. Incluye instalación tablero eléctrico.	\$ 9.800.000,00
2	SIPS 18 tubos de 3 metros de 3 pulgadas CH40. Acero al carbón .	\$ 2.520.000,00
3	SIPS 18 uniones CH40. Acero al carbón .	\$ 1.519.700,04
7	Limpieza Tubería Alcantarillado Aguas Negras y Pluvial (vehículo de succión- Presión, incluye limpieza sumideros)	\$ 2.686.050,15
8	Realización de 02 pruebas de bombeo determinando lo siguiente: Nivel estático (N.E) Nivel Dinámico (N.D) en intervalos de tiempo. Abatimiento (S), Capacidad Especifica (C.E) , profundidad del pozo	\$ 3.858.456,00
2.1	Lavado y desinfección tanques de 500 L	\$ 1.429.999,89

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

2.2	Lavado y desinfección tanques de 1000 L	\$ 2.372.499,74
2.3	Lavado y desinfección tanques de 2000 L	\$ 318.825,00
2.4	Lavado y desinfección tanques subterráneos de 5 m³	\$ 425.425,00
2.5	Lavado y desinfección tanques subterráneos de 25 m³	\$ 1.769.950,00
VALOR TOTAL		\$ 26.700.905,82
VALOR DEL 0.1% DIARIO		\$ 267.009,0582
SUMATORIA DEL 0.1% DESDE EL 06 AGOSTO DEL 2024 AL 23 DE AGOSTO DE 2024 (13 DÍAS hábiles)		\$ 3.471.117,76

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí X

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No Aplica

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

Durante el presente mes de OCTUBRE el contratista realizó la instalación de la electrobomba tipo lapicero, cambio de la tubería, realización de las pruebas de bombeo en ambos pozos. Incluido el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, tanto elevados como subterráneos al interior del CACOM-3.

De igual manera el contratista durante el presente mes objeto de realización del informe programa la limpieza de las redes de alcantarillado con apoyo del vehículo vector, esa actividad se encuentra programada para la segunda semana del mes de noviembre.

La ejecución de las actividades se ve reflejado en el informe de avance de actividades enviado por el contratista, el cual se adjunta al presente informe de supervisión.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°: 04

VIGENCIA: 30-07-2024

ÍTEM	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
Tanques elevados de 500 L	53	Mantenimiento, lavado y desinfección de tanques para agua potable	Áreas residenciales y administrativas	Completado al 100%
Tanques elevados de 1000 L	59	Mantenimiento y desinfección de tanques para agua potable	Zonas operativas y de entrenamiento	Completado al 100%
Tanques elevados de 2000 L	6	Mantenimiento y desinfección de tanques para agua potable	Áreas de comando y operaciones	Completado al 100%
Tanques subterráneos de 5 m³	2	Mantenimiento y desinfección de tanques subterráneos	Zonas de almacenamiento y áreas críticas	Completado al 100%
Tanques subterráneos de 25 m³	5	Mantenimiento y desinfección de tanques subterráneos	Áreas centrales del CACOM-3	Completado al 100%
SIPS de pulsos de ahorros para lavamanos	2	Instalación de sistemas de ahorros en lavamanos para optimización de consumo de agua	Baños de áreas administrativas y operativas	Completado al 100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024


ACTIVIDADES PENDIENTES

Como pendientes se encuentran 777 metros del ítem 6.0 Limpieza de tubería de alcantarillado (aguas negras y pluvial), esta actividad se programó con el contratista para la segunda semana del mes de noviembre, con la ejecución de dicha actividad se llegaría al 100% en el porcentaje de ejecución del presente contrato.



Fotografía Cambio electrobomba tipo lapicero de acuerdo a ficha técnica

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

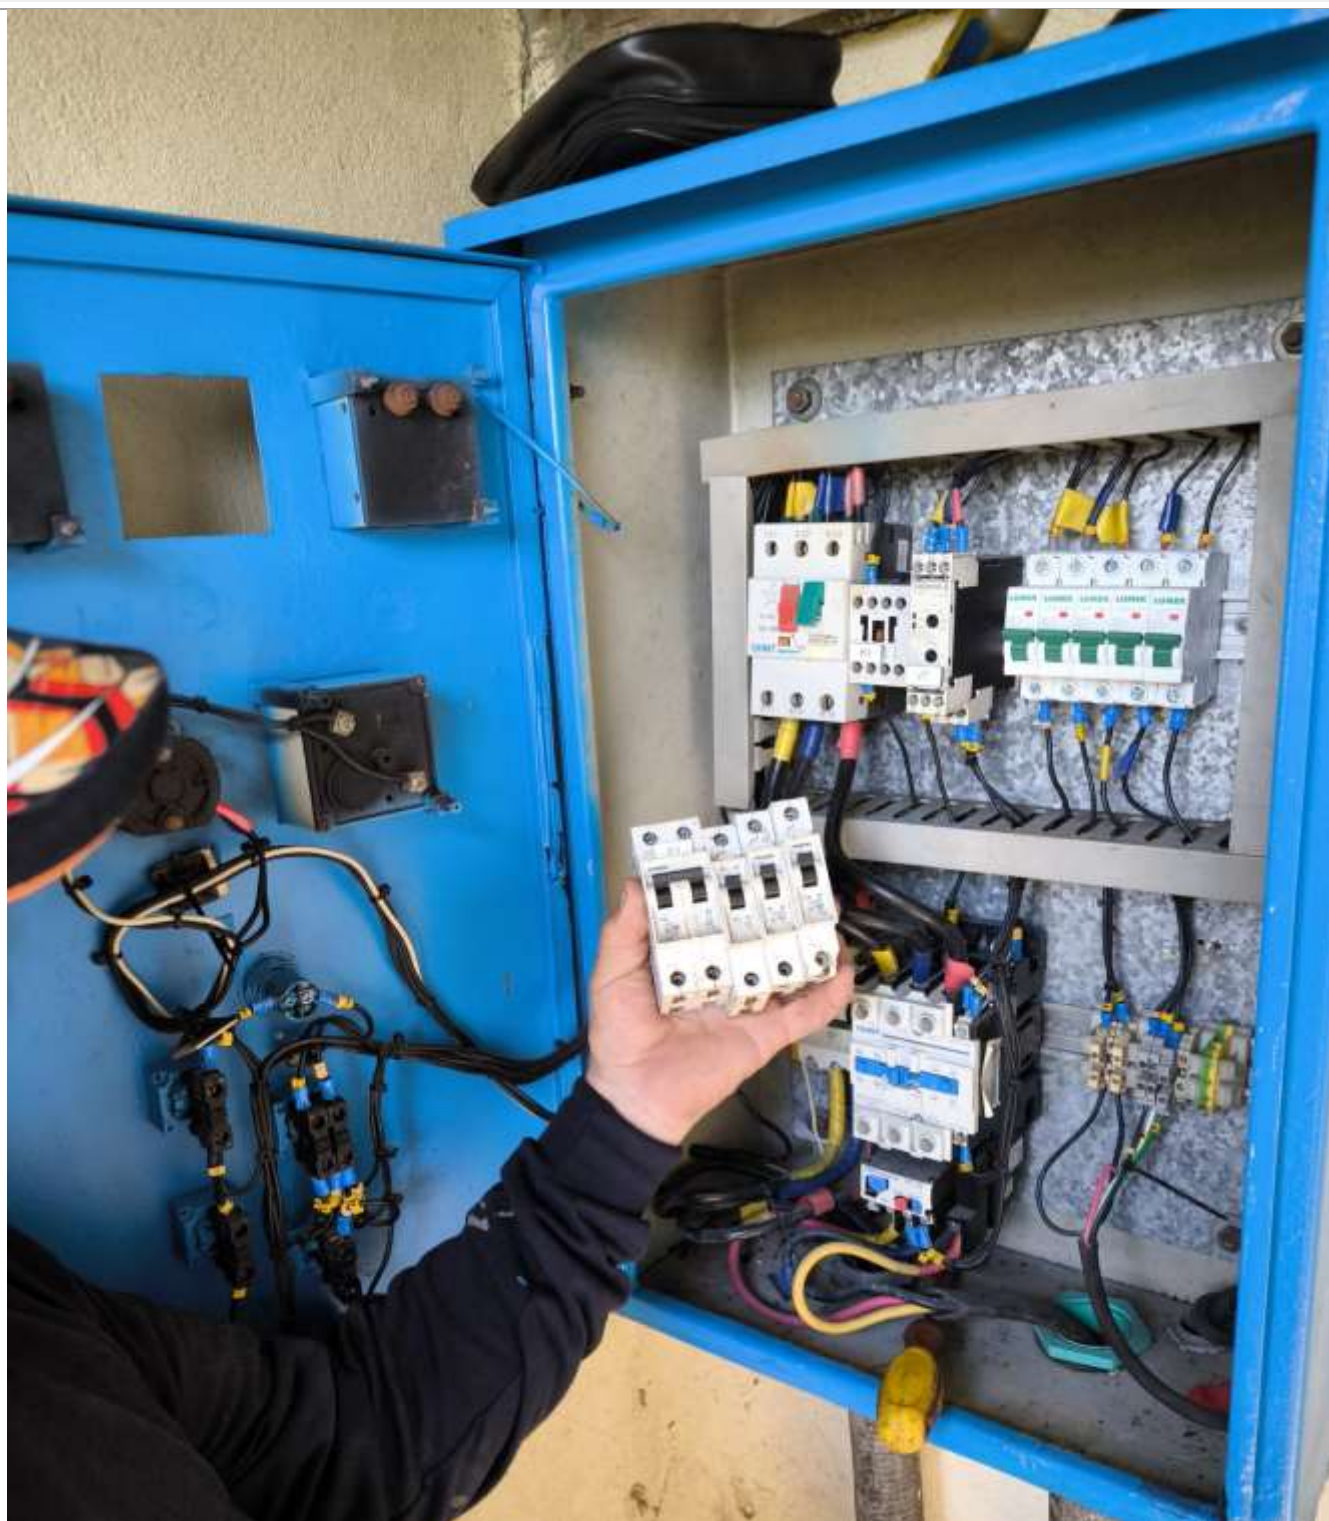

Fotografía Cambio de accesorio tablero de control pozo profundo Dragoncitos



Fotografía Pruebas de bombeo pozo profundo complejo de combustible. Medición de niveles pozo






FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024



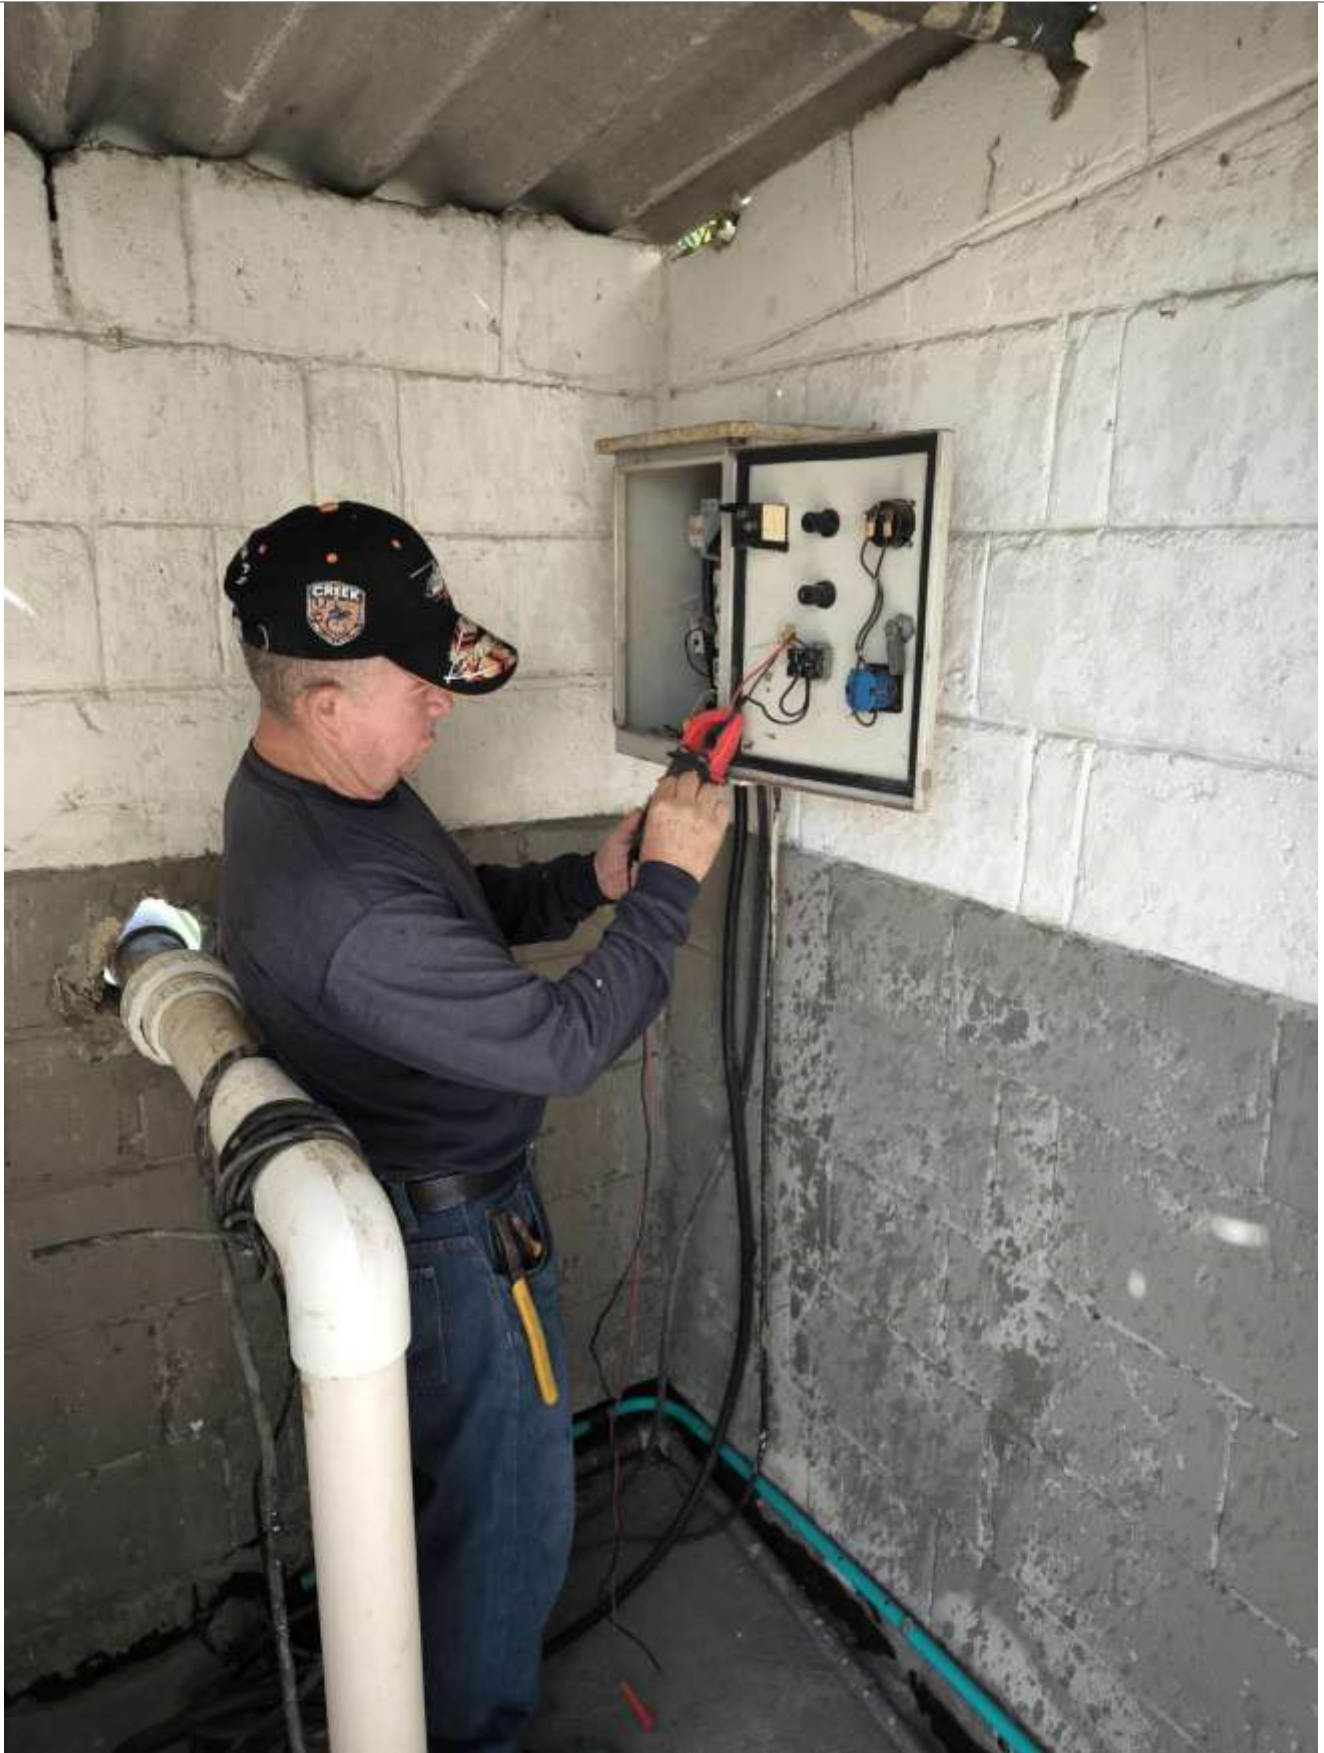



Fotografía Cambio de tubería pozo profundo Dragoncitos



FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024



Fotografía tablero de control Dragoncitos

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



Fotografía instalación macro medidor nuevo pozo Dragoncitos



Adecuación seguridad del tablero de control



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024



Fotografía verificación de amperaje y tensión del pozo profundo complejo de combustible

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



Fotografías limpieza y lavado tanques elevados sector Oficiales al interior del CACOM-3




Fotografías limpieza y lavado tanques elevados sector Suboficiales al interior del CACOM-3



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024

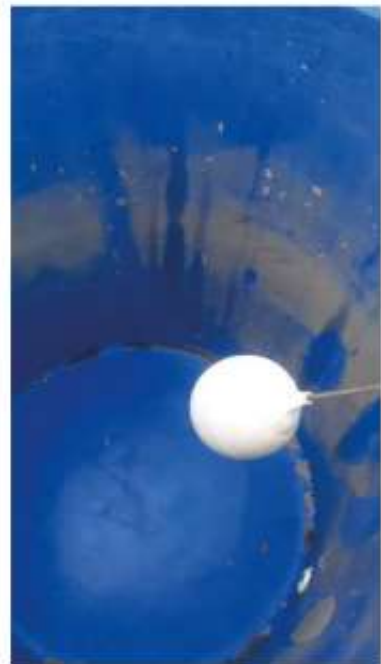



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024



Limpeza y desinfección de tanques elevados al interior del CACOM-3





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024







FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024



Limpieza y desinfección de tanques subterráneos para el almacenamiento de agua potable al interior del CACOM-3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

A la fecha se realiza pago por valor de \$ 19.053.850,6 correspondiente al 40% del contrato. El pago se efectúa mediante factura No. FE 5



RANDOM TECH S.A.S

NET 901.401.931-1

Calle 6 # 19a - 74
Tel: (605) 3003843727
Valledupar - Colombia
Randomtech04@gmail.com



Factura electrónica de venta

No. FE 5

Señores:

FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No 3

NIT

800.141.629-9

Teléfono

(605) 0000000 - Ext. 000

Dirección

Kilometro 3 vía Malambo, Atlántico

Ciudad

Malambo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

11/05/2024, 22:40

Expedición

11/05/2024, 22:40

Vencimiento

11/05/2024

Total items: 9

Valor en Letras:
Diecinueve millones cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia

\$ 19,053,850.63

Total Bruto

16,011,639.19

IVA 19%

3,042,211.44

Total a Pagar

19,053,850.63

Observaciones:
#S15-01-05-005;011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024;cristian.rochao@fac.mil.co#

Fabricante Software y Transmisor: Random Logos S.A.S. - NIT 901.401.931-1 Random Software S.A.S. Firma electrónica ver en el DOL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Entre las actividades pendientes se encuentran:

6	Limpieza tubería alcantarillado agua negra y pluvial (vehículo de sección - 777 Metros presión, incluye limpieza sumidres)
----------	--

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO

FIRMA:



C.C. No. 1.053.809.879 DE MANIZALES, CALDAS


DEPENDENCIA: GRUAL

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	El contratista incumple con las fechas establecidas en el cronograma de ejecución.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Contrato en ejecución



ST. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO
Supervisor

SEGUNDO INFORME DETALLADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: 05 de noviembre de 2024

CONTRATO N°: 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

CONTRATISTA: RANDOM TECH S.A.S.

FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de febrero de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como objeto el mantenimiento de las redes de acueducto, redes de alcantarillado, sanitario y pluvial, así como el mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.

2. PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- **Plazo de ejecución inicial:** 07 de marzo de 2024 al 30 de septiembre de 2024.
- **Porcentaje de pagos realizados:** 40%
- **Porcentaje de pagos pendientes:** 60%

Prórroga del contrato:

Se aprobó una prórroga que extiende el plazo de ejecución desde el 01 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024. El cronograma de trabajo para esta extensión inició el 07 de octubre de 2024.

- **Fecha estimada de finalización:** 29 de noviembre de 2024.

3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

A la fecha del informe, se han ejecutado las siguientes actividades:

- **Mantenimiento y reparación de redes:** 80% completado.
- **Lavado y desinfección de tanques:** 100% completado según el cronograma extendido.
- **Suministro e instalación de equipos:** Electrobomba, tubos y uniones de acero al carbón, y macromedidor.
- **Prueba de bombeo:** Realizada satisfactoriamente.
- **Novedades por filtración:** Se presentó daño en drywall

- Anexo certificado
- Anexo fotos

4. DETALLE DE ÍTEMS EJECUTADOS

ÍTEM	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
Tanques elevados de 500 L	53	Mantenimiento, lavado y desinfección de tanques para agua potable	Áreas residenciales y administrativas	Completado al 100%
Tanques elevados de 1000 L	59	Mantenimiento y desinfección de tanques para agua potable	Zonas operativas y de entrenamiento	Completado al 100%
Tanques elevados de 2000 L	6	Mantenimiento y desinfección de tanques para agua potable	Áreas de comando y operaciones	Completado al 100%
Tanques subterráneos de 5 m ³	2	Mantenimiento y desinfección de tanques subterráneos	Zonas de almacenamiento y áreas críticas	Completado al 100%
Tanques subterráneos de 25 m ³	5	Mantenimiento y desinfección de tanques subterráneos	Áreas centrales del CACOM-3	Completado al 100%
SIPS de pulsores ahorradores para lavamanos	2	Instalación de sistemas ahorradores en lavamanos para optimización de consumo de agua	Baños de áreas administrativas y operativas	Completado al 100%

TANQUES ELEVADOS DE 500 LITROS - 53 UNIDADES

Descripción: Se realizó el mantenimiento, lavado y desinfección de 53 tanques elevados de 500 litros. Estos tanques almacenan agua potable y son vitales para el suministro continuo a diversas áreas del CACOM-3. El mantenimiento asegura la calidad del agua, previniendo la contaminación y garantizando la salud de los usuarios.

Ubicación de Ejecución: Los tanques están ubicados en áreas residenciales y administrativas dentro del CACOM-3.



+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>

Estado de Ejecución: Completado al 100%.

TANQUES ELEVADOS DE 1000 LITROS - 59 UNIDADES

Descripción: Se llevó a cabo el mantenimiento y desinfección de 59 tanques elevados de 1000 litros. Estos tanques, dedicados al almacenamiento de agua potable, son esenciales para cubrir las necesidades diarias de las instalaciones y personal del CACOM-3.

Ubicación de Ejecución: Los tanques están ubicados principalmente en las zonas operativas y de entrenamiento del CACOM-3.

Estado de Ejecución: Completado al 100%.

TANQUES ELEVADOS DE 2000 LITROS - 6 UNIDADES

Descripción: El mantenimiento y desinfección de 6 tanques elevados de 2000 litros fueron ejecutados para garantizar la disponibilidad de agua potable en instalaciones clave del CACOM-3. Estos tanques tienen mayor capacidad y son críticos en áreas con alta demanda de agua.

Ubicación de Ejecución: Estos tanques están situados en instalaciones estratégicas, incluyendo áreas de comando y salas de operaciones.

Estado de Ejecución: Completado al 100%.

TANQUE SUBTERRÁNEO DE 5 M³ - 2 UNIDADES

Descripción: Se realizaron trabajos de mantenimiento y desinfección en 2 tanques subterráneos de 5 metros cúbicos. Estos tanques sirven como reserva de agua potable, asegurando un suministro constante en caso de emergencias o interrupciones en el servicio.

Ubicación de Ejecución: Los tanques subterráneos se encuentran ubicados en zonas de almacenamiento y áreas críticas dentro del CACOM-3.

Estado de Ejecución: Completado al 100%.

TANQUE SUBTERRÁNEO DE 25 M³ - 5 UNIDADES

Descripción: Se llevó a cabo el mantenimiento y desinfección de 5 tanques subterráneos de 25 metros cúbicos. Estos tanques son parte integral del sistema de almacenamiento de agua potable de gran capacidad, crucial para el abastecimiento en áreas de gran demanda y en situaciones de contingencia.

Ubicación de Ejecución: Los tanques están ubicados en áreas centrales del CACOM-3, asegurando la distribución efectiva de agua potable en todo el complejo.

Estado de Ejecución: Completado al 100%.



+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>

SIPS DE PULSORES AHORRADORES PARA LAVAMANOS - 2 UNIDADES

Descripción: Se instalaron cuatro sistemas de pulsos ahorradores en los lavamanos ubicados en diversas áreas del Comando Aéreo de Combate No. 3. Estos sistemas están diseñados para optimizar el uso de agua, reduciendo el consumo sin comprometer la funcionalidad y la eficiencia del servicio. Los pulsadores ahorradores permiten un flujo controlado de agua, contribuyendo a las políticas de sostenibilidad y eficiencia energética de la unidad.

Ubicación de Ejecución: Los pulsadores fueron instalados en los baños de las áreas administrativas y operativas del CACOM-3.

Estado de Ejecución: Completado al 100%.

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS

En cumplimiento con las especificaciones del contrato, se suministraron e instalaron los siguientes equipos:

- **Electrobomba tipo lapicero**
 - Potencia: 10 HP
 - Tensión: 220 V, trifásica
 - 9 etapas, capacidad de bombear 15 L a 60 m de profundidad
 - Material: acero inoxidable
- **Tubos de acero al carbón**
 - Cantidad: 18 tubos de 3 m, diámetro: 3 pulgadas, referencia: CH 40
- **Uniones de acero al carbón**
 - Cantidad: 18 uniones de 3 pulgadas de diámetro
- **Macromedidor**
 - Función: Medición precisa del flujo de agua en el sistema de bombeo

Prueba de Bombeo

Una vez instalada la electrobomba tipo lapicero, se realizó la **prueba de bombeo** para verificar la operatividad del sistema. La prueba permitió determinar que el equipo funcionó dentro de los parámetros establecidos, garantizando el flujo adecuado de agua desde el sistema de bombeo hacia las áreas correspondientes.

Detalles de Pruebas en Pozos:



+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>

POZO	FECHA	NIVEL ESTÁTICO	NIVEL DINÁMICO	CAUDAL	TIEMPO DE RECUPERACIÓN	TIEMPO DE BOMBEO
Dragoncito	14/10/2024	7 m	22 m	4.5 L/s	3 horas	12 horas
Combustible	26/10/2024	7.2 m	25 m	13.5 L/s	1 hora	8 horas

6. ÍTEMS PENDIENTES POR EJECUTAR

- **Limpieza de tubería de alcantarillado (aguas negras y pluvial)**
 - Método: Vehículo de succión-presión, incluye limpieza de sumideros
 - Total pendiente: 777 metros (23.71% del volumen total programado de 3,277 metros)

7. NOVEDADES POR FILTRACIÓN DE AGUA DURANTE EL LAVADO DE TANQUES

El día 22 de octubre se detectó una filtración de agua en el edificio de apartamentos Caravan, la cual causó daños en el drywall de uno de los baños. Tras verificar los daños, se llevaron a cabo las reparaciones necesarias. Además, se emitieron recomendaciones para prevenir incidentes similares en el futuro.


7. CONCLUSIÓN

Este informe detalla los trabajos realizados conforme al contrato 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024, mostrando un avance significativo y satisfactorio en los ítems programados, con impacto positivo en las operaciones del CACOM-3. A la fecha, se prevé la culminación total de las actividades antes del 29 de noviembre de 2024, conforme a los términos pactados.

FIRMA DEL RESPONSABLES:



José Eduardo López Medina
Ing. Civil
C.C. 1.065.837.333



Sergio José Moreno Escalona
C.C. 1.065.598.566
Representante Legal
Random Tech S.A.S.
NIT: 901.401.931-1





**LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA Y EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ÁREA SALUD DEL PROGRAMA SALUD AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS**

CERTIFICA

Que en la visita de inspección Higiénico Sanitaria realizada al establecimiento de comercio **LIMPIEZAS DE LA COSTA S.A.S. (LIMCOSTA)** con Nit/Matrícula No **900764716-8** dedicado a la actividad comercial principal «**ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS**» con Código **CIIU 8130**, actividad secundaria «**ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA**» con código **CIIU 0161** y otras actividades «**OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES**» con Código **CIIU 8129** y «**LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS**» con código **CIIU 8121** representado legalmente por **ALDEMAR DE JESUS MOLINARES SIERRA** con Cédula de Ciudadanía. No **73.154.497**, correo electrónico: limcostasas@gmail.com Teléfono: **3106600120** ubicado en **BARRIO EL POZON TRANSVERSAL 54 SECTOR 1RO DE MAYO MZ 148 LT 6. CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA** y luego de inspeccionar las instalaciones y revisar la documentación, se pudo comprobar que **CUMPLE** con los requisitos higiénicos sanitarios para su funcionamiento contemplados en la Ley 09 de 1979 y demás normas reglamentarias vigentes.

% CUMPLIMIENTO Y CONCEPTO DEL ACTA DE VISITA SANITARIA: **100% FAVORABLE.**

La presente Certificación Sanitaria tiene validez por el término de DOCE (12) MESES hasta el mes de noviembre de 2025, contado a partir de la fecha de su expedición, el 05 de noviembre de 2024 y puede ser suspendida si:

- a) Se modifican las condiciones sanitarias existentes al momento de su expedición.
- b) Se infrinjan las normas legales establecidas.
- c) Cuando se cambie la dirección del establecimiento de comercio.

Dado en Cartagena de Indias a los CINCO (05) días del mes de noviembre de 2024.

WILSON ORTEGA HERNANDEZ
Profesional Especializado
Código 222 Grado 41
Programa Salud Ambiental
Dirección Operativa Salud Pública -DADIS
Alcaldía Mayor Cartagena de Indias

Realizó la visita de inspección sanitaria: HECTOR ALVIS– Técnico Área Salud-Programa Salud Ambiental – Dirección Operativa de Salud Pública DADIS

Programa Salud Ambiental- Dirección Operativa Salud Pública
Departamento Administrativo Distrital de Salud- DADIS
Dirección: Cra 10B #25-10 Getsemaní Calle Larga Casa Fátima
Correo electrónico: ambientesaluddadis@cartagena.gov.co

LIMPIEZA DE LA COSTA SAS

CERTIFICA QUE

Yo, ALDEMAR MOLINARES SIERRA, identificado con la C.C. 73.154.497 de la ciudad de Valledupar, Cesar, y representante legal de la empresa LIMPIEZA DE LA COSTA SAS, con NIT 900.764.716-8, hace constar que la empresa RANDOM TECH, con NIT 901401931-1, representada legalmente por el señor SERGIO JOSE MORENO ESCALONA, identificado con la C.C. 1.065.598.566 de la ciudad de Valledupar, Cesar, tenemos una alianza comercial desde el año 2020 para la realización de actividades de lavado y desinfección de tanques elevados y subterráneos, además de la fumigación de toda clase de roedores y tala de árboles, mantenimiento de toda clase de redes de acueducto de agua potable y pluvial, limpieza de alcantarillado y trampas de grasa, ya que contamos con los equipos adecuados para estas actividades y los permisos correspondientes con la entidad prestadora de salud y la autoridad competente.

ATENTAMENTE:



Aldemar Molinares S.
Representante legal
Nit: 900.764.716-8
C.C. 73154497
TEL: 3128747835

LIMPIEZA DE LA COSTA SAS

CERTIFICA QUE

Yo, **ALDEMAR MOLINARES SIERRA** identificado con la CC 73154497 de la ciudad de Valledupar – cesar y representante legal de la empresa **LIMPIEZA DE LA COSTA SAS** con NIT: 900.764.716-8, hace constar que se hizo el lavado de **cincuenta y tres (53) tanques elevados de 500 litros**, estos pertenecientes al **COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 3** ubicado en malambo atlántico.

Este certificado se firma en la ciudad de Cartagena a los 5 días del mes de noviembre del 2024.

ATENTAMENTE:



Aldemar Molinares S.
Representante legal
Nit: 900.764.716-8
C.C. 73154497
TEL: 3128747835

LIMPIEZA DE LA COSTA SAS

CERTIFICA QUE

Yo, **ALDEMAR MOLINARES SIERRA** identificado con la CC 73154497 de la ciudad de Valledupar – cesar y representante legal de la empresa **LIMPIEZA DE LA COSTA SAS** con NIT: 900.764.716-8, hace constar que se hizo el lavado de **cincuenta y nueve (59) tanques elevados de 1000 litros**, estos pertenecientes al **COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 3** ubicado en malambo atlántico.

Este certificado se firma en la ciudad de Cartagena a los 5 días del mes de noviembre del 2024.

ATENTAMENTE:



Aldemar Molinares S.
Representante legal
Nit: 900.764.716-8
C.C. 73154497
TEL: 3128747835

LIMPIEZA DE LA COSTA SAS

CERTIFICA QUE

Yo, **ALDEMAR MOLINARES SIERRA** identificado con la CC 73154497 de la ciudad de Valledupar – cesar y representante legal de la empresa **LIMPIEZA DE LA COSTA SAS** con NIT: 900.764.716-8, hace constar que se hizo el lavado de **seis (6) tanques elevados de 2000 litros**, estos pertenecientes al **COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 3** ubicado en malambo atlántico.

Este certificado se firma en la ciudad de Cartagena a los 5 días del mes de noviembre del 2024.

ATENTAMENTE:



Aldemar Molinares S.
Representante legal
Nit: 900.764.716-8
C.C. 73154497
TEL: 3128747835

LIMPIEZA DE LA COSTA SAS

CERTIFICA QUE

Yo, **ALDEMAR MOLINARES SIERRA** identificado con la CC 73154497 de la ciudad de Valledupar – cesar y representante legal de la empresa **LIMPIEZA DE LA COSTA SAS** con NIT: 900.764.716-8, hace constar que se hizo el lavado de **dos (2) tanques subterráneos de 5m³**, estos pertenecientes al **COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 3** ubicado en malambo atlántico.

Este certificado se firma en la ciudad de Cartagena a los 5 días del mes de noviembre del 2024.

ATENTAMENTE:



Aldemar Molinares S.
Representante legal
Nit: 900.764.716-8
C.C. 73154497
TEL: 3128747835

LIMPIEZA DE LA COSTA SAS

CERTIFICA QUE

Yo, **ALDEMAR MOLINARES SIERRA** identificado con la CC 73154497 de la ciudad de Valledupar – cesar y representante legal de la empresa **LIMPIEZA DE LA COSTA SAS** con NIT: 900.764.716-8, hace constar que se hizo el lavado de **cinco (5) tanques subterráneos de 25m³**, estos pertenecientes al **COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 3** ubicado en malambo atlántico.

Este certificado se firma en la ciudad de Cartagena a los 5 días del mes de noviembre del 2024


ATENTAMENTE:



Aldemar Molinares S.
Representante legal
Nit: 900.764.716-8
C.C. 73154497
TEL: 3128747835





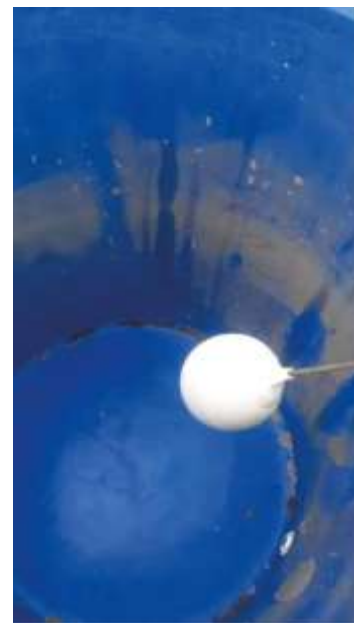









+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>







+57 300 3843727





Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>





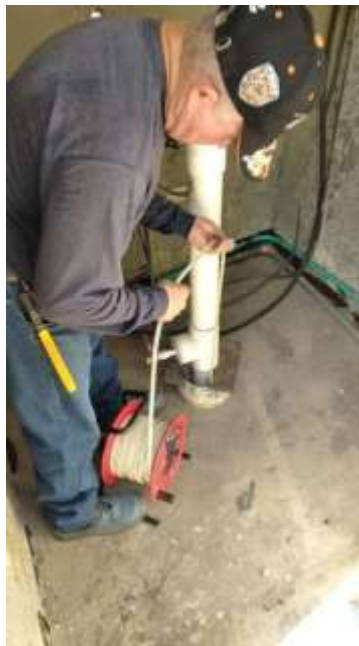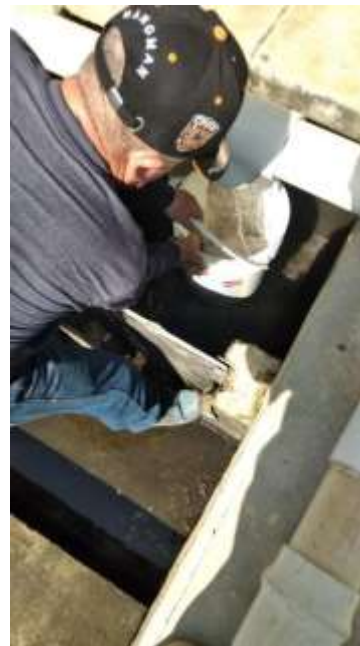

Señores:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO
AEREO DE COMBATE No.3**
Malambo

Valledupar, 06 de noviembre de 2024

REFERENCIA: Contrato 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

ASUNTO: Informe de Pruebas de Bombeo en Pozos

Se realizaron pruebas de bombeo en dos pozos denominados " DRAGONCITO " y "COMBUSTIBLE" con el fin de evaluar su rendimiento y analizar los niveles de agua durante el bombeo y recuperación. Estos datos son fundamentales para la planificación del uso y mantenimiento de los pozos, así como para la gestión sostenible de los recursos hídricos en la zona.

DETALLES DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO

Pozo Dragoncito

- **Fecha de prueba:** 14 de octubre de 2024
- **Nivel estático:** 7.0 m
- **Nivel dinámico:** 22.0 m
- **Caudal de bombeo:** 4.5 L/s
- **Tiempo de recuperación:** 3 horas
- **Duración de bombeo:** 12 horas

Resultados del bombeo:



+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>

TIEMPO TOTAL DE BOMBEO (MINUTOS)	INTERVALO (MINUTOS)	DESDE BOCA DE POZO (M)	ABATIMIENTO	CAUDAL (LTS/SEG)
1	1	7.50	0.50	4.5
6	5	8.10	1.10	4.5
16	10	9.10	2.10	4.5
31	15	10.10	3.10	4.5
61	30	11.10	4.10	4.5
106	45	12.10	5.10	4.5
196	90	13.10	6.10	4.5
316	120	14.10	7.10	4.5
466	150	15.10	8.10	4.5
616	150	16.10	9.10	4.5
766	150	17.10	10.10	4.5

Pozo Combustible

- **Fecha de prueba:** 26 de octubre de 2024
- **Nivel estático:** 7.2 m
- **Nivel dinámico:** 25.0 m
- **Caudal de bombeo:** 13.5 L/s
- **Tiempo de recuperación:** 1 hora
- **Duración de bombeo:** 8 horas

Resultados del bombeo:



+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>

TIEMPO TOTAL DE BOMBEO (MINUTOS)	INTERVALO (MINUTOS)	DESDE BOCA DE POZO (M)	ABATIMIENTO	CAUDAL (LTS/SEG)
1	1	10.02	2.82	13.5
6	5	10.07	2.87	13.5
16	10	10.13	2.93	13.5
31	15	10.18	2.98	13.5
61	30	10.24	3.04	13.5
106	45	10.30	3.10	13.5
196	90	10.35	3.15	13.5
316	120	10.41	3.21	13.5
466	150	10.47	3.27	13.5
616	150	10.52	3.32	13.5
766	150	10.58	3.38	13.5

OBSERVACIONES


1. **Pozo Dragoncito:** mostró un nivel estático de 7 m y alcanzó un nivel dinámico de 22 m con un caudal constante de 4.5 L/s. El tiempo de recuperación de 3 horas indica una capacidad moderada de recuperación del pozo.
2. **Pozo Combustible:** presentó un nivel estático de 7.2 m y un nivel dinámico de 25 m, manteniendo un caudal de 13.5 L/s. La recuperación en 1 hora sugiere que este pozo posee una capacidad de recuperación alta en comparación con el Dragoncito.
3. Los resultados de abatimiento y nivel dinámico para ambos pozos permiten concluir que el Pozo Combustible podría soportar un caudal de bombeo superior, siendo una opción preferente para bombeo de alta demanda.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda priorizar el uso del Pozo Combustible en actividades que requieran mayor volumen de extracción, dada su capacidad de recuperación y menor abatimiento relativo al caudal bombeado.
- Para el Pozo Dragoncito, se sugiere monitorear los niveles dinámicos con frecuencia durante períodos de bombeo prolongado, y en caso de presentarse un abatimiento excesivo, disminuir la tasa de bombeo para evitar la sobreexplotación del pozo.
- Se recomienda realizar inspecciones regulares en ambos pozos para asegurar el óptimo funcionamiento del equipo de bombeo y monitorear cualquier cambio en los niveles estáticos y dinámicos.

Atentamente



Jose Eduardo Lopez Medina
C.C. 1.065.837.333
021037-0618067 ATL



+57 300 3843727



Calle 6 # 19a - 74
Valledupar - Cesar



Randomtech04@gmail.com
<https://www.rtech.com.co/>

EL DIRECTOR GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901401931	1	RANDOM TECH S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 6 # 19A-74	VALLEDUPAR-CESAR	3003843727	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1034433188	9477019987	E	2024/11/12	2024/11/07	NEQUI	0	\$770,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (3 Afiliados)					\$3,163,334	\$506,200			\$3,163,334	\$126,600			\$3,023,334	\$121,000			\$3,163,334	\$16,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)					\$3,163,334	\$506,200			\$3,163,334	\$126,600			\$3,023,334	\$121,000			\$3,163,334	\$16,700		\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)					\$3,163,334	\$506,200			\$3,163,334	\$126,600			\$3,023,334	\$121,000			\$3,163,334	\$16,700		\$0	\$0
1	CC 8798498	AVILA ALEXANDER	231001	23	\$996,667	\$159,500	CCFC55	23	\$996,667	\$39,900	CCF15	23	\$996,667	\$39,900	14-23	23	\$996,667	\$5,300	23	\$0	\$0
2	CC 1149440325	FONTALVO LUIS	230301	20	\$866,667	\$138,700	CCFC55	20	\$866,667	\$34,700	CCF15	20	\$866,667	\$34,700	14-23	20	\$866,667	\$4,600	20	\$0	\$0
3	CC 1065598566	MORENO SERGIO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$3,163,334	\$506,200			\$3,163,334	\$126,600			\$3,023,334	\$121,000			\$3,163,334	\$16,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901401931	1	RANDOM TECH S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 6 # 19A-74	VALLEDUPAR-CESAR	3003843727	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-11	1034433188		9477019987	E	2024/11/12	2024/11/07	NEQUI	\$770,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$506,200	\$0	\$0	\$506,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$159,500	\$0	\$0	\$159,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$138,700	\$0	\$0	\$138,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$16,700	\$0	\$0	\$16,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$16,700	\$0	\$0	\$16,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$126,600	\$0	\$0	\$126,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$74,600	\$0	\$0	\$74,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
TOTAL				3	\$770,500	\$0	\$0	\$770,500	



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1065837333		LOPEZ MEDINA JOSE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	joseelopezm62@gmail.com	VALLEDUPAR-CESAR	3215998412

Clave: 9474490995

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/11/12	0	\$0	\$377,300

Periodo Pensión: 2024-10

Periodo Salud: 2024-10

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$208,000
COLPENSIONES		1	\$208,000
ARL	1	1	\$6,800
ARL SURA		1	\$6,800
EPS	1	1	\$162,500
SANITAS		1	\$162,500
SUBTOTAL			\$377,300
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$377,300

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																													
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																								
CC 1065837333			LOPEZ MEDINA JOSE EDUARDO					INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			CRR 8 #6-40 BRR NOVALITO		VALLEDUPAR-CESAR		3215998412		Si																								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																													
Periodo		Clave					Tipo		Fecha				Pago																																
Pensión	Salud	Pago			Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																										
2024-10	2024-10				9474490995		I		2024/11/12								0																												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	\$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	\$377,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																										\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	\$377,300
1	CC	1065837333	LOPEZ JOSE																			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$377,300		
Total Afiliados(1)																										\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	\$377,300
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																													
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																								
CC 1065837333			LOPEZ MEDINA JOSE EDUARDO					INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			CRR 8 #6-40 BRR NOVALITO		VALLEDUPAR-CESAR		3215998412		Si																								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																													
Periodo		Clave					Tipo		Fecha				Pago																																
Pensión	Salud	Pago			Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																										
2024-10	2024-10				9474490995		I		2024/11/12								0																												
RESUMEN DE PAGO																																													
RIESGO		CODIGO			NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR																														
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$208,000		\$0		\$0		\$208,000																														
COLPENSIONES		25-14			900,336,004		7		1		\$208,000		\$0		\$0		\$208,000																												
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$6,800		\$0		\$0		\$6,800																														
ARL SURA		14-11			890,903,790		5		1		\$6,800		\$0		\$0		\$6,800																												
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500																														
SANITAS		EPS005			800,251,440		6		1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500																												
TOTAL							1		\$377,300		\$0		\$0		\$377,300																														

